

# SUMÁRIO EXECUTIVO



ABRIL  
2022

Projeto  
**São Francisco**  
Integração que transforma vidas

PROJETO DE  
INTEGRAÇÃO DO  
RIO SÃO FRANCISCO

# PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

**Presidente da República**

*Jair Messias Bolsonaro*

## MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Ministro de Estado**

*Daniel de Oliveira Duarte Ferreira*

**Secretário Executivo Substituto**

*Helder Milillo Lopes Cunha Silva*

**Secretaria de Nacional de Segurança Hídrica**

**Secretário**

*Sergio Luiz Soares de Souza Costa*

**Chefe de Gabinete**

*Ana Catarina de Almeida Moura*

**Coordenador Geral de Gestão Integrada**

*Cristiane Collet Battiston*

**Gerente de Projeto**

*Erik Parente Currilin Perpétuo*

**Diretor do Departamento de Projetos Estratégicos**

*Oscálmir Porto Freitas*

**Coordenação Geral de Estudos e Projetos**

*Jimmu Azevedo Ikeda*

**Coordenação Geral de Programas Ambientais**

*Elianeiva de Queiroz Viana Odísio*

**Coordenação Geral de Contratos e Orçamentos**

*Stanley Rodrigues Bastos*

**Coordenação Geral de Obras e Fiscalização em Recife**

*Tiago José de Barros Portela*

**Elaboração Técnica**

*Cicero Emanuel Vieira de Menezes*

# ÍNDICE

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.....	02
AVANÇO DAS OBRAS.....	02
METAS DE EXECUÇÃO.....	03
MAPA DE LOCALIZAÇÃO.....	04
EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	05
MOBILIZAÇÃO.....	06
DADOS OPERACIONAIS EIXO NORTE.....	07
EXECUÇÃO FÍSICA EIXO NORTE.....	08
EIXO NORTE - META 1N.....	09
EIXO NORTE - META 2N.....	10
EIXO NORTE - META 3N.....	11
DADOS OPERACIONAIS EIXO LESTE.....	12
EXECUÇÃO FÍSICA EIXO LESTE.....	13
EIXO LESTE - META 1L.....	14
EIXO LESTE - META 2L.....	15
EIXO LESTE - META 3L.....	17
PROJETO BÁSICO AMBIENTAL.....	18
PERFIS ESQUEMÁTICOS DOS EIXOS.....	20

# Projeto São Francisco

Reservatório Jatí - CE





# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

## COM BACIAS HIDROGRÁFIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

O Projeto de Integração do Rio São Francisco vai garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes, em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de gerar emprego e promover a inclusão social.

O empreendimento tem extensão de 477 km organizados em dois Eixos de transferência de água - Norte com 260 km e Leste com 217 km. A obra engloba a construção de 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 4 túneis, 13 aquedutos, 9 subestações de 230 kV, e 270 km de linhas de transmissão em alta tensão.

Ao mesmo tempo em que busca garantir o abastecimento por longo prazo de grandes centros urbanos da região, como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, João Pessoa e de centenas de pequenas e médias cidades do Semiárido, o projeto beneficia áreas do interior do Nordeste com potencial econômico, importantes no âmbito de uma política de desconcentração do desenvolvimento nacional.

Projetado para uma capacidade máxima de 127 m<sup>3</sup>/s, os Eixos Norte e Leste poderão operar com uma vazão contínua de até 26,4 m<sup>3</sup>/s, destinados prioritariamente ao consumo humano e dessedentação animal. Em períodos de abundância na bacia do São Francisco (Sobradinho vertendo), as vazões transferidas poderão atingir a capacidade máxima estabelecida. Os volumes excedentes transferidos serão armazenados em reservatórios estratégicos existentes nas bacias receptoras, como: Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte; Epitácio Pessoa, na Paraíba; e Poço da Cruz, em Pernambuco.

## AVANÇO DAS OBRAS

O empreendimento, atualmente, apresenta 98,98% de execução física, sendo que o Eixo Norte conta com 99,80% e o Eixo Leste com 97,13% de execução. Os percentuais de avanço correspondem à evolução dos projetos executivos, das obras civis, das instalações eletromecânicas e ações ambientais.

A evolução física do empreendimento também pode ser verificada a seguir (Referência: 31/03/2022).

Execução Física **98,98%**  
Operacional do PISF



# METAS DE EXECUÇÃO

## EIXO NORTE

**META 1N (140 km):** Vai da captação do rio São Francisco, no município de Cabrobó (PE), até o reservatório de Jati, no município Jati (CE).

**META 2N (39 km):** Começa no reservatório Jati, no município de Jati (CE), e termina no reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE).

**META 3N (81 km):** Estende-se do reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávidos, no município de Cajazeiras (PB).

## EIXO LESTE


**META 1L - Meta Piloto (16 km):** Compreende a captação no reservatório de Itaparica até o reservatório Areias, ambos no município de Floresta (PE).

**META 2L (167 km):** Inicia na saída do reservatório Areias, no município de Floresta (PE), e segue até o reservatório Barro Branco, no município de Sertânia (PE).

**META 3L (34 km):** Este trecho está situado entre o reservatório Barro Branco, no município de Sertânia (PE), e o reservatório Poções, no município Monteiro (PB).



**Reservatório Serra do Livramento**

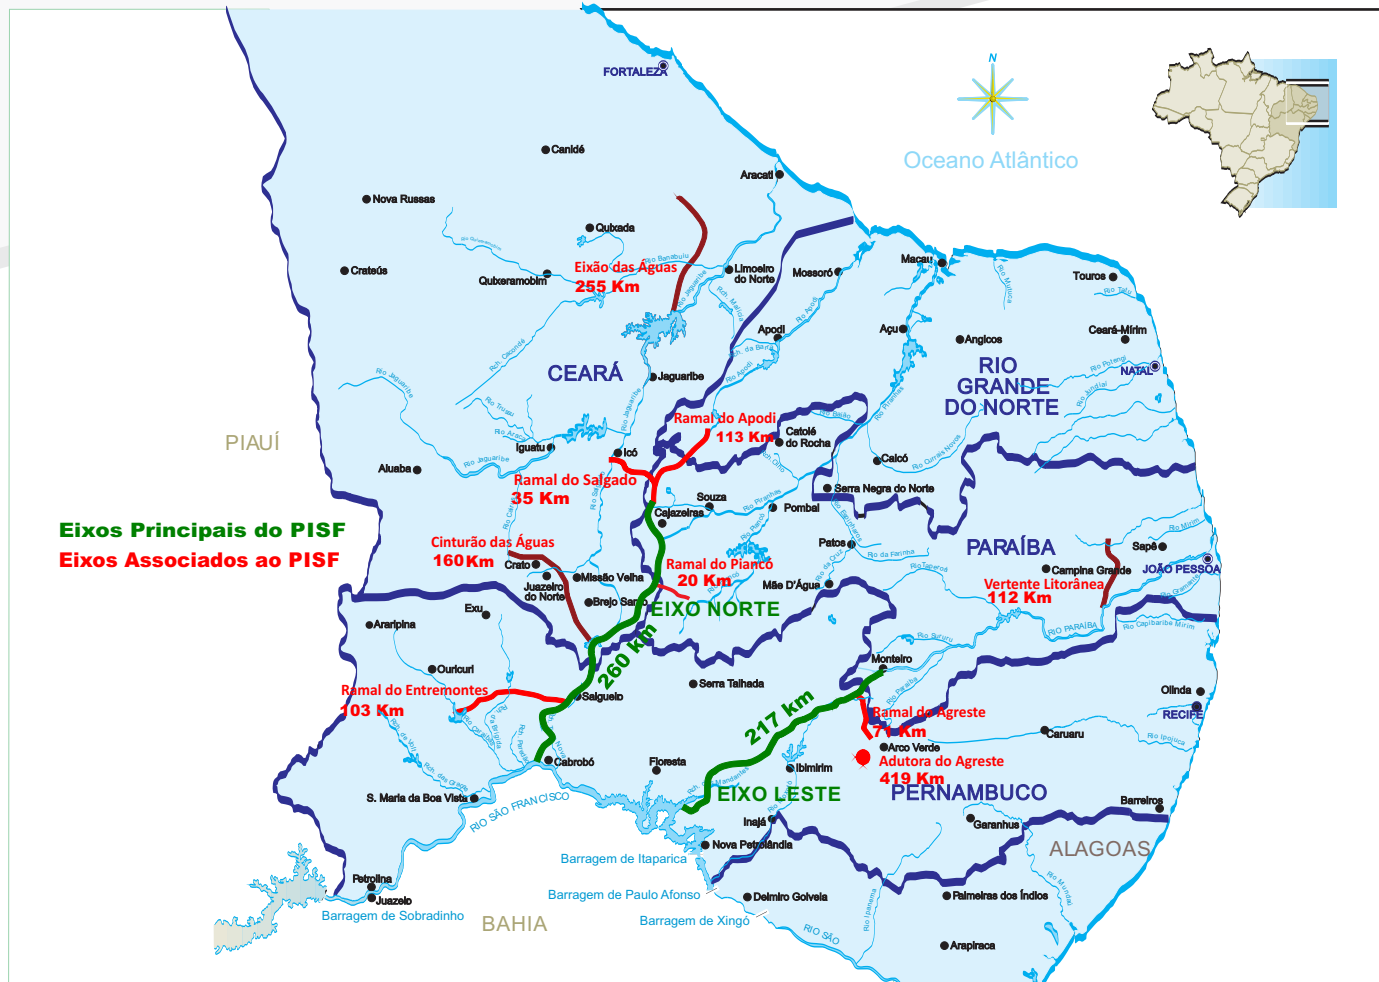







# MOBILIZAÇÃO

O Projeto de Integração do Rio São Francisco registra 1.231 trabalhadores contratados para atuarem nas obras. Esse número retrata o progresso do empreendimento.

## HISTÓRICO DE MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

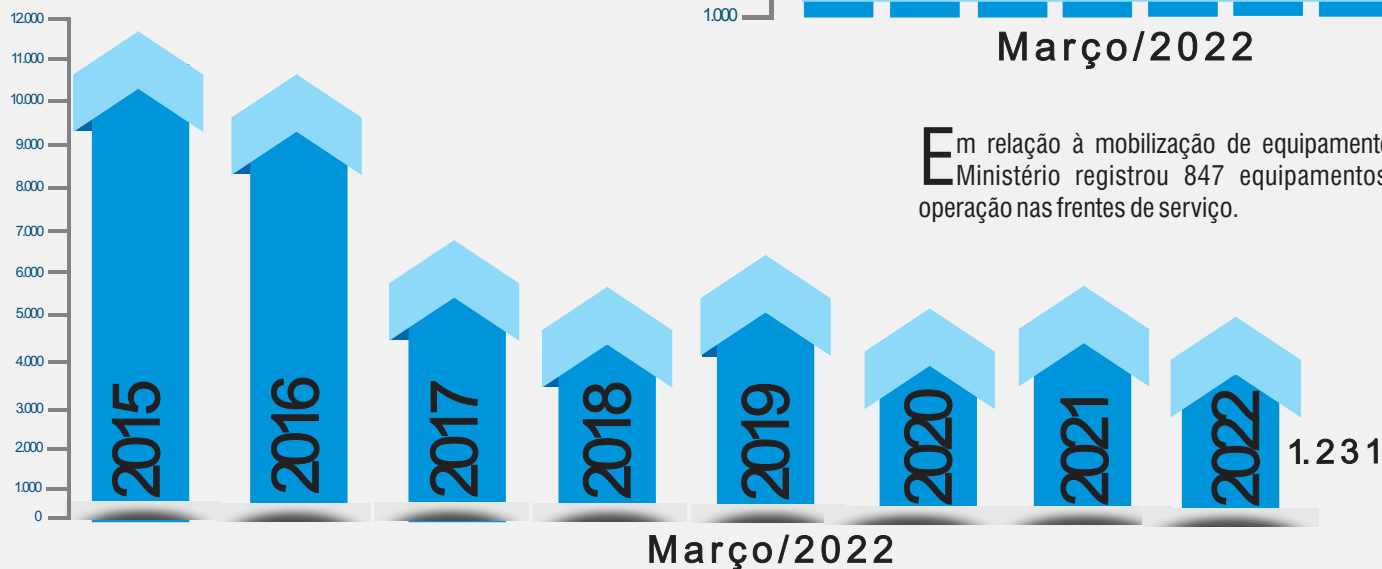

## HISTÓRICO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

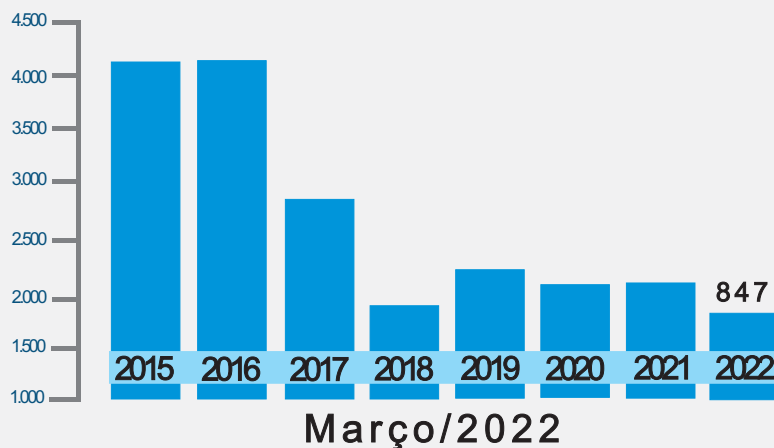

Em relação à mobilização de equipamentos, o Ministério registrou 847 equipamentos em operação nas frentes de serviço.

# EIXO NORTE

## Dados Operacionais

Sua captação se dá no Rio São Francisco. Projetado para uma capacidade máxima de 99 m<sup>3</sup>/s, o Eixo Norte operará com uma vazão contínua de 24,75 m<sup>3</sup>/s destinado ao consumo humano.

Capacidade Total  
de Armazenamento  
**692 milhões m<sup>3</sup>**

Volume Armazenado  
**501,3 milhões m<sup>3</sup>**


Volume Total Bombeado  
em milhões de m<sup>3</sup>

**01/01 a 31/03/2022**

EBI-1: 119,93

EBI-2: 114,75

EBI-3: 120,58

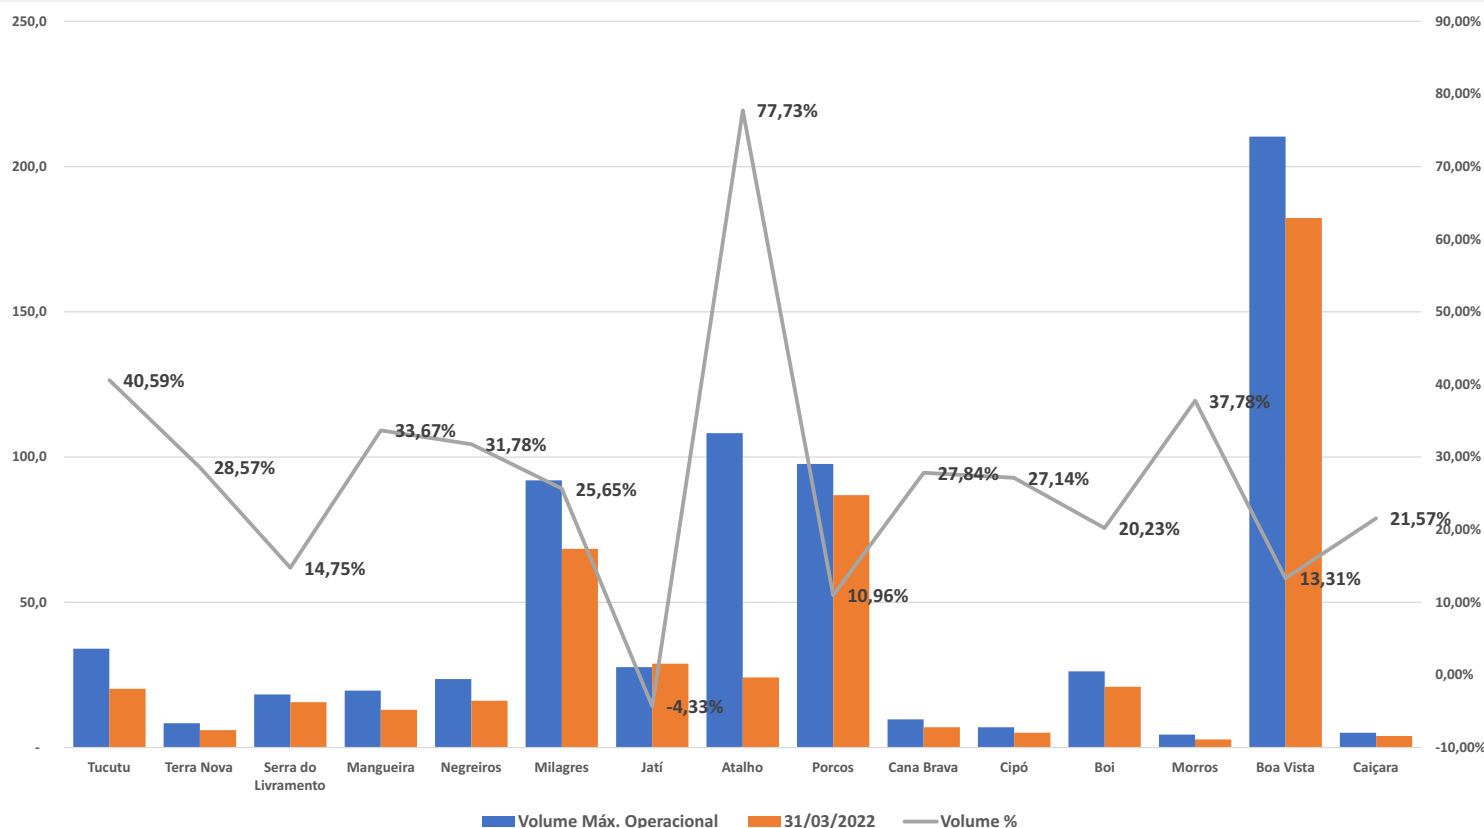


Abril/2022

# EIXO NORTE

## EXECUÇÃO FÍSICA



Reservatório Boa Vista

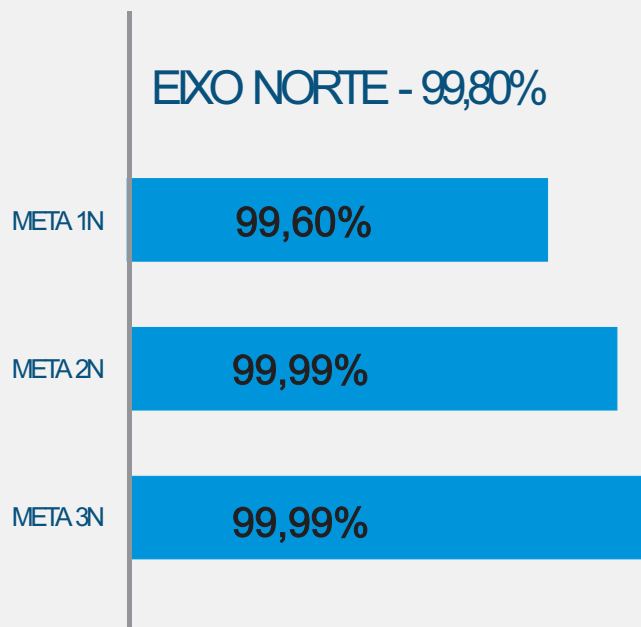

O Eixo Norte, a partir da captação no rio São Francisco próximo à cidade de Cabrobó – PE, percorrerá cerca de 260 km, conduzindo água aos rios Salgado e Jaguaribe, no Ceará; Apodi, no Rio Grande do Norte; e Piranhas-Açu, na Paraíba e Rio Grande do Norte.

O Eixo Norte encontra-se com 99,80% de execução física, com testes realizados nas três estações de bombeamento existentes.

Em agosto de 2020 foi concluído o enchimento do reservatório Jati, no próprio reservatório deriva-se o Cinturão das Águas do Ceará - CAC, que levará água até a região Metropolitana de Fortaleza/CE.

Março/2022

# EIXO NORTE META 1N

## DESTAQUES

**Reservatório Tucutú, Terra Nova, Serra do Livramento e Mangueira:** Obras Cíveis e Enchimento Concluídos.

**Aqueduto Logradouro, Saco da Serra, Mari e Terra Nova:** concluídos.

**Aqueduto Salgueiro:** concluído.

**Estações de bombeamento EBI-1, EBI-2 e EBI-3:** concluídas.

**Reservatório Negreiros e Milagres :** Obras Cíveis - Concluído.

**Túnel Milagres:** Concluído.

Estação de Bombeamento EBI-2

Aqueduto Mari


Estação de Bombeamento EBI-3

Reservatório Milagres

Segmento de Canal.

Estação de Bombeamento EBI-1





Reservatório Cana Brava



Reservatório Cipó

# EIXO NORTE META 2N

## DESTAQUES

**Reservatório Jati:** Obras civis concluídas.

**Canal entre Jati e Atalho:** Concluído.

**Reservatório Atalho e Porcos :** Obras civis concluídas.

**Reservatório Cana Brava e Cipó :** Obras civis concluídas.

**Reservatórios Boi I e Boi II:** Obras concluídas



Reservatório Boi



Reservatório Jati



Aqueduto Boi

# EIXO NORTE META 3N

## DESTAQUES

**Trecho com obras concluídas.**

**Aquedutos Boi, Pinga e Catingueira – Concluídos.**

**Bueiro Palha: Concluído.**

**Galeria Sobradinho: Concluída.**

**Segmentos de Canal entre Aqueduto Pinga e Túnel Cuncas I: Concluído**

**Segmento de canal (entre Reserv. Boa Vista e Túnel Cuncas II): Concluído.**

**Tomada d'água de Morros: Concluído.**

**Reservatório Boa Vista: Concluído.**

**Segmento de Canal (entre Aqueduto Catingueira e Bueiro Palha):**

**Concluído.**

**Túnel Cuncas II: Concluído.**

**Reservatório Caiçara : Concluído.**

**Aqueduto Catingueira**



**Túnel Cuncas I**



**Reservatório Boa Vista**



**Reservatório Boi**



# EIXO LESTE

## Dados Operacionais

Sua captação se dá no lago de Itaparica. Projetado para uma capacidade máxima de 28m³/s, o Eixo Leste operará com uma vazão contínua de 14m³/s destinado ao consumo humano.


Capacidade Total de Armazenamento  
**55,0 milhões m³**

Volume Armazenado  
**44,7 milhões m³**

Volume Total Bombeado em milhões de m³

01/01 a 31/03/2022

EBV-1: 40,40	EBV-4: 35,02
EBV-2: 37,02	EBV-5: 27,52
EBV-3: 42,27	EBV-6: 28,92

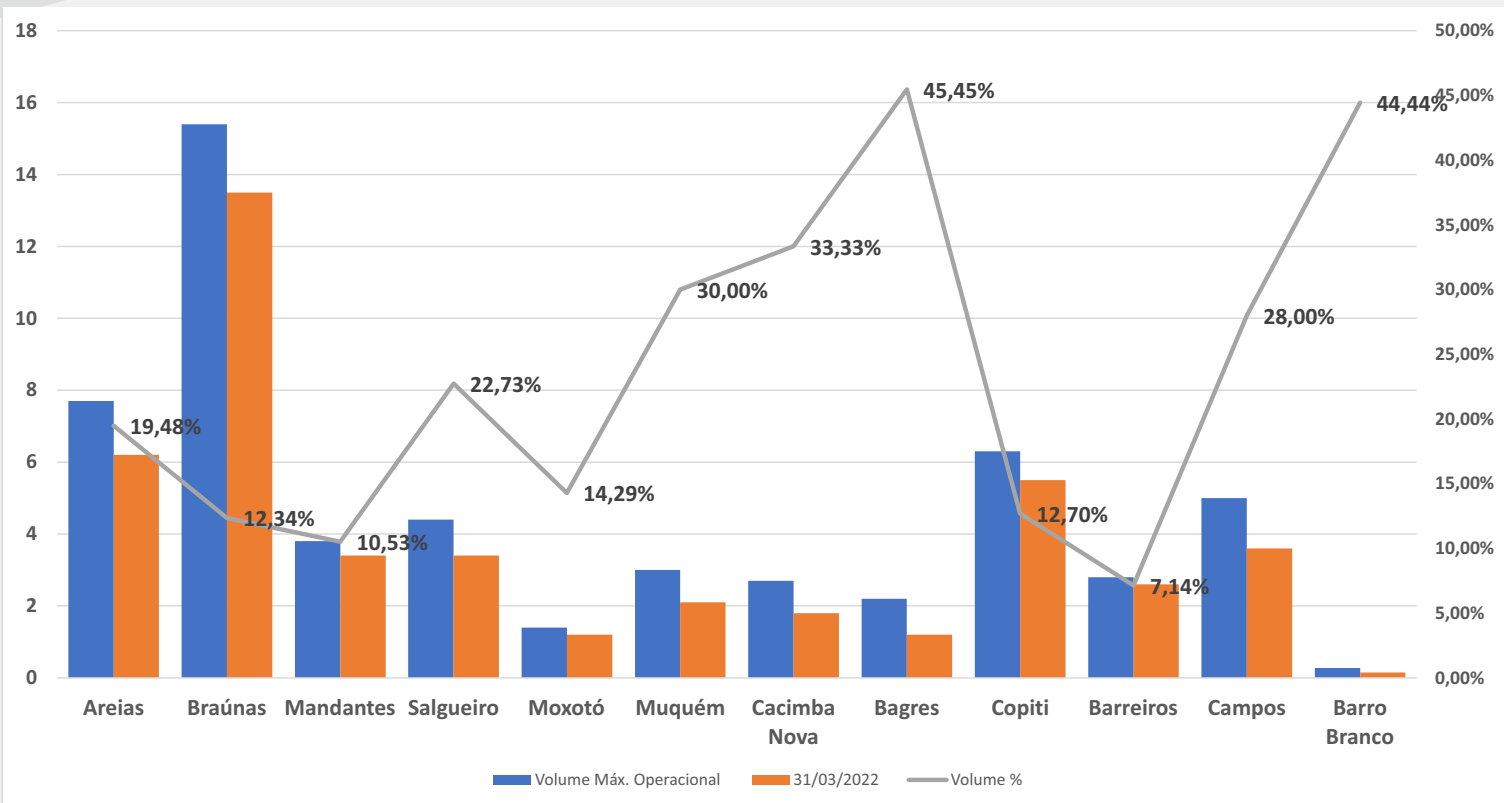

Março/2022



# EIXO LESTE

## EXECUÇÃO FÍSICA



Estação de Bombeamento EBV-1

### EIXO LESTE - 97,13%

META 1L

99,09%

META 2L

96,63%

META 3L

98,22%

O Eixo Leste se estende por 217 km partindo do reservatório de Itaparica (PE) em direção a leste no Estado de Pernambuco, passando pelas bacias do Pajeú, do Moxotó e da região do agreste pernambucano até chegar ao rio Paraíba, no município de Monteiro (PB).

Em 2017 foram concluídas as estruturas diretamente envolvidas na passagem da água, permitindo a chegada das águas do PISF ao açude Boqueirão (PB) em abril daquele ano, evitando o colapso hídrico e permitindo o fim do severo racionamento de água, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas em Campina Grande e região. Em setembro de 2018 destacamos o início dos testes na Adutora Moxotó, beneficiando a população do agreste pernambucano.

Atualmente o bombeamento do Eixo Leste está em funcionamento, conforme demanda dos estados beneficiados.

Março/2022



# EIXO LESTE META 1L

## DESTAQUES

Obras necessárias a passagem da água concluída, testando serviços complementares e ações ambientais.

**Estação de Bombeamento EBV-1:** Concluída. Em pré-operação.

**Canal entre Aqueduto da BR-316 e Reservatório Areias:** Concluídos.


**Subestações E0 e E1:** Concluídas e em operação.

Canal de Aproximação

Forebay de  
Jusante EBV-1

Reservatório Areias

Aqueduto Sobre a BR-316

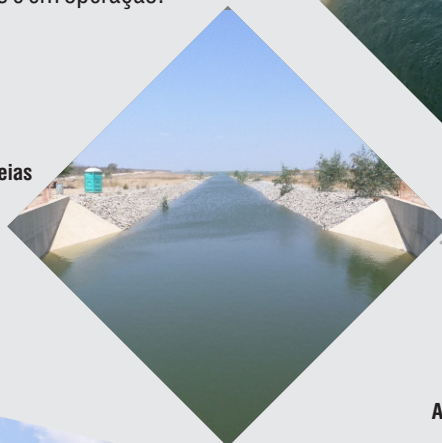

# EIXO LESTE

## META 2L

### DESTAQUES

Obras necessárias à passagem da água foram concluídas,

**Estação de bombeamento EBV-2:** Concluída.

**Segmento de canal entre EBV-2 :** Concluído.

**Canal entre Res. Braúnas e Res. Mandantes:** Concluído.

**Estação de bombeamento EBV-3:** Concluída.

**Reservatório Salgueiro:** concluído o enchimento.

**Canal entre Res. Salgueiro e Muquém:** Concluído.

**Aqueduto Jacaré:** Concluído.

**Reservatório Muquém, Cacimba Nova e Bagre:** Concluído.

**Estação de bombeamento EBV-4:** Concluída.

**Reservatório  
Mandantes**

**Estação de  
Bombeamento EBV-3.**

**Forebay de Jusante**

**Estação de  
Bombeamento EBV-2.**

**Reservatório Braúnas**

**Reservatório  
Mandantes.**



# EIXO LESTE META 2L

## DESTAQUES

Estação de  
Bombeamento - EBV-5

Estação de  
Bombeamento - EBV-6.

Reservatório  
Moxotó.

**Reservatório Moxotó:** Concluído.

**Estação de bombeamento EBV-5:** Concluída.

**Reservatório Barreiros:** Concluído.

**Estação de bombeamento EBV-6:** Concluída.

**Reservatório Campos:** Concluído.

Subestação de Energia - E1

Sala de comandos  
Elétricos da  
Subestação E-1

Chegada da Água

# EIXO LESTE

## META 3L

### DESTAQUES

**Reservatório Barro Branco:** Concluído.

**Segmento de canal entre Reservatório Barro Branco e Túnel Giancarlo:** Concluído.

**Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti:** Concluído.

**Adutora Monteiro:** Concluída.

Segmento de Canal



Túnel Eng. Giancarlo Lins  
Cavalcanti - Emboque



Trecho de Canal com Aqueduto para Drenagem



Aqueduto Sobre a BR-316



Túnel Eng. Giancarlo Lins  
Cavalcanti





# PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

O Projeto Básico Ambiental (PBA), elaborado a partir das recomendações propostas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), tem como objetivo propor medidas mitigadoras, compensatórias, de monitoramento e controle ambiental, frente aos impactos inerentes à execução do PISF. O PBA contempla 38 Planos e/ou Programas Ambientais, executados com base nas diretrizes aprovadas pelo IBAMA e nas condicionantes da Licença de Instalação (LI) nº 925/2013.

As ações executadas no âmbito de cada um dos 38 Programas Ambientais são semestralmente avaliadas pelo órgão licenciador, de forma a promover melhorias nos resultados e nas condições ambientais das áreas de influência do empreendimento.

O PISF destina mais de R\$ 1,6 bilhão do seu orçamento aos programas ambientais. Este valor representa cerca de 14% dos investimentos do projeto.

Os Programas Ambientais, atualmente, apresentam um avanço de 92,57% de execução física, nos Eixos Norte e Leste. Os percentuais de avanço correspondem à evolução dos 38 programas.

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA	PROGRAMAS DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO	<b>Objetivos:</b> Gestão e acompanhamento dos programas e mediação de conflitos socioambientais.
		<b>Quantidade de Programas:</b> 15 <b>Investimento Previsto:</b> R\$ 365.120.897,25 <b>Execução Física:</b> 94,72%
	PROGRAMAS DE LIBERAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE OBRAS	<b>Objetivos:</b> Garantir a qualidade ambiental da obra, a liberação dos trechos de obra.
		<b>Quantidade de Programas:</b> 04 <b>Investimento Previsto:</b> R\$ 198.719.495,86 <b>Execução Física:</b> 97,89%
	PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS E SOCIAMBIENTAIS	<b>Objetivos:</b> Realizar medidas mitigadoras e compensatórias frente aos impactos sociais e ambientais do empreendimento.
		<b>Quantidade de Programas:</b> 12 <b>Investimento Previsto:</b> R\$ 907.747.772,43 <b>Execução Física:</b> 77,64%
	PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	<b>Objetivos:</b> Monitorar e acompanhar os impactos ambientais das condições de desenvolvimento da região beneficiada.
		<b>Quantidade de Programas:</b> 05 <b>Investimento Previsto:</b> R\$ 16.763.420,53 <b>Execução Física:</b> 91,90%
	PROGRAMAS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	<b>Objetivos:</b> Avaliar e monitorar os programas relacionados a Linha de Transmissão.
		<b>Quantidade de Programas:</b> 02 <b>Investimento Previsto:</b> R\$ 4.914.993,55 <b>Execução Física:</b> 95,95%



**Quantidade de Programas Ambientais:** 38  
**Investimento Previsto:** R\$ 1,6 bilhão  
**Execução Física:** 92,57%. Março/2022

# PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Treinamento e Capacitação de Técnicos da Obra  
em Questões Ambientais, Saúde e Segurança**  
Colaboradores durante treinamento realizado no  
canteiro do reservatório Boi II da Meta 2N




**Conservação da Fauna e da Flora**




**Monitoramento da Qualidade da Água e Limnologia**  
Açude Aramando Ribeiro Gonçalves. Coleta de  
sedimentos para análise granulométrica.



**Supressão de Vegetação das Áreas de  
Obra e Limpeza dos Reservatórios**  
Material lenhoso armazenado em área do  
reservatório Cipó

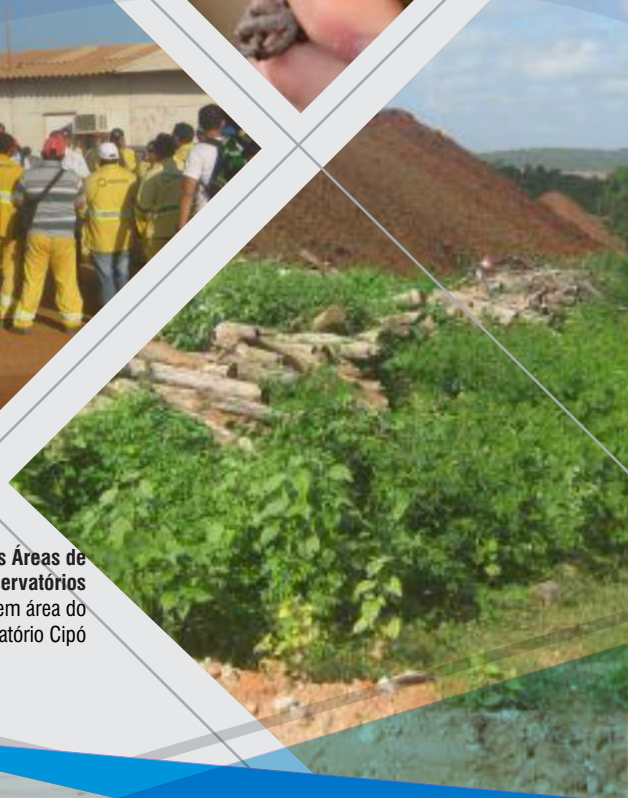

# EIXO NORTE - Avanço Físico - 99,80%

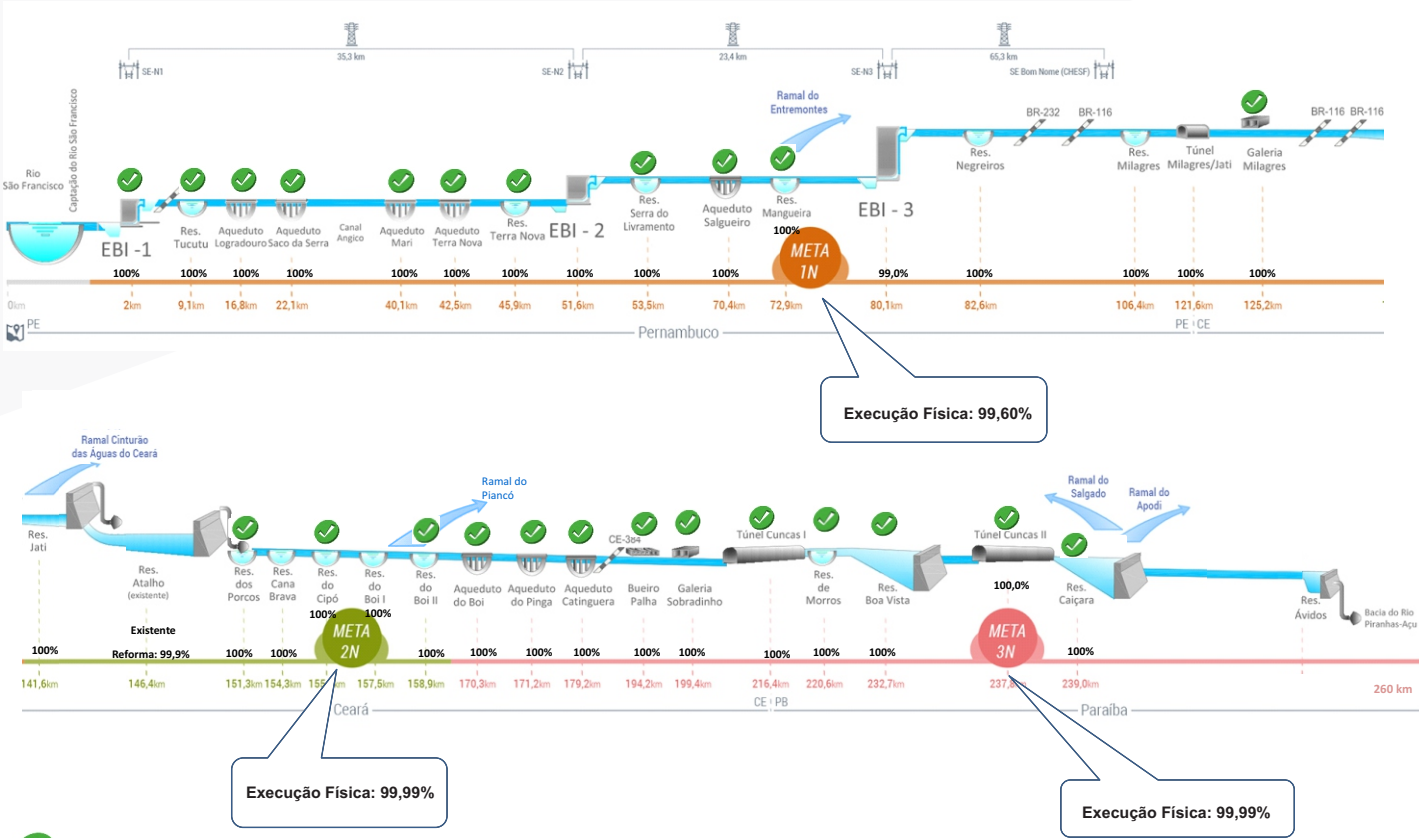

✓ Obra Física Concluída

# EIXO LESTE - Avanço Físico Operacional - 100% \*

## Avanço Físico - 97,13%



Obra Física Concluída

\* A Execução operacional (caminho das águas), não considera as estruturas que não impossibilitam a passagem da água.





MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
