

**SNTR**



POLÍTICA PÓS-VENDA

# MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## SINALEIRAS



Indica que a obrigação contratual avaliada está dentro do prazo e apresenta condições adequadas de exequibilidade;



Indica que a obrigação contratual avaliada apresenta risco relevante, relacionada à qualidade do serviço ou atraso da obrigação contratual.



Indica que a obrigação contratual avaliada já apresenta a materialização de risco, indicando problemas quanto a qualidade da rodovia, ou atraso relevante em alguma obrigação contratual

## Estudo da BR-116/101/SP/RJ

### Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP


Trecho rodoviário que faz a ligação entre Rio de Janeiro/ RJ e São Paulo/SP, além de conectar importantes cidades da região

## STATUS: Contrato vigente

Atualizado em 20/10/2025

<p> <b>Leilão</b> 29/10/2021</p> <p> <b>Participantes Leilão</b> <b>(i) CCR S.A.; e</b> <b>(ii) Ecorodovias</b></p> <p> <b>Assinatura Contrato</b> 28/01/2022</p> <p> <b>Início cobrança pedágio</b> 01/03/2022</p> <p> <b>100 Dias</b> 08/05/2022</p> <p> <b>Trabalhos iniciais</b> 28/01/2023</p>	<p> <b>WACC</b> 7,20%</p> <p> <b>Grupo Controlador/deságio</b> <b>Motiva Infraestrutura de</b> <b>Mobilidade S.A. (16,25%)</b></p> <p> <b>Período Concessão</b> <b>Início: 01/03/2022</b> <b>Final: 01/03/2052</b></p> <p> <b>Prazo do Contrato</b> <b>30 anos</b></p>	<p> <b>Duplicação: 80,1 km</b> <b>Faixas Adicionais: 601,82 km</b> <b>Vias Marginais: 144,0 km</b> <b>Áreas de Escape: 02 und</b> <b>Serra das Araras: 16,2 km</b> <b>Túneis: 2,634 km</b></p> <p><b>Obras relevantes:</b> <b>152 Dispositivos e interseções;</b> <b>128 Novas Passarelas;</b> <b>2 Áreas de Escape;</b> <b>4 PPD's.</b></p> <p> <b>CAPEX Total (Bilhões): R\$ 20,77</b> <b>OPEX Total (Bilhões): R\$ 15,27</b> <b>CAPEX + OPEX Total (Bilhões): R\$ 36,04</b> <b>Receita 2023 a 2024 (Milhões): R\$ 1.342,17</b> <b>Receita 2025 1º Trim (Milhões): R\$ 341,16</b> <b>CAPEX + OPEX Contábil 2023+2024 (Milhões): R\$ 3.179,94</b> <b>CAPEX + OPEX Contábil 2025 (Milhões): R\$ 1.110,32</b> <b>ISSQN Recolhido – 2024 (Milhões): R\$ 71,89</b></p>	<p><b>Valor da Tarifa: R\$ 12,07</b> <b>VEQ/Dia/Praça (2024): 33.334</b></p> <p><b>Ciclo de Obras: 3º ao 7º ano</b> <b>Recuperação da Rodovia: 1º ao 5º ano</b> <b>Manutenção da Rodovia: 6º ao 30º ano</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1º Ano</th> <th>2º Ano</th> <th>3º Ano</th> <th>4º Ano</th> <th>5º Ano</th> <th>6º Ano</th> <th>7º Ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245,30</td> <td>775,10</td> <td>1.755,45</td> <td>1.800,51</td> <td>2.037,48</td> <td>2.077,22</td> <td>1.965,98</td> </tr> </tbody> </table>	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	245,30	775,10	1.755,45	1.800,51	2.037,48	2.077,22	1.965,98
1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano											
245,30	775,10	1.755,45	1.800,51	2.037,48	2.077,22	1.965,98											

Data-base: Dez/2024

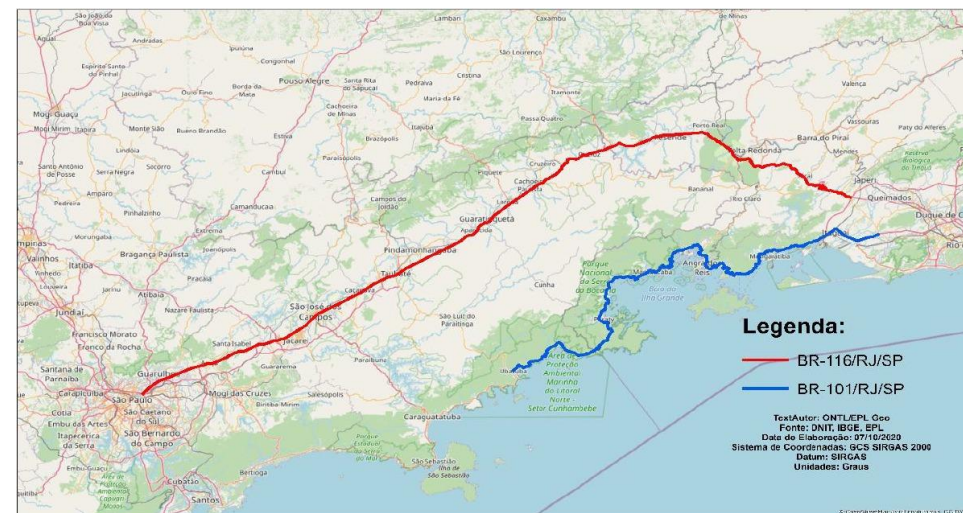


# **OBRAS RIO SP – RIO DE JANEIRO**

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-101/RJ – Km 416,000 ao 496,100**  
**Obras relevantes previstas**

**Duplicação – Cenário geral do contrato**

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 06 (Fev. 2028)	BR-101/RJ	416,000	433,100	17,100	Contínuo
Ano 08 (Fev. 2030)	BR-101/RJ	433,100	481,800	48,700	Contínuo
Ano 09 (Fev. 2031)	BR-101/RJ	481,800	496,100	14,300	Contínuo
				<b>80,10</b>	

**Obras de Duplicação – 80,100 km**

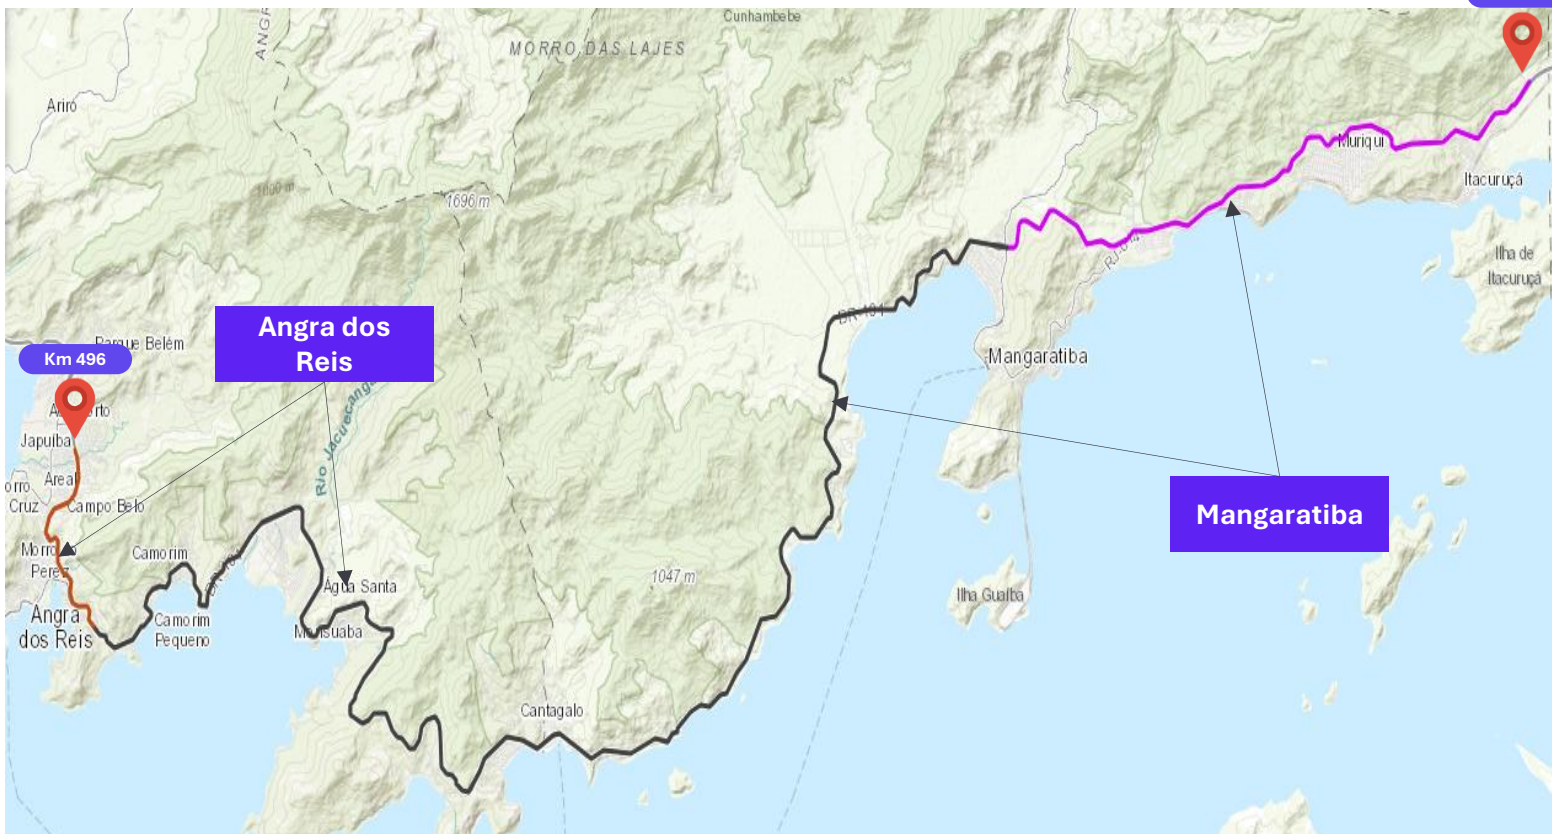

**BR-101/RJ – Duplicação**


**Legenda:**

- 3º Ano (Fev.2025)
- 4º Ano (Fev.2026)
- 5º Ano (Fev.2027)
- 6º Ano (Fev.2028)
- 7º Ano (Fev.2029)
- 8º Ano (Fev.2030)
- 9º Ano (Fev.2031)
- Sem ampliação de capacidade

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-101/RJ – Km 380,500 ao 599,570**  
**Obras relevantes previstas**

## Faixas Adicionais – Cenário geral do contrato

Obras de Faixas Adicionais – 25,800 km

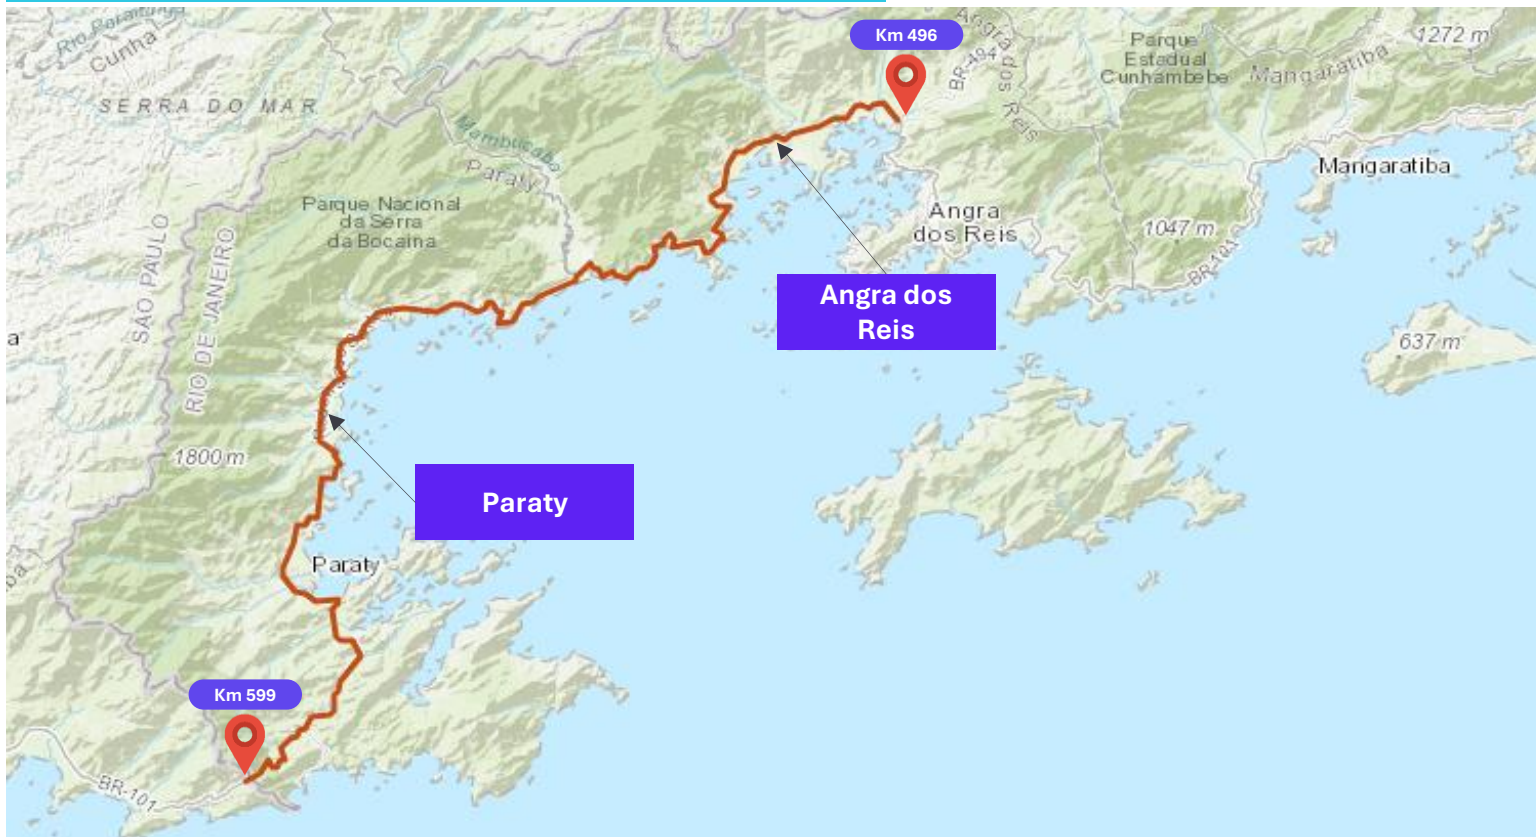

BR-101/RJ – Faixas Adicionais

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 09 (Fev. 2031)	BR-101/RJ	500,2	574,7	25,800	Descontínuo

25,800

Legenda:


- 3º Ano (Fev.2025)
- 4º Ano (Fev.2026)
- 5º Ano (Fev.2027)
- 6º Ano (Fev.2028)
- 7º Ano (Fev.2029)
- 8º Ano (Fev.2030)
- 9º Ano (Fev.2031)
- Sem ampliação de capacidade

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-101/RJ – Km 380,500 ao 599,570**  
**Obras relevantes previstas**

**Marginais– Cenário geral do contrato**

Obras de Marginais – 10,580 km

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 07 (Fev. 2029)	BR-101/RJ	410,0	414,50	3,000	Descontínuo
Ano 09 (Fev. 2031)	BR-101/RJ	399,75	407,700	7,580	Descontínuo
				<b>10,580</b>	

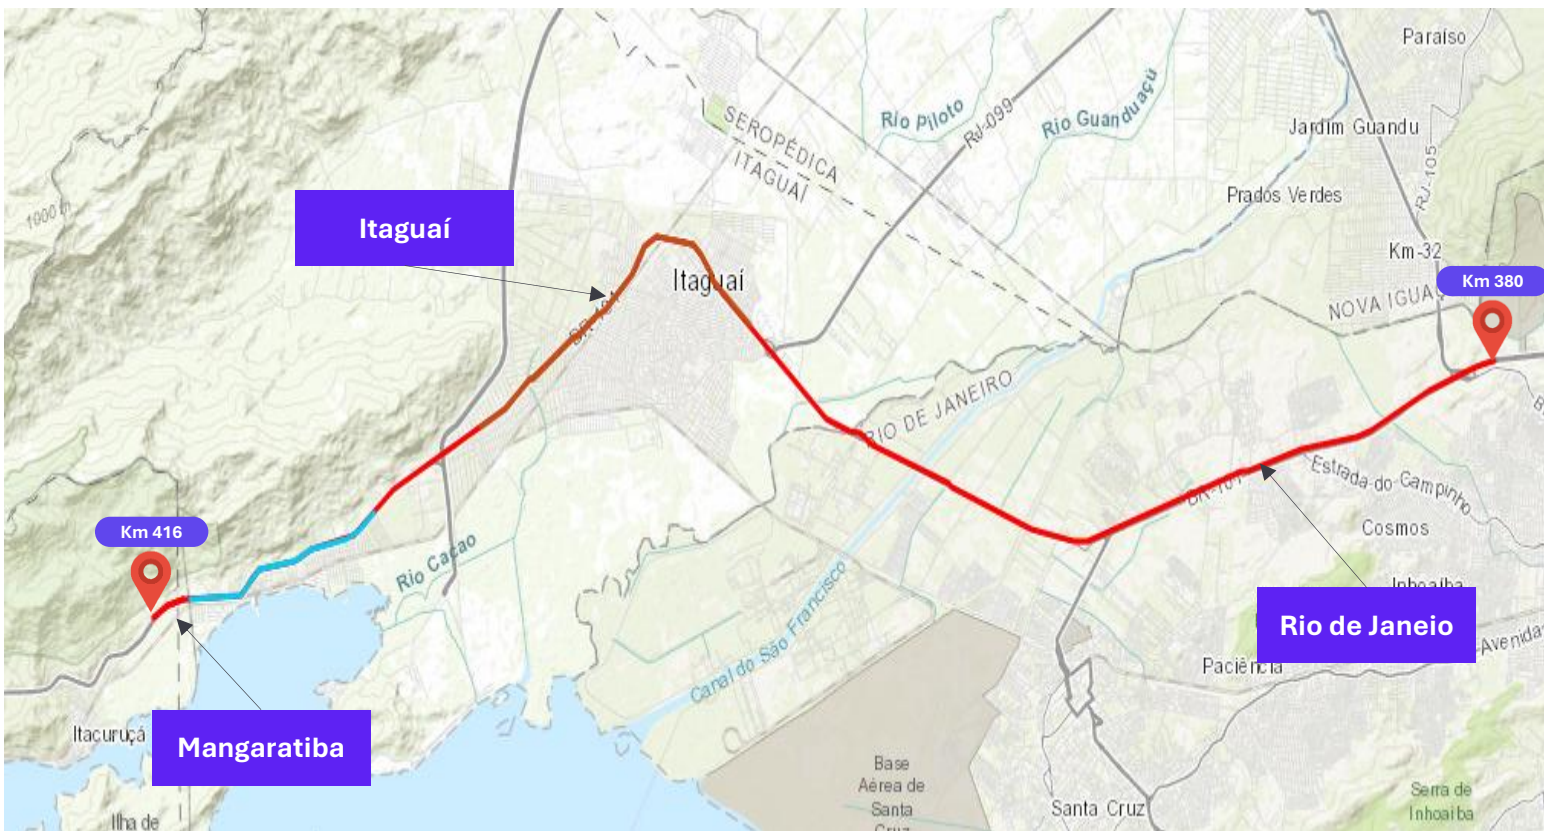

**Legenda:**

- 3º Ano (Fev.2025)
- 4º Ano (Fev.2026)
- 5º Ano (Fev.2027)
- 6º Ano (Fev.2028)
- 7º Ano (Fev.2029)
- 8º Ano (Fev.2030)
- 9º Ano (Fev.2031)
- Sem ampliação de capacidade

**BR-101/RJ – Marginais**

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-116/RJ - Km 217,580 ao 339,580**  
**Obras relevantes previstas**

**Faixas Adicionais – Cenário geral do contrato**

**Obras de Faixas Adicionais – 203,02 km**

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 05 (Fev. 2027)	BR-116/RJ	290,800	303,400	25,200	Contínuo
Ano 06 (Fev. 2028)	BR-116/RJ	257,200	309,500	40,800	Descontínuo
Ano 07 (Fev. 2029)	BR-116/RJ	278,900	339,520	54,02	Descontínuo
Ano 08 (Fev. 2030)	BR-116/RJ	217,300	264,600	58,200	Descontínuo
Ano 09 (Fev. 2031)	BR-116/RJ	214,700	243,200	24,800	Descontínuo
				<b>203,02</b>	



**Legenda:**

- 3º Ano (Fev.2025)
- 4º Ano (Fev.2026)
- 5º Ano (Fev.2027)
- 6º Ano (Fev.2028)
- 7º Ano (Fev.2029)
- 8º Ano (Fev.2030)
- 9º Ano (Fev.2031)
- Sem ampliação de capacidade

**BR-116/RJ – Faixas Adicionais**

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-116/RJ - Km 217,580 ao 339,580**  
**Obras relevantes previstas**

**Obras de Marginais – 29,260 km**



**BR-116/RJ – Marginais**

**Marginais– Cenário geral do contrato**

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 05 (Fev. 2027)	BR-116/RJ	300,000	304,000	6,1700	Contínuo
Ano 06 (Fev. 2028)	BR-116/RJ	264,600	316,900	10,910	Descontínuo
Ano 07 (Fev. 2029)	BR-116/RJ	278,900	339,520	9,100	Descontínuo
Ano 08 (Fev. 2030)	BR-116/RJ	217,300	264,600	2,110	Descontínuo
Ano 09 (Fev. 2031)	BR-116/RJ	214,700	243,200	0,970	Descontínuo

**29,260**

**Legenda:**

- 3º Ano (Fev.2025)
- 4º Ano (Fev.2026)
- 5º Ano (Fev.2027)
- 6º Ano (Fev.2028)
- 7º Ano (Fev.2029)
- 8º Ano (Fev.2030)
- 9º Ano (Fev.2031)
- Sem ampliação de capacidade



# MOTIVA RioSP 626 km


## BR/116/RJ - Serra das Araras

Obras relevantes previstas – em andamento

- BR-116/RJ – Serra das Araras de 8 km
  - Km 225 ao Km 233 entre os municípios de Piraí/RJ e Paracambi/RJ
  - Prazo contratual: fev/2029
  - Início: abril/2024
  - Conclusão: fevereiro/2029
  - Valor: R\$ 1.555 MM [Base Jan.2025]
  - Status: em andamento
- Execução: 49%**

Serra das Araras – 8 km

**ANO 07 (FEV-2029)**

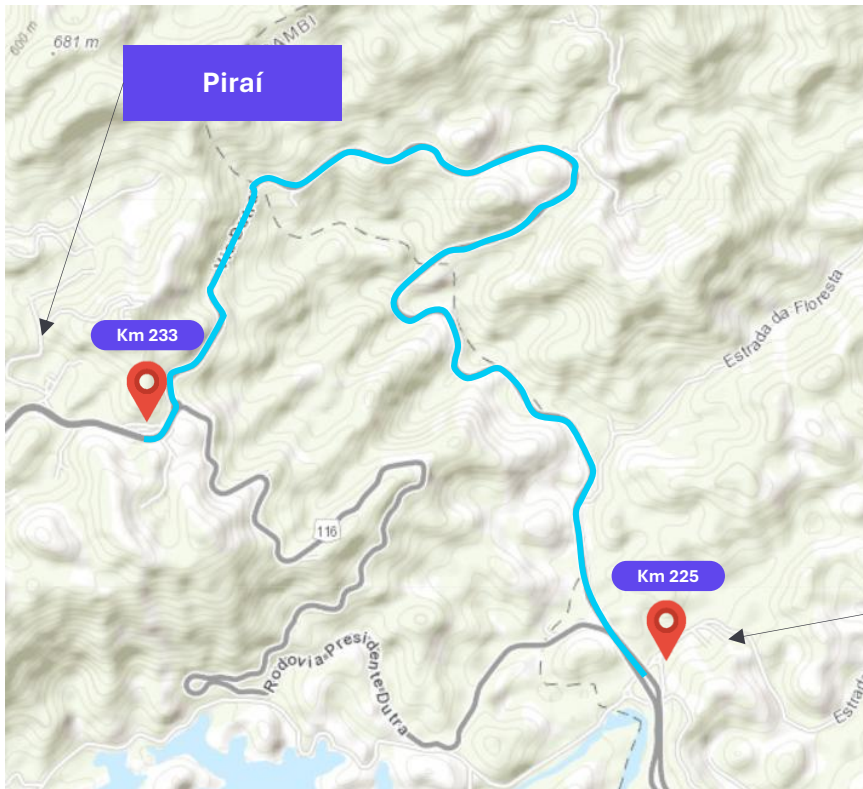

**BR-116/RJ – Serra das Araras**




# OBRAS RIO SP – SÃO PAULO

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-101/SP – Km 0,000 ao 52,600**  
**Obras relevantes previstas**

## Faixas Adicionais – Cenário geral do contrato

Obras de Faixas Adicionais – 7,200 km

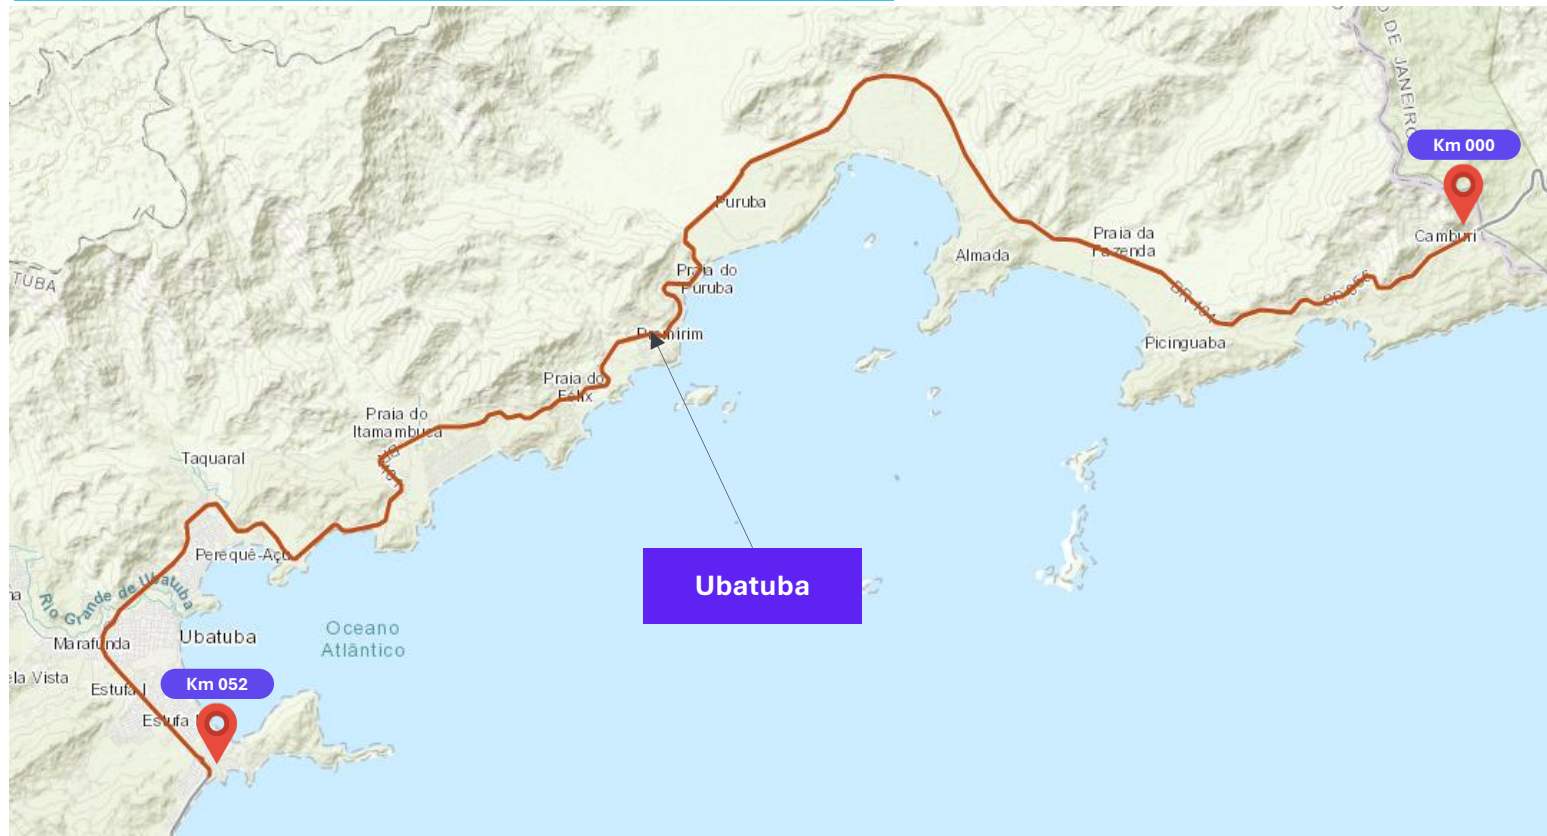

**BR-101/SP – Faixas Adicionais**

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 09	BR-101/SP	0,000	52,600	7,200	Descontínuo
				<b>7,200</b>	


**Legenda:**

- 3º Ano (Fev. 2025)
- 4º Ano (Fev. 2026)
- 5º Ano (Fev. 2027)
- 6º Ano (Fev. 2028)
- 7º Ano (Fev. 2029)
- 8º Ano (Fev. 2030)
- 9º Ano (Fev. 2031)
- Sem ampliação de capacidade

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-116/SP - Km 0,000 ao 231,600**  
**Obras relevantes previstas**

## Faixas Adicionais – Cenário geral do contrato

Obras de Faixas Adicionais – 379,300 km

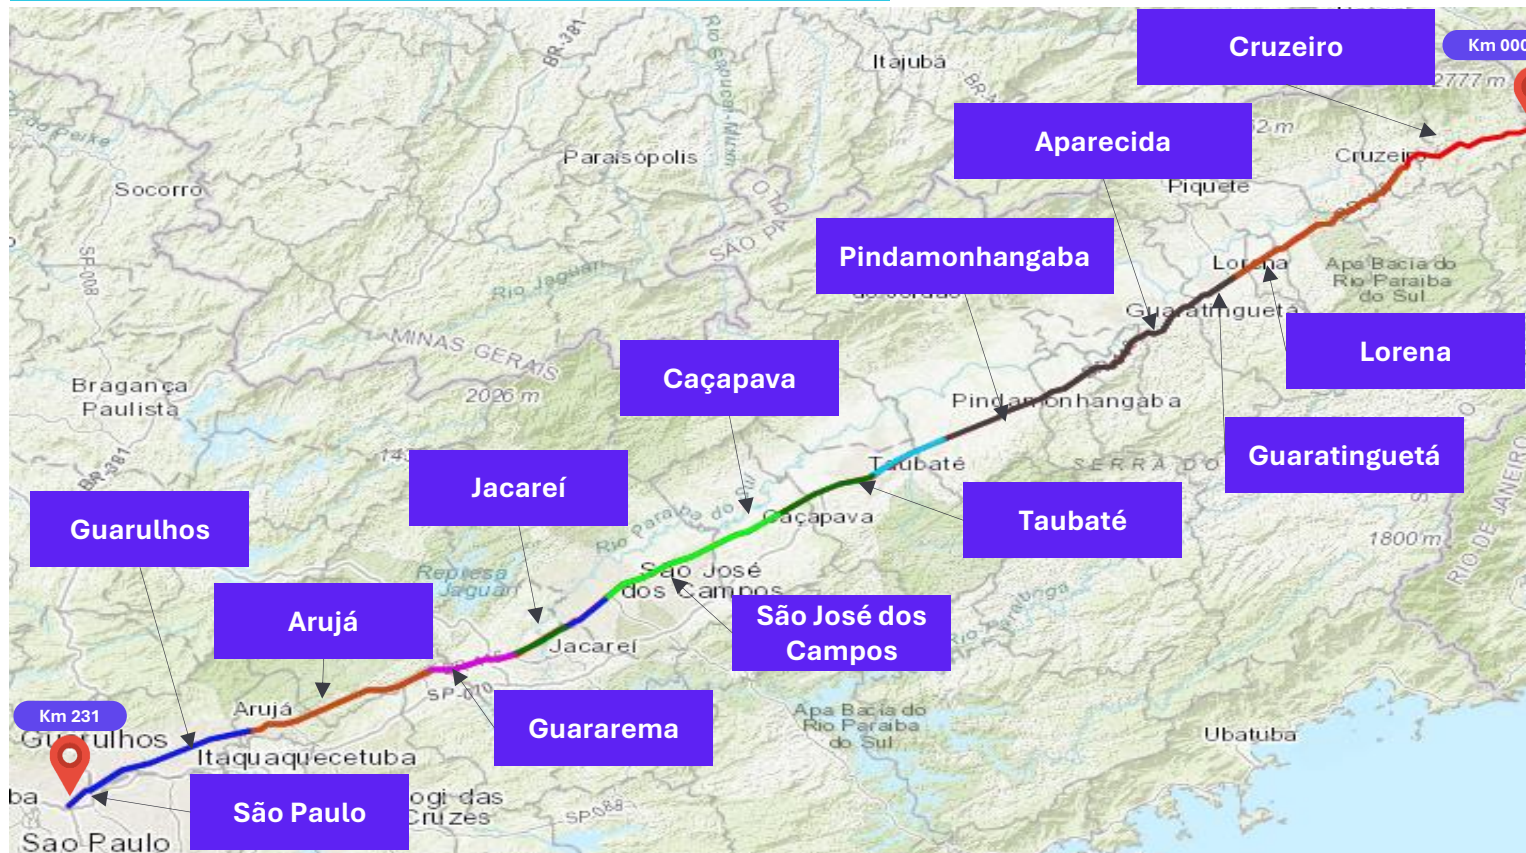

**BR-116/SP – Faixas Adicionais**

Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 03	BR-116/SP	151,300	231,600	38,200	Descontínuo
Ano 04	BR-116/SP	124,900	151,300	52,800	Contínuo
Ano 05	BR-116/SP	110,700	166,800	46,400	Descontínuo
Ano 06	BR-116/SP	166,800	178,800	24,000	Contínuo
Ano 07	BR-116/SP	99,000	110,700	11,700	Contínuo
Ano 08	BR-116/SP	51,200	204,700	105,800	Descontínuo
Ano 09	BR-116/SP	21,800	199,600	100,400	Descontínuo

**379,300**

**Legenda:**

- 3º Ano (Fev. 2025)
- 4º Ano (Fev. 2026)
- 5º Ano (Fev. 2027)
- 6º Ano (Fev. 2028)
- 7º Ano (Fev. 2029)
- 8º Ano (Fev. 2030)
- 9º Ano (Fev. 2031)
- Sem ampliação de capacidade

**MOTIVA RioSP 626 km**  
**BR-116/SP - Km 0,000 ao 231,600**  
**Obras relevantes previstas**

## Marginais- Cenário geral do contrato

Obras de Marginais – 104,160 km



**BR-116/SP – Marginais**


Ano PER	Rodovia	km		Extensão (km)	Segmento
		Início	Fim		
Ano 03	BR-116/SP	151,300	231,600	20,450	Descontínuo
Ano 04	BR-116/SP	124,900	151,300	43,550	Contínuo
Ano 07	BR-116/SP	99,000	117,400	23,960	Contínuo
Ano 08	BR-116/SP	51,200	99,000	6,520	Contínuo
Ano 09	BR-116/SP	178,800	204,700	9,680	Contínuo
				<b>104,160</b>	

**Legenda:**

- 3º Ano (Fev. 2025)
- 4º Ano (Fev. 2026)
- 5º Ano (Fev. 2027)
- 6º Ano (Fev. 2028)
- 7º Ano (Fev. 2029)
- 8º Ano (Fev. 2030)
- 9º Ano (Fev. 2031)
- Sem ampliação de capacidade

Obras de Faixas Adicionais/Vias Marginais – 6,74 km

ANO 03 (FEV-2025)

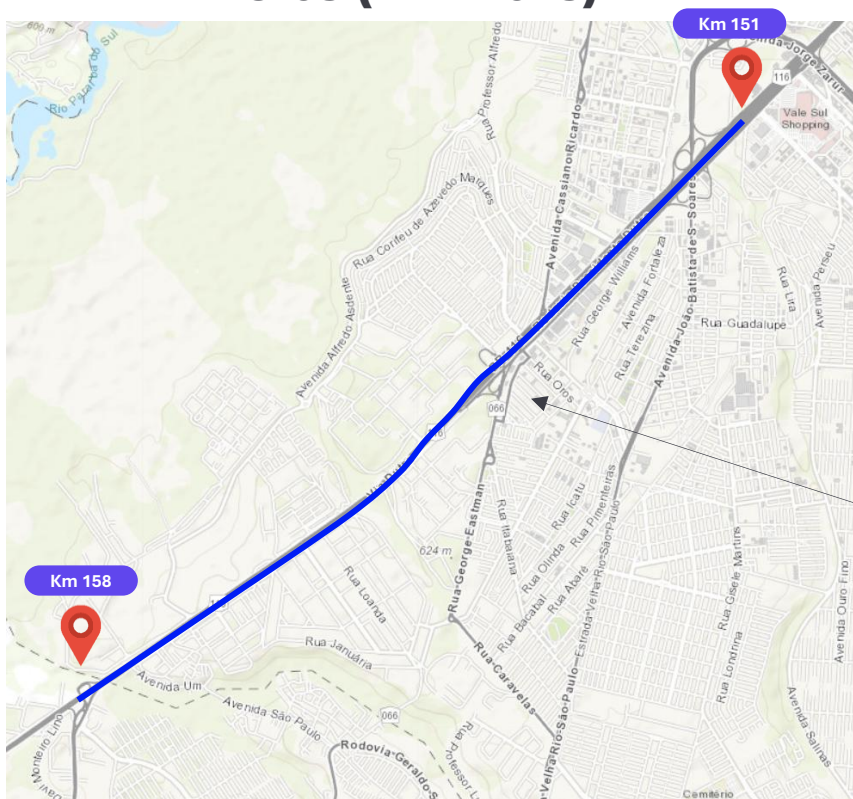

São José dos Campos

Legenda:

- 3º Ano (Fev. 2025)
- 4º Ano (Fev. 2026)
- 5º Ano (Fev. 2027)
- 6º Ano (Fev. 2028)
- 7º Ano (Fev. 2029)


BR-116/SP – Faixas Adicionais/Vias Marginais

- BR-116/SP – 6,74 km de Faixas Adicionais e Vias Marginais Km 151,300 ao Km 158,038 no município de São José dos Campos
- Data contrato: Fev/2025
- Início: agosto/2023
- Conclusão: dezembro/2025
- Valor: R\$ 161 MM
- Status: em andamento/atrasado
- Execução: 84%



Obras de Faixas Adicionais/Vias Marginais – 7,9 km

ANO 04 (FEV-2026)

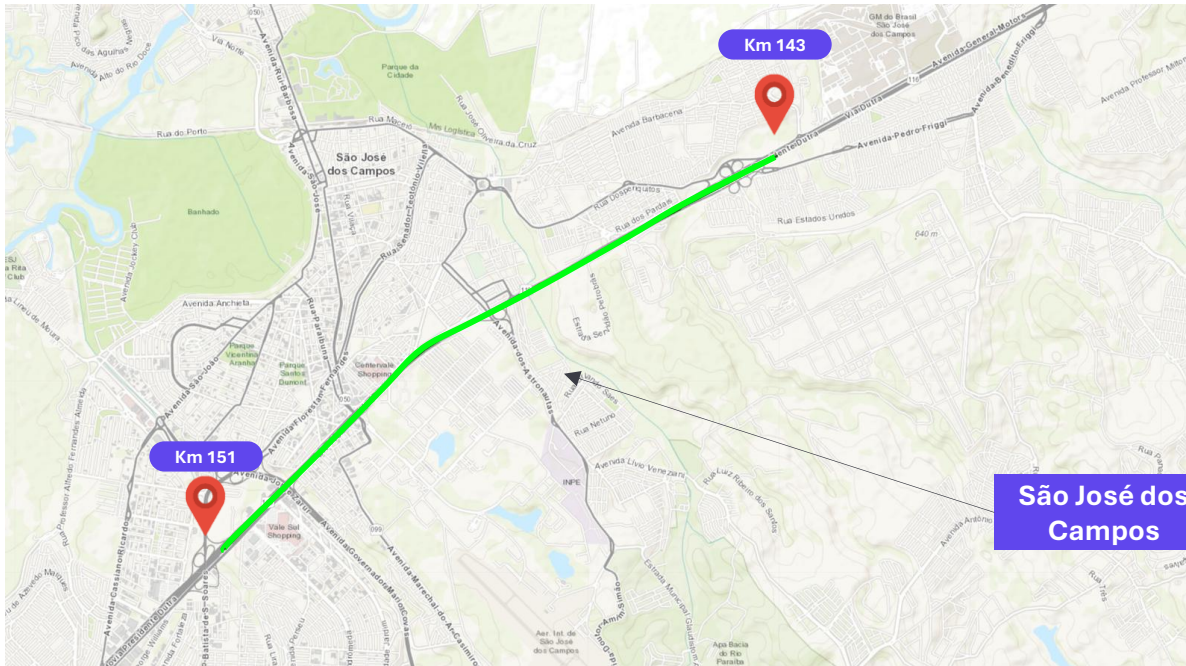

BR-116/SP – Faixas Adicionais/Vias Marginais

Legenda:

- 3º Ano (Fev. 2025)
- 4º Ano (Fev. 2026)
- 5º Ano (Fev. 2027)
- 6º Ano (Fev. 2028)
- 7º Ano (Fev. 2029)

- BR-116/SP – 7,9 km de Faixas Adicionais e Vias Marginais
- Km 143,400 ao Km 151,300 no município de São José dos Campos
- Data contrato: Fev/2026
- Início: dezembro/2023
- Conclusão: Aguardando ASV
- Valor: R\$ 281 MM
- Status: em andamento
- Execução: 11%



Km 146 – Data: 06/10/2025
