


BR 163 - PARÁ


## ESTRADEIRO BR 163

N



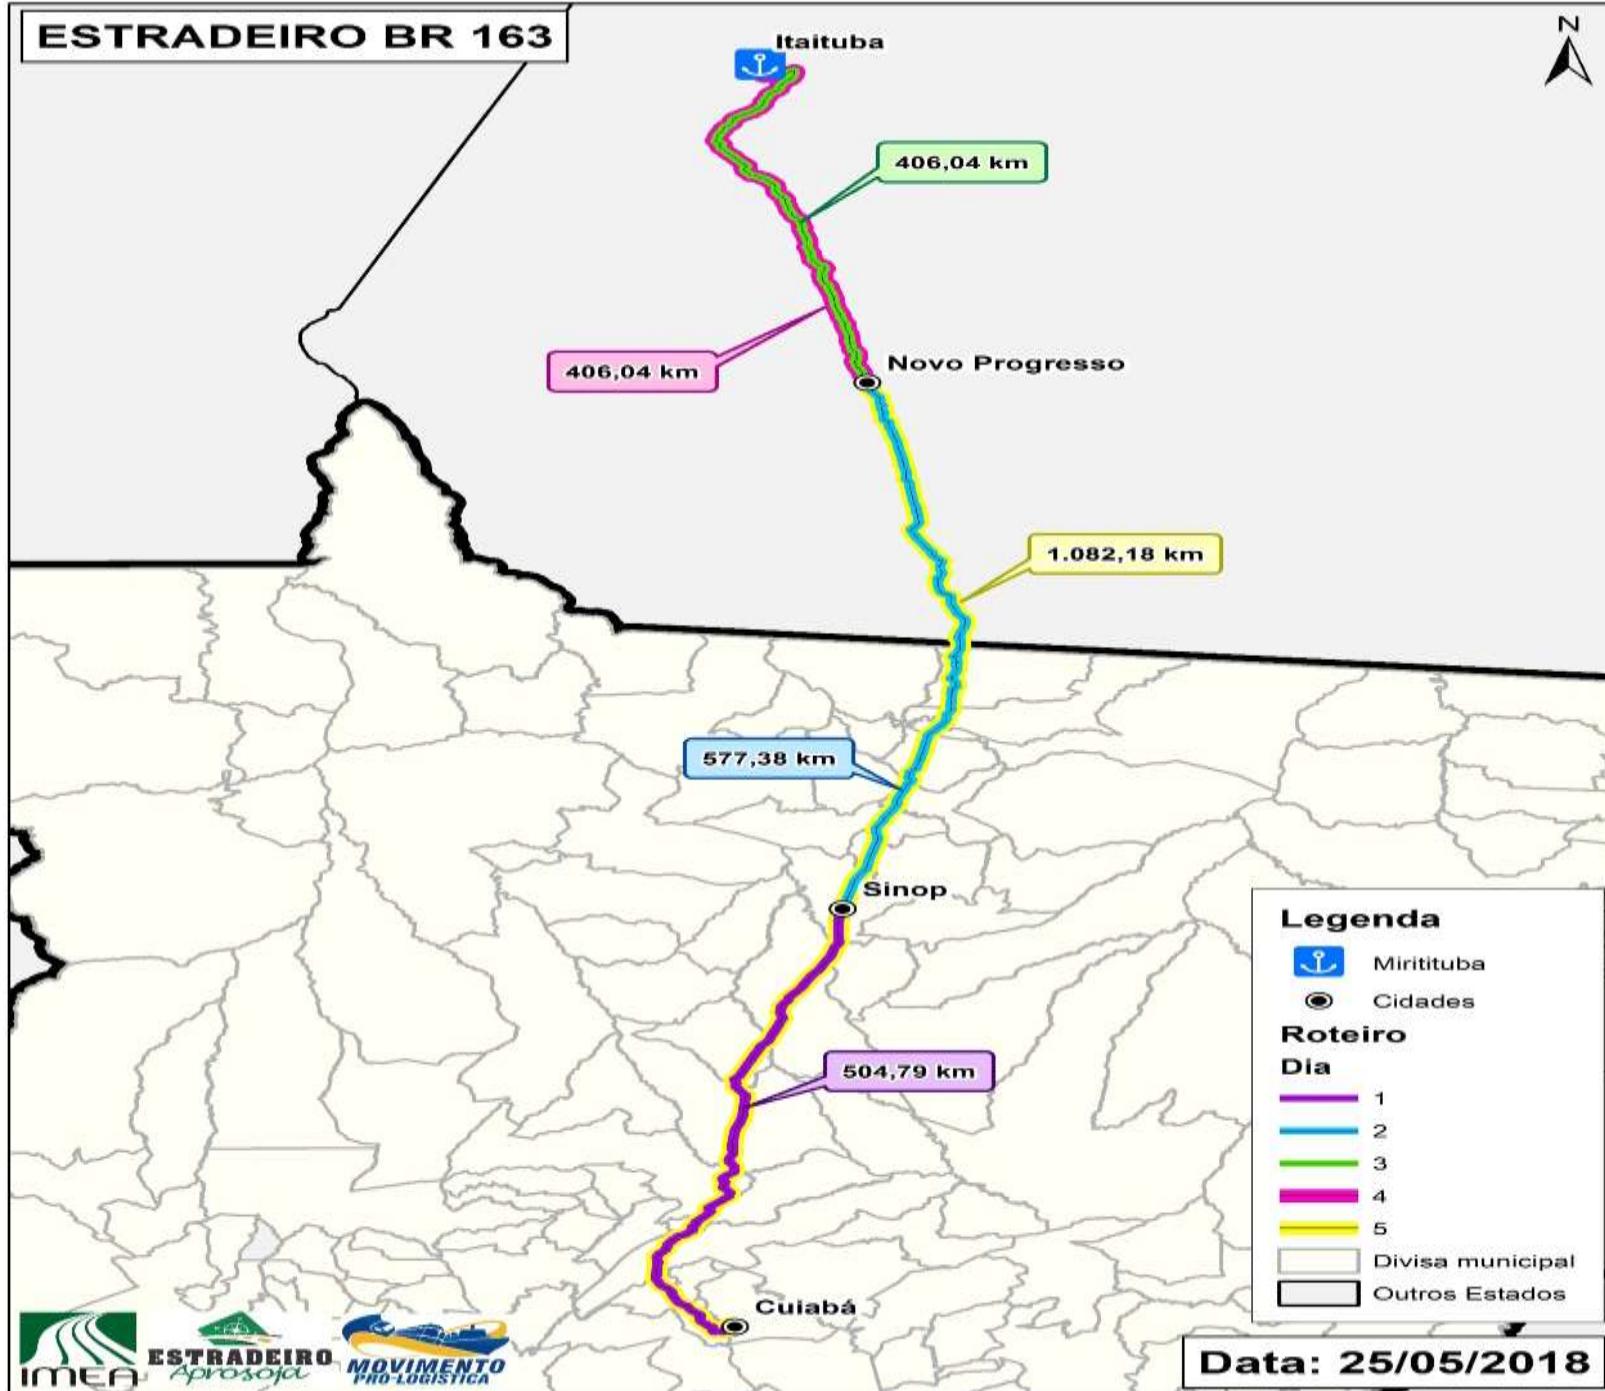

Lote 7 - 8º BEC

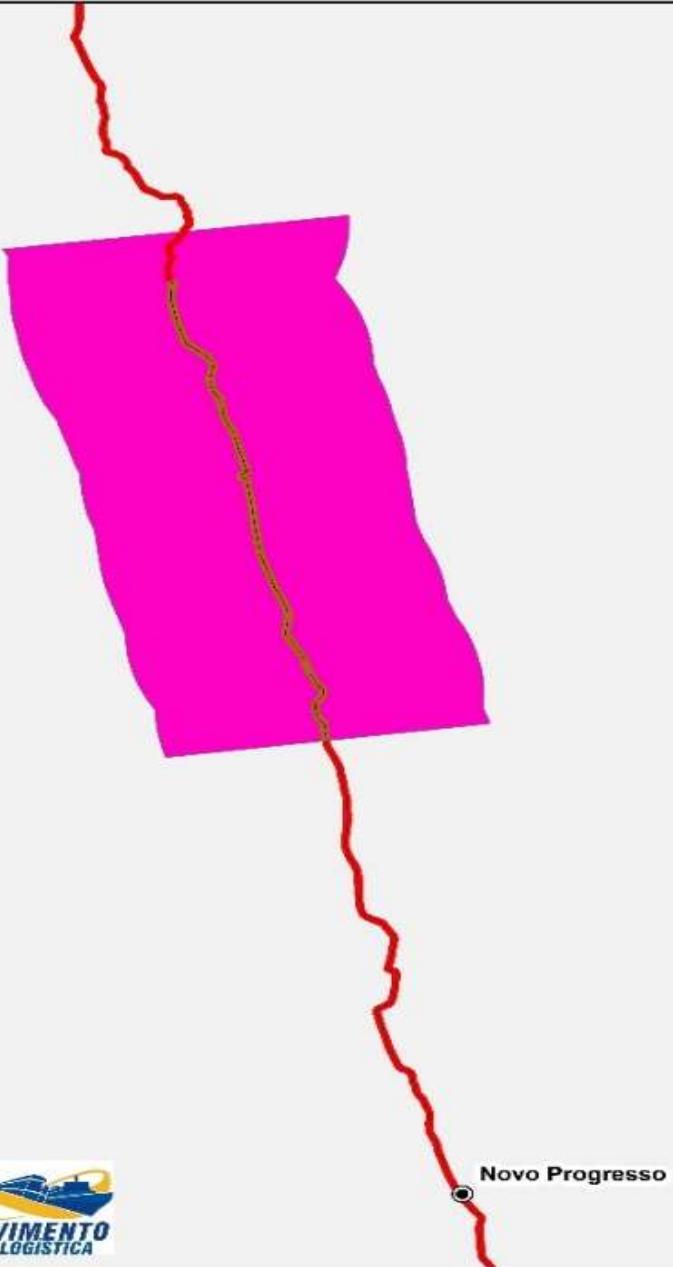

#### Legenda


##### Situação das obras

- Pavimentada - 15 km (23,08%)
- Não pavimentada - 50 km (76,92%)


##### Lote

- 8º BEC
- Divisa estadual
- Outros Estados

Localidade	Moraes de Almeida		
LOTE 1.4 - 8º BEC - 65,0 km			
Km	313,40	Km	%
Terraplenagem	44,5	68,46	
OAC	61,8	95,08	
Sub-base	41,5	63,85	
Base	14	21,54	
Revestimento	14	21,54	
Sinalização	0	0	
Previsto			
Realizado			

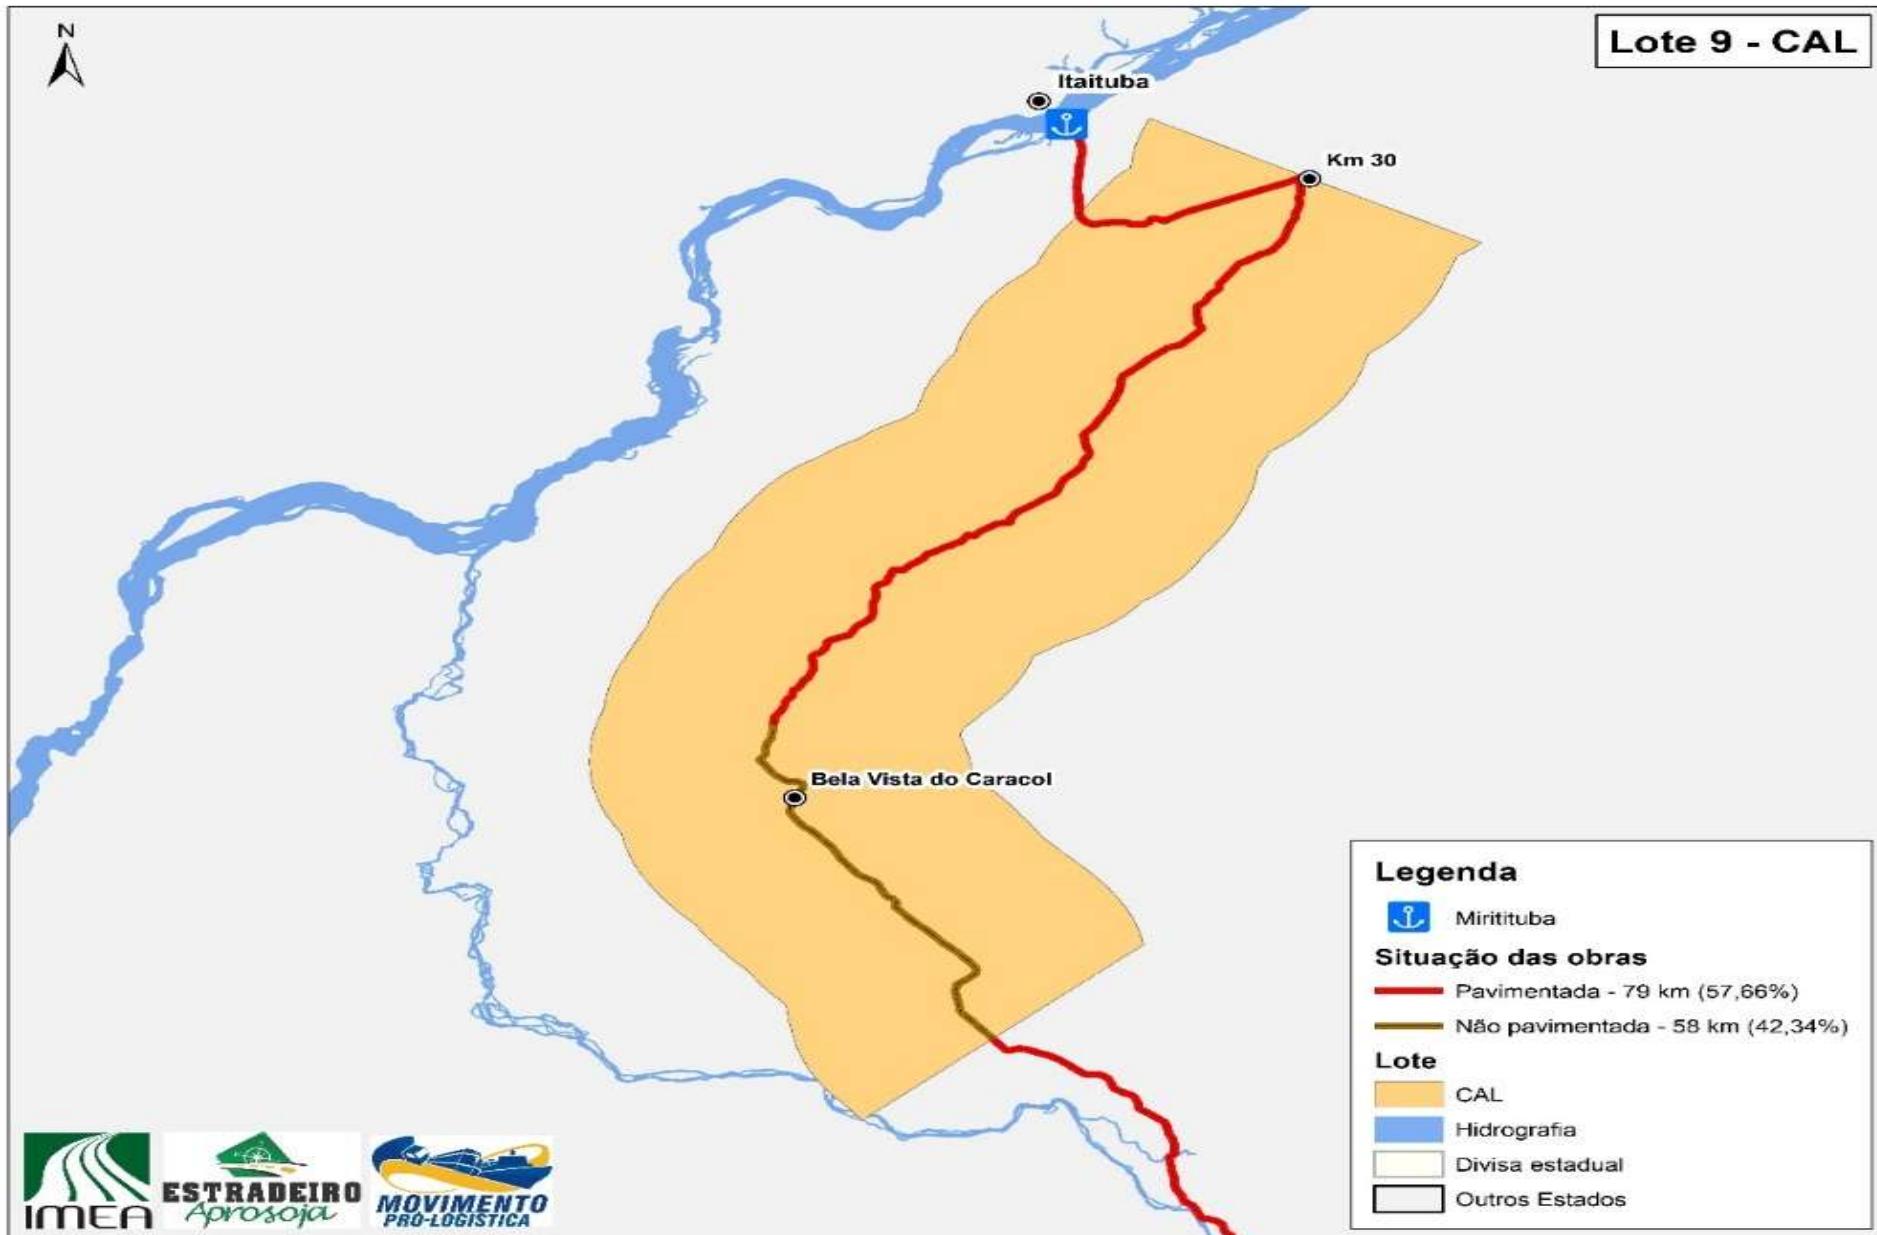

Localidade		Caracol	Entranc. BR 230		
Km	537,04	LOTE 1.6 - CAL - 137,52 km			%
			674,56	Km	
Terraplenagem			130,0	94,5	
OAC			137,0	99,6	
Sub-base			102,0	74,2	
Base			102,0	74,2	
Revestimento			100,0	72,7	
Sinalização			92,0	66,9	
Previsto					
Realizado					

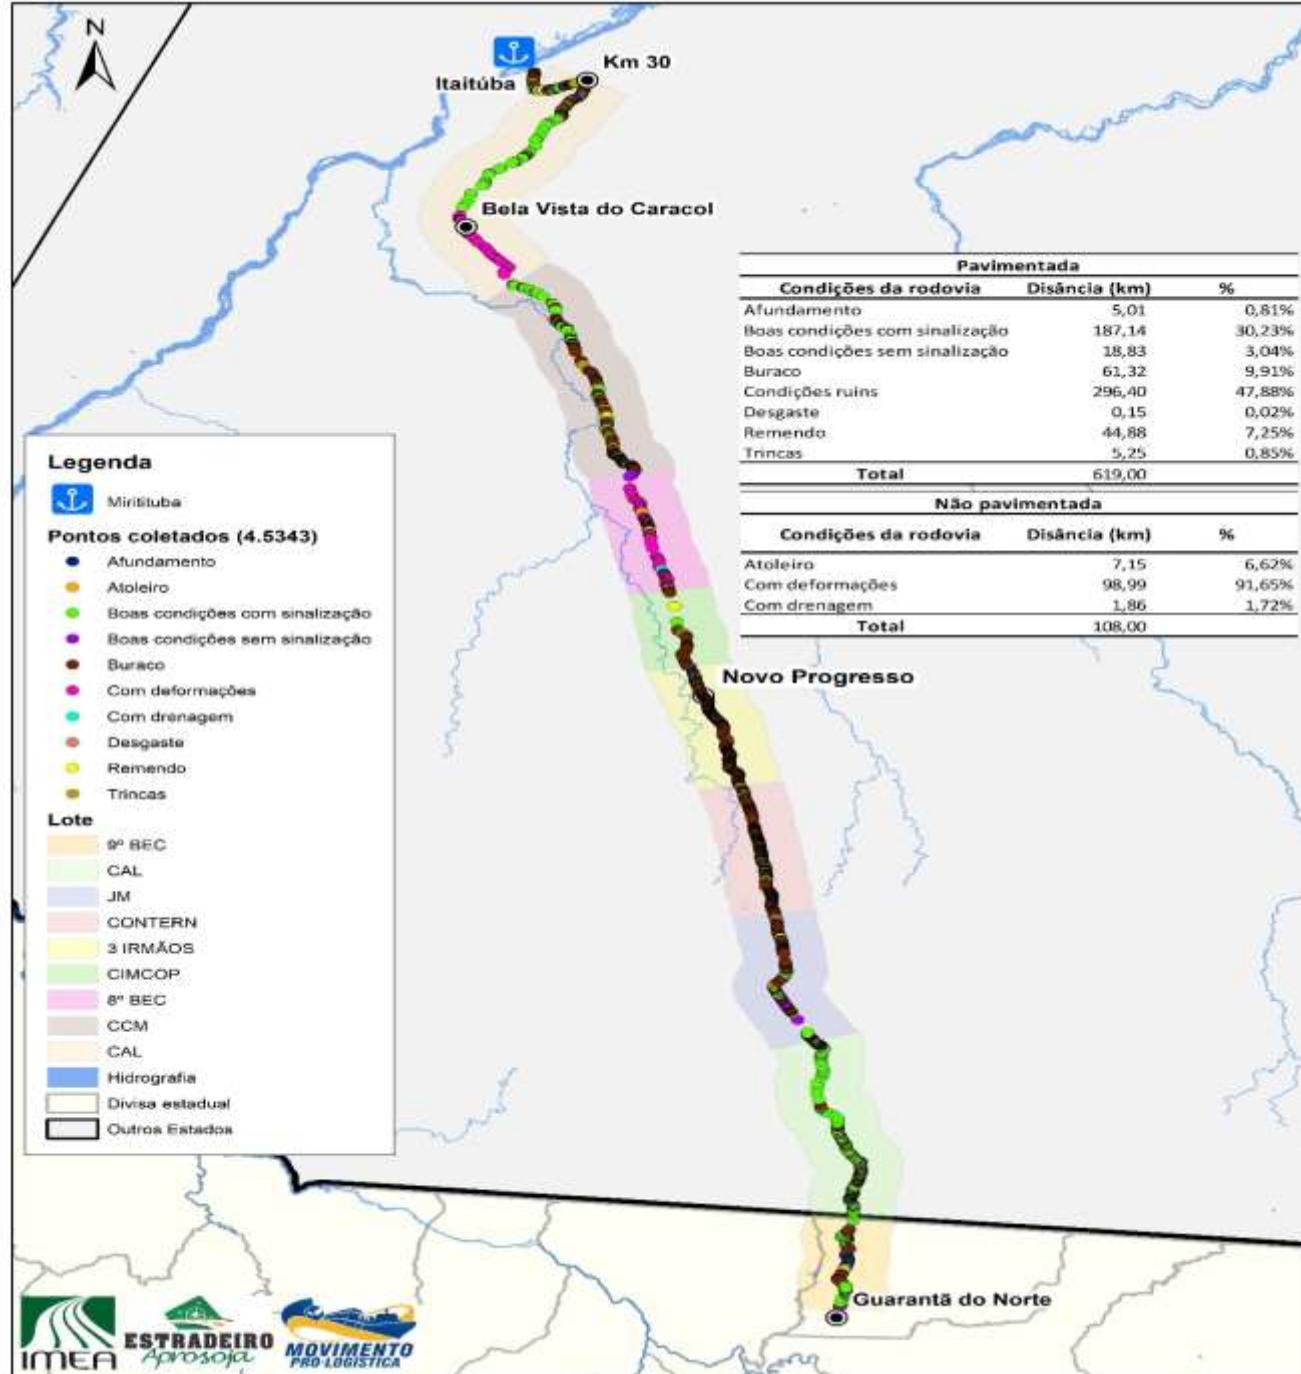

## SITUAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TRECHOS NA BR 163 – PARÁ

KM	EMPRESA	SERVIÇO
0 - 102	Jurema	CREMA + Reforço de capa
102 - 240	CFA	CREMA + Reforço de capa
240 - 305	Fratelo	PATO (restauração)
305 - 419	à licitar	PATO
354 - 419	EB-XINGÚ	Pavimentação com capa reforçada
419 - 537	em licitação	CREMA + Reforço de capa
537 - 649	AGRIENGE	Pavimentação
649 - 674	VF Gomes	PATO

OBRIGADO
