


**Legenda:**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

**Tipo de Intervenção**

IMPLANTAÇÃO	150,70 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	20,26 Km
ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH.	5,22 Km
OBRA DE EMERGÊNCIA	1,02 Km
OAE*	
A LICITAR	
<b>Total</b>	<b>177,20 Km</b>

\* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

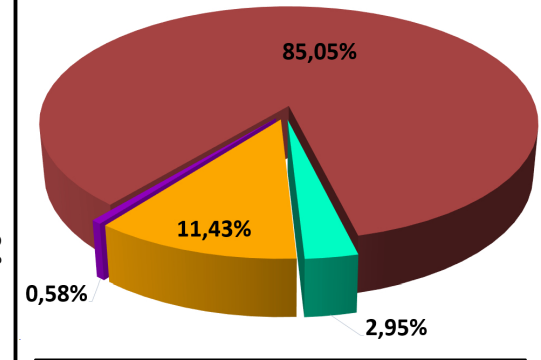

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)	
1	Único	18 00131/2022	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-343	340,98	341,20	1,02	Construção de trincheira em interseção com Av. João XXIII em Teresina	13/06/2022	09/09/2024	R\$ 46.086.737,68	51,75%	18 00255/2022	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENG.	Obra em execução, com serviços de perfuração de estacas escavadas em fase de finalização.
2	1	18 00721/2018	TCE ENGENHARIA LTDA	BR-343	341,50	349,10	5,22	Adequação da BR-316/343/PI - Saídas Sul e Leste de Teresina/PI	10/12/2018	31/03/2024	R\$ 129.567.902,60	21,85%	18 00536/2018	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENG.	Obra finalizada, com entrega parcial dos serviços (concluídos Viaduto sobre a Av. dos Expedicionários, suas marginais e rotatória).
3	Único	18 00899/2019	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-316	13,38	33,54	20,26	Duplicação do trecho entre Entr. com BR-226/PI e Demerval Lobão	27/12/2019	14/03/2024	R\$ 90.388.642,57	86,81%	18 00927/2020	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Obra em execução, com Binder, além de serviços finais de acabamento, concentradas na entrada da travessia urbana de Demerval Lobão.
4	Único	18 00517/2022	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-330	0,00	1,42	4,02	Construção de ponte sobre rio Parnaíba e seus acessos	26/09/2022	27/06/2025	R\$ 34.447.249,67	11,82%	18 00557/2023	NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA	Obra em fase de implantação.
5	Único	18 00191/2019	CONSORCIO ARTELESTE/MAVILLIS	BR-235	435,30	435,48	4,60	Construção de OAE	23/05/2019	31/03/2024	R\$ 35.484.066,85	99,23%	18 00843/2019	CONSÓRCIO FUTURE ATP / ZAGO	Obra em conclusão, com frentes nos serviços de sinalização. As desapropriações na faixa de domínio seguem pendentes.

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)	
D1	UT-003/2007	Estado do Piauí	BR-235	0,00	150,70	150,70	Implantação da BR-235/PI	17/04/2009	29/10/2024	R\$ 265.555.827,73	R\$ 0,00	R\$ 265.555.827,73	75,76%	Obra paralisada por falha no projeto. Levantamentos sendo realizados para contratação de nova executora para correção e finalização da obra.

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-343	341,50	349,10	Rem. Contrato 721/2018 - Adequação BR-316/343/PI (Saídas Sul e Leste de Teresina)			O remanescente (cerca de 5,5 km) será licitado juntamente com a supervisão, com projeto executivo. A SR possui delegação de competência.	
L2	BR-316			Demerval Lobão a Monsenhor Gil (Lote 2)		31/12/2023	Previsão de licitar o lote 2 da BR-316/PI, entre Demerval Lobão e Monsenhor Gil, até dezembro/2023.	
L3	BR-235	0,00	150,00	Remanescente do Convênio 3/2007			Levantamentos sendo realizados para contratação de nova executora para correção de projeto e finalização da obra.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
