


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - - - Não pavimentada
 - ▭ Planejada
- Tipos de Intervenção**
- IMPLANTAÇÃO 7,40 Km
 - ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 6,07 Km
 - ▲ OAE
 - A LICITAR
- Total 13,47 Km**

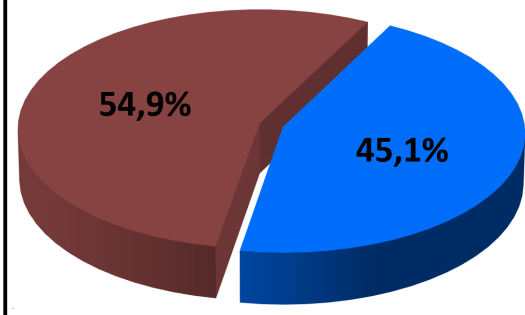

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras Diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	22 00811/2020	TÉCNICA RONDÔNIA DE OBRAS	BR-425	51,70 79,70	0,215	Pontes sobre os rios Araras (Km 51,7) e Ribeirão (Km 79,7)	04/12/2020	30/01/2024	R\$ 23.527.994,98	69,67%	22 00377/2021	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Obra em andamento. Em desenvolvimento as atividades nas superestruturas das OAEs e a execução dos aterros.
2	Único	22 00794/2021	TÉCNICA RONDÔNIA DE OBRAS	BR-364	423,30 423,52	0,22	Ponte sobre o rio Jarau	04/01/2022	19/09/2024	R\$ 28.989.641,63	36,82%	22 00694/2021	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA	Em fase de elaboração/aprovação projetos na superestrutura da ponte existente sobre o Rio Jarau. Executados serviços na mesoestrutura e superestrutura da ponte nova.
3	Único	22 00902/2020	CONSÓRCIO META-VETOR	BR-364	347,00 351,67	4,67	Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	25/07/2024	R\$ 53.450.334,80	19,33%	22 00541/2021	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Em fase de elaboração/aprovação de projetos. Executando serviços na mesoestrutura e superestrutura do viaduto do segmento 01, serviços de terraplenagem e sub-base.
3	Único	22 00902/2020	CONSÓRCIO META-VETOR	BR-364	337,10 338,50	1,4	Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	25/07/2024	R\$ 53.450.334,80	19,33%	22 00541/2021	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Em fase de elaboração/aprovação de projetos. Executando serviços na mesoestrutura e superestrutura do viaduto do segmento 01, serviços de terraplenagem e sub-base.
4	Único	22 00614/2021	CODRASA COMERCIO E CONST.	BR-364	236,00 236,75	0,75	Recuperação, Reforço e Alargamento de Ponte Rodoviária	10/11/2021	08/08/2024	R\$ 11.239.615,27	17,74%	22 00795/2021	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS	Obra em andamento, com o ritmo lento. Em execução os serviços na ponte da marginal esquerda, contudo no mês citado acima não houve avanço físico do contrato.
5	Único	22 00513/2023	CONSÓRCIO ENTEC/FENIX	BR-364	576,90 578,70	1,80	Correção de traçado e execução de 3ª faixa	26/09/2023	20/09/2024	R\$ 20.309.136,89	2,84%			Executando serviços de terraplenagem

Obra Delegada

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1	TED-656/2020	EXÉRCITO BRASILEIRO - 5ª BEC	BR-364	421,40 427,00	7,4	Implantação das Ruas Laterais na Travessia Urbana de Jarau	02/10/2020	02/10/2024	R\$ 29.161.513,12	R\$ 0,00	R\$ 29.161.513,12	82,74%	Executando serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação como previsto no cronograma físico do BEC.

Obras a licitar

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO
L1	BR-364	382,40 384,30	Ação 7XX3 - Adeq. Div/MT a Div/AC - PREV 01 - Travessia Urbana de Ouro Preto do Oeste	50600.032524/2023-73			Em processo de atualização de orçamento
L2	BR-364	6,50 162,60	Ação 7XA3 - Execução de terceiras faixas e inteseção com rodovia RO-391 (P/ Chupinguaia)	50622.000781/2021-26		0331/23-22	Licitação fracassada por falta de Proposta de Preços válidas e Documentação de Habilitação que atendesse às exigências do Edital.
L3	BR-364	26,50 27,90	Ação 7XA3 - Viaduto na interseção das rodovias BR-364/RO e BR-435/RO	50622.002710/2021-68		0309/23-22	Licitação fracassada por falta de Proposta de Preços válidas e Documentação de Habilitação que atendesse às exigências do Edital.
L4	BR-425		Ponte Internacional sobre rio Mamoré (Gujará-Mirim) e acessos	50600.037576/2023-36		0539/23-00	Edital publicado em 16/11/2023.

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
