


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - - - Não pavimentada
 - ⋯ Planejada

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	49,43 Km
A LICITAR	
Total	49,43 Km

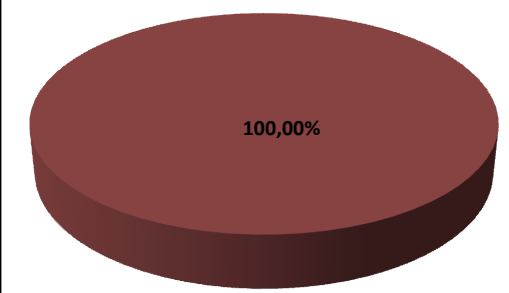

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obra Direta														
OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	1	26 00048/2016	CONSÓRCIO CAVALCA AGRIMAT CONSTEPRO	BR-432	0,20 36,93	36,73	Implantação/Pavimentação	11/03/2016	27/11/2023	R\$ 120.434.264,89	96,69%	26 00427/2022	TRAFECON ENGENHARIA LTDA	Em processo de recebimento definitivo

Obra Delegada														
OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)	
D1	TED-622/2017	EXÉRCITO BRASILEIRO - 6º BEC	BR-432	167,60 180,30	12,7	Implantação e pavimentação	26/10/2017	14/10/2024	R\$ 38.377.764,50	R\$ 0,00	R\$ 38.377.764,50	95,97%	O Contrato encontra-se ativo em fase de conclusão. Canteiro desmobilizado.	

Obras a licitar														
A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO							SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-401	107,00 177,00	Construção Bomfim - Normandia				Projeto básico e executivo em análise na DPP. As obras não serão iniciadas em 2023.							
L2	BR-432		Ação 7242 - Ponte sobre o Igarapé Cachorro				O projeto executivo aprovado, em fase de atualização de orçamento. A SR deve verificar a inclusão dos acessos no projeto.							
L3	BR-210		Ação 152V - Construção 5 de Pontes				Previstas 5 pontes e 2 galerias, todas com projeto executivo aprovado. SR atualizando orçamento. A SR deve verificar a inclusão dos acessos no projeto.							

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
