


**Legenda:**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

**Tipos de Intervenção**

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	261,88 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	35,70 Km
IMPLANTAÇÃO	24,10 Km
ALICITAR	
<b>Total</b>	<b>321,68 Km</b>

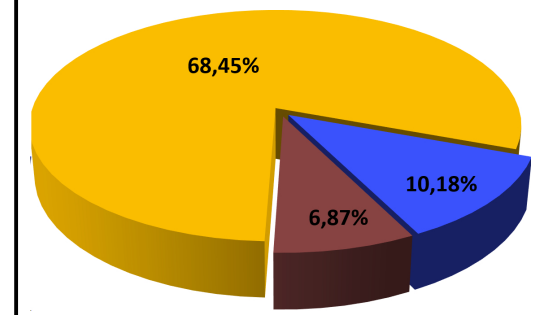

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	10 00094/2021	CONSÓRCIO PLANATERRA/TRAÇADO/IGUATEMI	BR-285	30,00 54,10	24,1	Remanescentes de obras na BR-285	15/03/2021	17/08/2026	R\$ 114.421.158,84	11,86%	10 00391/2022	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Em obras. Terraplenagem, OAE de passagem de fauna e drenagem.
2	1	10 00821/2019	CONSÓRCIO BR-116 NORTE (MAC / ETERC / SOGEL / IGUATEMI)	BR-116	234,70 270,40	35,7	Melhoramento físicos e segurança de tráfego	02/12/2019	24/06/2025	R\$ 556.093.573,46	26,30%	10 00650/2016	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Serviços nas OAE's Rio dos Sinos, no Viaduto de acesso à ERS - Scharlau e Rua Celina Kroeff. Execução da pavimentação
3	Único	10 00058/2022	PLANATERRA TERRAPL. PAVIMENTAÇÃO LTDA	BR-116	397,18 422,30	25,12	Remanescentes do contrato 461/2012	21/03/2022	11/08/2024	R\$ 222.847.495,17	41,01%	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Em obras. Terraplenagem, OAE e obras complementares.
4	Único	10 00802/2020	CONSÓRCIO A.GASPAR/V.GARAMBONE	BR-116	400,34 401,20	0,125	Implantação do viaduto Pompéia	01/12/2020	29/06/2025	R\$ 85.940.903,92	19,40%	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Em obras. Execução de blocos e estacas de blocos.
4	Único	10 00802/2020	CONSÓRCIO A.GASPAR/V.GARAMBONE	BR-116	428,16 428,84	0,68	Duplicação da Ponte sobre o rio Camaquã	01/12/2020	29/06/2025	R\$ 85.940.903,92	19,40%	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Em obras. Execução de blocos e estacas de blocos.
5	7	00 00463/2012	SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	BR-116	448,50 470,10	21,6	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	27/01/2024	R\$ 171.201.530,81	84,02%	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Conclusão da obra.
6	Rem. lote 7	10 00041/2023	CONSÓRCIO SULTEPA / BOURSCHEID ENG.	BR-116	448,50 470,10	21,6	Remanescente do lote 7	22/03/2023	06/08/2024	R\$ 77.150.942,06	9,34%	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Em obras. Serviços de pavimentação, terraplenagem e drenagem.
7	Rem. lotes 8/9	10 00427/2023	CONSÓRCIO SBS-BOURSCHEID	BR-116	470,10 511,76	41,66	Remanescente dos lotes 8 e 9	28/08/2023	07/02/2027	R\$ 101.780.002,36	1,65%	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Obras remanescentes lotes 8 e 9. Início dos serviços em 01/09/2023.
8	1	00 00139/2014	CONSÓRCIO B C M	BR-290	112,30 142,00	29,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	01/08/2022	R\$ 168.971.402,71	16,57%	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Em análise a possibilidade jurídica de continuidade do contrato
9	2	00 01070/2013	CONSÓRCIO B C M	BR-290	142,00 172,08	30,08	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	05/11/2021	R\$ 212.694.280,34	9,87%	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Em análise possibilidade de alteração da composição do Consórcio e reativação do contrato
10	3	00 00217/2014	CONSÓRCIO B C M	BR-290	172,00 199,03	27,03	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	14/02/2027	R\$ 259.062.207,21	12,12%	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Em obras. Execução de terraplenagem.
11	4	00 01126/2013	CONSÓRCIO TRIER - CTESA - ESTEIO	BR-290	199,30 228,00	28,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	20/10/2025	R\$ 278.561.847,14	46,48%	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Em obras. Serviços de terraplenagem, pavimentação e OAC's.
12	2	00 00494/2013	CONSÓRCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-287	247,70 254,30	6,6	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	26/12/2024	R\$ 248.437.568,45	95,35%	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.	Em obras. Execução OAE, pavimentação e drenagem.
12	2	00 00494/2013	CONSÓRCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-158	329,10 331,90	2,8	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	26/12/2024	R\$ 248.437.568,45	95,35%	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.	Em obras. Execução OAE, pavimentação e drenagem.
13	1	00 00493/2013	CONSÓRCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-158	324,00 329,10	5,1	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	26/12/2024	R\$ 200.381.230,40	93,85%	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.	Em obras. Muro de contenção.
14	Único	00 00557/2022	COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S/A	BR-392	700,00 700,00	2,628	Ponte Internacional em Porto Xavier e acessos	09/02/2023	31/03/2027	R\$ 221.181.076,09	0,00%			Ordem de início emitida em 09/02/2023. Empresa em recuperação judicial.

Obra delegada

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1	TED-919/2018	1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	BR-116	300,54 351,34	50,8	Duplicação BR-116/RS (antigos contratos 00 00457/2012 e 00 00458/2012)	19/12/2018	18/12/2024	R\$ 255.528.384,19	R\$ 0,00	R\$ 255.528.384,19	56,14%	Em obras. Executando terraplenagem, pavimentação, drenagem, OACs e serviços complementares.

Obras a licitar

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-285	451,12 461,36	Adequação na travessia urbana de Ijuí	50610.001741/2023-01		0295/23-10	Licitação adjudicada e homologada à Construtora Luiz Costa	0373/23-10
L2	BR-116		Ação 7L04 - Travessia Urbana de Guaíba				Edital em análise na Procuradoria do Exército. Não há impedimentos.	
L3	BR-116	422,30 447,98	Remanescente do Lote 6	50610.001294/2023-81		0211/23-10	Adjudicado e Homologado para Construtora Pelotense	
L4	BR-116	0,00 9,20	2ª Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, incluindo Acesso do Lado Brasileiro e a Aduana Brasileira	50600.025887/2023-52		0394/23-00	Licitação fracassada. Em atualização do orçamento referencial	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
