




DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
ALAGOAS

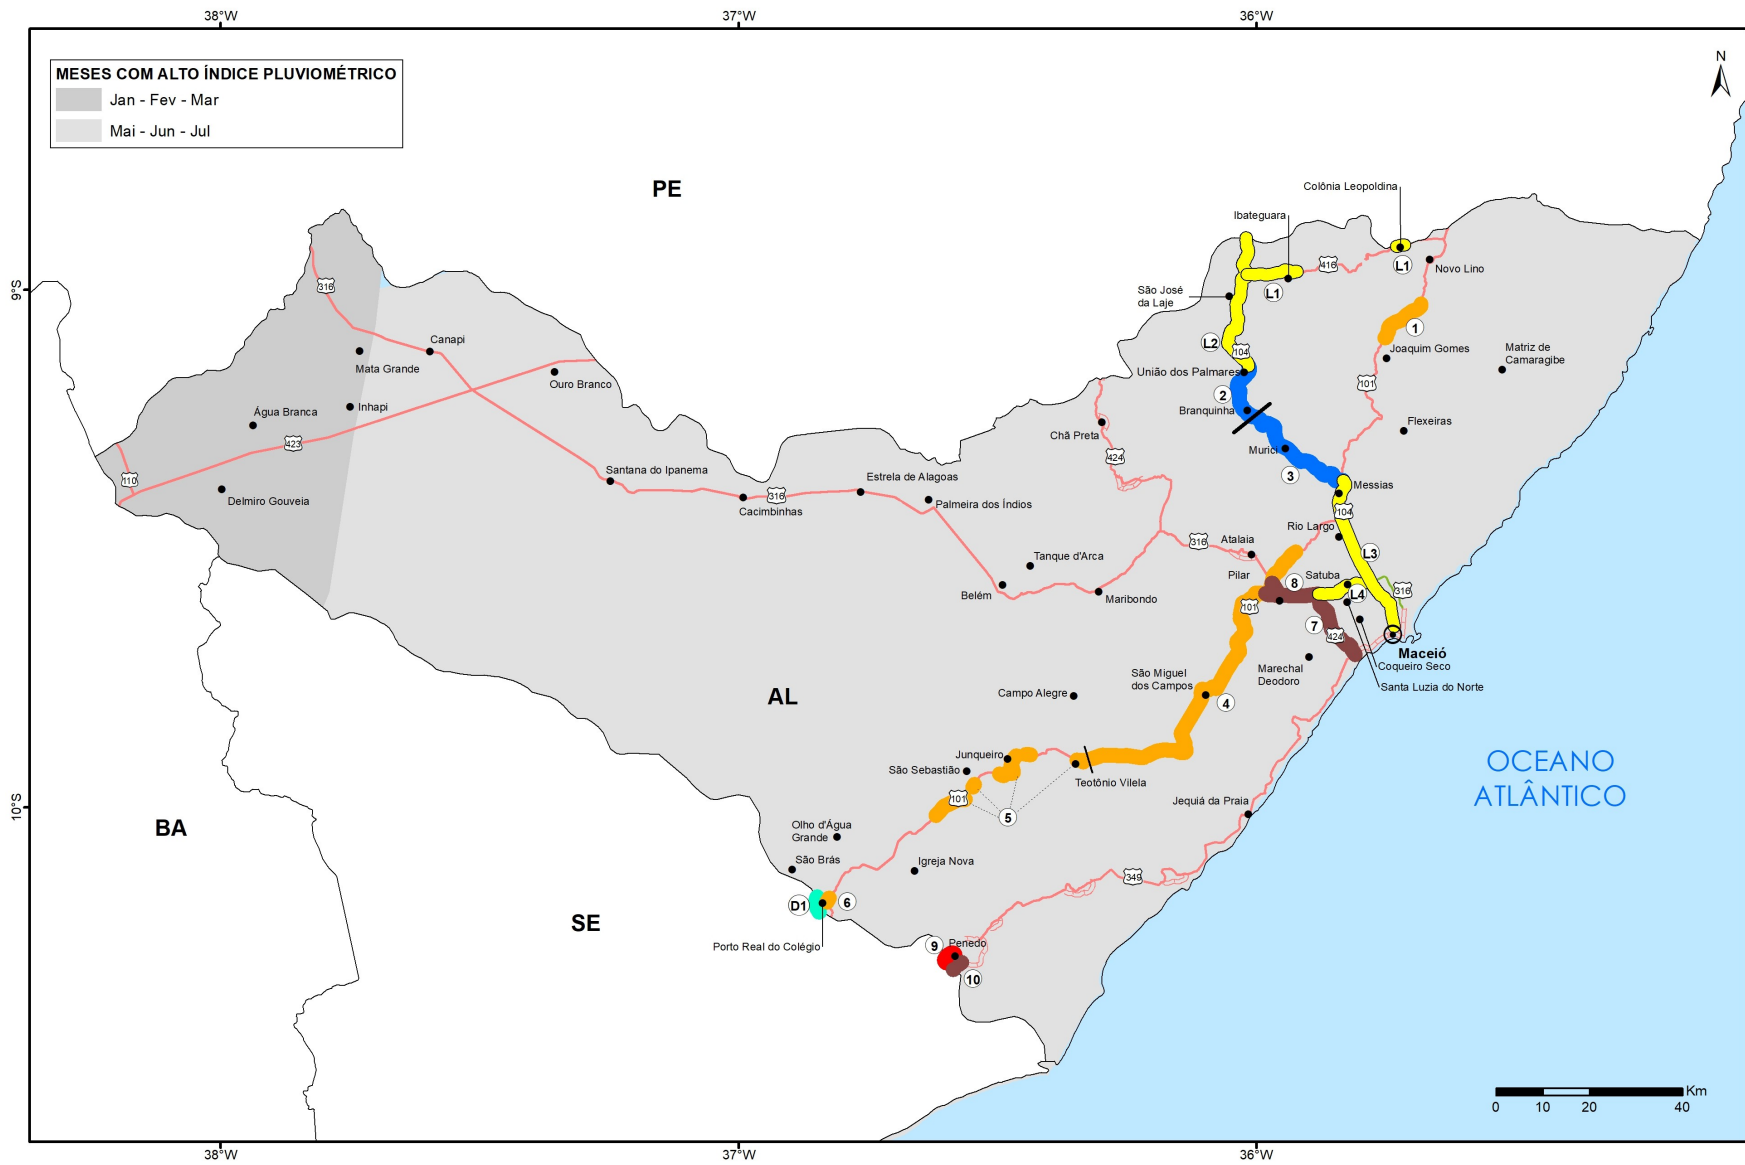

Legenda:


- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 131,23 Km
- IMPLANTAÇÃO 41,00 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 56,10 Km
- OAE*
- A LICITAR

Total 228,33 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+H+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	3003	7624	2-3	2	00 00608/2024	CONSORCIO JARDIM PLAN / CONSERVA / FP	BR-101	20,60	30,50	9,9	Remanescente de duplicação do Lote 2	21/10/2024	23/04/2027	R\$ 115.679.495,91	32,01%	Obra com redução do ritmo dos serviços em decorrência da incidência de chuvas na região.	00 00628/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA
2	2589	1610	1B	00	00793/2025	CONSORCIO LUIZ COSTA / VANGUARDA / FP	BR-104	33,40	46,10	12,7	Adequação do trecho União dos Palmares a Branquinha	29/12/2025	29/06/2028	R\$ 289.043.906,76	0%	Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	00 00828/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA
3	2589	1610	2A	00	00796/2025	CONSORCIO LUIZ COSTA / VANGUARDA / FP	BR-104	46,10	74,40	28,3	Adequação do trecho Branquinha a Messias	15/01/2026	30/07/2028	R\$ 508.890.843,29	2,79%	Em andamento a implantação do canteiro de obras, a execução dos serviços de terraplenagem, sinalização e infraestrutura do Viaduto Muriel.	00 00828/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA
4	1986	7624	2-3	4/5	00 00083/2017	CONSORCIO BR-101/AL	BR-101	92,21	170,32	78,11	Remanescente de duplicação e restauração com melhoramento	03/10/2017	31/01/2027	R\$ 622.423.861,76	63,16%	Trecho 2 (31 km) concluído. Trecho 1 (47,11 km) executando sinalização, componente ambiental, defensas metálicas e barreiras de segurança.	20 00101/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
5	2586	7624	2-3	6	00 00636/2024	CONSORCIO ALAGOAS BR-101/AL	BR-101	170,32	212,32	42	Remanescente de duplicação do Lote 6	25/10/2024	30/04/2027	R\$ 102.806.831,96	37,42%	Em execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e OAES.	00 00828/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA
6	3005	7624	2-3	7	20 00563/2023	CONSORCIO FP / LP / ENGEVAT	BR-101	244,14	245,36	1,22	Remanescente de duplicação do Lote 7	10/03/2023	31/10/2025	R\$ 29.042.832,56	99,29%	Obra concluída. Aguardando termo de recebimento dos serviços.	20 00170/2023	CONSORCIO JDS - TRAFECOM
7	2590	161N	3	2	00 00876/2024	CONSORCIO ALAGOAS BR-424/AL - LOTE 2	BR-424	92,00	108,20	16,6	Arco Metropolitano de Maceió na BR-424	18/11/2024	06/05/2027	R\$ 266.736.567,10	12,85%	Obra em andamento com serviços de terraplenagem, pavimentação e nos viadutos.	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU - AL
8	2590	161N	3	1A	00 00799/2025	CONS. FP / CONSERVA / SVC / L. PEREIRA / ENGENHARIA / AMORIM	BR-316	251,40	263,50	12,1	Arco Metropolitano de Maceió na BR-316	27/01/2026	29/07/2029	R\$ 222.001.980,46	0%	Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU - AL
9	136049	7XZ5	2-3-7	Unico	00 00057/2024	CONSORCIO PENEDO / NEOPOLIS	BR-349	135,10	136,30	1,2	Ponte sobre o rio São Francisco (Penedo-Neópolis)	16/02/2024	29/07/2027	R\$ 207.980.868,23	49,46%	Obra em execução, com frentes ativas nos serviços de infraestrutura e superestrutura.	00 00952/2024	CONSORCIO MODERA-CONCREMAT-SCB-LPV
10	136049	7XZ5	2-3-7	Unico	00 00835/2025	CONSORCIO AGC / NOVATEC / UCHOA BR-349/AL	BR-349	0,00	13,20	13,2	Acesso à Ponte de Penedo-Neópolis sobre o Rio São Francisco	10/02/2026	10/03/2028	R\$ 161.397.495,00	0%	Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	00 00952/2024	CONSORCIO MODERA-CONCREMAT-SCB-LPV

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	7624	2-3	TC-134/2026		ESTADO DE ALAGOAS	BR-101	247,33	248,61	1,16	Posto Fiscal - Porto Real do Colégio - km 247,33 ao km 248,61	29/06/2026	17/03/2028	R\$ 16.070.054,04	R\$ 0,00	R\$ 16.070.054,04	0%	Assinado TC-134/2026 junto ao Governo do estado de Alagoas. Objeto do referido Termo a iniciar.		

Obra a Licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	140979	7U07	2-3	Unico	BR-416	0,00	49,00	Remanescente de implantação dos Segmentos 2 e 4		Em levantamento do remanescente de obra do empreendimento, o qual compreende os Segs 2 e 4. Previsão de licitação em 2026 referente apenas à execução de obra.	A LICITAR	A LICITAR
L2	2589	1610	1A	BR-104	0,00	33,40	Adequação do trecho Divisa PE a União dos Palmares		Projetos em elaboração por meio do CT 20 00132/2024.	A LICITAR	A LICITAR	
L3	2589	1610	2B	BR-104	74,40	94,00	Adequação do trecho Messias a Maceió		Projetos em elaboração por meio do CT 20 00132/2024.	A LICITAR	A LICITAR	
L4	2590	161N	3	1B	BR-316	263,50	276,10	Arco Metropolitano de Maceió na BR-316		Projetos aprovados. Revisão de licitação apenas de execução de obra em 2026.	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU - AL

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+H+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
