




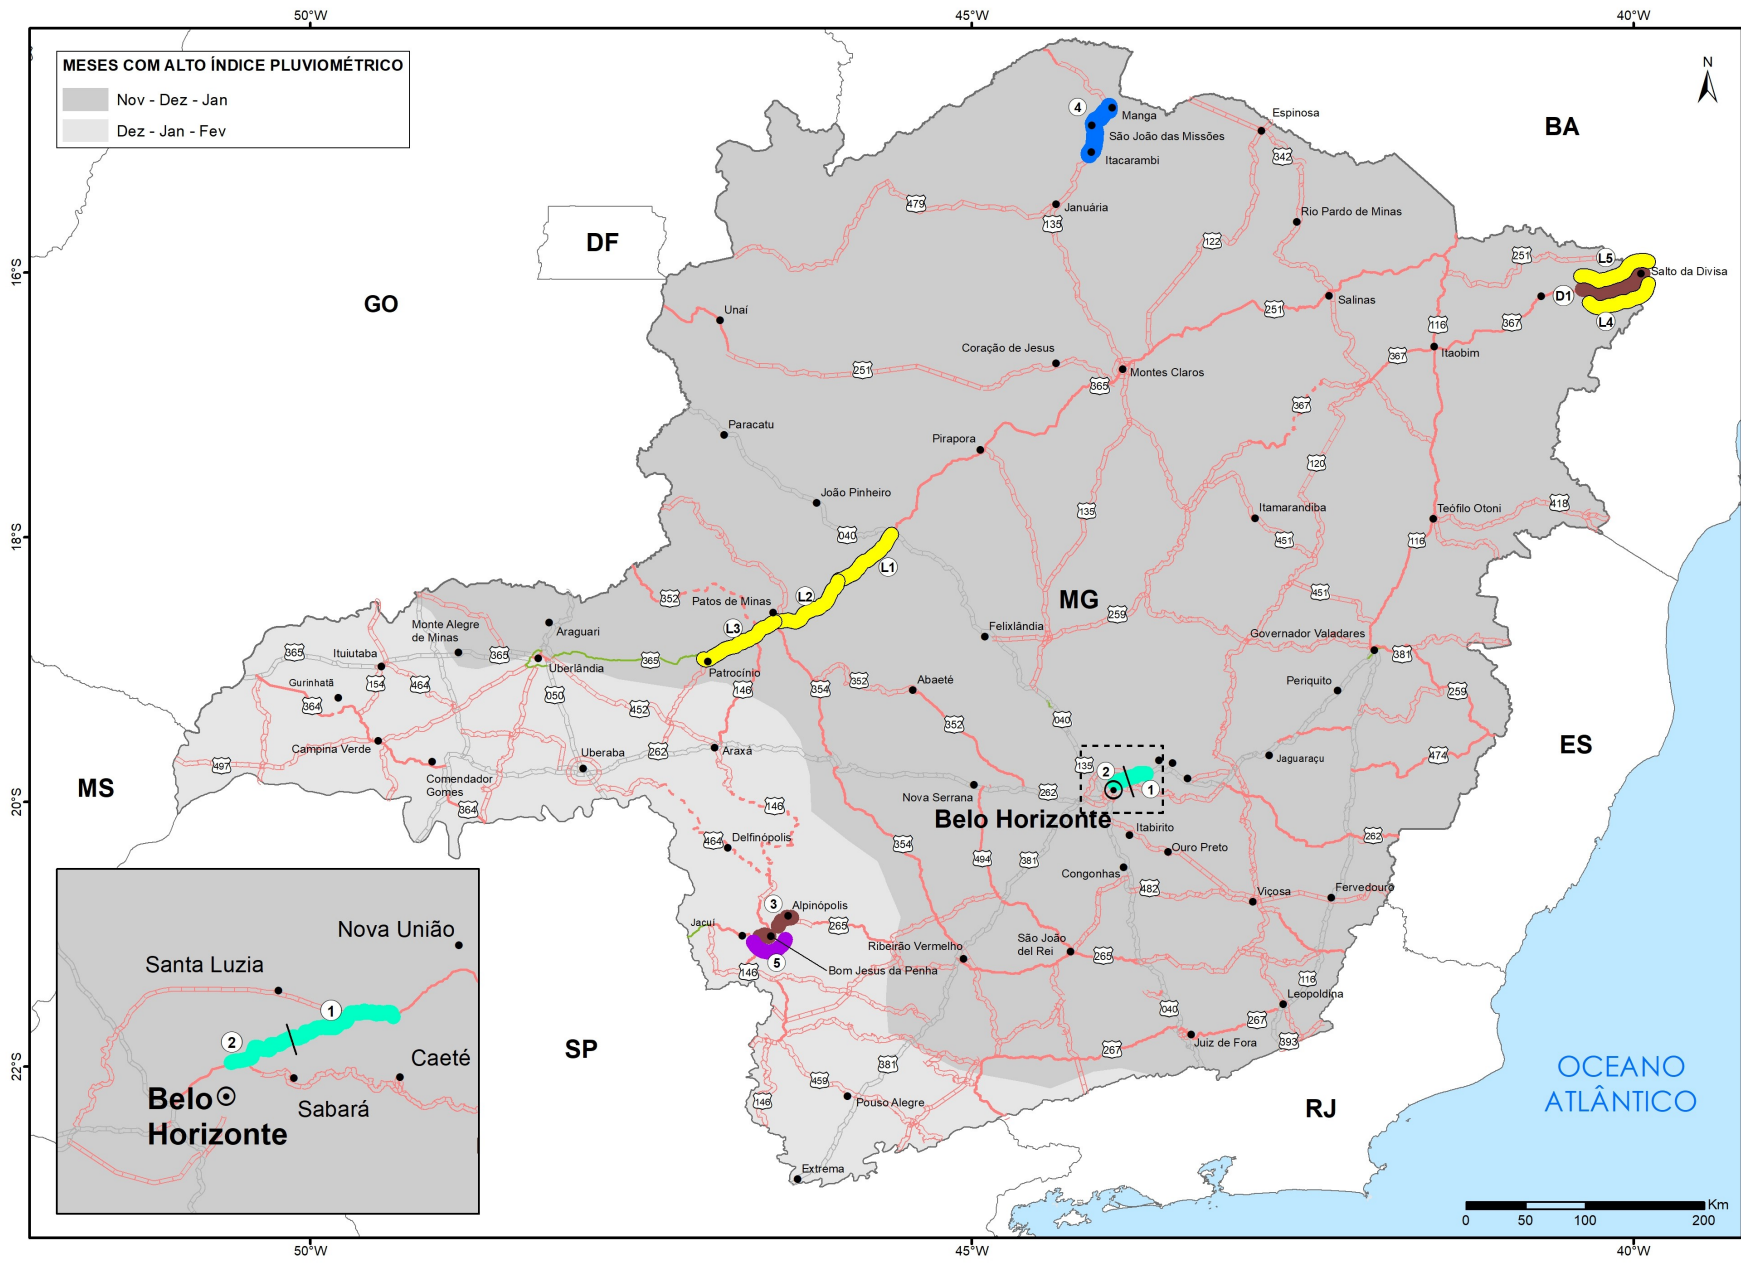

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL MINAS GERAIS




Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH.	31,40 Km
IMPLANTAÇÃO	71,03 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	57,41 Km
OBRA COMPLEMENTAR	
A LICITAR	
Total	159,84 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	124123	100K	2-3	8A	00 00618/2024	CONSORCIO BR-381/MG - CLO/CONSERVA	BR-381	422,40	440,40	18	Duplicação da BR-381	17/10/2024	25/09/2028	R\$ 405.408.730,60	0,4%	Contrato em fase de projetos. Estudos em análise na DFP. Contrato 111/2026 de supervisão assinado, com ordem de início emitida. Pendências de desapropriação e reassentamento.	Edital 0483/24-06	BM LICITAÇÃO
2	124124	100K	2-3	8B	00 00041/2025	CONSORCIO CLC / CONSERVA / TECNOGEO	BR-381	445,00	458,40	13,4	Duplicação da BR-381	29/05/2025	07/05/2029	R\$ 525.119.585,72	0%	Contrato em fase de projetos. Estudos em análise na DFP. Contrato 111/2026 de supervisão assinado, com ordem de início emitida. Pendências de desapropriação e reassentamento.	Edital 0483/24-06	BM LICITAÇÃO
3	2029	7XJ0	2-3	Unico	06 00298/2023	PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA	BR-265	545,80	582,00	9,43	Remanescentes de implantação e pavimentação	07/06/2023	27/09/2026	R\$ 60.420.784,28	63,94%	Obra em andamento, com pendências relativas ao solo mole. 2º RFPfo foi aprovada, conclusão do contrato previsto para dez/26.	06 00314/2022	TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA
4	2028	10W	2-3	Unico	00 00277/2022	CONSORCIO LCM / ARA / HOLLIS	BR-135	82,00	139,41	57,41	Adequação/Restauração e melhoramentos	09/08/2022	20/12/2027	R\$ 273.455.328,39	4,56%	Obra em andamento, com pendências relativas às pedreiras comprometendo o ritmo de execução.	06 00331/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
5	2029	7XJ0	2-3	Unico	06 00648/2025	ENGEGRAUT GEOTECNIA E ENGENHARIA	BR-265	573,00	577,80	4,8	Tratamento de solo mole na BR-265/MG	24/10/2025	24/07/2028	R\$ 12.565.133,63	84,99%	Obra referente a estabilização do solo mole concluída.	06 00645/2025	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
D1	2028	13XG	2-3	TED-403/2022	DEC - EXERCÍCIO BRASILEIRO	BR-367	0,00	61,60	61,6	Remanescente de implantação do Contrato 06 01040/2018	25/08/2022	07/05/2026	R\$ 328.741.747,74		R\$ 0,00	R\$ 328.741.747,74	71,39%	Obra em andamento, com a 1ª RPO aprovada e 2ª RPO em análise pela fiscalização com apoio da supervisão. Previsão de conclusão em Ago/27.	06 00120/2025	ENECOM ENGENHARIA LTDA

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2498	16S0	2	1	BR-365	278,00	Adequação de capacidade - Lote 1	50606.001034/2024-56		Projetos executivos aprovados, aguardando licitação.	A LICITAR	A LICITAR
L2	2498	16S0	2	2	BR-365	336,70	Adequação de capacidade - Lote 2	50606.001034/2024-56		Projetos executivos aprovados, aguardando licitação.	A LICITAR	A LICITAR
L3	2498	16S0	2	3	BR-365	418,30	Adequação de capacidade - Lote 3			Projetos executivos aprovados, aguardando licitação.	A LICITAR	A LICITAR
L4	2026	13XG	2-3		BR-367	0,00	Remanescente do TED 403/2022 - Implantação			Anteprojeto em elaboração, com previsão de licitação em 2026.	06 00120/2025	ENECOM ENGENHARIA LTDA
L5	2026	13XG	2-3		BR-367	0,00	Remanescente do TED 403/2022 - O&E			Previsão de publicar edital de obras em 2026.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
