
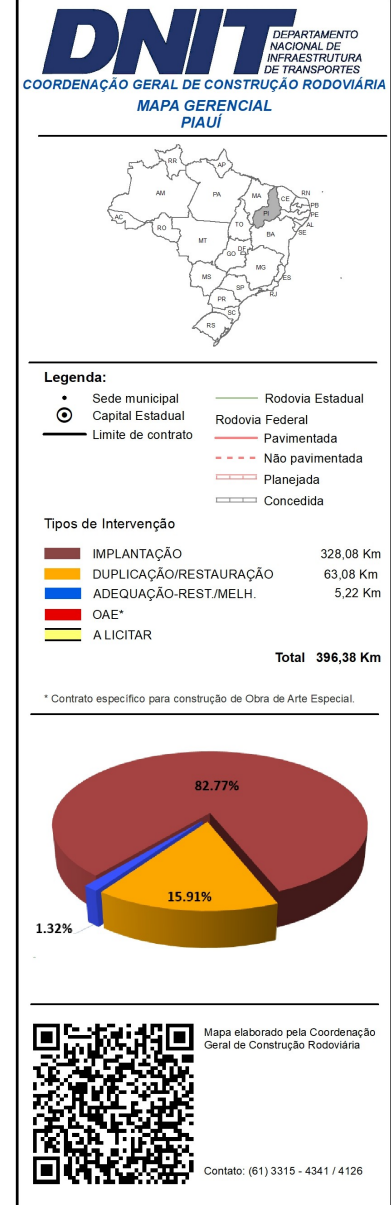


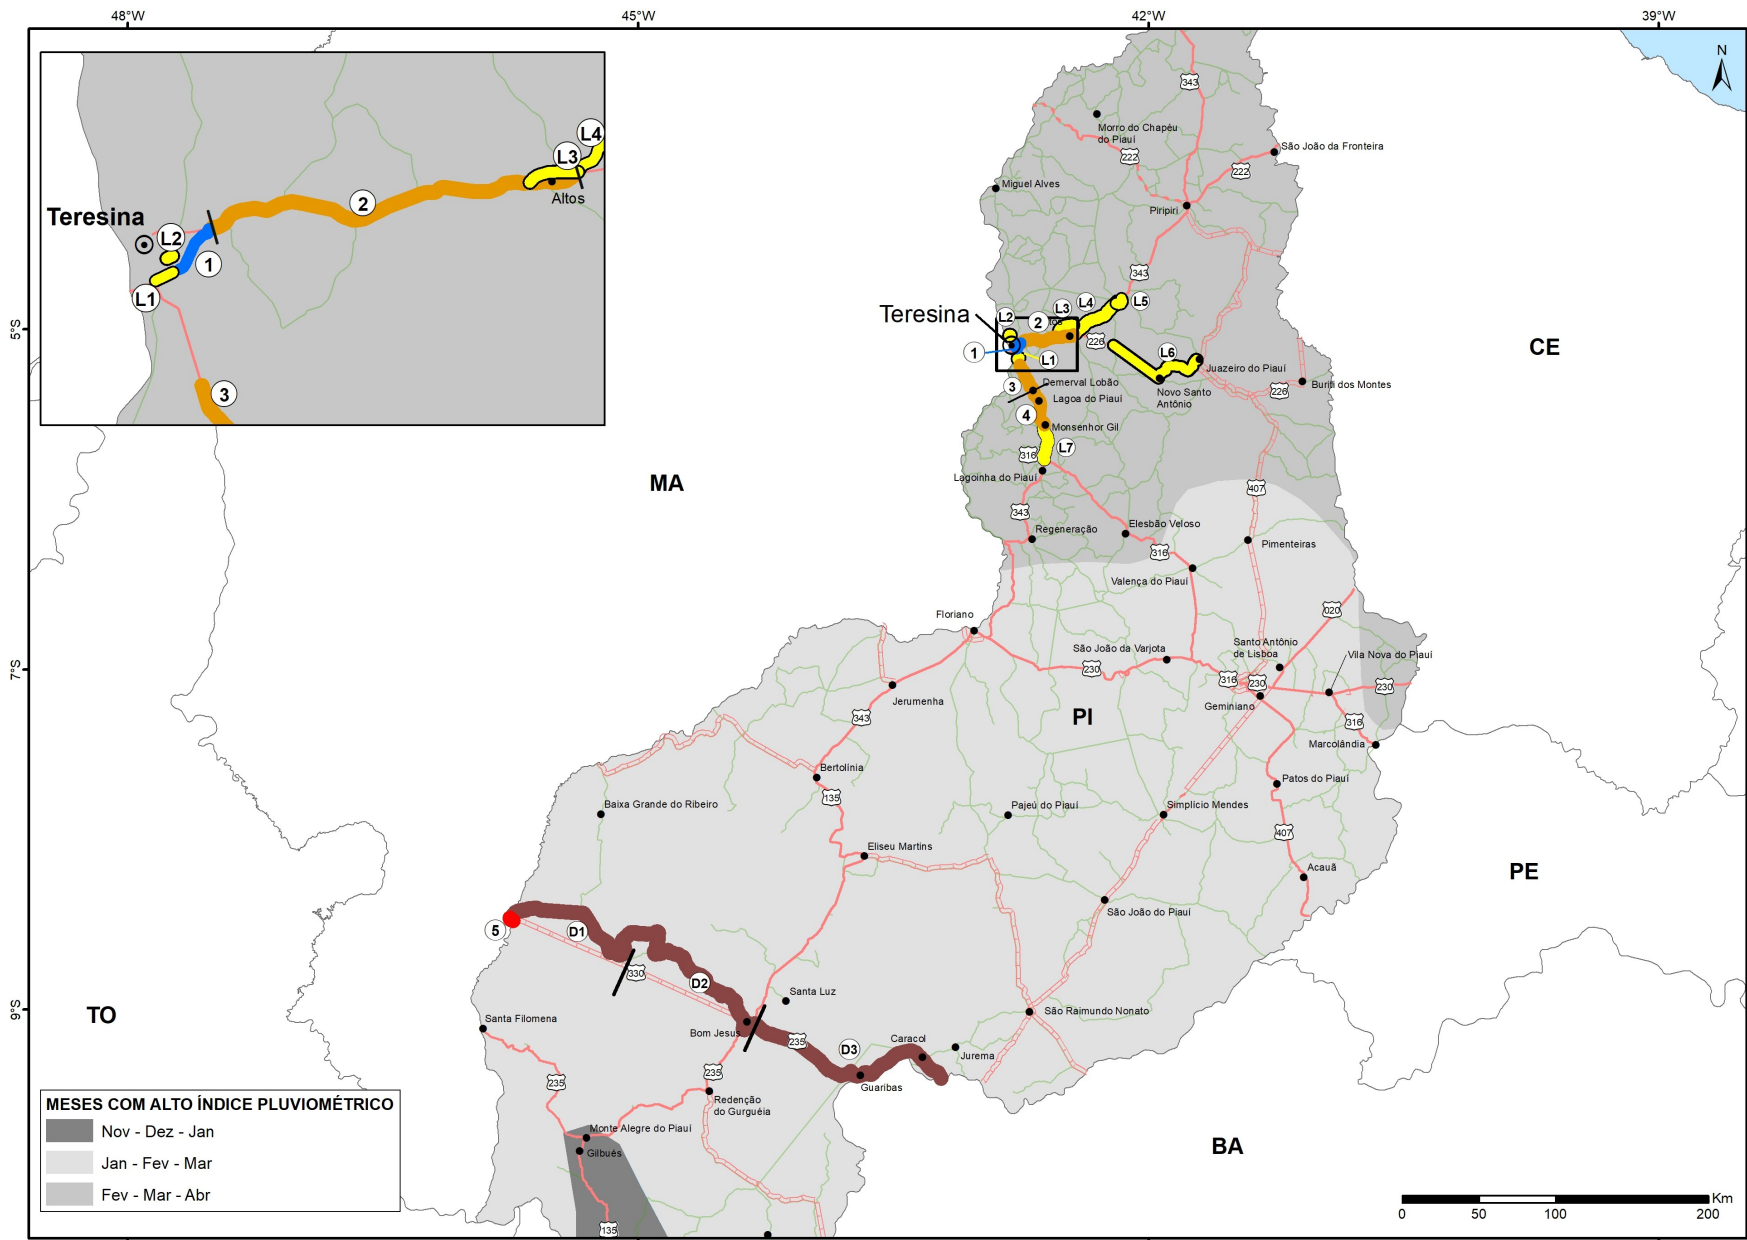

Obra Direta																						
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)			SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA			
1	2566	7W95	2-3	1	18 00887/2024	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-343	341.50	348.72	5,22	Rem. Contrato 721/2018 - Adequação BR-316/343/PI (Saídas Sul e Leste de Teresina)	31/10/2024	30/04/2026	R\$ 138.564.607,84	39,95%	Em execução os serviços no vaduto sobre a av. José Francisco de Almeida.			18 00493/2025	ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA		
2	2947	7W95	2-3	Unico	18 00669/2025	CONSORCIO DUPLICAÇÃO BR-343	BR-343	311.20	332.20	20,76	Duplicação entre Teresina e Altos	05/09/2025	05/06/2027	R\$ 211.013.991,97	0%	Em andamento atividades preliminares, consistentes em serviços de desmatamento, deslocamento e limpeza da faixa de domínio.			Edital 0438/25-18	EM LICITAÇÃO		
3	2055	7X75	2	Unico	18 00699/2019	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-316	13,38	33,54	20,26	Duplicação do trecho entre Entr. com BR-226/PI e Demerval Lobão.	26/12/2019	04/09/2026	R\$ 90.770.742,66	94,08%	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.						
4	2521	163K	3	2	18 00679/2025	CONSORCIO HIDROS / JUREMA	BR-316	33,54	55,60	22,06	Demerval Lobão a Monsenhor Gil - Lote 2	28/10/2025	28/04/2029	R\$ 165.411.396,30	0%	Em andamento em serviços de drenagem e terraplenagem.			A LICITAR	A LICITAR		
5	2057	7XMS	3	Unico	18 00517/2022	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-330	0,00	1,42	4,02	Constituição de ponte sobre rio Parnaíba e seus acessos (Ribeiro Gonçalves)	27/09/2022	22/02/2026	R\$ 35.706.570,27	99,91%	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.			18 00557/2023	NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA		

Obra Delegada																						
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)			SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
D1	4632	163K	3	TC-485/2024	ESTADO DO PIAUÍ	BR-330	1,34	115,78	114,44	Implantação da BR-330	27/11/2024	23/06/2026	R\$ 438.408.863,50	R\$ 4.354.068,64	R\$ 442.760.932,14	0%	Concluído a instalação do canteiro de obras e da usina de asfalto, em execução serviços de terrap. e drenagem.			Edital 249/2025	EM LICITAÇÃO	
D2	4115	163K	3	TC-484/2024	ESTADO DO PIAUÍ	BR-330	115,78	178,72	62,94	Implantação da BR-330	27/11/2024	27/11/2027	R\$ 280.405.803,09	R\$ 2.804.058,03	R\$ 283.209.861,12	0%	Em tratativa o início das obras por meio do contrato firmado junto ao governo do estado.			Edital 249/2025	EM LICITAÇÃO	
D3	2058	7N22	2-3	UT-003/2007	ESTADO DO PIAUÍ	BR-235	0,00	150,70	150,7	Implantação da BR-235/PI	16/01/2008	29/10/2026	R\$ 436.940.747,77	R\$ 0,00	R\$ 436.940.747,77	46,04%	Contrato de obra em andam ento por meio do Convênio junto ao Governo do estado do Piauí.			A LICITAR	A LICITAR	

Obra a licitar																							
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO			PROCESSO DA LICITAÇÃO			EDITAL			SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)			SUPERVISÃO			EMPRESA SUPERVISORA	
L1		7W95	2-3	3	BR-343	347,08	349,10	Contorno de Teresina - Lote 3			50618.000799/2024-30			01/01/26-18			Publicado edital de licitação nº 0101/26-18 para execução da obra.			A LICITAR			A LICITAR
L2		7W95	2-3	2	BR-343	346,72	347,08	Construção OAE - Lote 2			50618.000797/2024-41						Projetos concluídos. Prevista a licitação da execução da obra no presente exercício.			A LICITAR			A LICITAR
L3	4118	20UC		Unico	BR-343	303,10	332,20	Contorno Rodoviário de Altos									Projetos em elaboração por meio do contrato 18 00080/2020.			A LICITAR			A LICITAR
L4	4118	20UC		Unico	BR-343	266,90	304,40	Duplicação de trecho rodoviário Campo Maior - Altos									Projetos em elaboração por meio do contrato 18 00441/2025.			A LICITAR			A LICITAR
L5	4118	20UC		Unico	BR-343	260,00	271,00	Contorno Rodoviário de Campo Maior									Projetos em elaboração por meio do contrato 18 00496/2023.			A LICITAR			A LICITAR
L6		7Y07	6	Unico	BR-226	124,90	227,70	Implantação do trecho Juazeiro do Piauí - Altos									O anteprojeto do empreendimento encontra-se concluído, estando em tratativas a sua inclusão orçamentária.			A LICITAR			A LICITAR
L7	4631	20UC	3	1	BR-318	55,60	79,60	Duplicação de Monsenhor Gil até Estaca Zero - Lote 1									Procedim ento licitatório para a contratação da elaboração de estudos e projetos em tratativas para abertura, prevista para final de 2026.			A LICITAR			A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
