





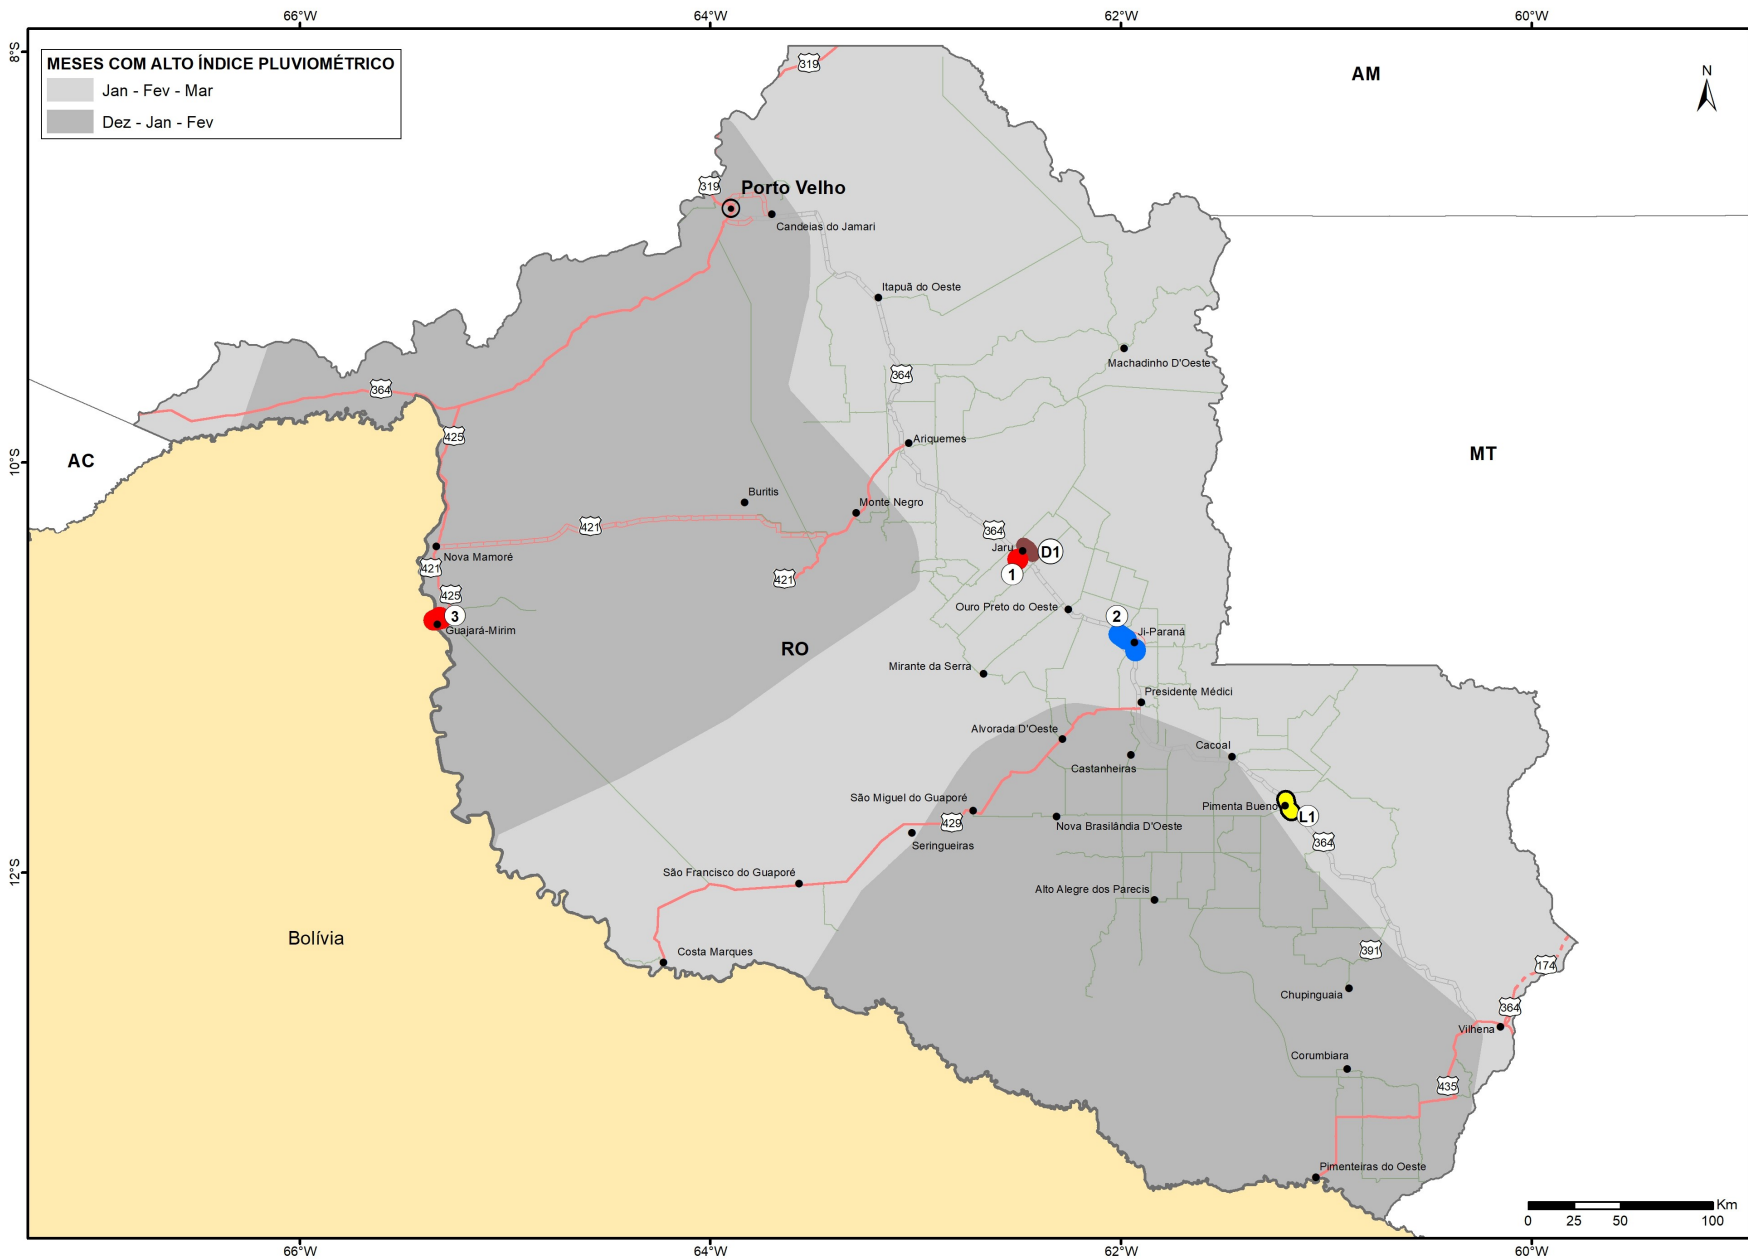

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL RONDÔNIA




Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	7,40 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	6,07 Km
OAE*	
A LICITAR	
Total	13,47 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+H+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2071	7XA3-7X03-7XM7	2-7	Unico	22 00794/2021	TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA	BR-364	423,30	423,52	0,22	Ponte sobre o rio Jaru	30/12/2021	29/01/2027	R\$ 29.378.573,37	94,25%	Ponte nova está praticamente concluída. Na ponte existente, encontram-se em execução os serviços relativos à superestrutura.	22 00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT
2	2072	7XM7-7P87	3-7	Unico	22 00902/2020	CONSORCIO CARAJAS-JI-PARANÁ (GONÇALVES / PLANEJE / VETOR)	BR-364	347,00	351,67	4,67	Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	31/12/2026	R\$ 64.492.300,73	68,59%	Seg 1 concluído. No Seg 2, estão em execução os serviços de sub-base e base, com início da construção da OAE do viaduto.	22 00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT
3	2072	7XM7-7P87	3-7	Unico	22 00902/2020	CONSORCIO CARAJAS-JI-PARANÁ (GONÇALVES / PLANEJE / VETOR)	BR-364	337,10	338,50	1,4	Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	31/12/2026	R\$ 64.492.300,73	68,59%	Seg 1 concluído. No Seg 2, estão em execução os serviços de sub-base e base, com início da construção da OAE do viaduto.	22 00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT
3	2940	7X26	3	Unico	00 00461/2025	CONSORCIO MAMORÉ (AGAPAR / ARTELESTE / ENESCOL)	BR-425	144,40	148,10	3,7	Ponte Internacional sobre rio Mamoré (Guajará-Mirim) e acessos	18/08/2025	28/01/2028	R\$ 446.379.662,90	1,16%	Contratação integrada em fase do projeto. Foi aprovado o Plano de Contagem de Tráfego.	22 00111/2025	CONSORCIO MAIA MELO - CAVA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
D1	2071	7XA3-7X03	2-3	TED-656/2020	EXERCITO BRASILEIRO - 9º BEC	BR-364	421,40	427,00	7,4	Implantação das ruas laterais na Travessia Urbana de Jaru.	10/02/2020	10/02/2026	R\$ 40.970.721,11		R\$ 0,00	R\$ 40.970.721,11	98,92%	Obra concluída. Aguardando aprovação da RFO para formalizar o termo de entrega e o recebimento do As Built.	22 00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1		7X03		BR-364	193,70 201,13	Melhoramentos e pavimentação nas marginais da travessia urbana de Pimenta Bueno	50622.000411/2026-01		Em fase de atos preparatórios na SR para Contratação Integrada.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+H+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
