


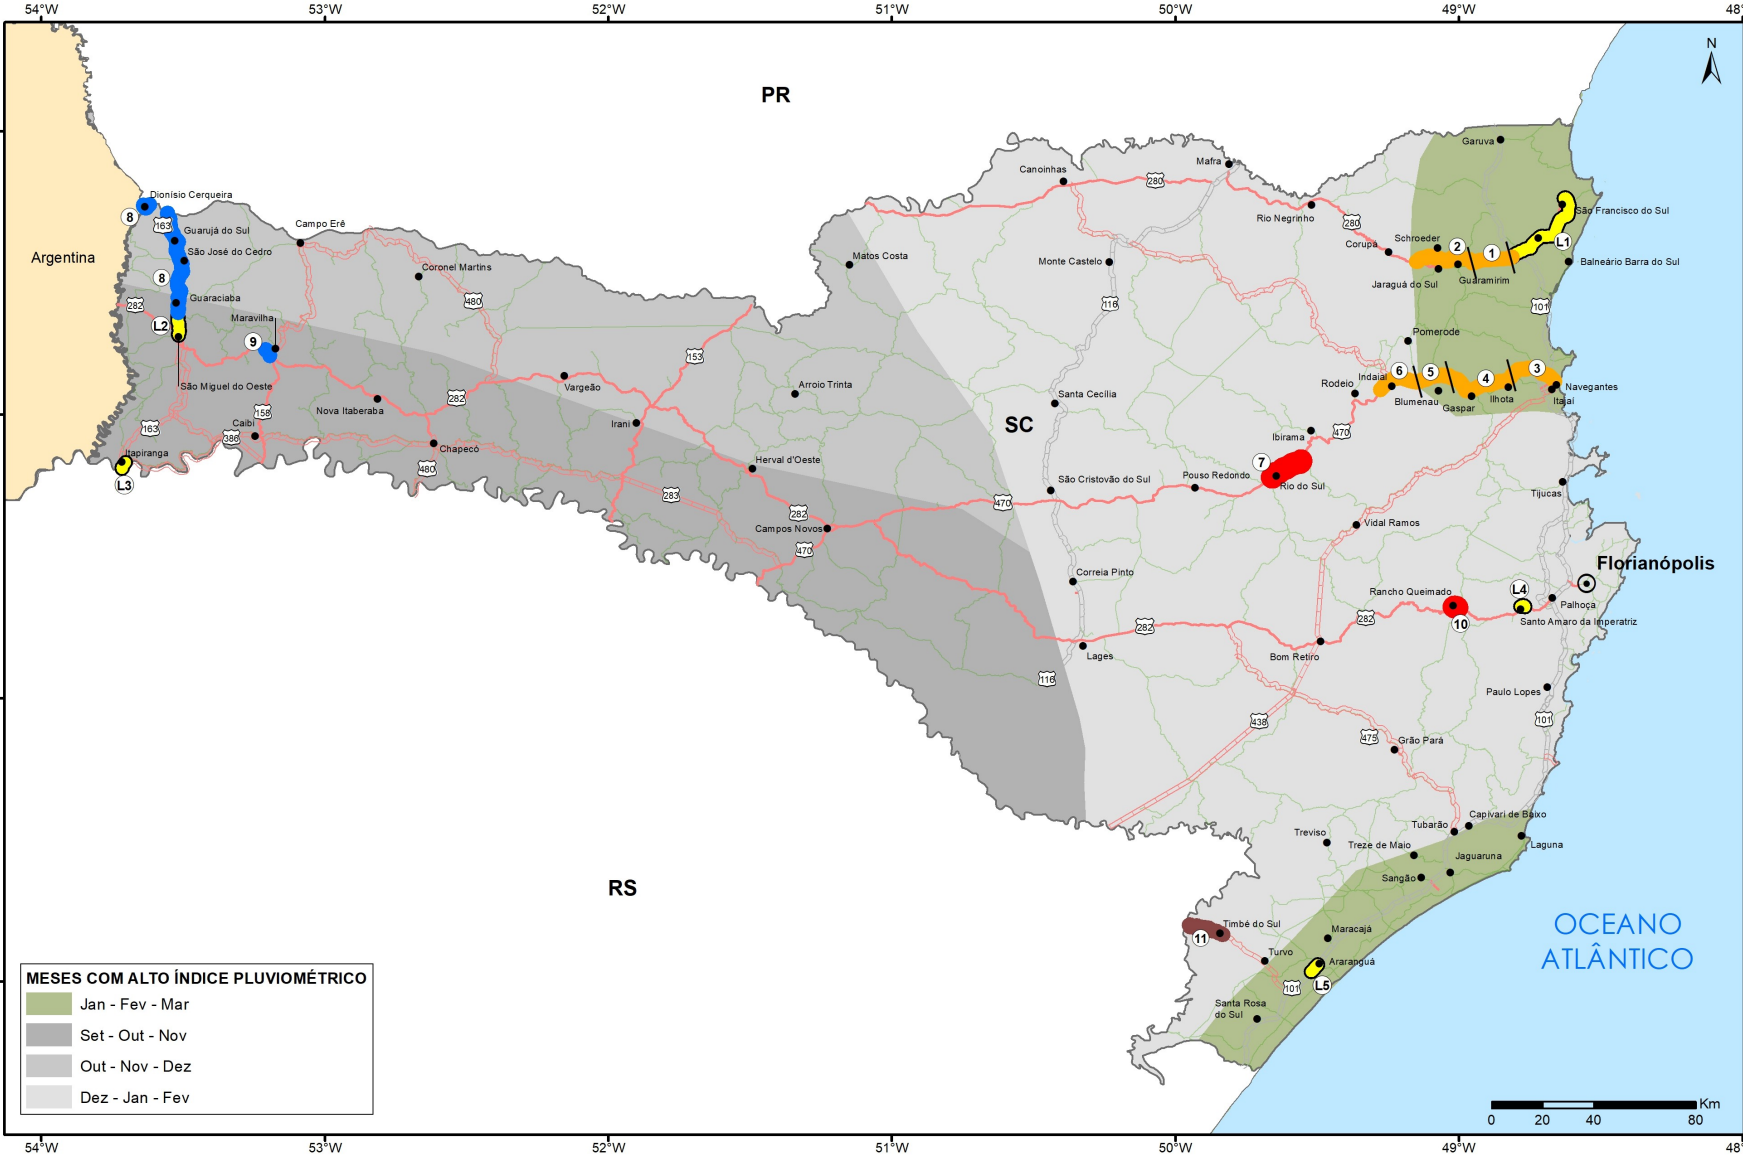

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL SANTA CATARINA

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	147,08 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	50,98 Km
IMPLANTAÇÃO	22,00 Km
OAE*	
ALICITAR	
Total	220,06 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2102	10JQ	2-3-7	2.1	16 00574/2013	SULCATA RINENSE-MINART/CI/MBR/CONS	BR-280	36,68	50,74	14,06	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2027	R\$ 281.612.334,09	83,3%	Obra em andamento. 4º RFFO entregue a superintendência. Reconhecimento de dívida em análise.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
2	2103	10JQ	2-3-7	2.2	16 00614/2013	CETENCO ENGENHARIA S/A	BR-280	50,74	74,58	23,84	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2027	R\$ 985.140.471,01	79,56%	Obra em andamento com foco na execução dos elevados. 3º RFFO em análise.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
3	2097	7530	2-3-7-8	1	16 01093/2013	CONSORCIO PLANATERRA-AZZA-SOGE	BR-470	0,00	18,61	18,61	Duplicação BR-470/SC	17/03/2014	28/09/2026	R\$ 414.507.774,80	95,08%	Obra em andamento, executando viaduto do km 4. Previsão de concluir a obra até Ago/26.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
4	2098	7530	2-3-7-8	2	16 00355/2014	CONSORCIO IVALI- SETEP	BR-470	18,61	44,87	26,26	Duplicação BR-470/SC	13/06/2014	16/09/2026	R\$ 528.670.647,76	99,46%	Obra em andamento. Previsão de conclusão 2026.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
5	2099	7530	2-3-7-8	3	16 00703/2013	SULCATA RINENSE-MINART/CI/MBR/CONS	BR-470	44,87	57,78	12,91	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	05/02/2027	R\$ 350.938.127,82	76,12%	Obra em andamento. 4º RFFO em análise pela supervisora. Previsão 5º RFFO em 2026 (restauração e ajustes de declividade).	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
6	2100	7530	2-3-7-8	4	16 00603/2013	SULCATA RINENSE-MINART/CI/MBR/CONS	BR-470	57,78	73,18	15,4	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	04/11/2027	R\$ 424.765.272,50	61,39%	Obra em andamento. 5º RFFO não está em condições de aceitação. Necessidade de remanejamento das redes de gás e elétrica.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
7	7530	2-3-7-8	Unico		16 00846/2025	PLANATERRA TERRA PL. PAVIMENTAÇÃO	BR-470	130,30	139,50	9,2	Viaduto Rio do Sul	05/02/2026	05/08/2028	R\$ 20.385.028,59	0%	Ordem de início emitida. Projetos em desenvolvimento.	A LICITAR	A LICITAR
8	2104	12KF	3-7	Unico	16 00192/2019	TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST.	BR-163	0,00	3,60	3,6	Ampliação de capacidade	08/06/2019	31/03/2027	R\$ 326.936.879,07	94,42%	2º RFFO aprovada (Viaduto de Guaraciaba). 3º RFFO solicitada (terraplanagem). 4º RFFO prevista para o acesso a Guarajá do Sul.	16 00180/2021	CONSORCIO MPB-UNICA
8	2104	12KF	3-7	Unico	16 00192/2019	TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST.	BR-163	78,62	122,60	43,98	Ampliação de capacidade	08/06/2019	31/03/2027	R\$ 326.936.879,07	94,42%	2º RFFO aprovada (Viaduto de Guaraciaba). 3º RFFO solicitada (terraplanagem). 4º RFFO prevista para o acesso a Guarajá do Sul.	16 00180/2021	CONSORCIO MPB-UNICA
9	2094	7XJ5	3-7	Unico	16 00674/2024	GAIA RODOVIAS LTDA	BR-282	604,30	607,70	3,4	Travessia urbana de Maravilha	10/08/2024	13/09/2026	R\$ 30.402.040,93	4,61%	Obra em andamento. Previsão de RFFO para tratar sobre solo saturado, reforço de subleito, muro de gabião e drenagem.	Edital 0309/25-16	Em licitação
10	2095	7XJ5	3-7	Unico	16 00734/2023	CONSORCIO VOGELSAINGER / ENGEDAL	BR-282	58,30	61,00	2,7	Viaduto em Rancho Queimado	01/02/2024	24/11/2026	R\$ 19.360.702,54	80,9%	Obra em andamento. RFFO em análise da SR/SC. Contrato prorrogado até Nov/26.	A LICITAR	A LICITAR
11	2105	7N85	2-3-7	Unico	16 00840/2013	CONSORCIO SETEP-IVALI-SOTEP	BR-285	33,80	55,80	22	Implantação da BR-285/SC	29/11/2013	23/10/2024	R\$ 180.108.045,12	98,15%	Obra concluída. Termo de recebimento provisório emitido.	16 00534/2014	IGUATEMI CONSULT. E SERVIÇOS

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2101	10JQ	2-3-7	1	BR-280	0,70 36,70	Duplicação BR-280/SC	50616.002894/2025-79	0156/26-16	Edital 0156/26-16 divulgado para contratação do remanescente do Lote 1A.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
L2	2104	12KF	3-7		BR-163	70,00 78,52	Adequação de trecho entre São Miguel do Oeste e Guaraciaba			Previsão de lançar edital em Ago/26.		
L3	2570	165A			BR-163	0,00 1,20	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai			Previsão de licitar obra em 2026.		
L4	2095	7XJ5	3-7		BR-282	27,00 27,00	Construção de OAE			Previsão de conclusão do projeto em 2026 e licitação apenas para 2027.		
L5	2093	7XW7	3		BR-101	2,70 6,70	Contorno em Araranguá			Projeto será doado pela prefeitura local. Previsão de licitar semi-integrada em Nov/26.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
