


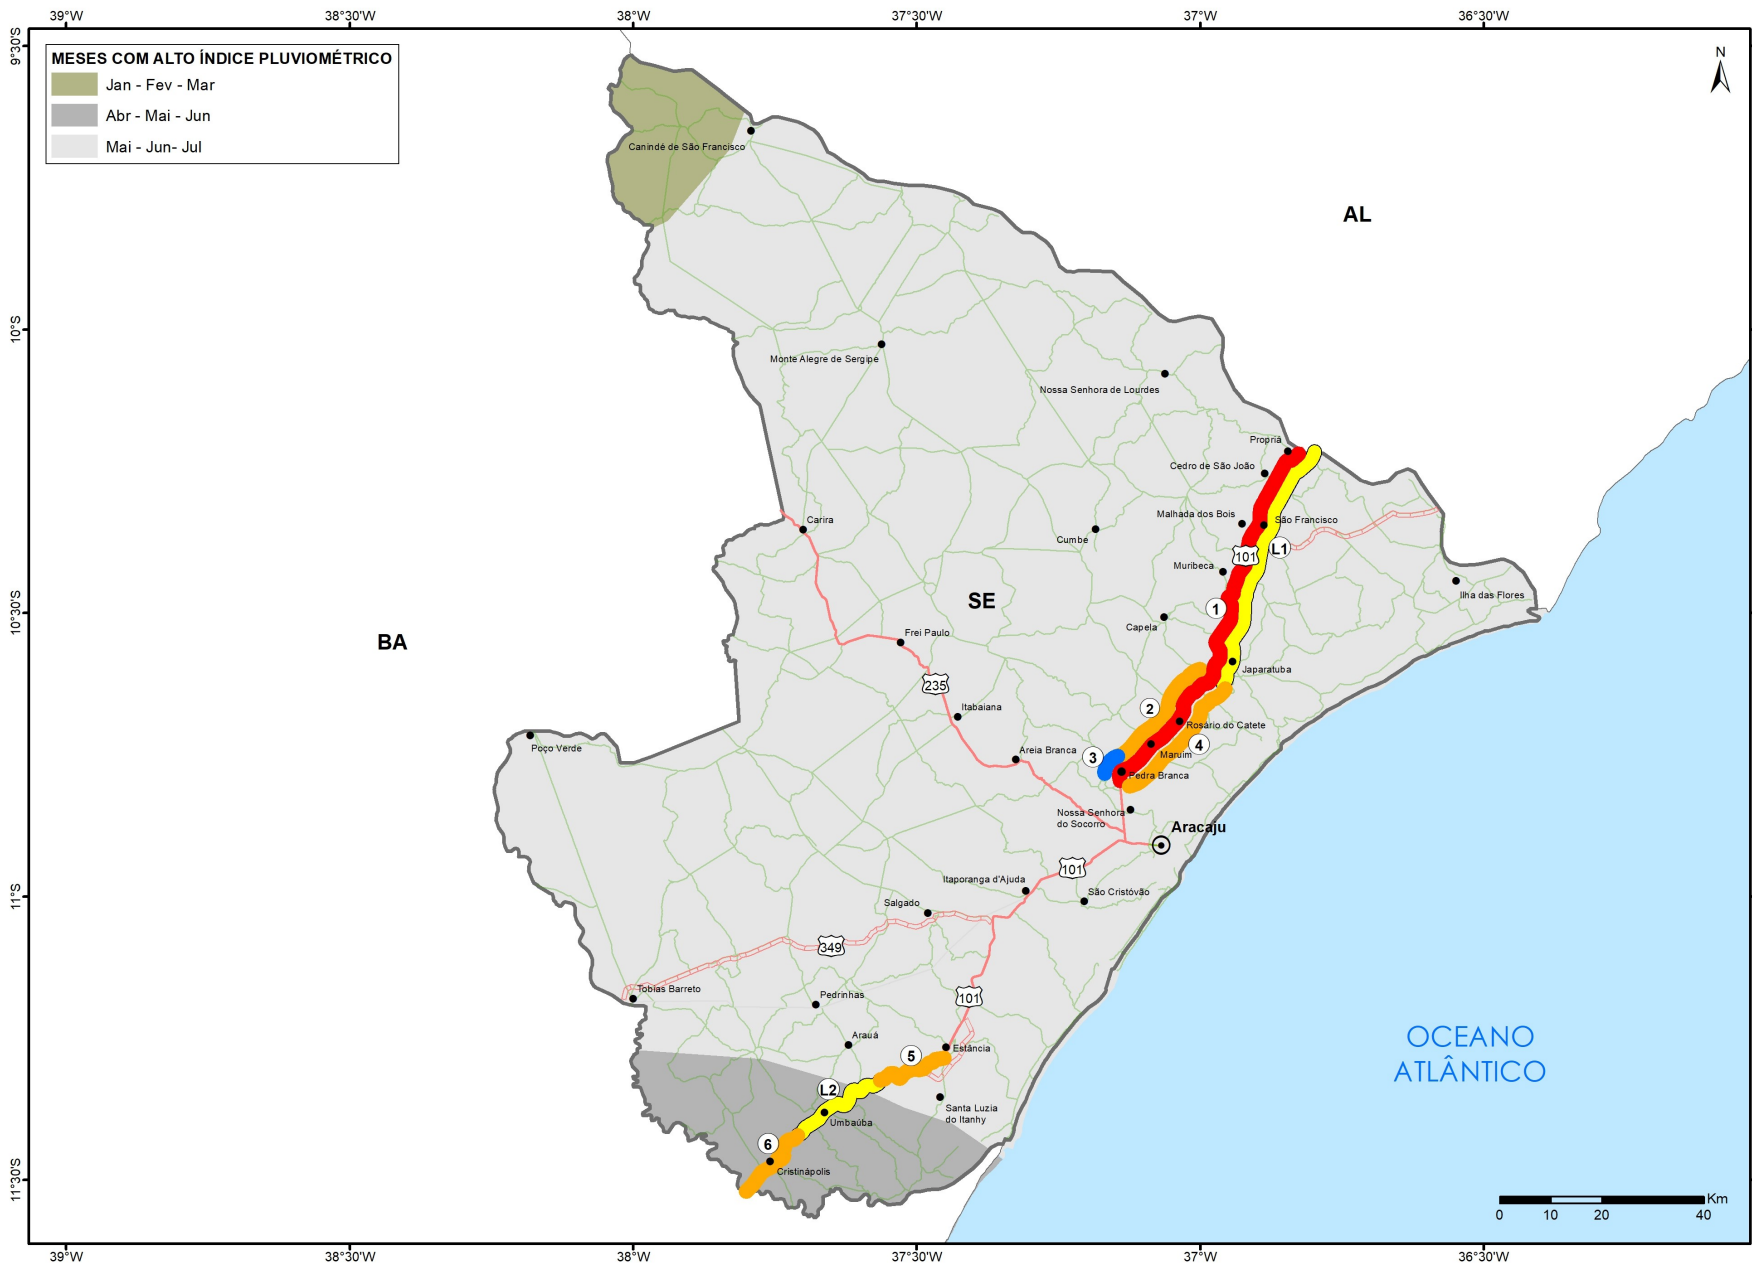

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL SERGIPE

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	1,30 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	67,00 Km
A LICITAR	
OAE*	
Total	68,30 Km

* Contrato envolvendo obras de OAEs ao longo do trecho da rodovia. Devido à quantidade de OAEs, o contrato encontra-se representado por um segmento formado pela localização da primeira e última OAEs.

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta																Obra a licitar															
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA											
1	3085	110Q	3	2.1	21 00512/2024	MATERIA ENGENHARIA LTDA	BR-101	1,20	77,30	0 Remanescente de OAEs e Passarelas	08/12/2024	28/05/2027	R\$ 23.823.422,62	30,58%	Execução de todas as passarelas inferiores e superiores em andamento.				21 00923/2024	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A											
2	3085	110Q	3	2.2	21 00409/2021	CONSTRUTORA LUIZ COSTA	BR-101	51,80	77,30	25,5 Remanescente da duplicação	23/08/2021	31/03/2027	R\$ 185.052.339,22	56,51%	Em execução novo pavimento rígido w hiletopping na pista principal e no acostamento, serviços de drenagem e contenções.				21 00923/2024	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A											
3	3085	110Q	3	Unico	21 00259/2025	CONSORCIO PEDRA BRANCA - HB20 - CLPT	BR-101	77,00	78,30	1,3 Remanescente da Travessia de Pedra Branca	06/06/2025	06/06/2027	R\$ 56.543.275,35	10,17%	Projetos aprovados com OS emitida para execução em obra em Dez/25.				Edital 0322/24-21	EM LICITAÇÃO											
4	3085	110Q	3	2.2	21 00620/2025	CONSORCIO BR-101/SE - HB20 - CLPT	BR-101	51,80	77,30	25,5 Complementação das obras de dupl.Trecho Norte - Pedra Branca	26/12/2025	16/09/2027	R\$ 97.000.000,00	4,73%	Serviços de terraplenagem, regularização do sub-leito, execução da base do pavimento flexível e drenagem. Início da execução das Pts.				21 00923/2024	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A											
5	2106	110R	3	5.1	00 00798/2025	CONSORCIO PP/ CONSERVA	BR-101	152,60	168,60	16 Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.1	29/01/2026	03/02/2030	R\$ 204.580.859,22	0%	Contrato 798/2025 assinado e com emissão de Ordem de Serviço de projeto em Fev/26.				Edital 0477/24-21	EM LICITAÇÃO											
6	2106	110R	3	5.3	21 00087/2026	CONSORCIO IVA-NG-SOTIPA	BR-101	189,00	206,10	19,1 Duplicação e implantação de variantes na BR-101/SE - Lote 5.3	27/03/2026	27/03/2030	R\$ 294.695.458,99	0%	Contrato assinado com emissão de OS em Mar/26.				Edital 0477/24-21	Em licitação											
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO			PROCESSO DA LICITAÇÃO			EDITAL			SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA										
L1	110Q	Unico	BR-101	0,00	51,80	Remanescente da Adequação da BR-101 - Divisa AL/SE - Entr. SE-226 (A)				50621.001005/2025-87			0500/2025-21			Projetos em elaboração com previsão de conclusão em Jun/26				Edital 0477/24-21	Em licitação										
L2	2106	110R	3	5.2	BR-101	168,60	189,00	Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.2									Edital 500/25-21 de contratação publicado e resultado homologado. Com previsão de assinatura de contrato em Jun/26.														

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
