




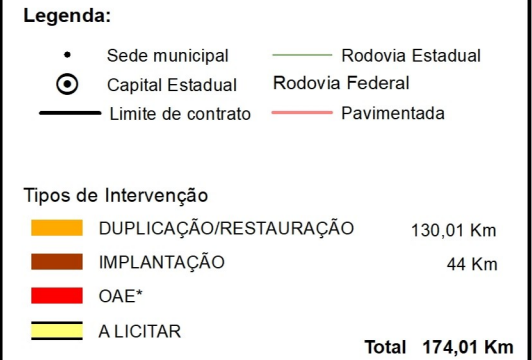

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

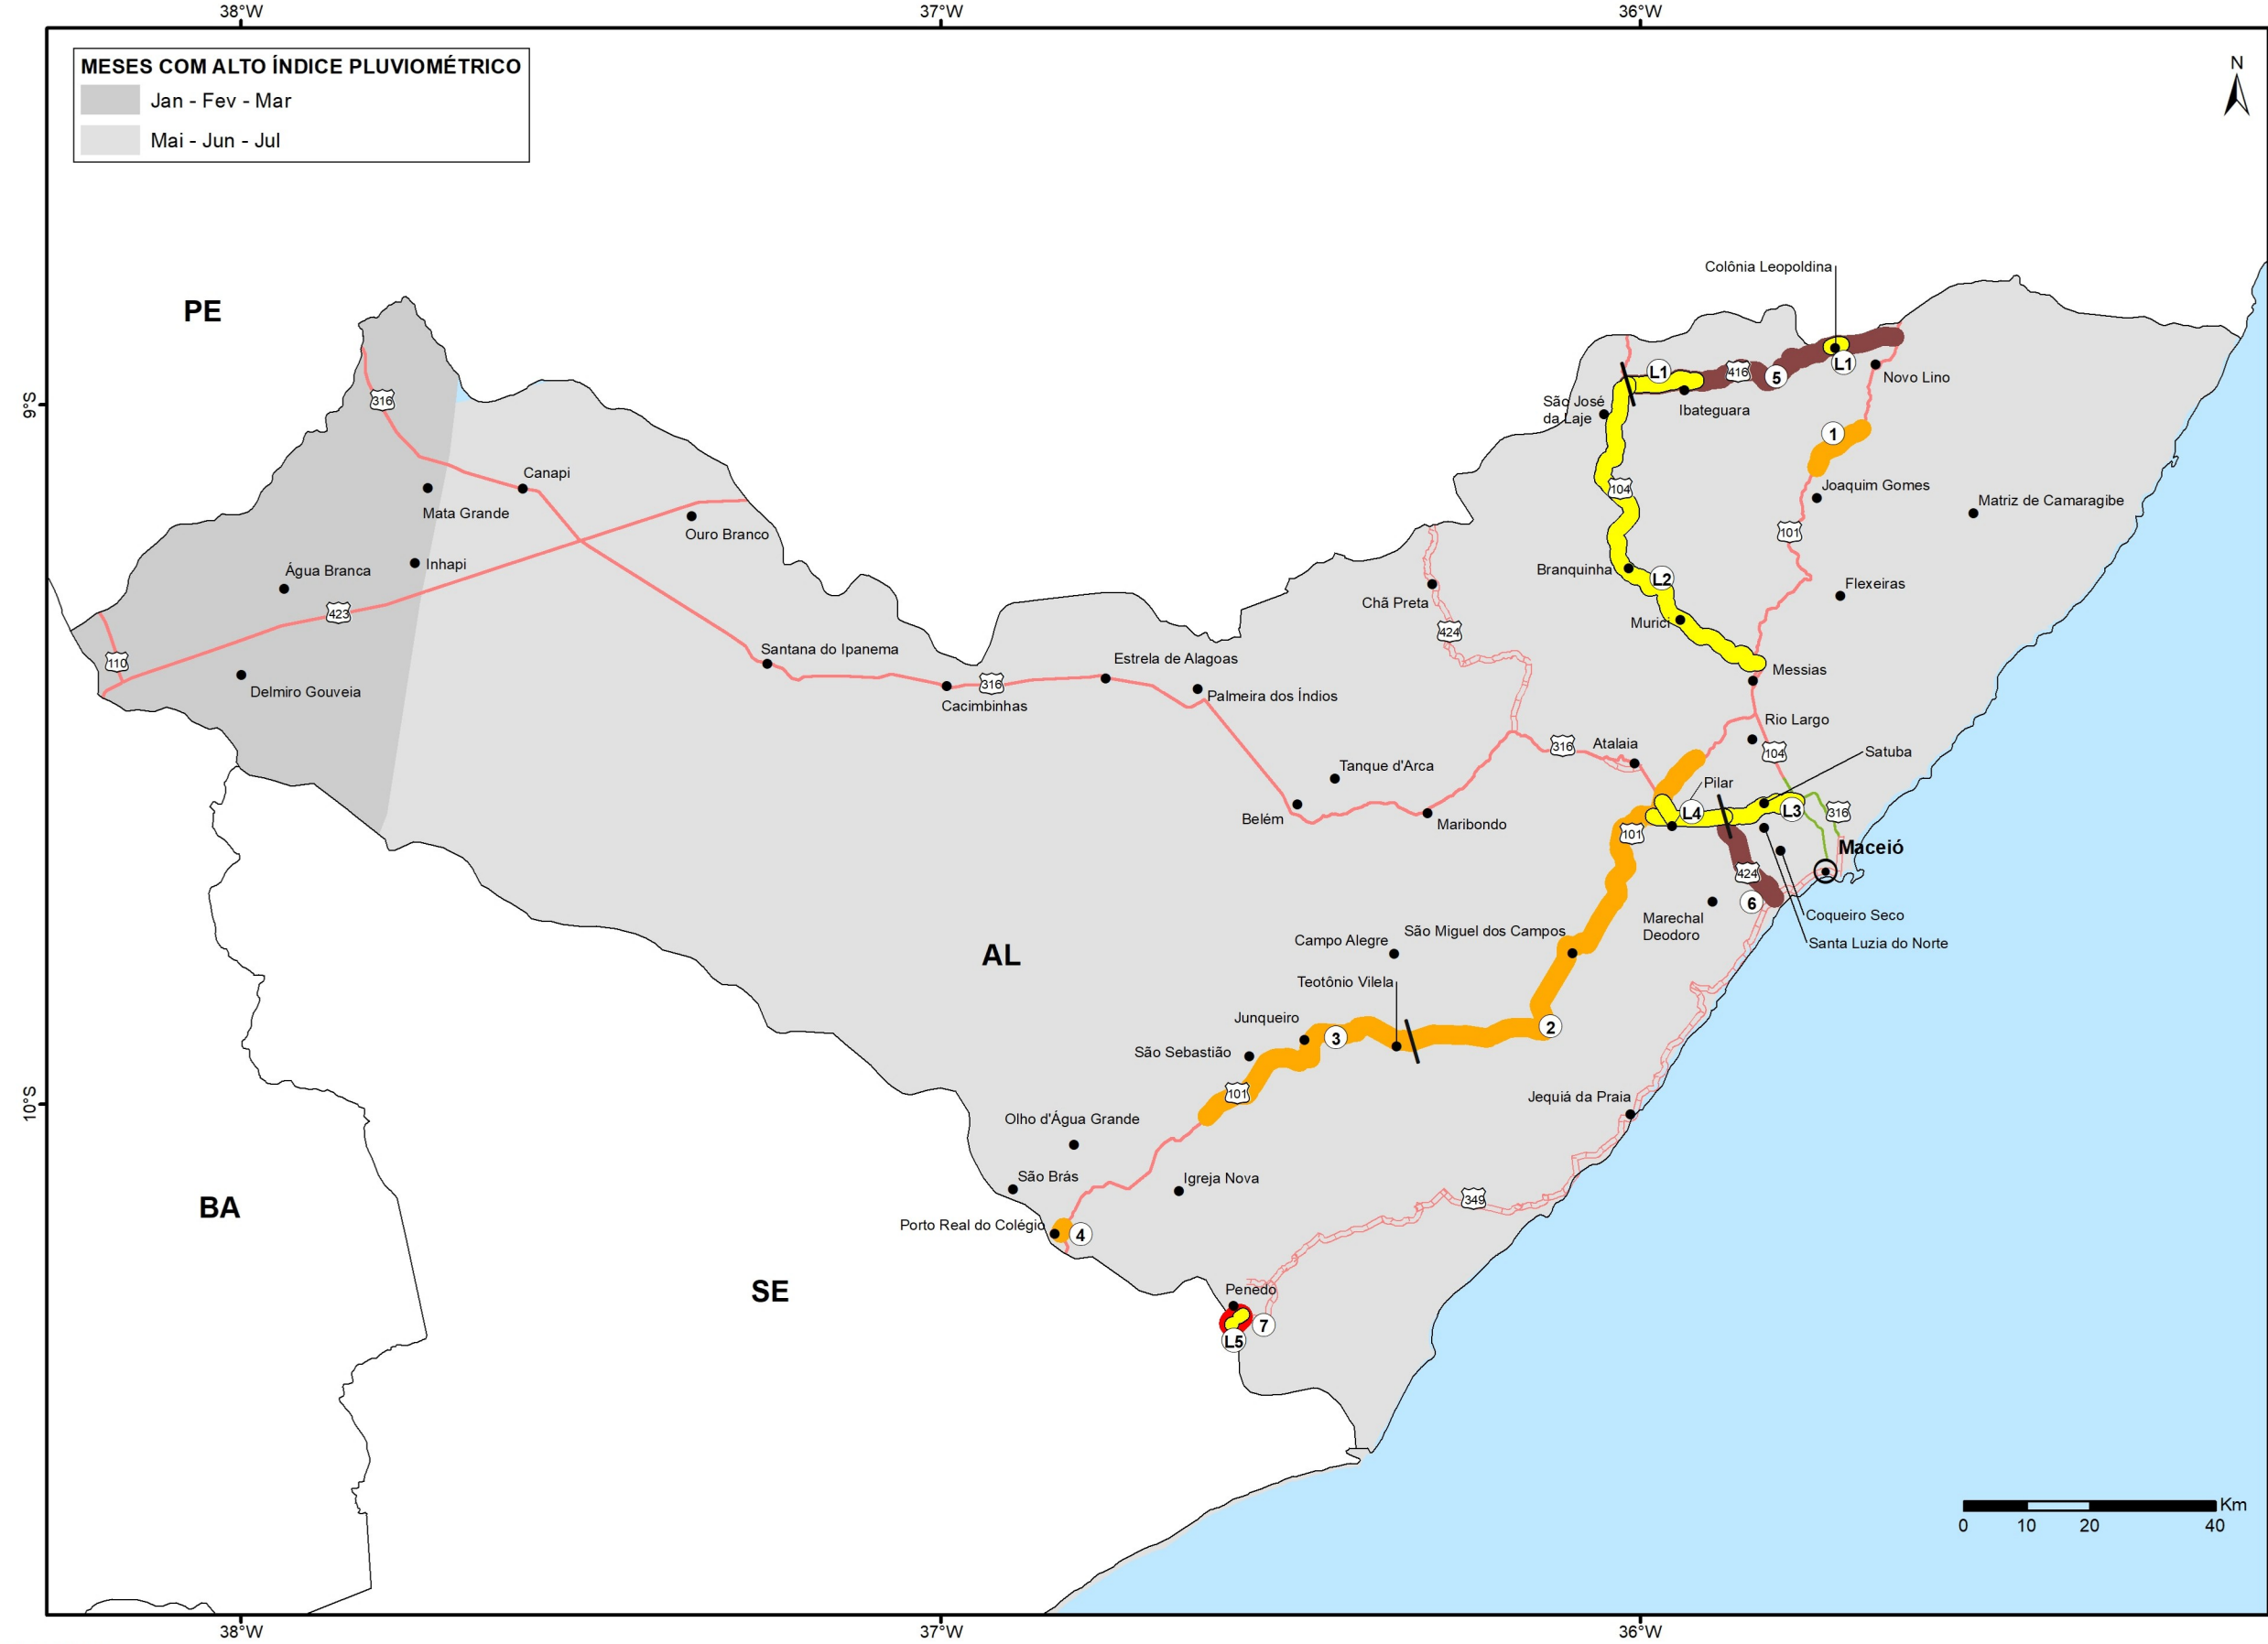

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

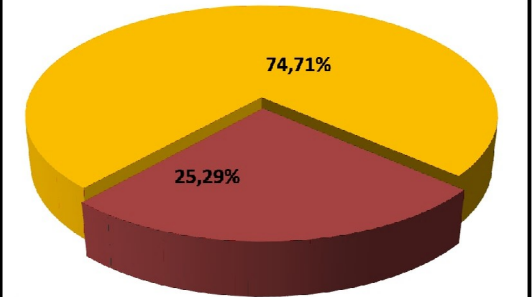

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. C	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	3003	7624	2-3	2	00 00608/2024	CONSORCIO JA RDIM/AL CONSERVA/ FP	BR-101	20,60	30,50	9,9	Remanescente do Lote 2	21/10/2024	23/04/2027	R\$ 113.417.492,76	0,28%	Ordem de inicio para trechos com projetos aprovados. Previsto aprovar todos os projetos durante o inverno e atacar toda a obra a partir de ago/2025.	00 00829/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA
2	1986	7624	2-3	4/5	00 00083/2017	CONSORCIO BR-101/AL	BR-101	92,21	170,32	78,11	Duplicação e restauração com melhoramentos	10/03/2017	31/01/2026	R\$ 612.401.010,10	87,3%	Previsto entregar a travessia de São Miguel dos Campos em dez./2025. Há interferência com posteameto e desapropriação a serem resolvidas.	20 00101/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
3	2586	7624	2-3	6	00 00636/2024	CONSORCIO ALA GOAS BR-101/AL	BR-101	170,32	212,32	42	Remanescente do Lote 6	25/10/2024	30/04/2027	R\$ 97.670.920,83	0%	Ordem de inicio parcial emitida 5 km do trecho.	00 00829/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA
4	3005	7624	2-3	7	20 00563/2023	CONSORCIO FP-LP-ENGMA-T	BR-101	244,14	245,36	1,22	Remanescente de duplicação do lote 7	03/10/2023	31/10/2025	R\$ 28.858.537,81	71,88%	OA E finalizada. Pendente pagamento do saldo contratual e aprovação da RPFO para encerrar o contrato.	20 00170/2023	CONSORCIO JDS - TRAFECOM
5	1987	7U07	2-3	Único	20 00866/2019	CONSORCIO SVC/PAV/ISERVICE	BR-416	7,60	57,00	27,4	Conclusão de remanescentes de pavimentação	01/01/2020	20/07/2025	R\$ 121.688.865,44	58,48%	Obra em andamento nos segmentos 1 e 3. RPFO aprovada pela SR.	20 00308/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA/ZA GO-AL
6	2590	161N	3	2	00 00676/2024	CONSORCIO ALA GOAS BR-424/AL - LOTE 2	BR-424	92,00	108,20	16,6	Arco Metropolitano de Maceió na BR-424	18/11/2024	06/05/2027	R\$ 252.788.540,45	0%	Contrato assinado. Construtora em processo de adequação do cronograma. TCU solicitou adequação do orçamento original para incorporar alteração na matriz de risco.	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU_AL
7	7XZ5	2-3-7	Único	00 00057/2024	CONSORCIO PENEDO / NEOPOLIS	BR-349	135,10	136,30	1,2	Ponte sobre o rio São Francisco (Penedo-Neópolis)	16/02/2024	29/07/2027	R\$ 205.867.963,66	3,95%	Ordem de inicio parcial para começar a execução da fundação.	00 00952/2024	CONSORCIO MODERA - CONCREMAT - SCB - LPV	

Obras a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	1987	7U07	2-3	BR-416		Remanescente dos Segmentos 2 e 4			Previsão de licitação do remanescente referente a execução dos segmento 2 e 4 em set./2025		
L2	2589			BR-104	8,90 74,00	A adequação com Duplicação Messias - São José das Lajes			Previsão de aprovar os projetos na DPP até out./2025. Previsão de publicação de edital para contratação de obra em dez./25.		
L3	2590	161N	3	BR-316	262,80 276,10	Arco Metropolitano de Maceió na BR-316			O lote 1 previsto pra licitar em 2026.	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU_AL
L4	2590	161N	3	BR-316	0,00 2,90	Arco Metropolitano de Maceió na BR-316 - Acesso			Projetos aprovados. Em fase interna de licitação	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU_AL
L5	2590	161N	3	BR-316	251,40 262,80	Arco Metropolitano de Maceió na BR-316			Projetos aprovados. Em fase interna de licitação	20 00074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU_AL
L5		7XZ5	2-3-	BR-349	0,00 13,20	Acesso a Ponte de Penedo-Neópolis sobre o Rio São Francisco			Projeto executivo do acessos sendo conduzidos pela DPP, previsão de licitação de obra em dez./2025.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
