


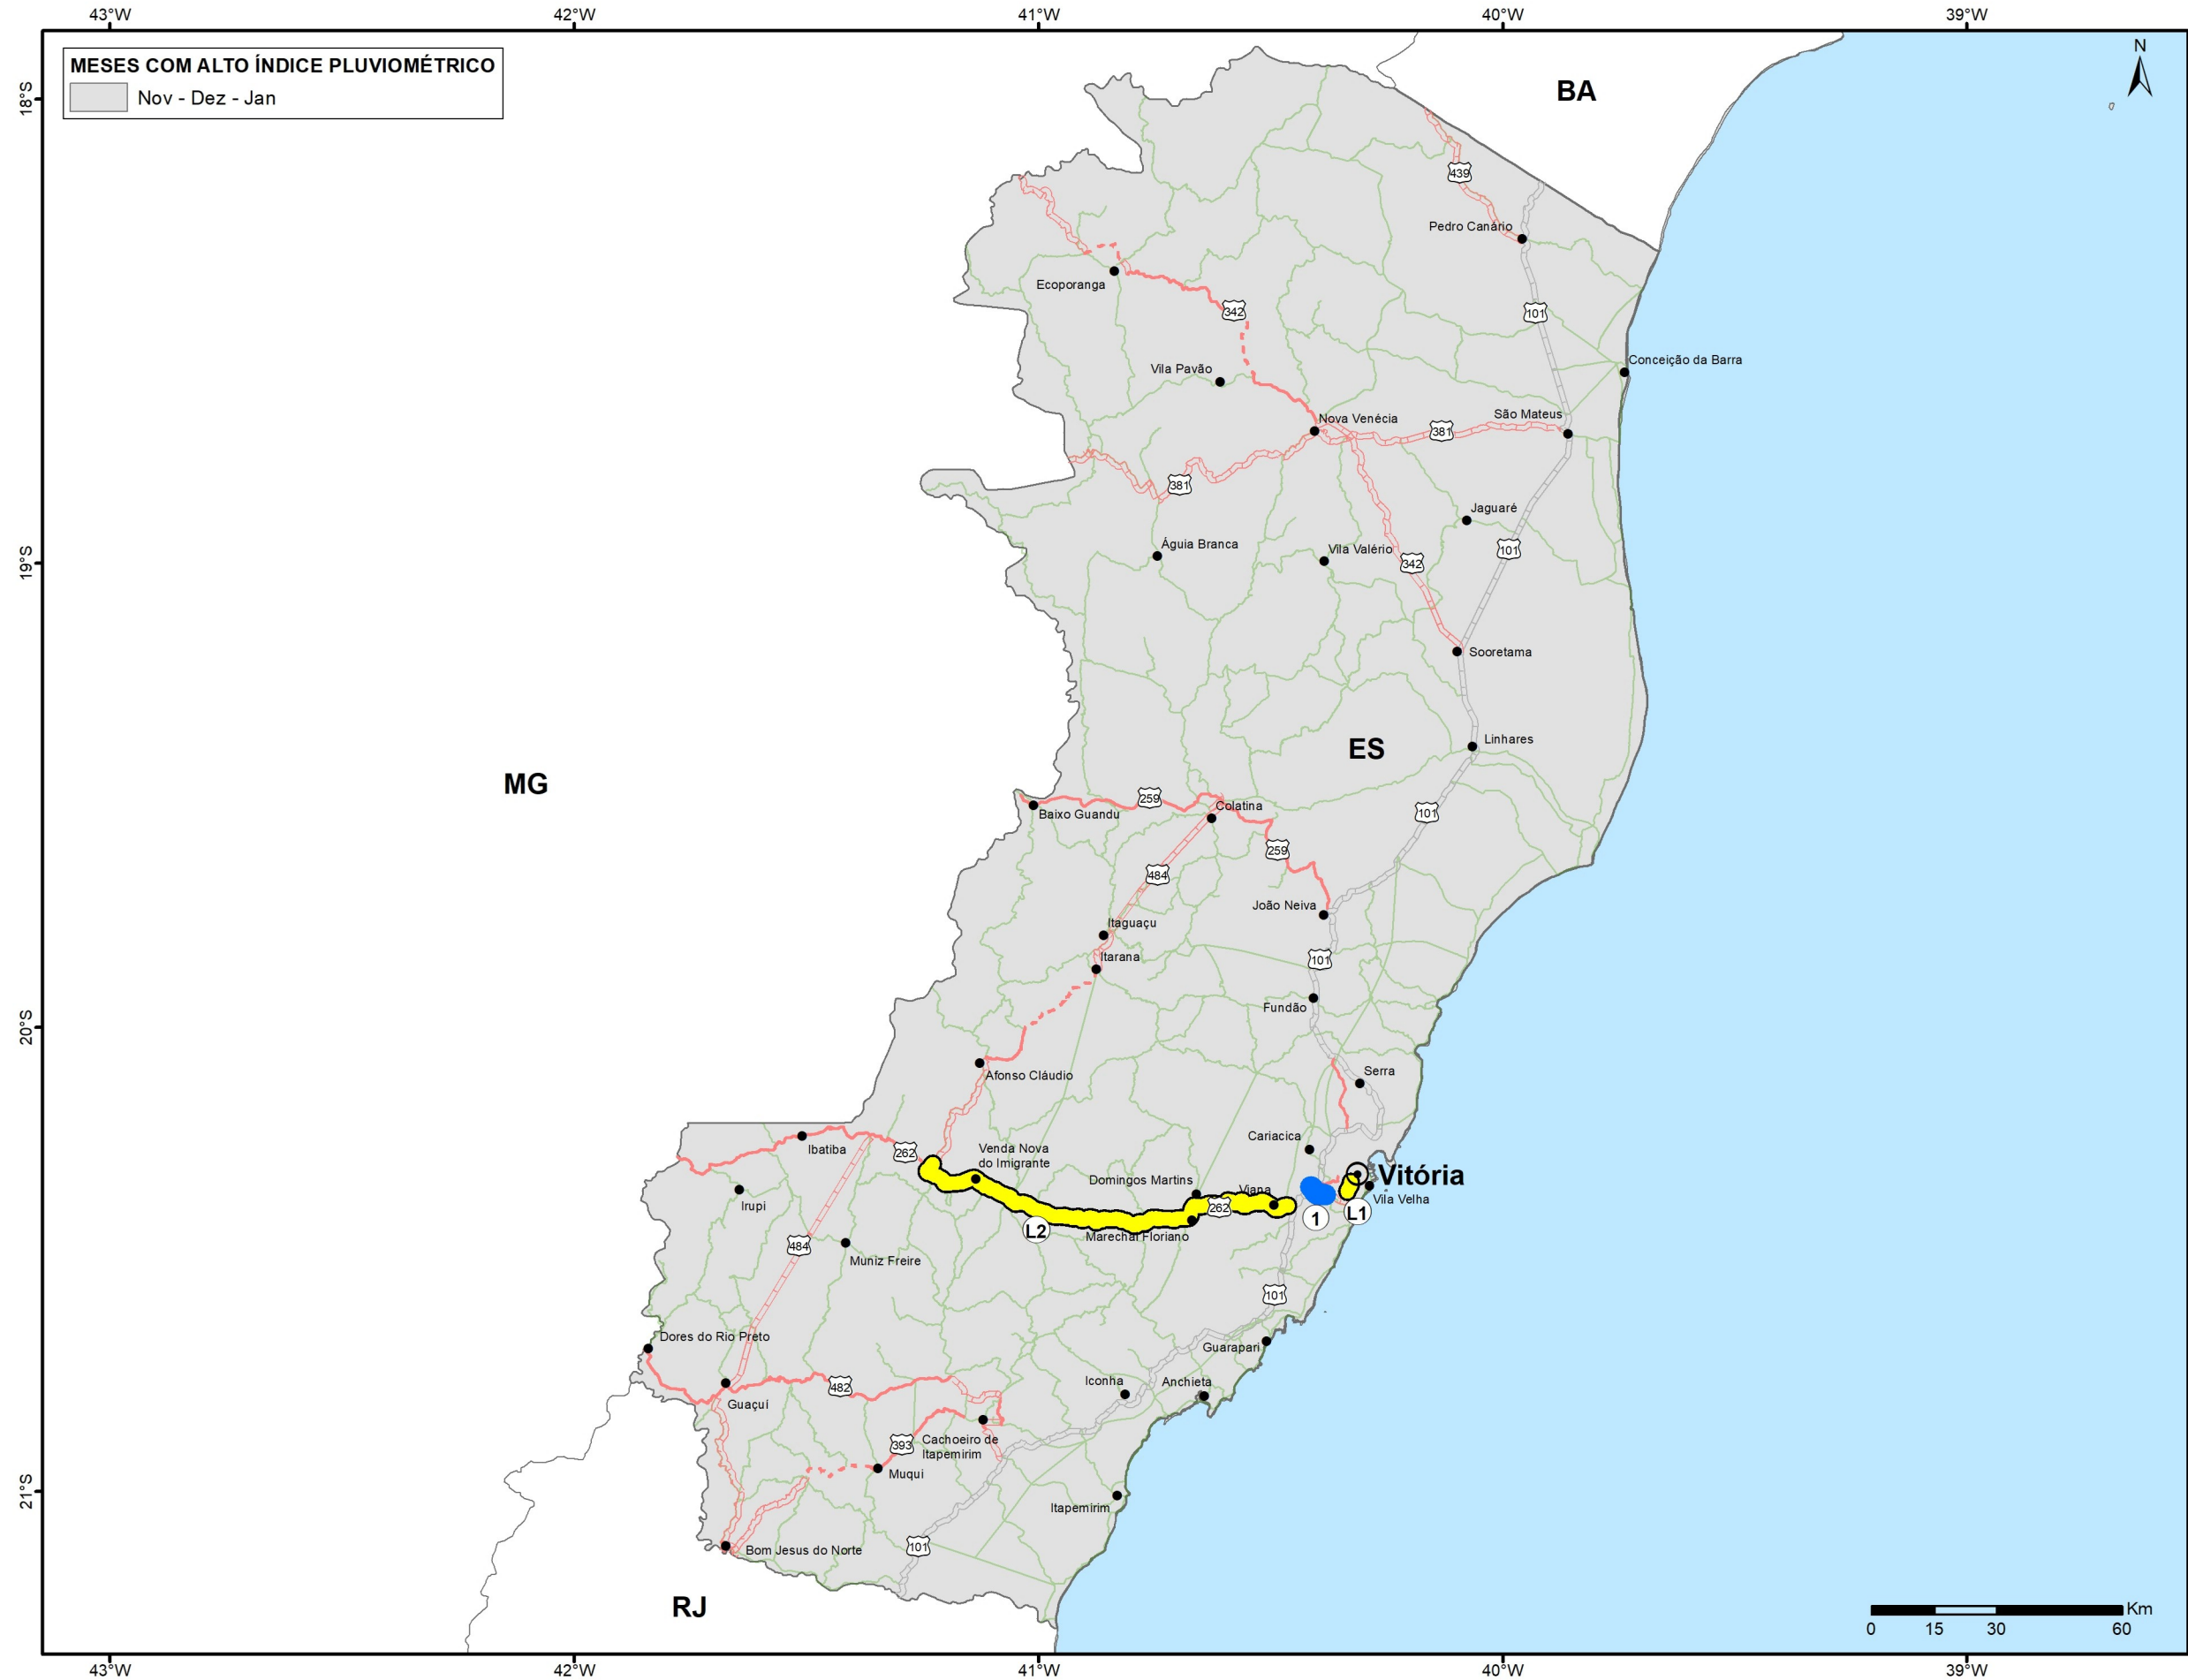

Obra Direta																				
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. %	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)			SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2010	7U06	2-3-	Unico	00 01061/2014	CONSORCIO CONTRACTOR - IGUATEMI	BR-447	0,00	4,33	4,33	Acesso Capuaba	02/01/2015	31/05/2026	R\$ 235.844.715,35	71,11%	Obra em andamento com serviços de terraplenagem, pavimentação, OAEs e drenagem. Há pendências de desapropriação e remanejamento de postes.			17 00261/2022	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.

Obra a Licitar																		
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)			SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA				
L1		7U06	2-3-7	BR-447	13,90	16,30	Prev obra Vias elevadas da BR-447		Previsão de licitar supervisão em Set/25 e Contratação Integrada em Nov/25.			A LICITAR		A LICITAR				
L2	2553	163H	3	BR-262	0,00	120,00	Adequação/restauração		Previsão de licitar supervisão em Set/25 e Contratação Integrada em Nov/25.			A LICITAR		A LICITAR				

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
