


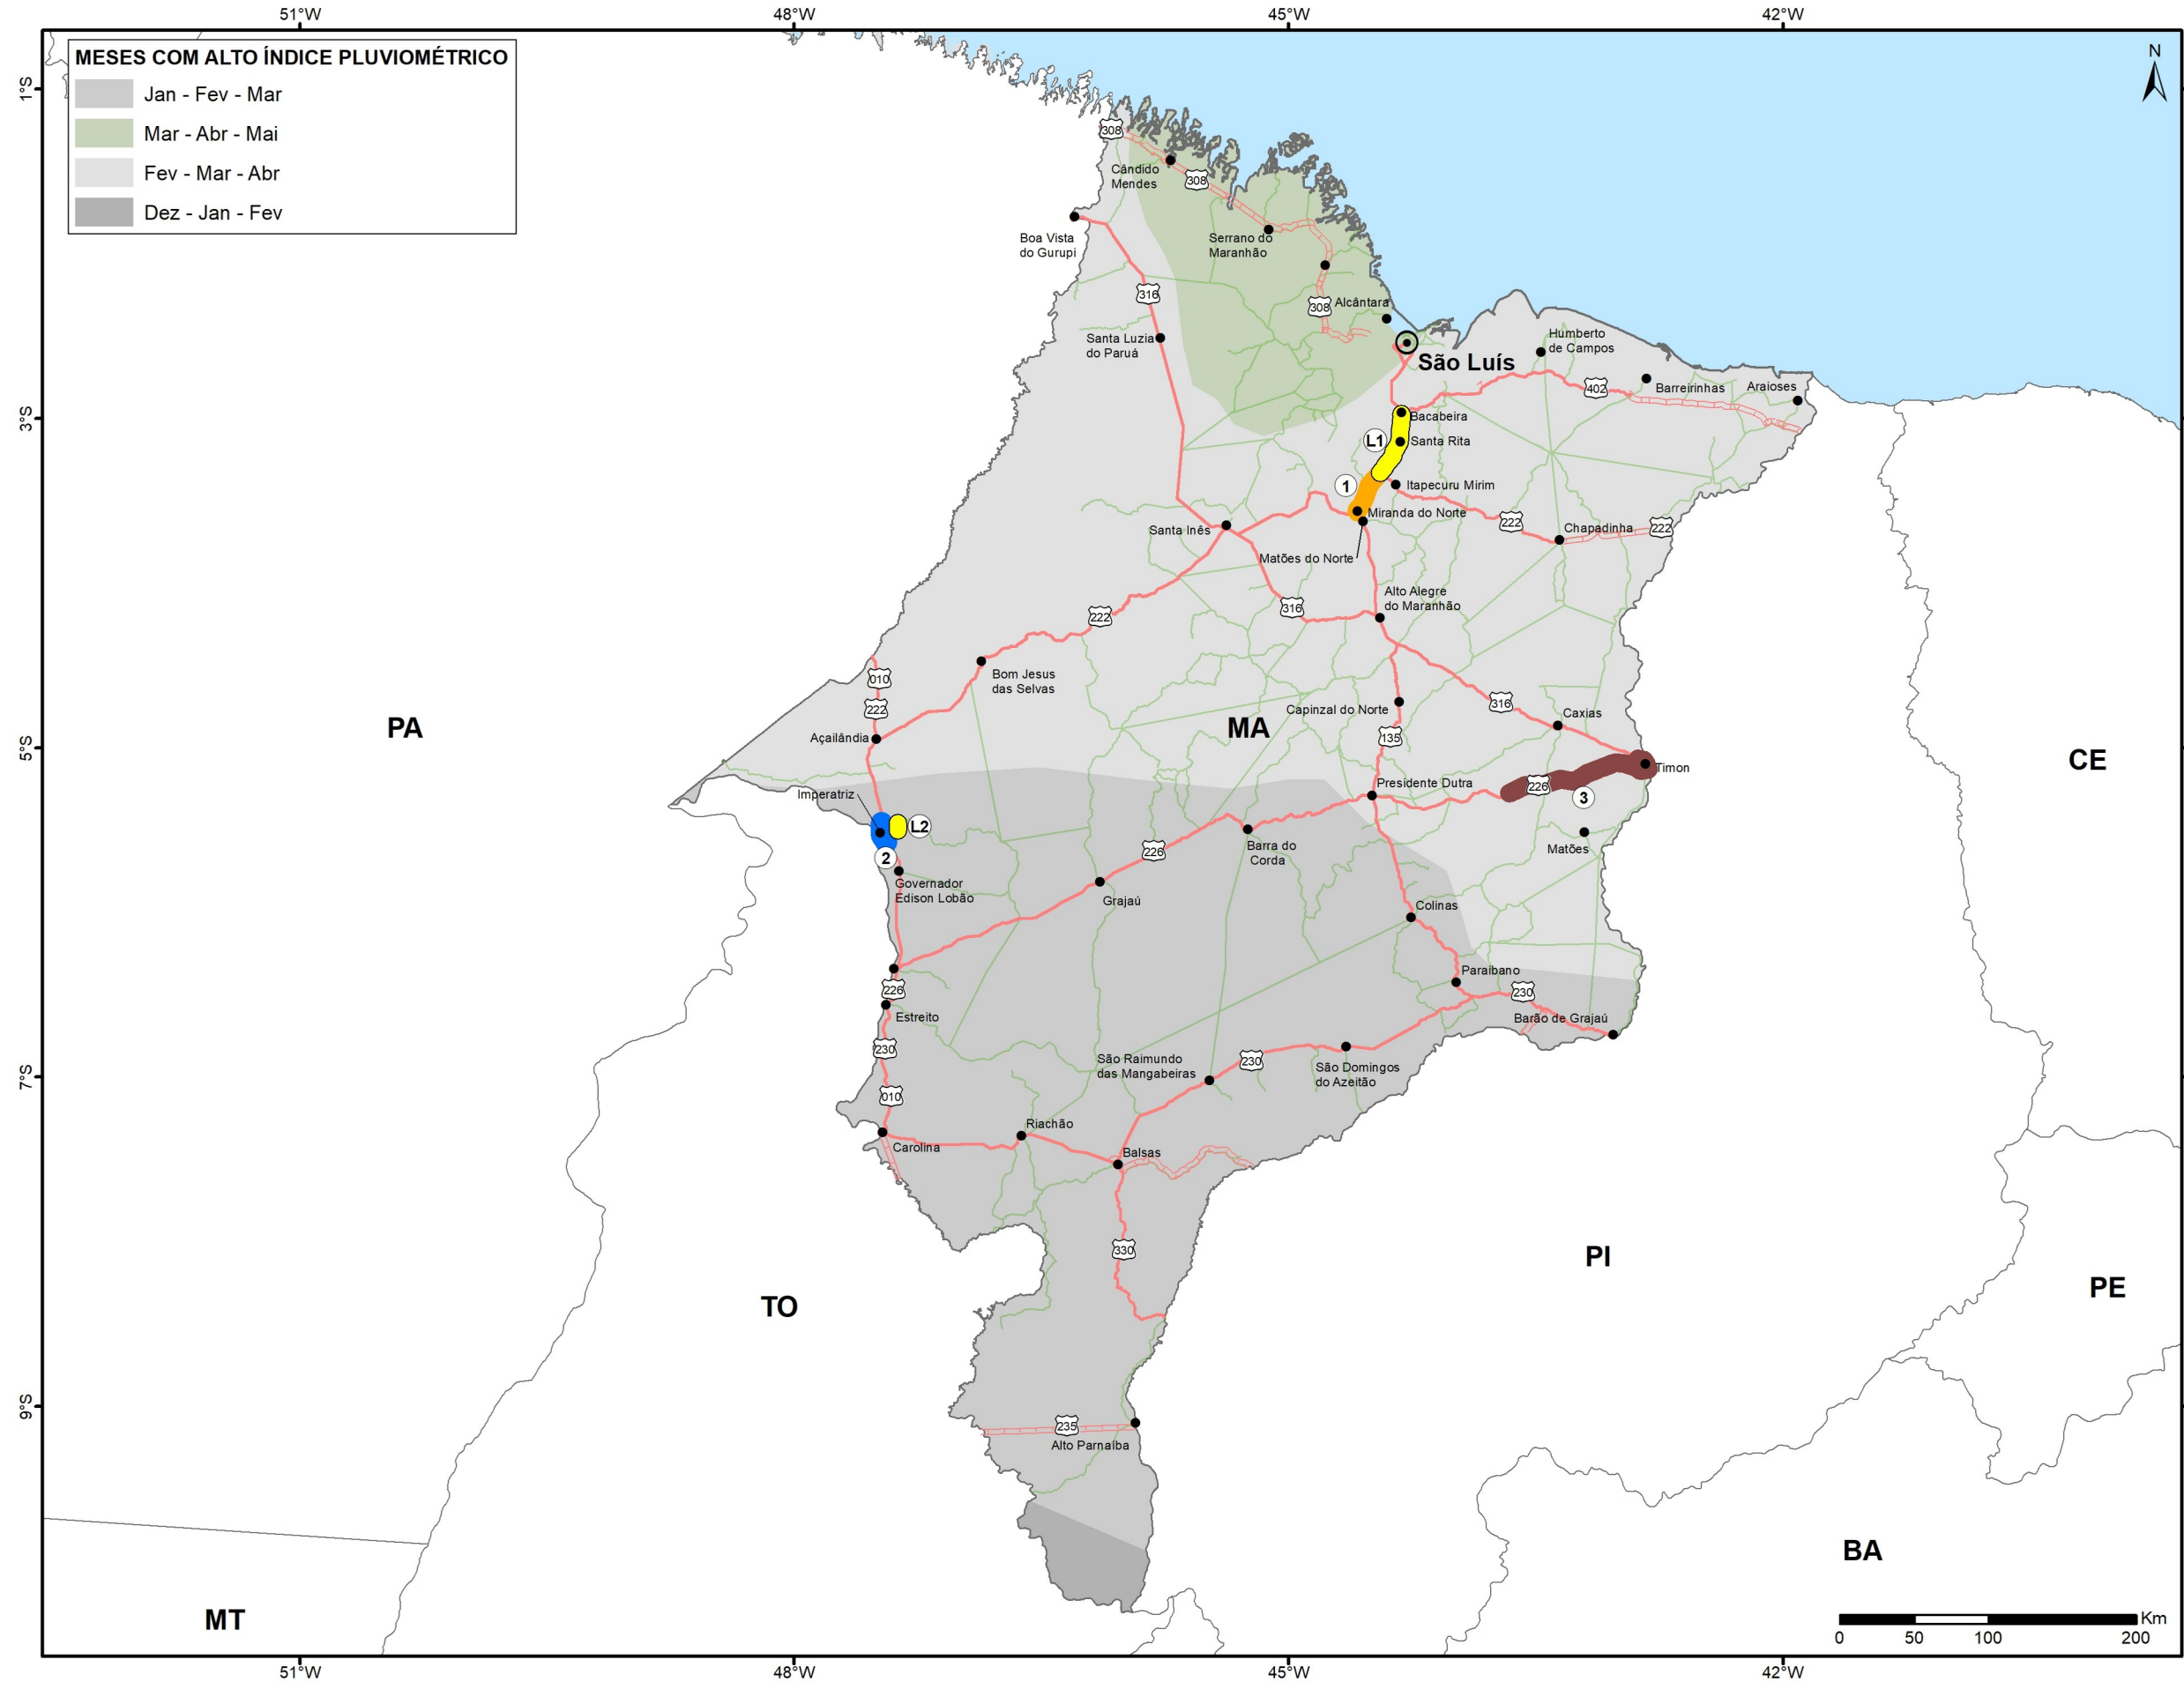


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	32,15 Km
IMPLANTAÇÃO	111,50 Km
ADEQUAÇÃO	14,40 Km
A LICITAR	
Total	158,05 Km

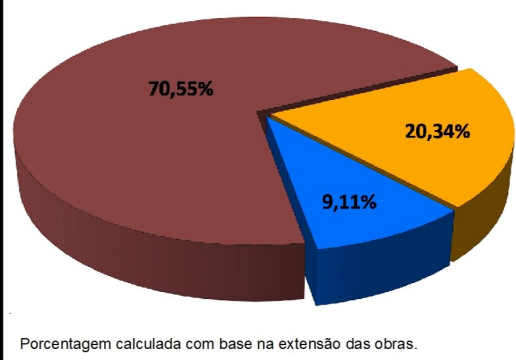

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta															SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*						
1	2022	7W84	2-3-7	3	15 00627/2023	CONSORCIO BR-135/MA (LCM / OTIMA)	BR-135	95,00 127,30	32,15	Duplicação da BR-135/MA	12/12/2023	12/10/2026	R\$ 143.924.061,42	16,61%	Previsão de entrega de 17 Km em 2025, incluindo marginais. RPFO em análise pela SR relativo a mudança de traçado próximo a PAF.				15 00626/2023	GEOSISTEMA S ENG. E PLANEJAMENTO LTDA
2	2019	13X5	2-3-7	Único	15 00441/2014	EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	BR-010	246,40 260,80	14,4	Travessia Urbana de Imperatriz	16/09/2014	31/12/2024	R\$ 280.263.283,33	60,32%	4,5 km entregues. Vigência expirada. Será contratado remanescente.				15 00537/2022	FROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
3	2020	7XJ9-7V00	3-7	Único	15 00039/2023	CONSORCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-316	609,40 620,90	11,5	Contorno de Timon	03/04/2023	22/04/2025	R\$ 177.106.638,16	87,8%	Entrega da obra dependendo da aprovação da RPFO. Conclusão prevista para set/25				15 00459/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA - ZAGO
3	2020	7XJ9-7V00	3-7	Único	15 00039/2023	CONSORCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-226	0,00 100,00	100	Implantação da BR-226/MA	03/04/2023	22/04/2025	R\$ 177.106.638,16	87,8%	Entrega da obra dependendo da aprovação da RPFO. Conclusão prevista para set/25				15 00459/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA - ZAGO

Obra a licitar										SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL							
L1	2021	7W84		BR-135	51,30 95,60	Remanescente Lote 2			Supervisora fazendo o levantamento do remanescente. Gerenciadora trabalhando na execução dos estudos ambientais. Previsão licitação em 2026						
L2	2019	13X5	2-3-7	BR-010	250,90 260,80	Remanescente da travessia urbana de Imperatriz			Previsão de licitação em jun./25 já com projeto executivo.					15 00537/2022	FROSUL - PROJ SUPER. PLANEJ.

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
