


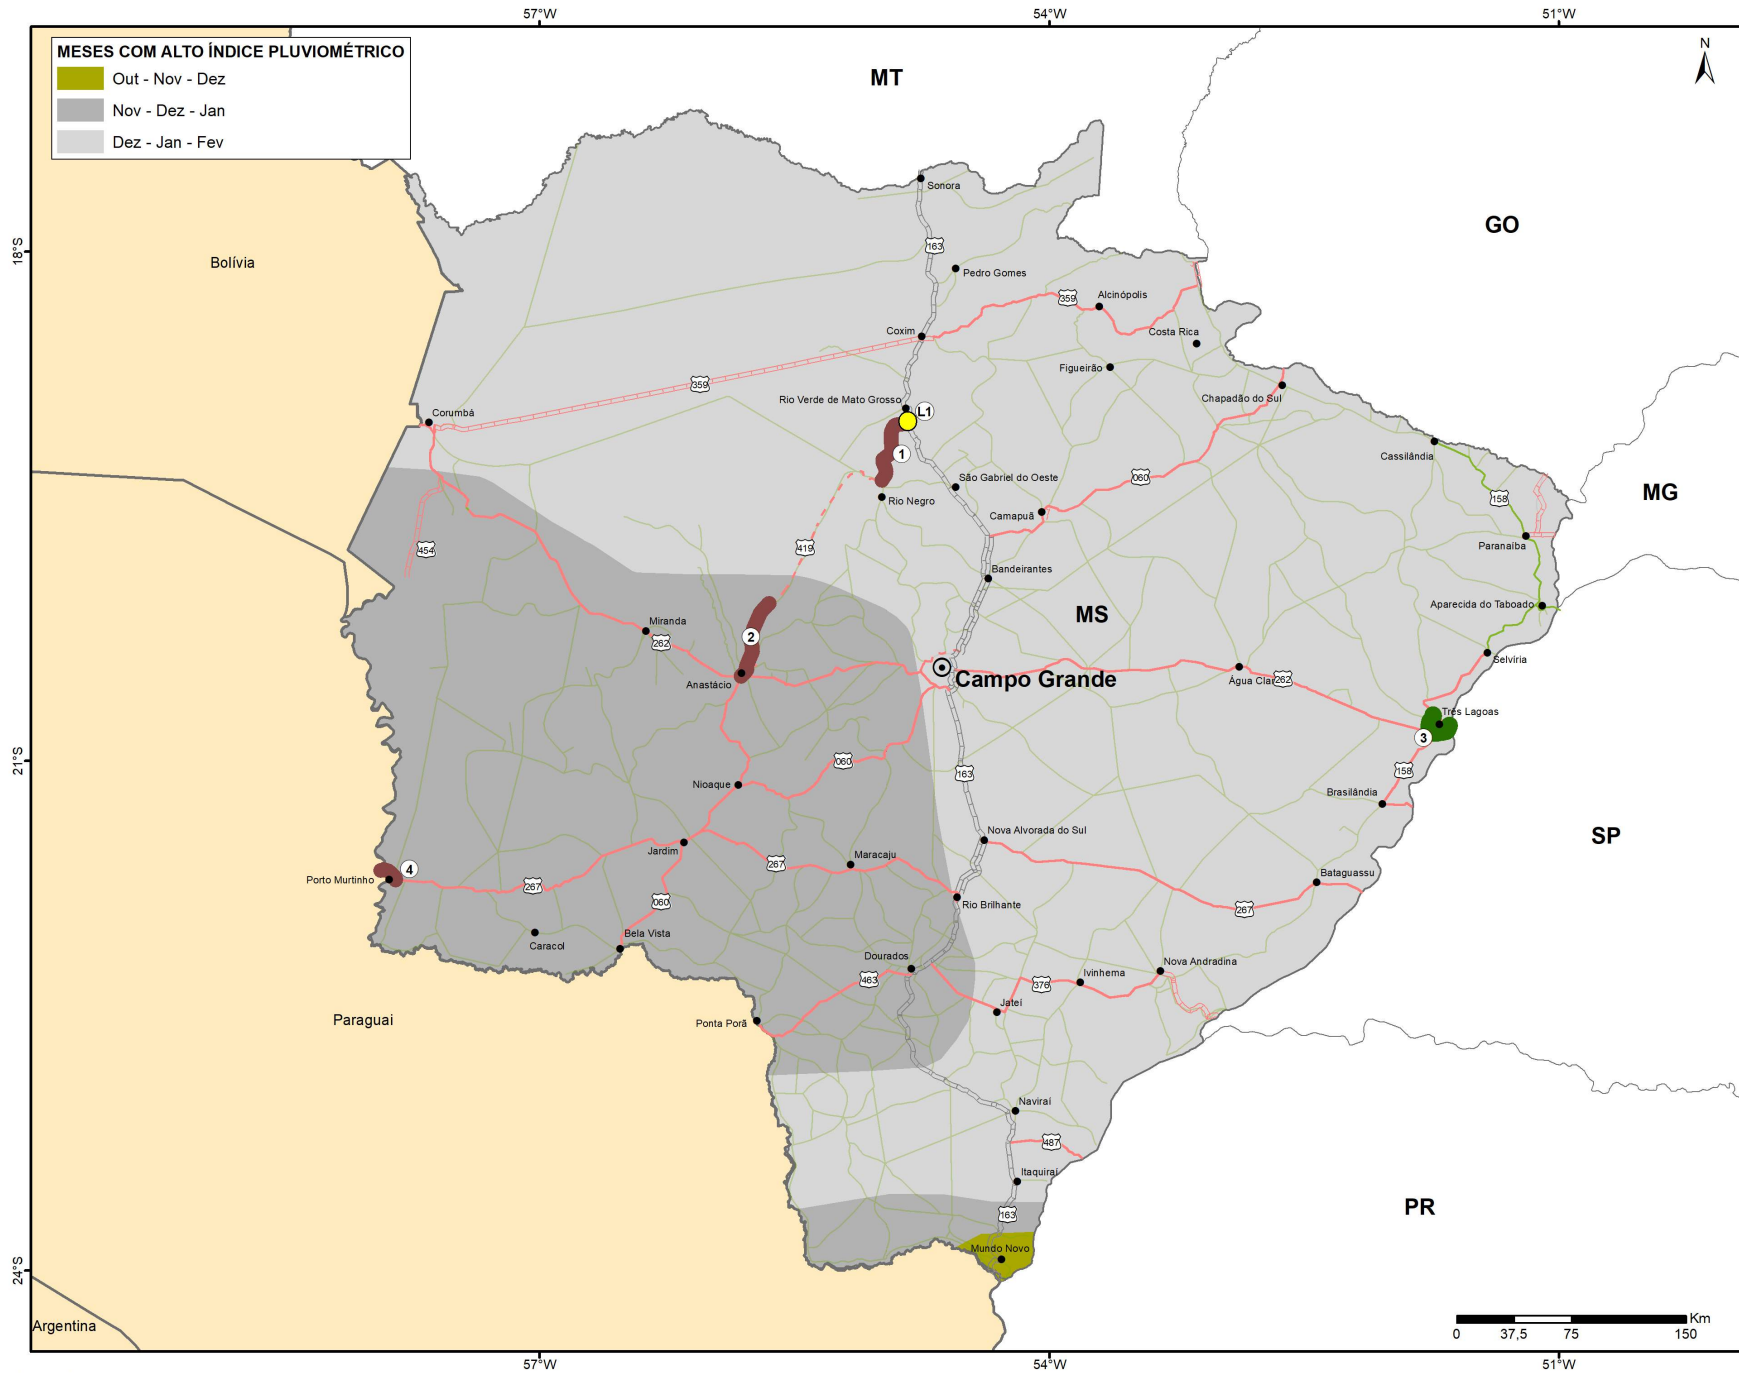

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODoviÁRIA
MAPA GERENCIAL
MATO GROSSO DO SUL

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	120,30 Km
CONTORNO RODoviÁRIO	26,50 Km
Total	146,80 Km

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

81,95%

18,05%

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta																			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
1	7557	2-3-7	1	19	00587/2017	CONSORCIO CAIAPÓ / PAV. SERV. ICE / GEOSISTEMAS	BR-419	11,30	63,80	52,5	Implantação da BR-419/MS	11/09/2017	24/06/2025	R\$ 154.402.938,31	96,35%	Obra concluída, aguardando aprovação do RPFO para encerramento formal.	19 00608/2018	PLANJE PROJETOS ENGENHARIA	
2	2033	7X37	2-3-7	4	19	00194/2021	CONSORCIO CAIAPOMME-BR-419/MS	BR-419	189,30	244,00	54,7	Implantação do Lote 4	29/06/2021	06/01/2026	R\$ 208.837.433,32	60,84%	Dispensa de título mineral em andamento, previsão de execução de 8,7km em TSD até o final do ano e CBUQ para 2026.	19 00345/2022	CONSORCIO HOUER - ENECON
3	2031	7X34	3-7	Unico	19	00934/2020	CONSORCIO CONTORNO DE TRÊS LAGOAS	BR-262	0,00	16,20	16,2	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	10/09/2025	R\$ 200.861.908,18	49,25%	Obra em andamento, RPFO em revisão e possível aditamento para Dez/25.	19 00644/2021	CONSORCIO JDS - PROGAIA
3	2031	7X34	3-7	Unico	19	00934/2020	CONSORCIO CONTORNO DE TRÊS LAGOAS	BR-158	0,00	16,20	10,3	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	10/09/2025	R\$ 200.861.908,18	49,61%	Obra em andamento, RPFO em revisão e possível aditamento para Dez/25.	19 00644/2021	CONSORCIO JDS - PROGAIA
4	2030	7XG6	2-3-8	Unico	19	00758/2023	CONSORCIO PDC FRONTEIRA-PORTO MURTINHO	BR-267	678,10	691,20	13,1	Acesso à ponte internacional em Porto Murtinho	26/12/2023	26/05/2026	R\$ 496.918.301,15	5,31%	Projetos com disciplinas ainda pendentes de aprovação pela SRE/MS e pela DFP. A obra já foi iniciada, com algumas frentes de serviço em andamento.	19 00142/2024	CONSORCIO JDS/A STEC

Obra a licitar												SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO					EDITAL			
L1		7557	2-3-7	BR-163	670,90 - 671,40	Construção de OAE no Km 670,9									Revisão de publicação de edital no 1º semestre de 2025

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
