


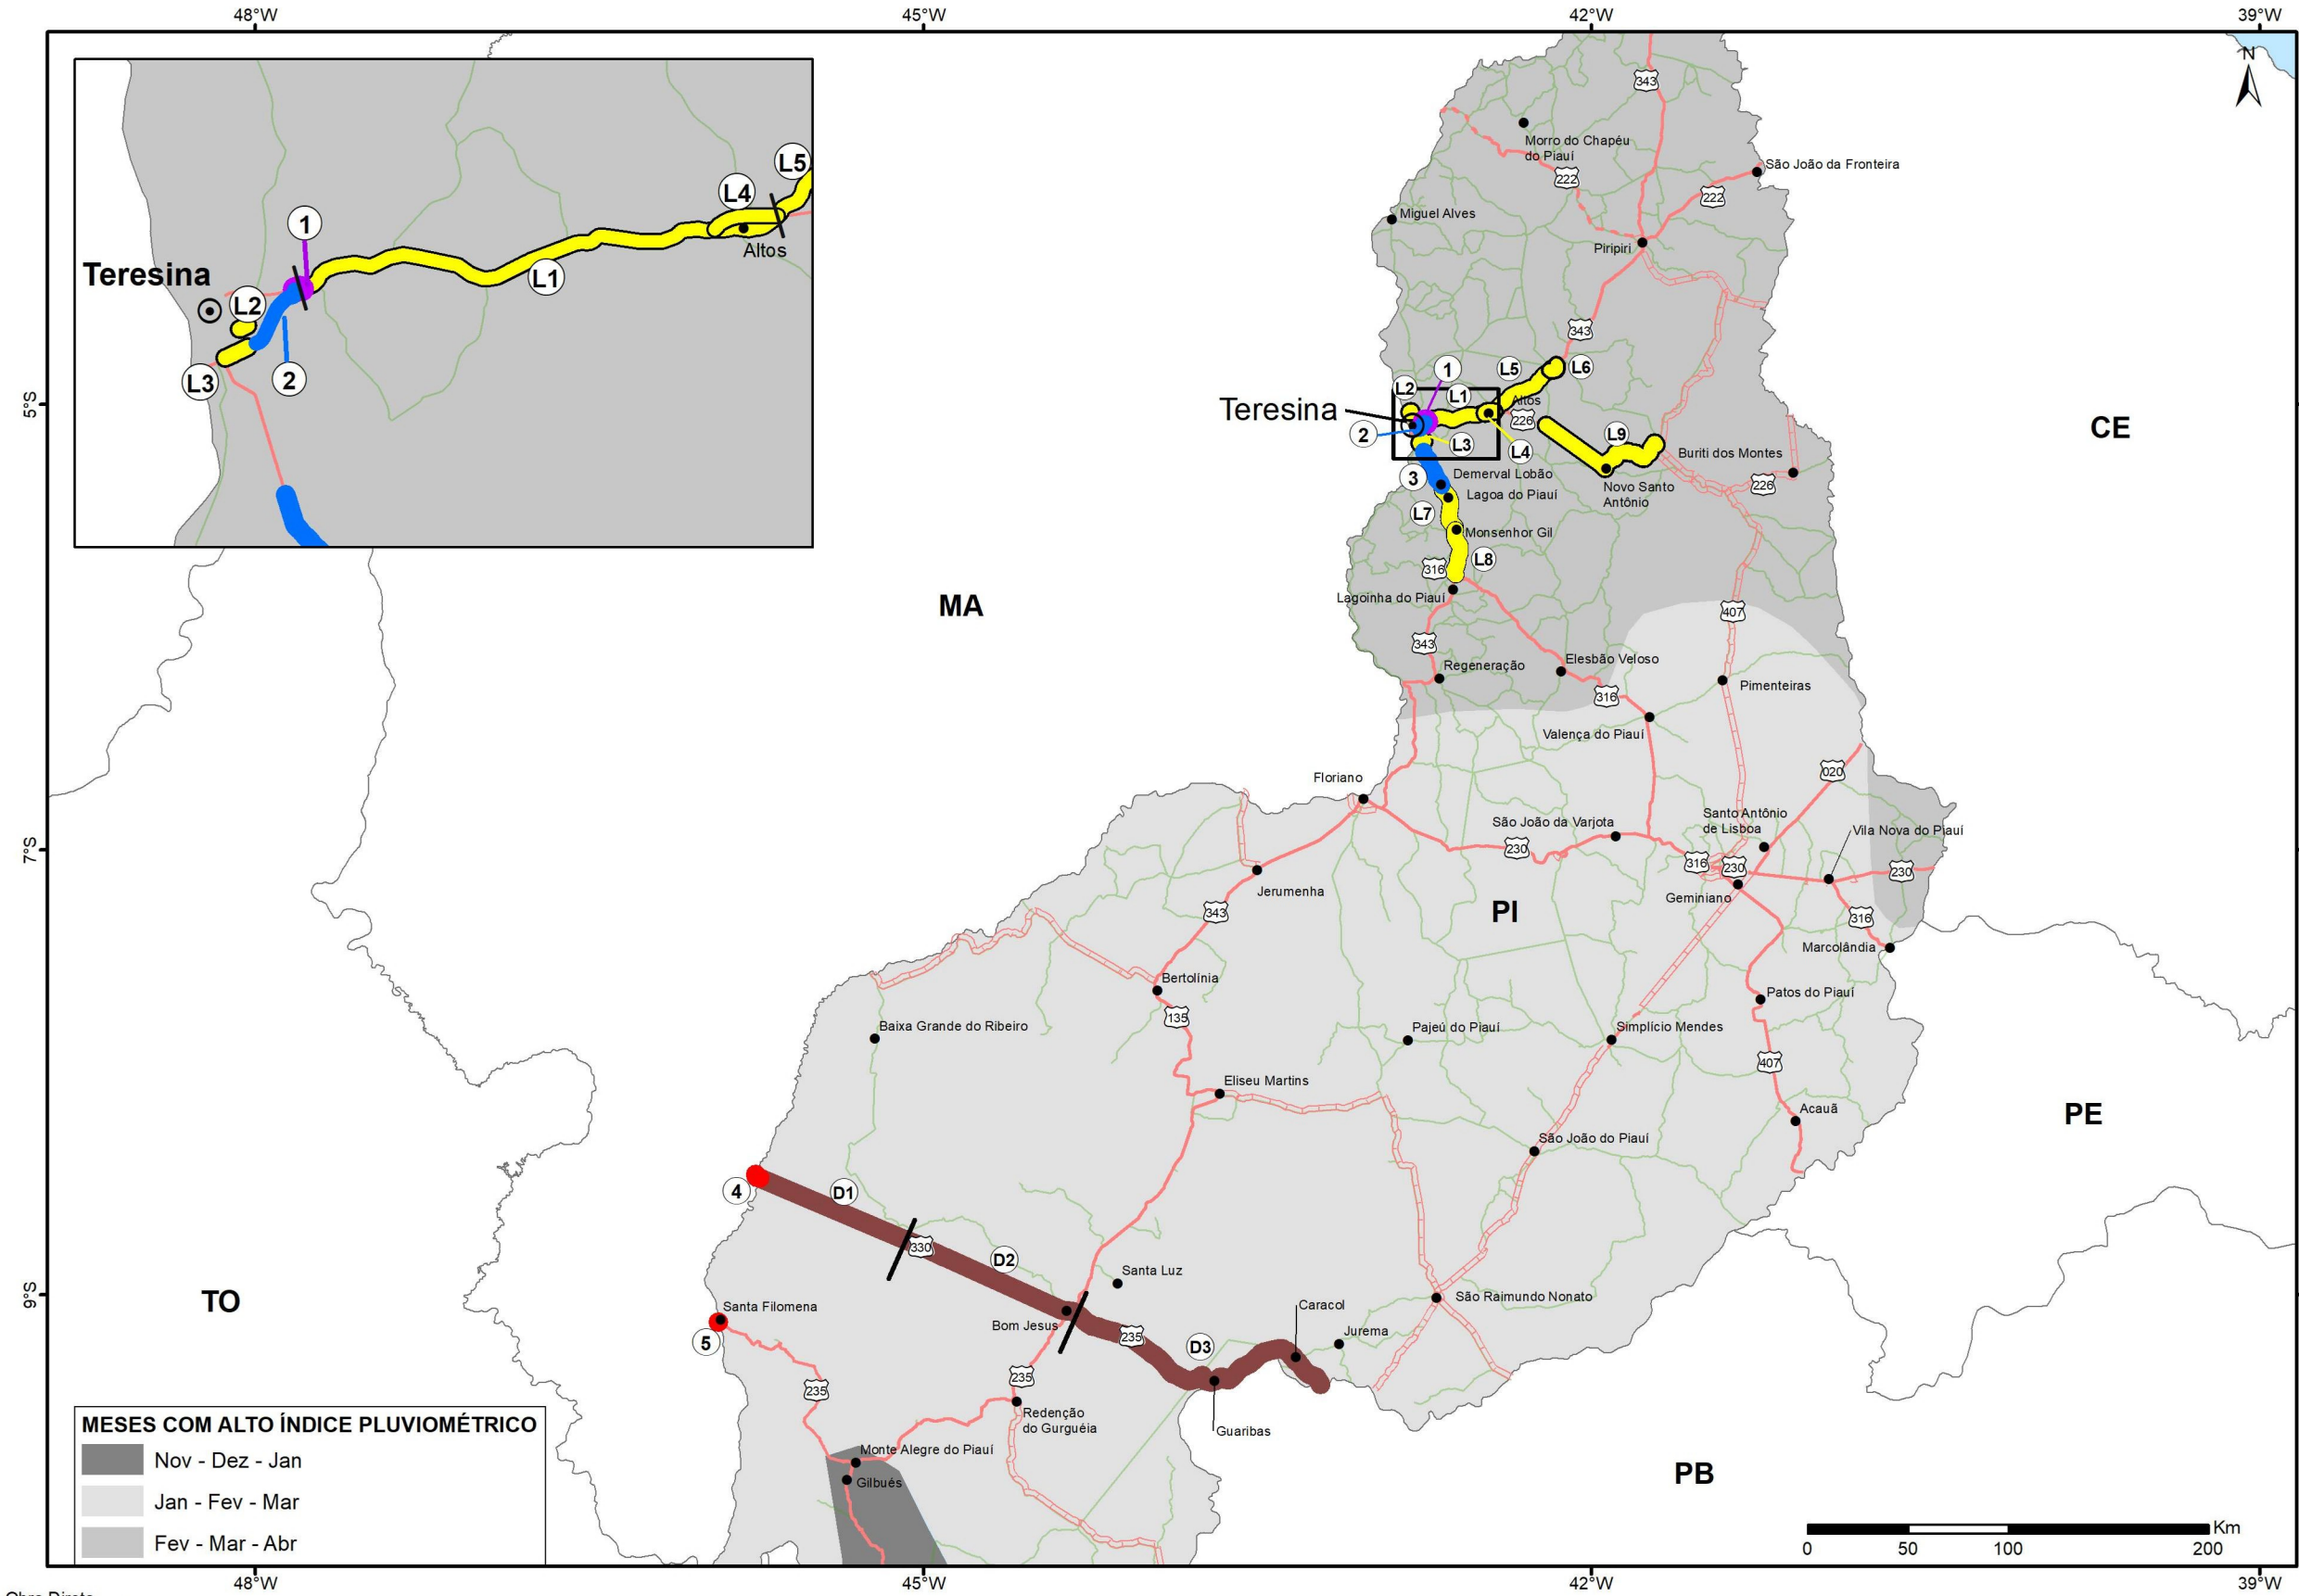


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipo de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	150,70 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	20,26 Km
OBRA DE EMERGÊNCIA	1,02 Km
OAE*	
A LICITAR	
Total	171,98 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

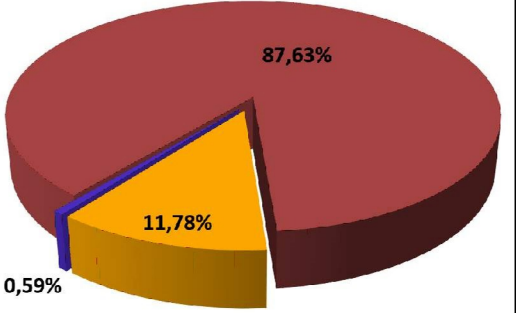

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2056	7W95	2-3	Único	18 00131/2022	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-343	340,98	341,20	1,02	Construção de trincheira em interseção com Av. João XXIII em Teresina.	13/06/2022	08/03/2025	R\$ 51.152.422,41	81,73%	Obra concluída. Aguardando emissão do termo de recebimento.	18 00255/2022	ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
2	2566	7W95	2-3	1	18 00687/2024	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-343	341,50	346,72	5,22	Rem. Contrato 721/2018 - Adequação BR-316/343/PI (Saídas Sul e Leste de Teresina).	31/10/2024	30/04/2028	R\$ 137.299.364,09	6,29%	Construtora mobilizada para início dos serviços.	Edital 0450/24-18	Em licitação
3	2055	7X75	2	Único	18 00899/2019	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-316	13,38	33,54	20,26	Duplicação do trecho entre Entr. com BR-226/PI e Demerval Lobão.	27/12/2019	14/03/2025	R\$ 90.770.742,66	94,08%	Duplicação concluída, já com tráfego no local. Em andamento elaboração/aprovação de projeto do prolongamento da OAE e passarelas.	18 00927/2020	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD.
4	2057	7XM5	3	Único	18 00517/2022	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-330	0,00	1,42	4,02	Construção de ponte sobre rio Parnaíba e seus acessos (Ribeiro Gonçalves).	26/09/2022	27/06/2025	R\$ 35.706.570,27	62,31%	Ponte concluída, trabalhando nos acessos. Previsão de entrega em Jul/25.	18 00557/2023	NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA
5	7N22	2-3	Único	18 00191/2019	CONSORCIO ARTELESTE/MAVILLIS	BR-235	435,30	435,48	4,6	Construção de OAE.	23/05/2019	31/08/2024	R\$ 35.645.637,38	99,97%	Obra concluída. Aguardando emissão do termo de recebimento.	18 00843/2019	CONSORCIO FUTURE ATP / ZAGO	

Obra Delegada																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	4115	163K	3	TC-485/2024	Estado do Piauí	BR-330	1,34	115,78	114,4	Lote 2	27/11/2024	26/11/2028	R\$ 438.406.863,50	R\$ 4.384.068,64	R\$ 442.790.932,14	0%	Previsão de assinatura do contrato pelo estado para o final de Maio/25.	Prev02 CONTR
D2	4632	163K	3	TC-484/2024	Estado do Piauí	BR-330	115,78	178,72	62,94	Lote 1	27/11/2024	27/11/2027	R\$ 280.405.803,09	R\$ 2.804.058,03	R\$ 283.209.861,12	0%	Previsão de assinatura do contrato pelo estado para Jun/25.	Prev04 CONTR
D3	2058	7N22	2-3	UT-003/2007	Estado do Piauí	BR-235	0,00	150,70	150,7	Implantação da BR-235/PI - Gestão feita pela SR do Piauí	17/04/2009	29/10/2026	R\$ 436.940.747,77	R\$ 0,00	R\$ 436.940.747,77	46%	Licitação do Remanescente (60 Km) pelo Estado. Previsão de lançamento do edital em Jun/25	

Obra a licitar																
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA				
L1	2947	7W95	2-3	BR-343	311,20	332,20	Duplicação entre Teresina e Altos	50618.000013/2025-65		Edital nº 0062/25-18 publicado, previsão de abertura das propostas em Jun/25.	Prev02 CONTR					
L2		7W95	2-3	BR-343	346,72	347,08	Construção OAE	50618.000797/2024-41		Previsão de licitação em junho/2025 e assinatura de contrato em Out/25.	Prev07 CONTR					
L3		7W95	2-3	BR-343	347,08	349,10	Contorno de Teresina - Lote 3	50618.000799/2024-30		Previsão de licitação em setembro/2025 e assinatura de contrato em Dez/25.	Prev09 CONTR					
L4		20UC		BR-343	303,10	332,20	Contorno Rodoviário de Altos			Projetos em elaboração por meio do contrato nº 18 00080/2020, com previsão de publicação de edital de obra no final do 2º semestre de 2025.						
L5		20UC		BR-343	266,90	304,40	Duplicação de trecho rodoviário Campo Maior - Altos			Em processo licitatório a elaboração de estudos e projetos por meio do Edital nº 0306/24-18.						
L6		20UC		BR-343	260,00	271,00	Contorno Rodoviário de Campo Maior			Projetos em elaboração por meio do Contrato 18 00496/2023, com previsão de publicação de edital de obra no final do 2º semestre de 2025.						
L7	2521	163E	3	BR-316	33,54	55,60	Demerval Lobão a Monsenhor Gil (Lote 2)	50618.001396/2024-16	0058/25-18	Edital nº 0058/25-18 suspenso. A ser relicitado. Previsão de assinatura do contrato em Jun/25.	Prev02 CONTR					
L8	4631	163E	3	BR-316	55,60	79,60	Duplicação de Monsenhor Gil até Estaca Zero			Previsão de licitação da elaboração de estudos e projetos em Ago/25.						
L9		7V07	6	BR-226	124,90	227,70	Implantação do trecho Juazeiro do Piauí - Altos			Anteprojeto pronto para licitar como integrada. Previsto licitar no segundo semestre de 2025.	A LICITAR	A LICITAR				

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
