


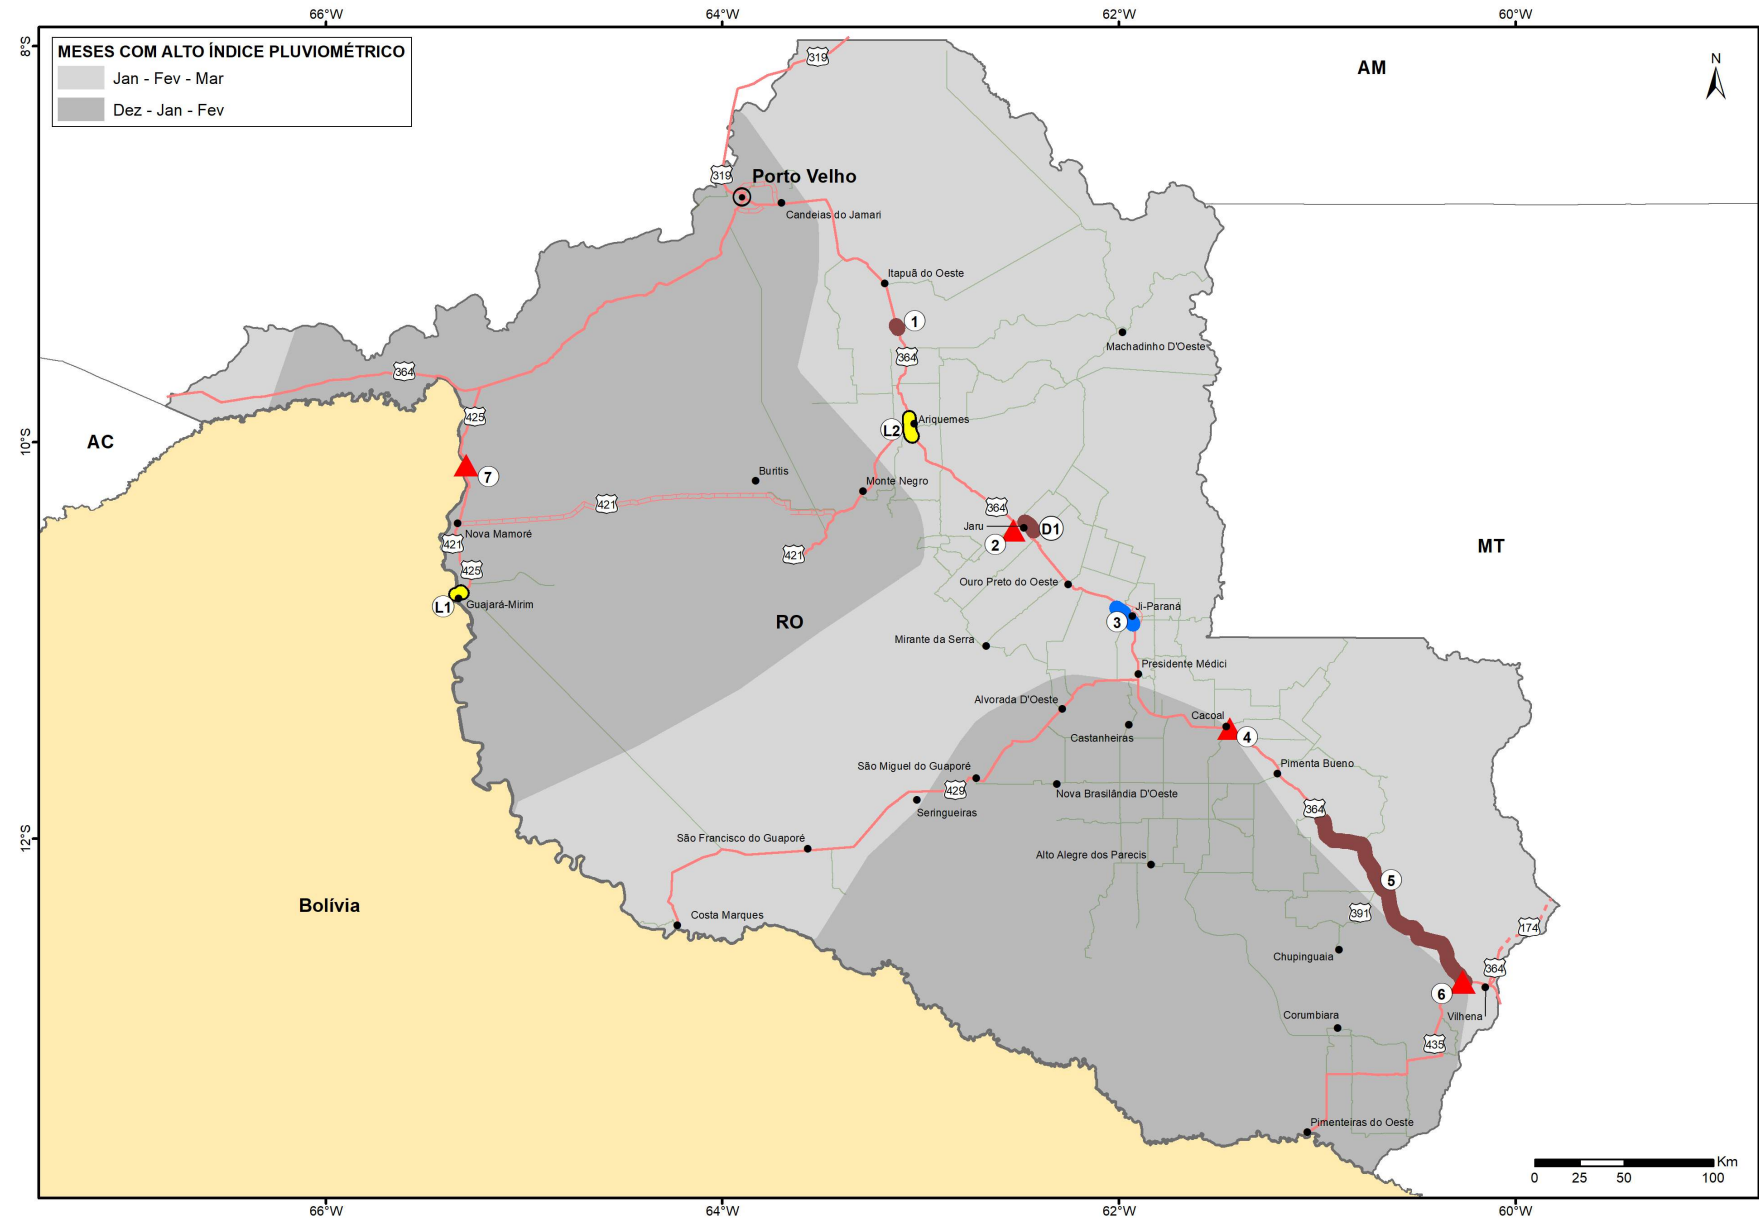

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R+R)	EXEC. FINA. NC. %	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA			
1	TXA3	2	Único	22	00513/2023	CONSORCIO ENTECFENSA	BR-364	576,90	578,70	1,8	Correção de traçado e execução de terceira faixa	26/09/2023	22/05/2025	R\$ 20.833.431,75	17,45%	RFPO em andamento para alteração de mudança de geometria da pista projetada.	22	00353/2022	CONSORCIO BUREAU VERITAS - SY STRA	
2	2071	TXA3-TXX3-TXMT	2-7	Único	22	00784/2021	TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	BR-364	423,30	423,52	0,22	Ponte sobre o rio Jarú	04/01/2022	31/10/2025	R\$ 28.943.101,37	74,61%	Obra em andamento, com a nova OAE finalizada e conclusão da restauração da ponte antiga prevista para o 2º semestre de 2025.	22	00694/2021	PROSL - PROJETOS SUPER PLANEJ.
3	2072	TXMT-7P67	3-7	Único	22	00902/2020	CONSORCIO META-VETOR	BR-364	347,00	351,67	4,67	Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	26/07/2025	R\$ 55.127.217,18	59,65%	RFPO em andamento com previsão de entrega em julho de 2025. Previsão de entrega de obra em dezembro/2025.	22	00541/2021	ECOPLAN ENGENHARIA - LTDA
3	2072	TXMT-7P67	3-7	Único	22	00902/2020	CONSORCIO META-VETOR	BR-364	347,00	351,67	1,4	Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	26/07/2025	R\$ 55.127.217,18	59,65%	RFPO em andamento com previsão de entrega em julho de 2025. Previsão de entrega de obra em dezembro/2025.	22	00541/2021	ECOPLAN ENGENHARIA - LTDA
4	TXMT-TXA3	7-2	Único	22	00614/2021	COBRASA COMERCIO E CONSTRUÇÕES	BR-364	236,00	236,75	0,75	Recuperação, Reforço e Alargamento de Ponte Rodoviária	10/11/2021	08/08/2024	R\$ 11.239.615,27	18,16%	Contrato rescindido e instaurado PAAR. Prevista nova licitação em 2025.	22	00795/2021	ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA	
5	TXA3-TXX3	2-3	Único	22	00757/2023	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	BR-364	26,50	162,60	15,35	Construção de 15,35Km de terceiras faixas	21/12/2023	20/03/2026	R\$ 70.886.036,66	2,71%	RFPO em andamento para alteração do levantamento topográfico devido à sua incompatibilidade com o geométrico.	22	00254/2022	CAVA ENGENHARIA DE INFRAEST	
6	TXA3-TXX3	2-3	Único	22	00686/2023	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	BR-364	26,50	27,90	1,4	Viaduto na interseção das rodovias BR-364/RO e BR-435/RO	29/11/2023	27/11/2025	R\$ 29.358.766,41	25,93%	Sem frentes de serviço abertas em função de entrave com rede de energia, excetuando-se a execução da OAE	22	00254/2022	CAVA ENGENHARIA DE INFRAEST	
7	2070	TX64	2-3	Único	22	00811/2020	TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	BR-425	51,70	79,70	0,215	Pontes sobre os rios Ararás (Km 51,7) e Ribeirão (Km 79,7)	04/12/2020	29/07/2024	R\$ 23.580.993,10	100%	Obra concluída. OAEs em operação.	22	00377/2021	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2071	TXA3-TXX3	2-3	TED 656/2020	EXERCITO BRASILEIRO - 5º BEC	BR-364	421,40	427,00	7,4	Implantação das ruas laterais na Travessia Urbana de Jarú	02/10/2020	02/10/2025	R\$ 40.970.721,11	R\$ 0,00	R\$ 40.970.721,11	89%	RFPO em andamento para regularização de quantitativos não previstos no Plano de Trabalho	22 00694/2021	PROSL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2940	7XZ8	3	BR-425		Ponte Internacional sobre rio Mamoré (Guajará-Mirim) e acessos	50600.037576/2023-36	0539/23-07	Em processo licitatório.	22 00111/2025	CONSORCIO MAIA MELO - CAVA
L2		10KK	2-3-6	BR-364	510,00	520,00	Travessia Urbana de Ariquemes		Projetos executivos sendo analisados na DPP. Previsão de licitar a obra em julho/25		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
