






COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL SANTA CATARINA

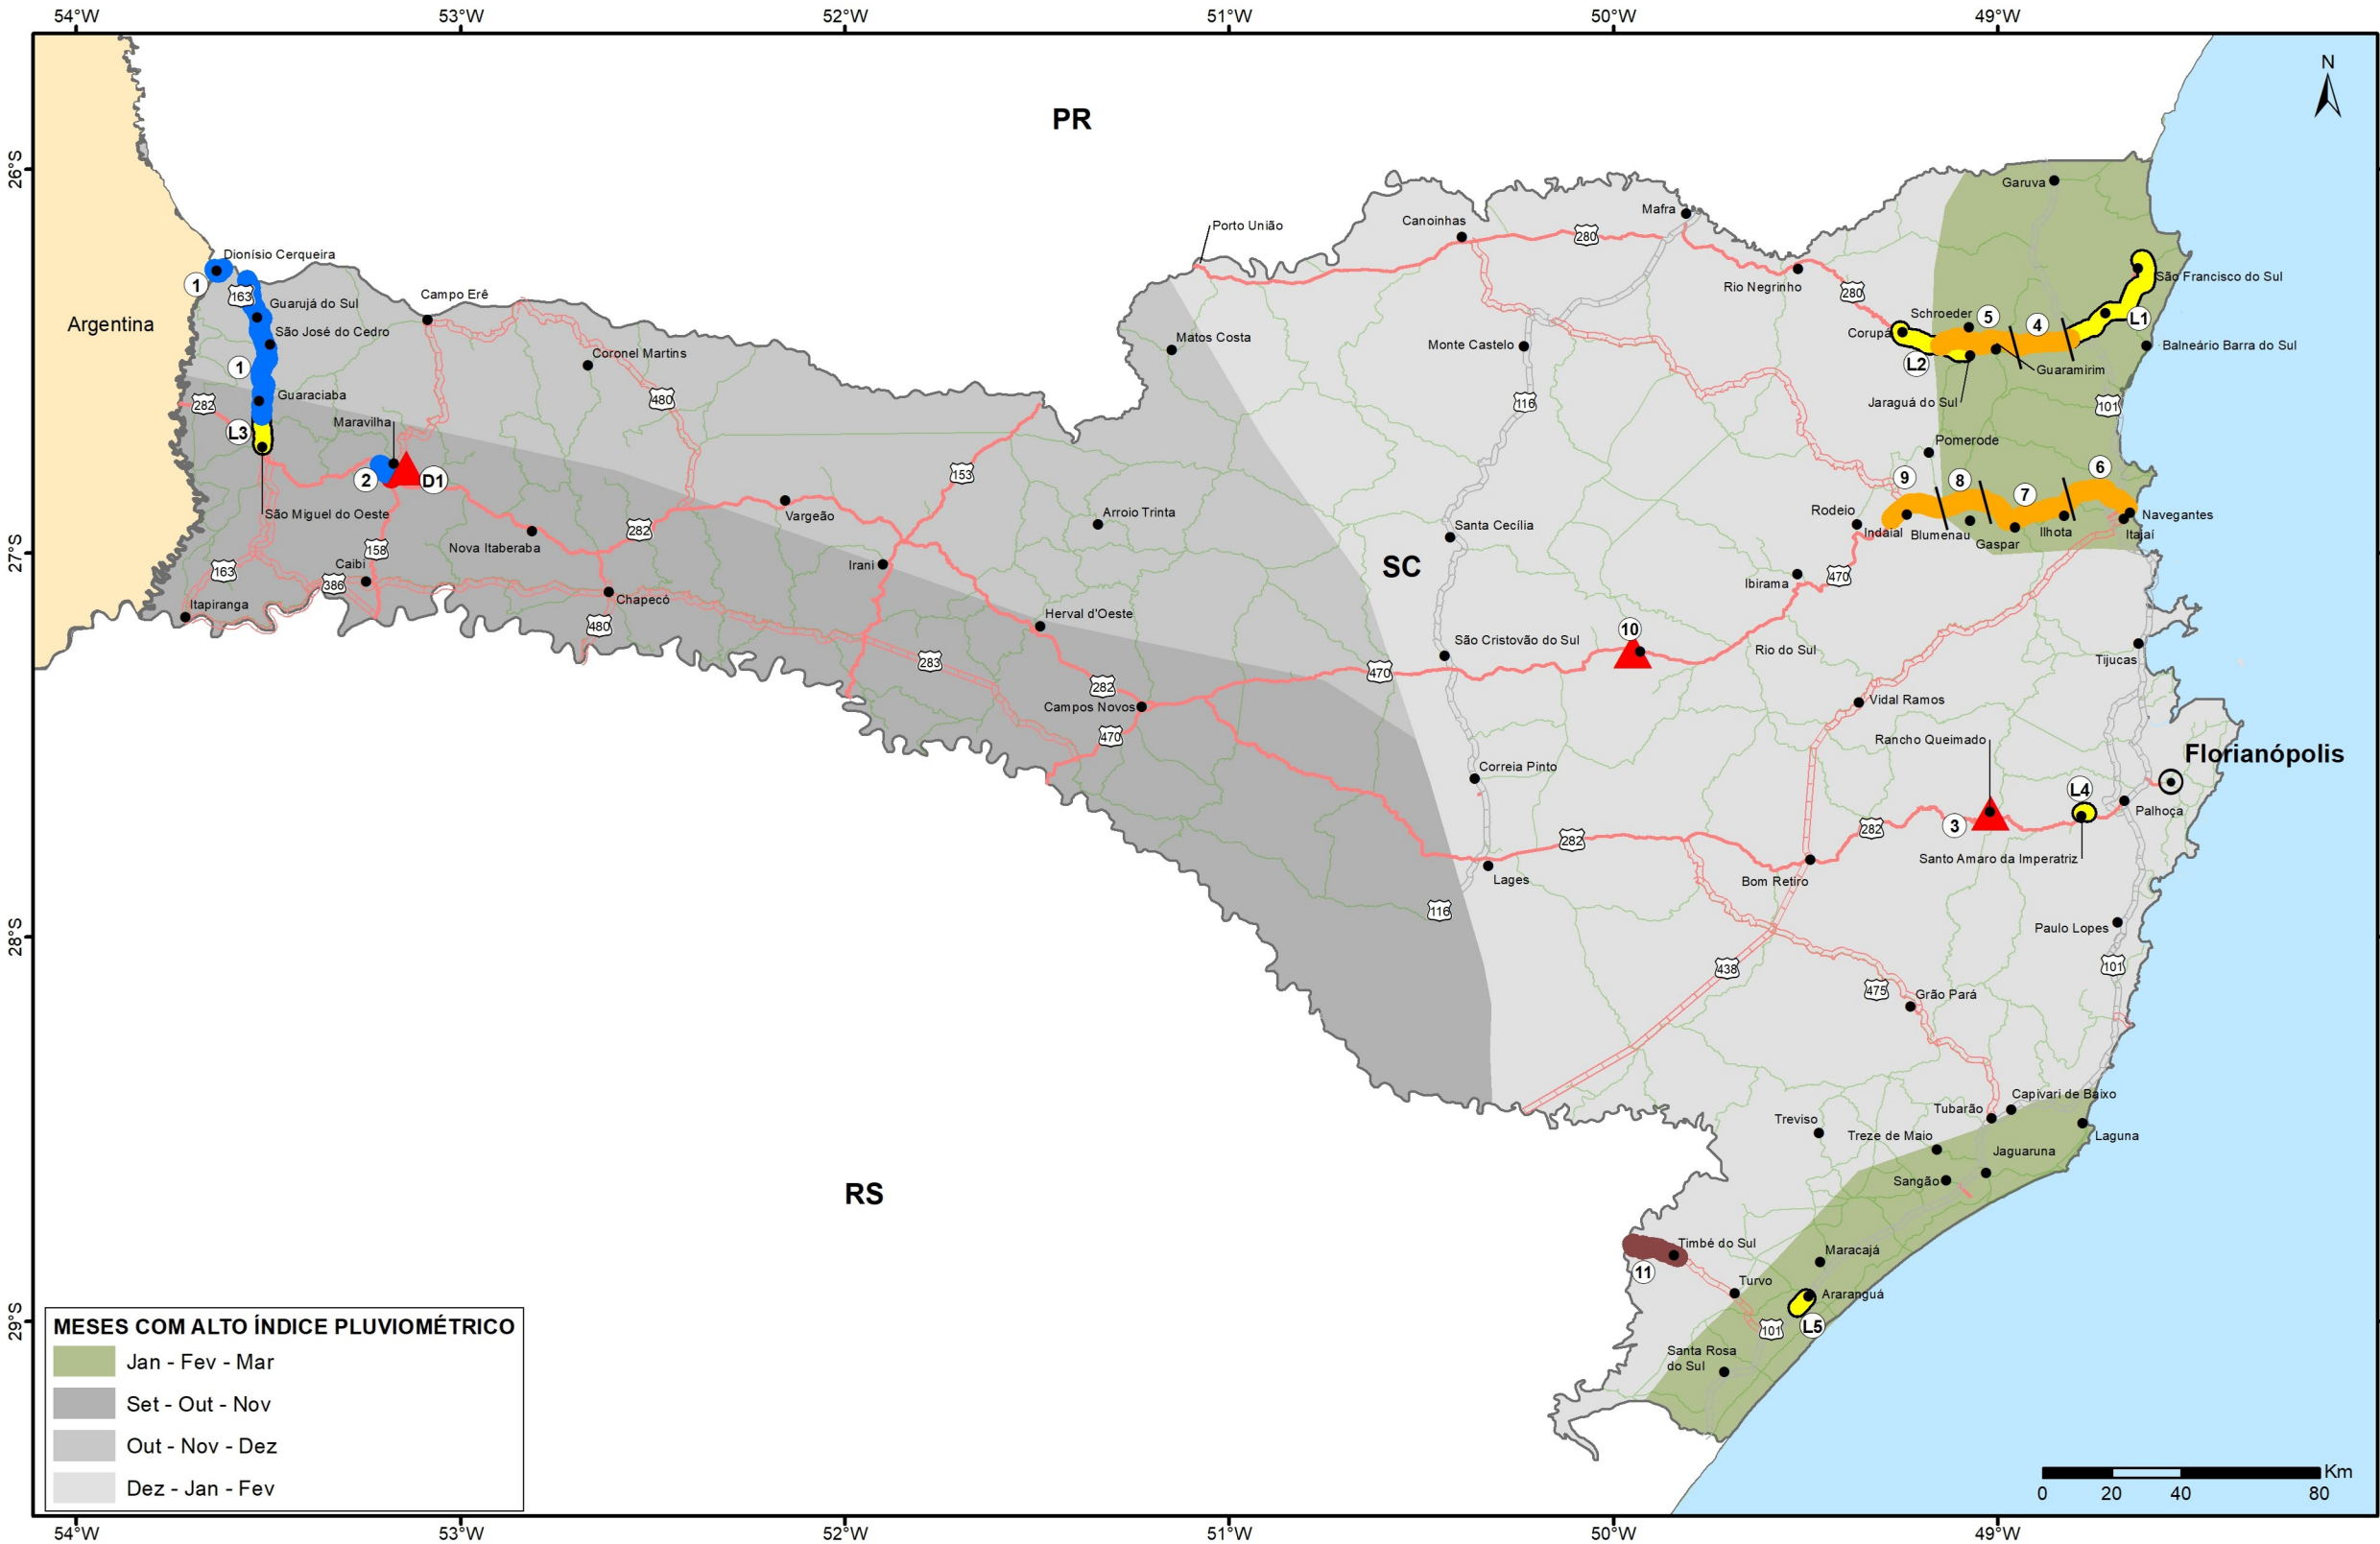


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

	DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	147,08 Km
	ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	50,98 Km
	IMPLANTAÇÃO	22,00 Km
	OAE*	
	A LICITAR	
Total		220,06 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

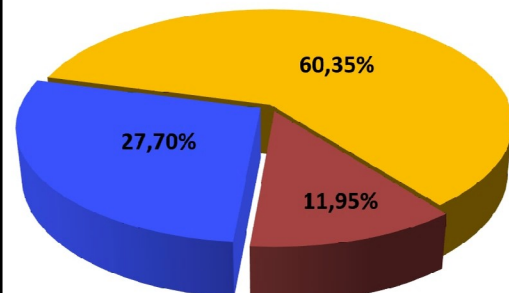

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2104	12KF	3-7	Único	16 00192/2019	TORC - TERRAP OBRAS RODOV. CONST.	BR-163	0,00	3,60	3,6	Ampliação de capacidade na BR-163/SC	06/08/2019	31/03/2026	R\$ 323.052.443,28	89,11%	Obra em andamento. Previstas 2 RFFOs para 2025 para tratar de contenção de taludes e viadutos em Guaraciaba e Guarujá do Sul.	16 00180/2021	CONSORCIO MPB-UNICA
1	2104	12KF	3-7	Único	16 00192/2019	TORC - TERRAP OBRAS RODOV. CONST.	BR-163	78,62	122,60	43,98	Ampliação de capacidade na BR-163/SC	06/08/2019	31/03/2026	R\$ 323.052.443,28	89,11%	Obra em andamento. Previstas 2 RFFOs para 2025 para tratar de contenção de taludes e viadutos em Guaraciaba e Guarujá do Sul.	16 00180/2021	CONSORCIO MPB-UNICA
2	2094	7XJ5	3-7		16 00674/2024	GAIA RODOVIAS LTDA	BR-282	604,30	607,70	3,4	Travessia urbana de Maravilha	08/10/2024	01/07/2026	R\$ 28.572.115,68	0%	Obra em andamento. Edital de supervisão em atos preparatórios. Há previsão de uma RFFO para tratar de problema com solo saturado e drenagem pluvial.		
3	2095	7XJ5	3-7	Único	16 00734/2023	CONSORCIO VOGEL SANGER / ENGEDAL	BR-282	58,30	61,00	2,7	Viaduto em Rancho Queimado	02/01/2024	02/07/2025	R\$ 18.728.094,34	29,53%	Obra com ritmo adequado. Possível RFFO para tratar de terraplanagem de vias marginais e muro de gabião.		
4	2102	10JQ	2-3-7	2.1	16 00574/2013	SULCARTINENSE-MINART/CM/BR/CONS	BR-280	36,68	50,74	14,06	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2026	R\$ 247.091.007,52	83,34%	Obra em andamento. Prevista RFFO no 2º semestre. Pendências ambientais impactam Ponte sobre o Rio Pirai. A execução dessa ponte é caminho crítico para a obra.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
5	2103	10JQ	2-3-7	2.2	16 00614/2013	CETENCO ENGENHARIA S/A	BR-280	50,74	74,58	23,84	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2026	R\$ 993.395.722,26	68,01%	Obra em andamento. Há previsão de RFFO em jun/2025. Contrato pode atingir limite de aditivo após essa revisão.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
6	2097	7530	2-3-7-8	1	16 01093/2013	CONSORCIO PLANA TERRA-AZZA-SOGEL	BR-470	0,00	18,61	18,61	Duplicação BR-470/SC	17/03/2014	28/09/2025	R\$ 396.051.221,74	91,6%	Obra em andamento. Haverá uma RFFO para substituir a iluminação dos viadutos prevista para ago/2025. Houve prorrogação de prazo para dez/2025.	16 00606/2024	FROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
7	2098	7530	2-3-7-8	2	16 00355/2014	CONSORCIO IVALI - SETEP	BR-470	18,61	44,87	26,26	Duplicação BR-470/SC	13/06/2014	21/09/2025	R\$ 527.653.976,86	96,74%	Obra em andamento. Monitoramento de problema geotécnico em um viaduto. Previsão de RFFO para substituir a iluminação dos viadutos	16 00606/2024	FROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
8	2099	7530	2-3-7-8	3	16 00703/2013	SULCARTINENSE-MINART/CM/BR/CONS	BR-470	44,87	57,78	12,91	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	14/08/2025	R\$ 350.938.127,82	62,45%	Obra em andamento. Prevista duas RFFO para 2025. Remanejamento de rede elétrica e de gás em andamento.	16 00606/2024	FROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
9	2100	7530	2-3-7-8	4	16 00603/2013	SULCARTINENSE-MINART/CM/BR/CONS	BR-470	57,78	73,18	15,4	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	04/11/2025	R\$ 311.140.293,56	68,84%	Obra em andamento. Prevista uma RFFO para 2025. Remanejamento de rede elétrica e de gás em andamento.	16 00606/2024	FROSUL - PROJ SUPER PLANEJ.
10	2192	7N85	2-7-8	Único	16 00503/2019	CONSORCIO PLANA TERRA/URBANIZA	BR-470	175,00	177,00	2	Interseção em 2 níveis em Pouso Redondo	12/08/2019	24/01/2025	R\$ 13.623.404,37	97,1%	Contrato em encerramento. Termo de recebimento definitivo emitido.		
11	2105	7N85	2-3-7	Único	16 00840/2013	CONSORCIO SETEP-IVALI-SOTEP	BR-285	33,80	55,80	22	Implantação da BR-285/SC	29/11/2013	23/10/2024	R\$ 180.108.045,12	97,39%	Obra concluída. Há pendências sendo feitas para emitir a entrega definitiva. Haverá uma licitação para contratação de iluminação na serra.	16 00534/2014	IGUATEMI CONSULT. E SERVICOS

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	2095			ACT-71/2022	Município de Maravilha	BR-282	602,00 602,00	0	Viaduto no Km 602+100 no Município de Maravilha (Entr. BR-158).	06/12/2022	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00	0%	Obra em andamento com ritmo adequado.		

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2101	10JQ	2-3-7	BR-280	0,70	36,70	Duplicação BR-280/SC		Previsão de licitar remanescente até nov./2025.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
L2		7N86	2	BR-280	64,20	84,30	Jaraguá a Porto União - Acostamentos		Solicitar autorização do DG para licitar contratação integrada em 2025		
L3	2104	12KF	3-7	BR-163	70,00	78,52	Adequação de trecho entre São Miguel do Oeste e Guaraciaba		Previsão de lançar edital em jul/2025	Rev 03 CONTR	
L4	2095	7XJ5	3-7	BR-282	27,00	27,00	Construção de OAE		Solicitar autorização do DG para licitar contratação integrada em 2025		
L5	2093	7XW7	3	BR-101	2,70	6,70	Contorno em Araranguá		Projeto sendo doado pela prefeitura. Licitação prevista até out/2025.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
