


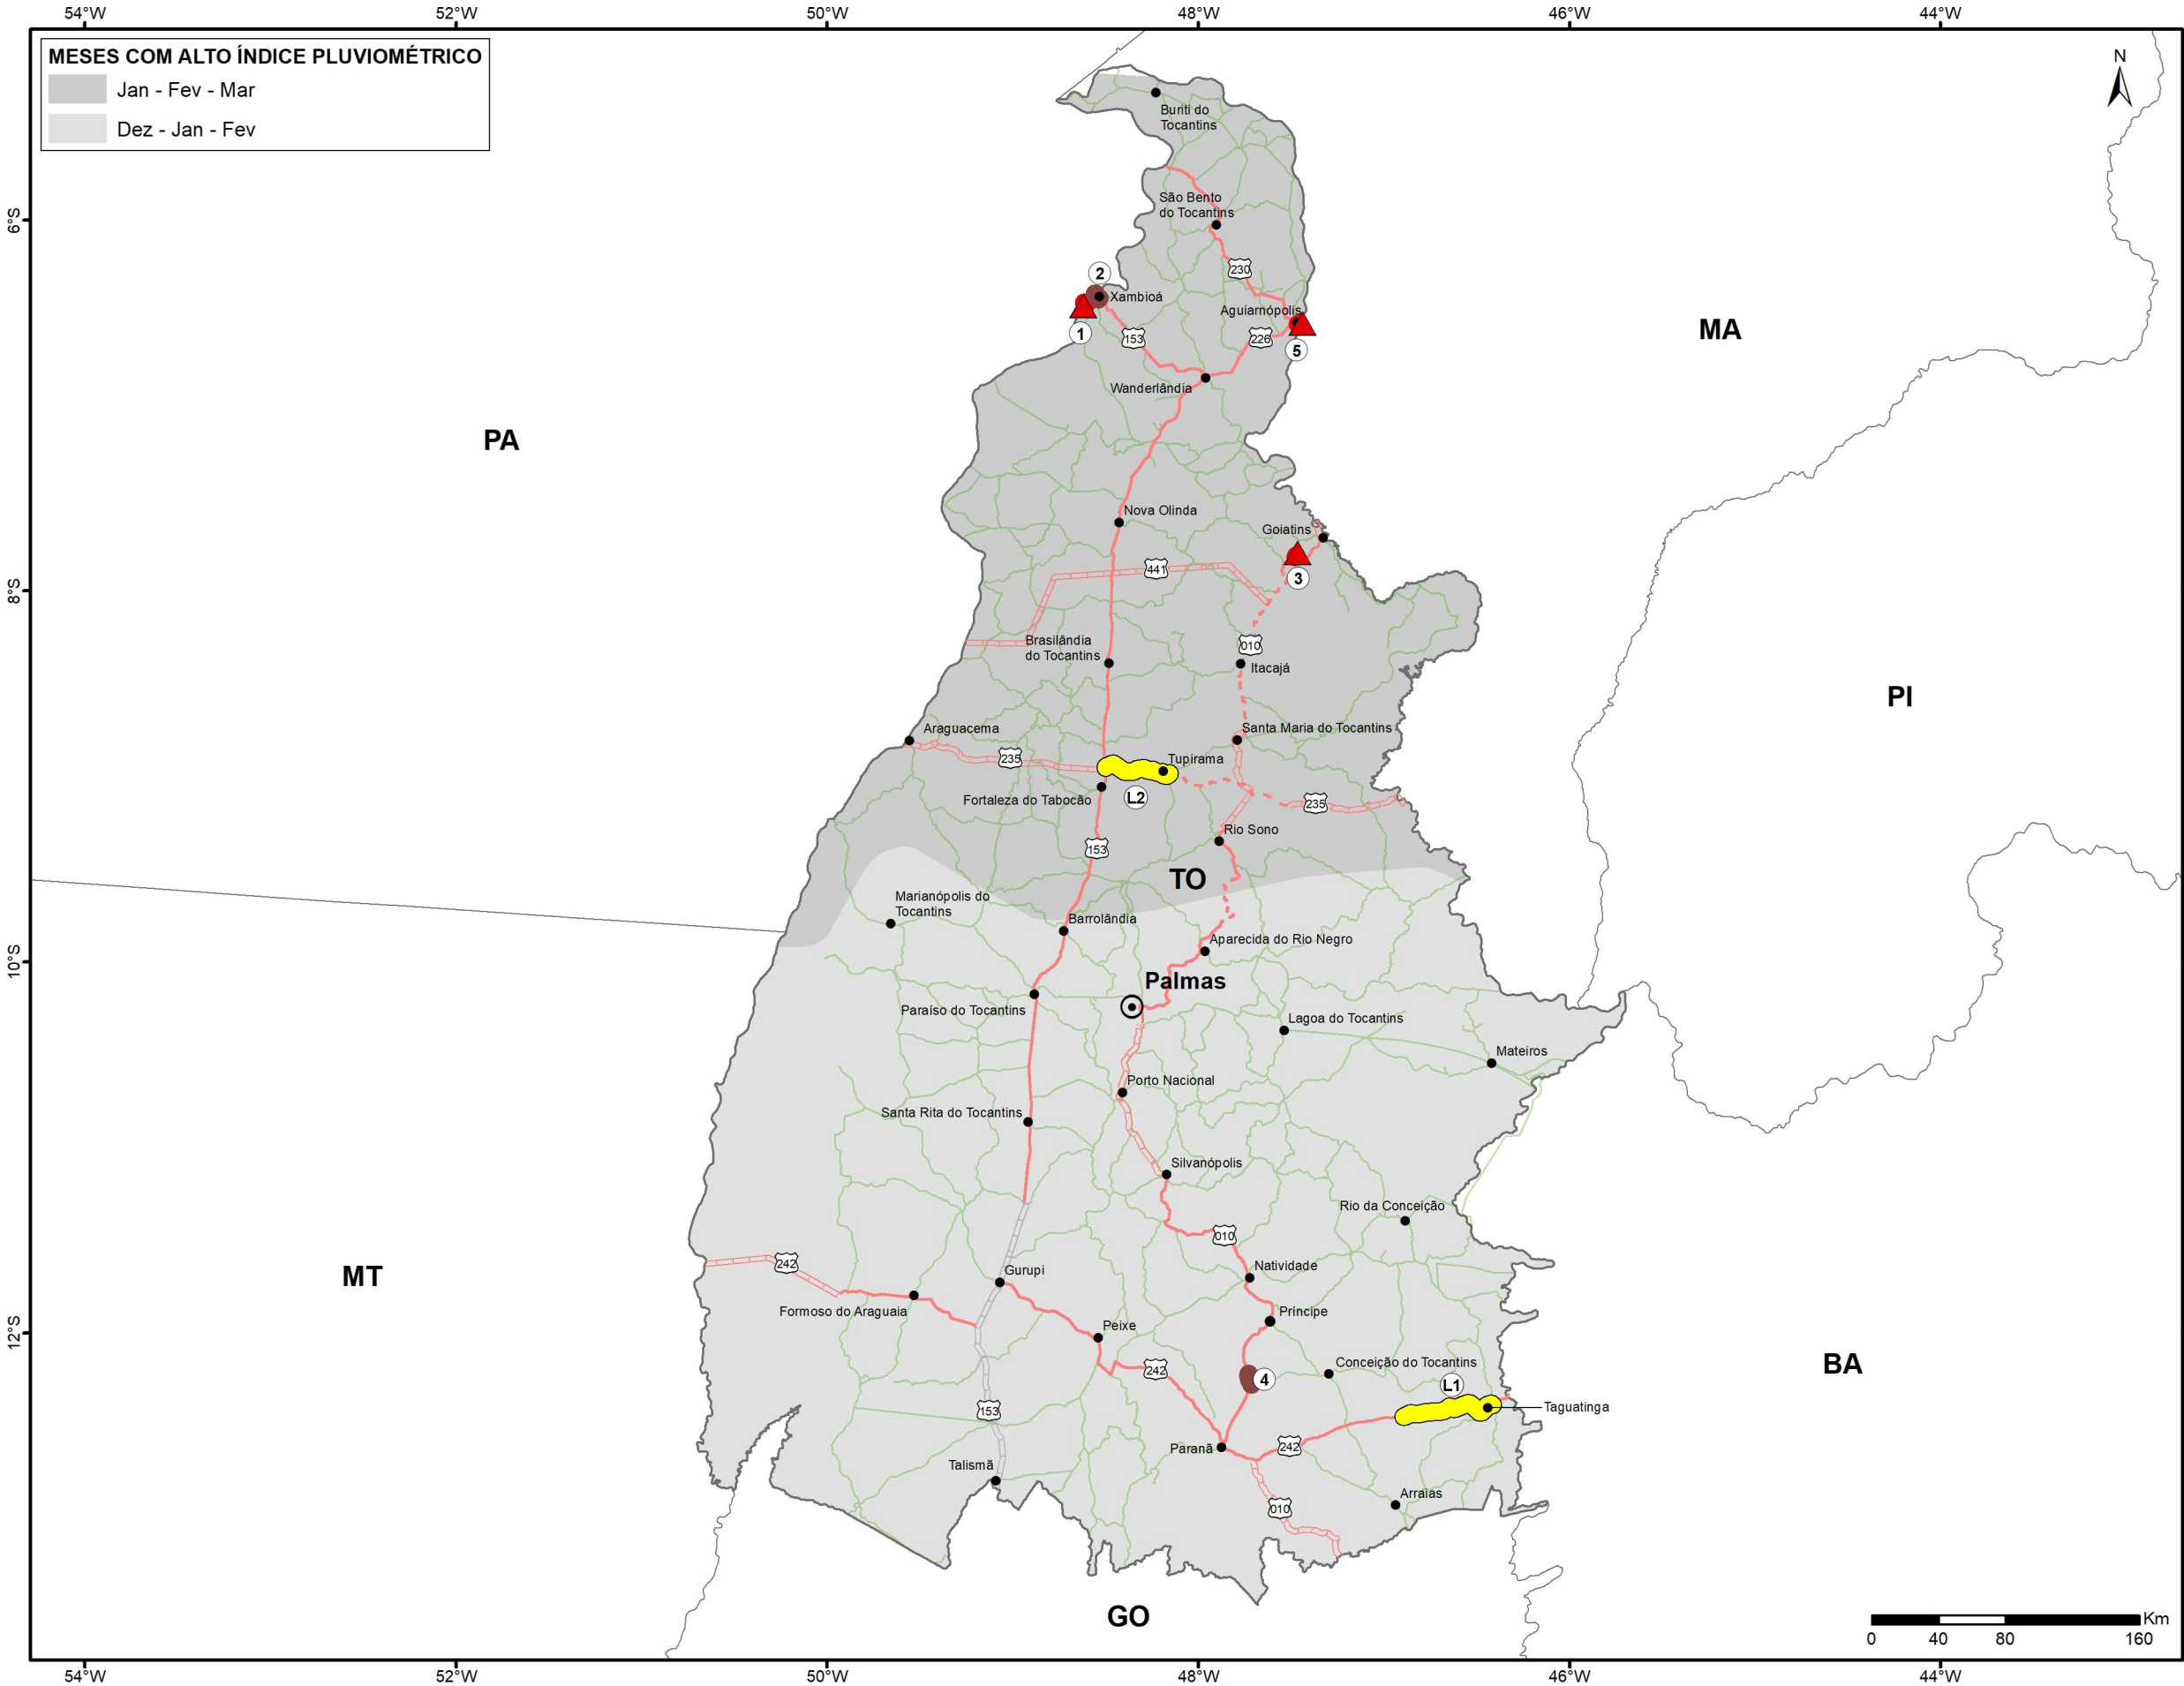

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA


MAPA GERENCIAL

TOCANTINS



- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada

- Tipos de Intervenção**
- OAE
 - IMPLANTAÇÃO
 - A LICITAR
- 9,11 Km
- Total 9,11 Km**



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Obras Diretas																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2109	7L92	2-3	Unico	23 00217/2017	CONSORCIO A. GASPAR/ARTELESTE/V. GARAMBONE	BR-153	0,00	1,73	Ponte sobre o rio Araguaia (Xambioá)	10/05/2017	14/04/2025	R\$ 204.292.366,46	98,96%	Ponte concluída. Aguardando execução dos acessos para finalizar pavimentação, laje de transição e sinalização.	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	
2	2109	7L92	2-3	Unico	23 00658/2023	TETO CONSTRUTORA	BR-153	1,20	2,90	Acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	13/11/2023	14/08/2025	R\$ 28.642.875,99	4,6%	Executando canteiro. Pendências com projetos e desapropriação. Previsão de concluir os acessos em 2025.	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	
2	2109	7L92	2-3	Unico	23 00658/2023	TETO CONSTRUTORA	BR-153	1,20	2,90	Acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	13/11/2023	14/08/2025	R\$ 28.642.875,99	4,6%	Executando canteiro. Pendências com projetos e desapropriação. Previsão de concluir os acessos em 2025.	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	
3		130Z	2	Unico	23 00748/2023	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-010	806,50	807,10	Ponte sobre o Ribeirão Aldeia Grande e acessos	18/12/2023	07/10/2025	R\$ 8.450.000,00	0%	Aguardando empenho para iniciar a obra e assinar a supervisão.	Edital 0600/23-23	DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA	
4		152W	3	Unico	23 00426/2024	MODR EDIFICAÇÕES LTDA	BR-010	134,60	141,70	Remanescente de implantação	04/07/2024	26/10/2025	R\$ 16.299.465,70	51,89%	Obra em andamento. Revista RFO em jul/2025 para tratar de jazida.	23 00456/2024	NEOCONTEC CONSULTORIA TÉCNICA	
5		167Q	3	Unico	00 00958/2024	CONSORCIO PENEDO / NEÓPOLIS	BR-226	0,00	1,70	Boraração de projeto e execução da reconstrução de ponte sobre o rio Tocantins	31/12/2024	22/12/2025	R\$ 171.969.000,00	18,42%	Executando fundações e pilares correspondente à etapa de projeto aprovada. Algumas disciplinas de projeto ainda em análise	00 00063/2025	CONSORCIO GEOSISTEMAS-PROSUL	
Obras a licitar																		
A LICITAR		ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO		PROCESSO DA LICITAÇÃO		EDITAL		SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
L1		2111	5E15	3	BR-242		BR-242/TO - Construção - Lote 5						Plano de mitigação de impactos efetivos e plano de compensação espeleológica encaminhados ao IBAMA para análise.					
L2		2502			BR-235		Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153)						Previsão de contratar a obra no segundo semestre de 2025					

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
