


- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Planejada
- Tipos de Intervenção**
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 1,30 Km
  - DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 67,00 Km
  - A LICITAR
  - OAE\*
- Total 68,30 Km**

\* Contrato envolvendo obras de OAEs ao longo do trecho da rodovia. Devido à quantidade de OAEs, o contrato encontra-se representado por um segmento formado pela localização da primeira e última OAEs.

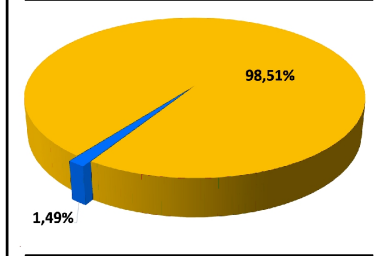

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	3085	110Q	3	2.1	21 00512/2024	MA TERA ENGENHARIA LTDA	BR-101	1,20	77,30	0 Remanesce de OAEs e Passarelas	08/12/2024	28/05/2027	R\$ 23.221.390,18	25,89%	Execução de todas as passarelas inferiores e superiores em andamento	21 00923/2024	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
2	3085	110Q	3	2.2	21 00409/2021	CONSTRUTORA LUZ COSTA	BR-101	51,80	77,30	25,5 Remanescente da duplicação	23/08/2021	31/03/2027	R\$ 185.052.339,22	52,41%	Executando terraplenagem, drenagem e pavimentação. Concluído desvio de Carmópolis	21 00923/2024	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
3	3085	110Q	3	Único	21 00259/2025	CONSORCIO PEDRA BRANCA - HB20 - CLPT	BR-101	77,00	78,30	1,3 Remanescente da Travessia de Pedra Branca	06/06/2025	06/06/2027	R\$ 56.543.275,35	6,82%	Projetos aprovados com OS emitida para execução em obra em Dez/25	Edital 0322/24-21	EM LICITAÇÃO
4	3085	110Q	3	2.2	21 00820/2025	CONSORCIO BR-101/SE - HB20-CLPT	BR-101	51,80	77,30	25,5 Complementação das obras de dupl Trecho Norte - Pedra Branca	26/12/2025	16/09/2027	R\$ 97.486.944,14	3,69%	Contrato assinado e Ordem de Serviço de execução emitida em Dez/25	21 00923/2024	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
5	2106	110R	3	5.1	00 00798/2025	CONSORCIO FP/ CONSERVA	BR-101	152,60	168,60	16 Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.1	29/01/2026	03/02/2030	R\$ 204.580.859,22	0%	Contrato nº 798/2025 assinado e com emissão de Ordem de Serviço de projeto em Fev/26	Edital 0477/24-21	EM LICITAÇÃO
6	2106	110R	3	5.3	21 00087/2026	CONSORCIO IVA/ING-SOTEPA	BR-101	189,00	206,10	19,1 Duplicação e implantação de variantes na BR-101/SE - Lote 5.3	27/03/2026	27/03/2030	R\$ 294.695.458,99	0%	Contrato 87/2026 assinado com emissão de OS 7em Mar/26	Edital 0477/24-21	Em Licitação

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2106	110R	3	5.2	BR-101	189,00	Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.2	50621.001005/2025-87	0500/2025-21	Edital 500/25-21 de contratação publicado e resultado homologado. Com previsão de assinatura de contrato em Jun/2026.	Edital 0477/24-21	Em Licitação

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
