



Aprender
CONECTADO

ESCOLAS
CONECTADAS

DA ESCOLA PARA O FUTURO.
DO BRASIL PARA O MUNDO.

EACE em números

2026

5.036 km

de fibra óptica implantada

70 mil

Access points Instalados

83%

Escolas concluídas
Rede Externa, Rede Interna e Gerador Solar
(Piloto, Fases 2&3, 4.1 e 4.2)

154 Mbps

Velocidade média contratada
(Terrestre)

53

Escolas/dia útil
(mar/2026)

+114

Equipes
distribuídos em todas
estados do Brasil

49 Mbps

Velocidade média contratada
(Satélite)

EACE no Brasil



1.977 mil estudantes




Municípios
2.244
contemplados



Escolas rurais
15.531



Escolas Indígenas
1.025
Escolas em área
quilombola
1.079

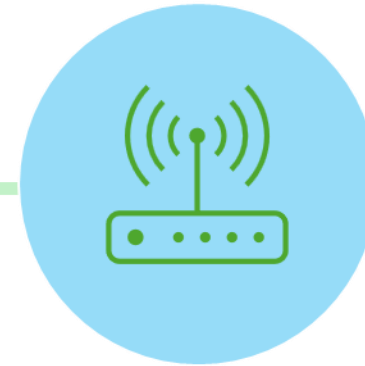

Velocidade/Matrícula
2,2 Mbps
(download)




Energia Solar
6.498
kWh/dia
instalados


		NORTE	NORDESTE	CENTRO OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
	REDE EXTERNA	5.456	9.437	381	1.275	2.362	18.911
	REDE INTERNA	6.504	9.896	392	1.294	2.346	20.432
	GERADOR SOLAR	1.469	46	5	3	0	1.523
	ESCOLAS CONCLUÍDAS	5.477	9.167	339	1.248	2.291	18.562

(*) Inclui Piloto, Fase 2&3, 4.1 e 4.2

PLANEJADO x REALIZADO

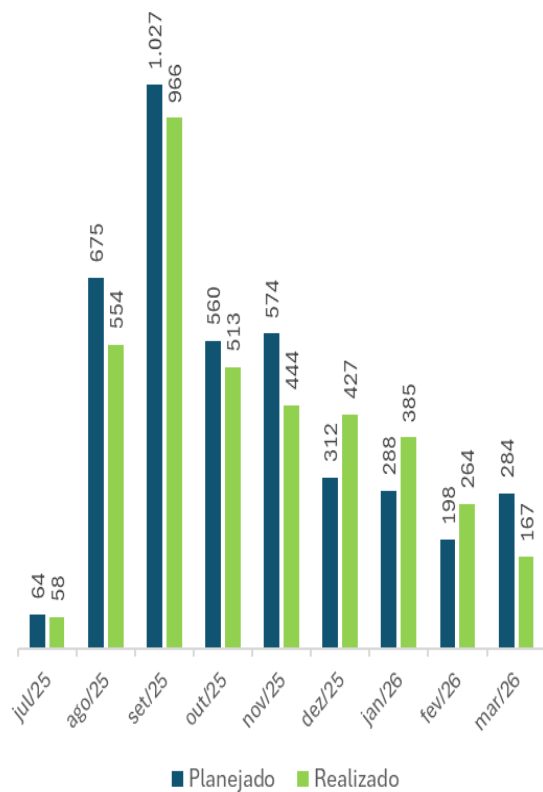


EVOLUÇÃO - Acumulado

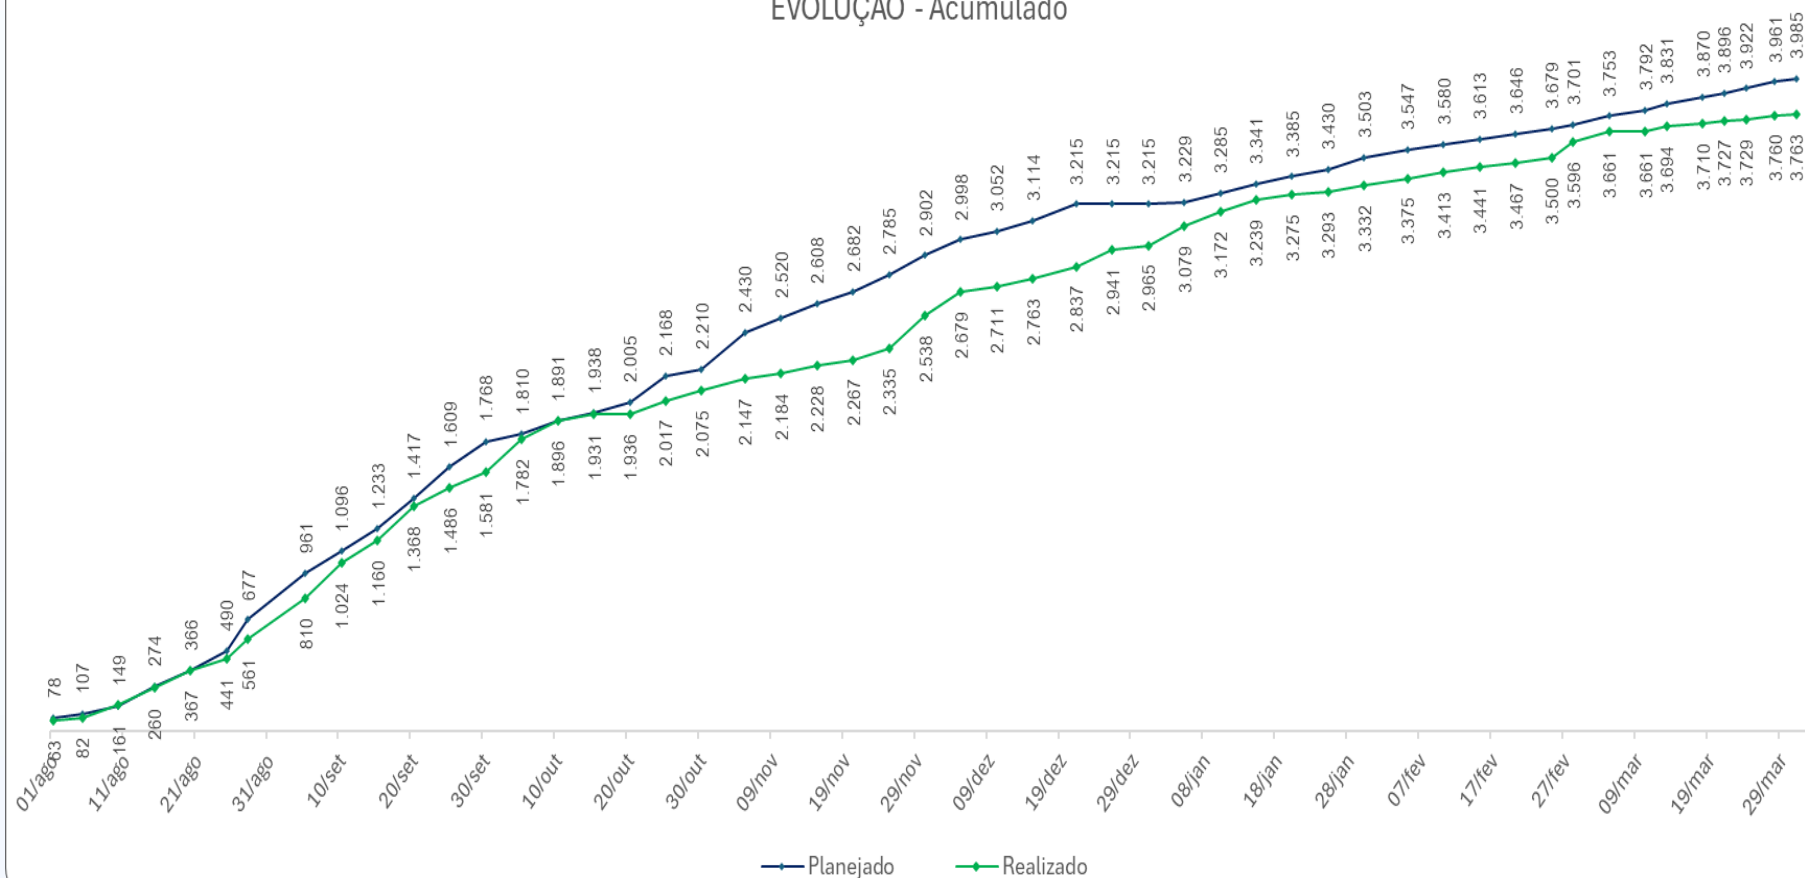




18.562 escolas concluídas


EVOLUÇÃO - Acumulado

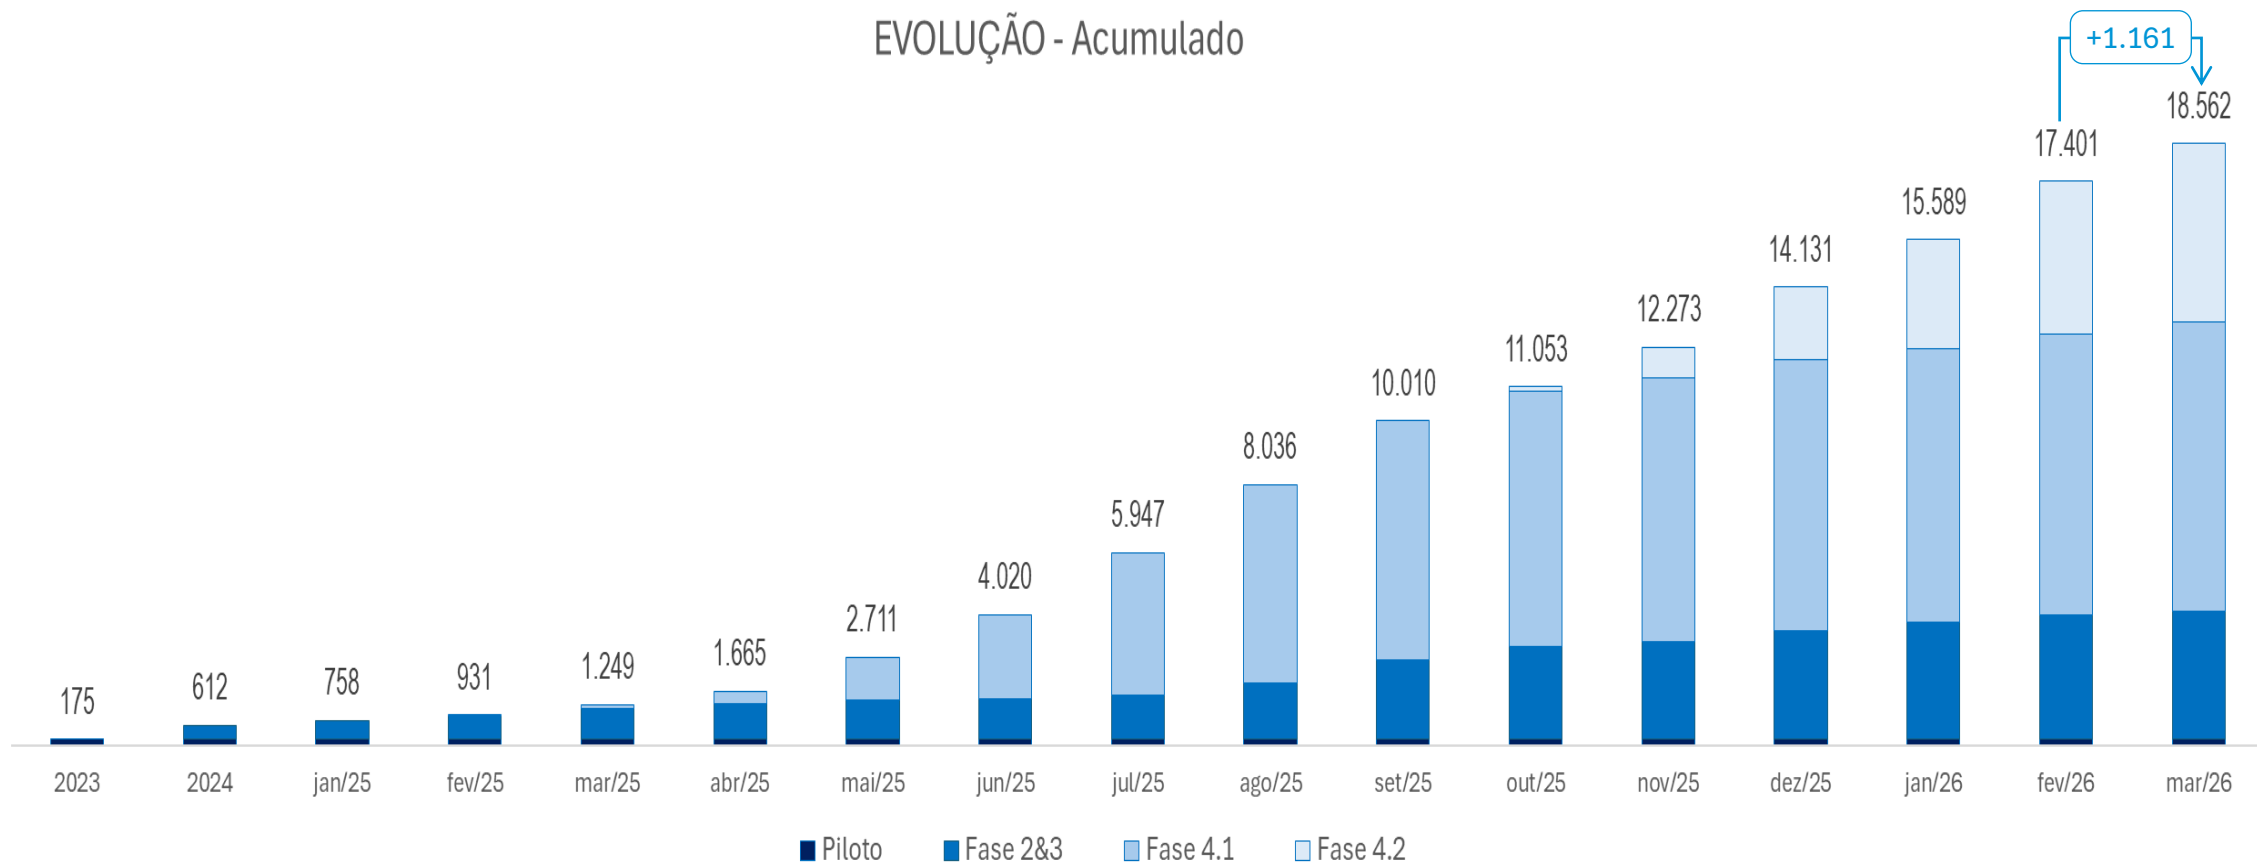


FASE 2&3

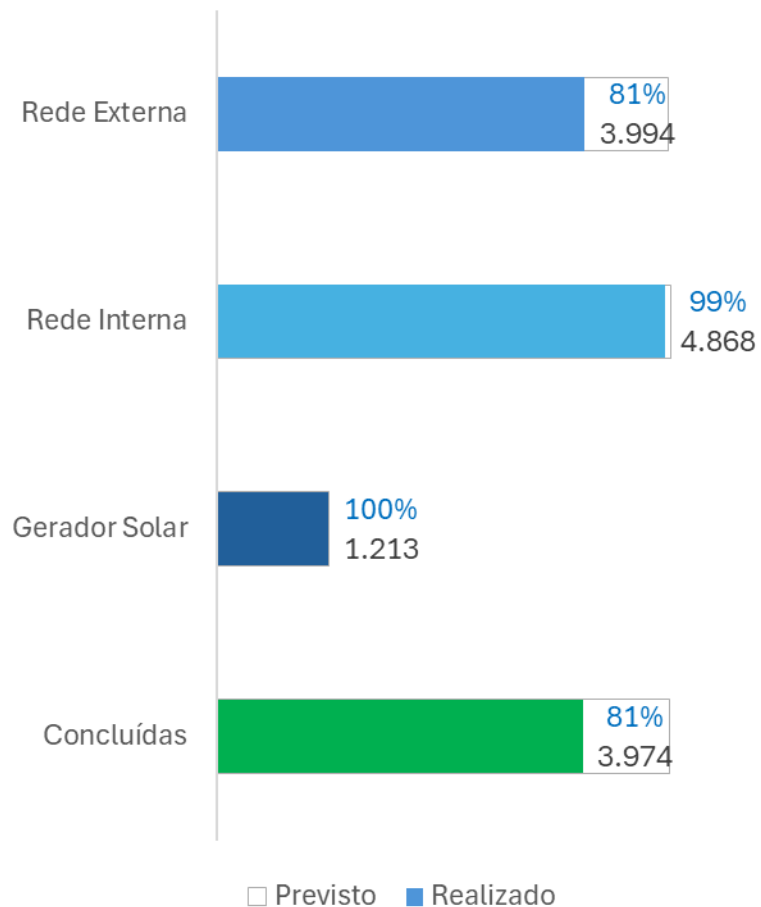


FASE 4.1

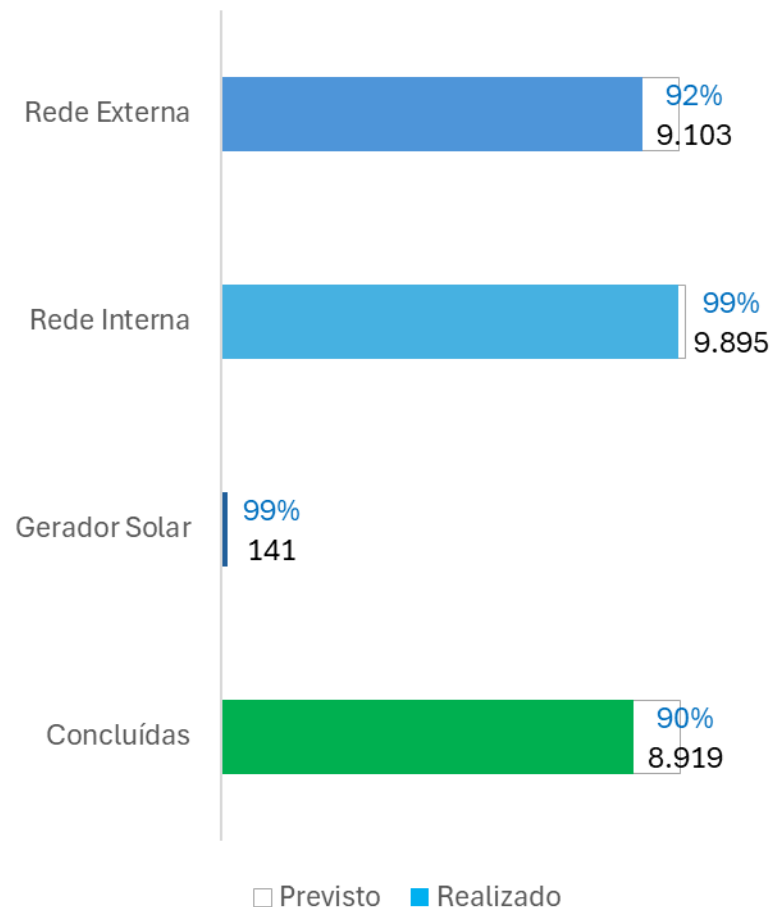


FASE 4.2

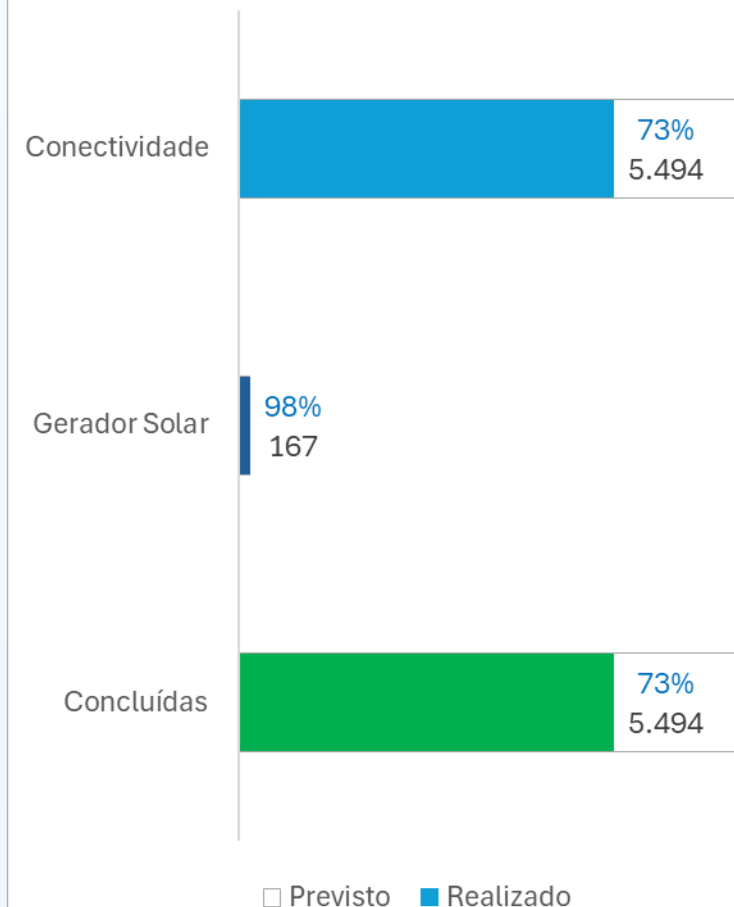

PLANEJADO

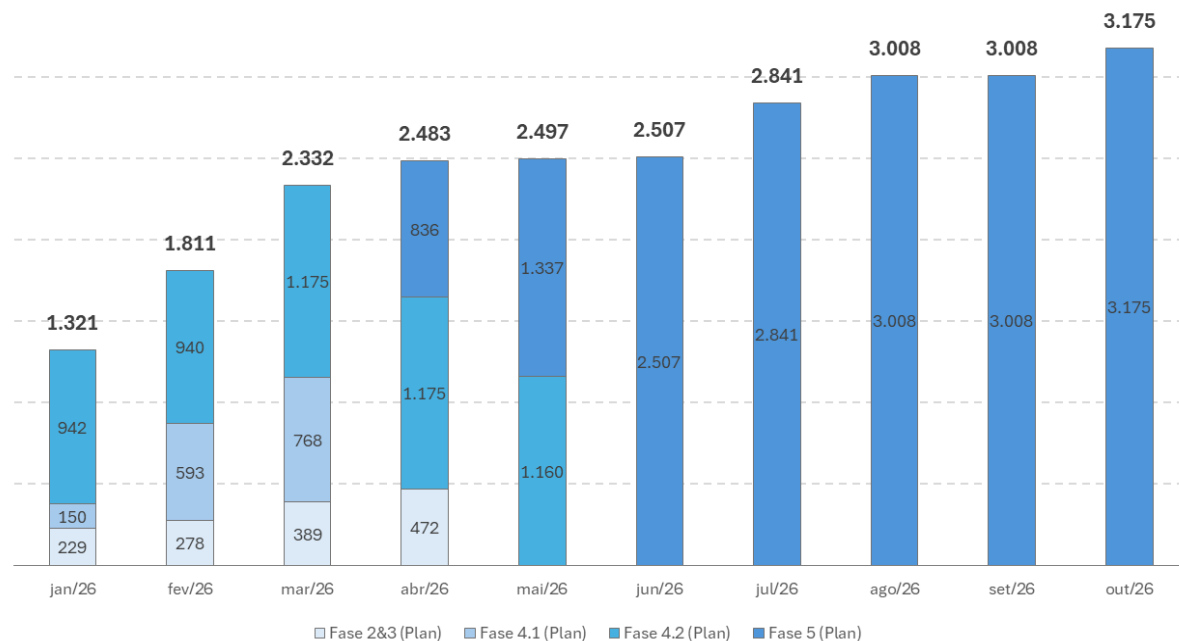

REALIZADO

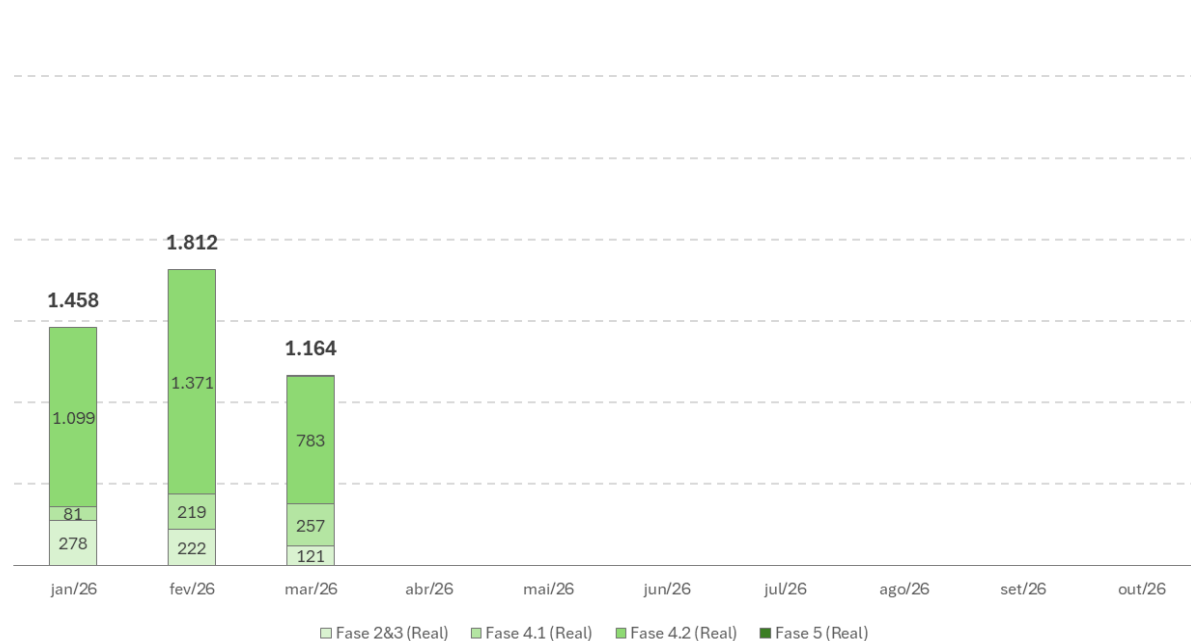

Impedimentos impactando evolução

IMPEDIMENTOS		Fase 2&3	Fase 4.1	Fase 4.2
Sem energia	696	616	59	21
Obras	171	52	16	103
Validação MEC	41	1	16	24
RE outras políticas	31	4	27	0
Mud Endereço	18	7	11	0
Sem acesso	13	11	2	0



48 – Fase 2&3


421 – Fase 4.1


1.435 – Fase 4.2

4.555 – Fase 5

2.480 – Não previsto

Migração Gesac 9k → Aprender Conectado (Planejado x Realizado)

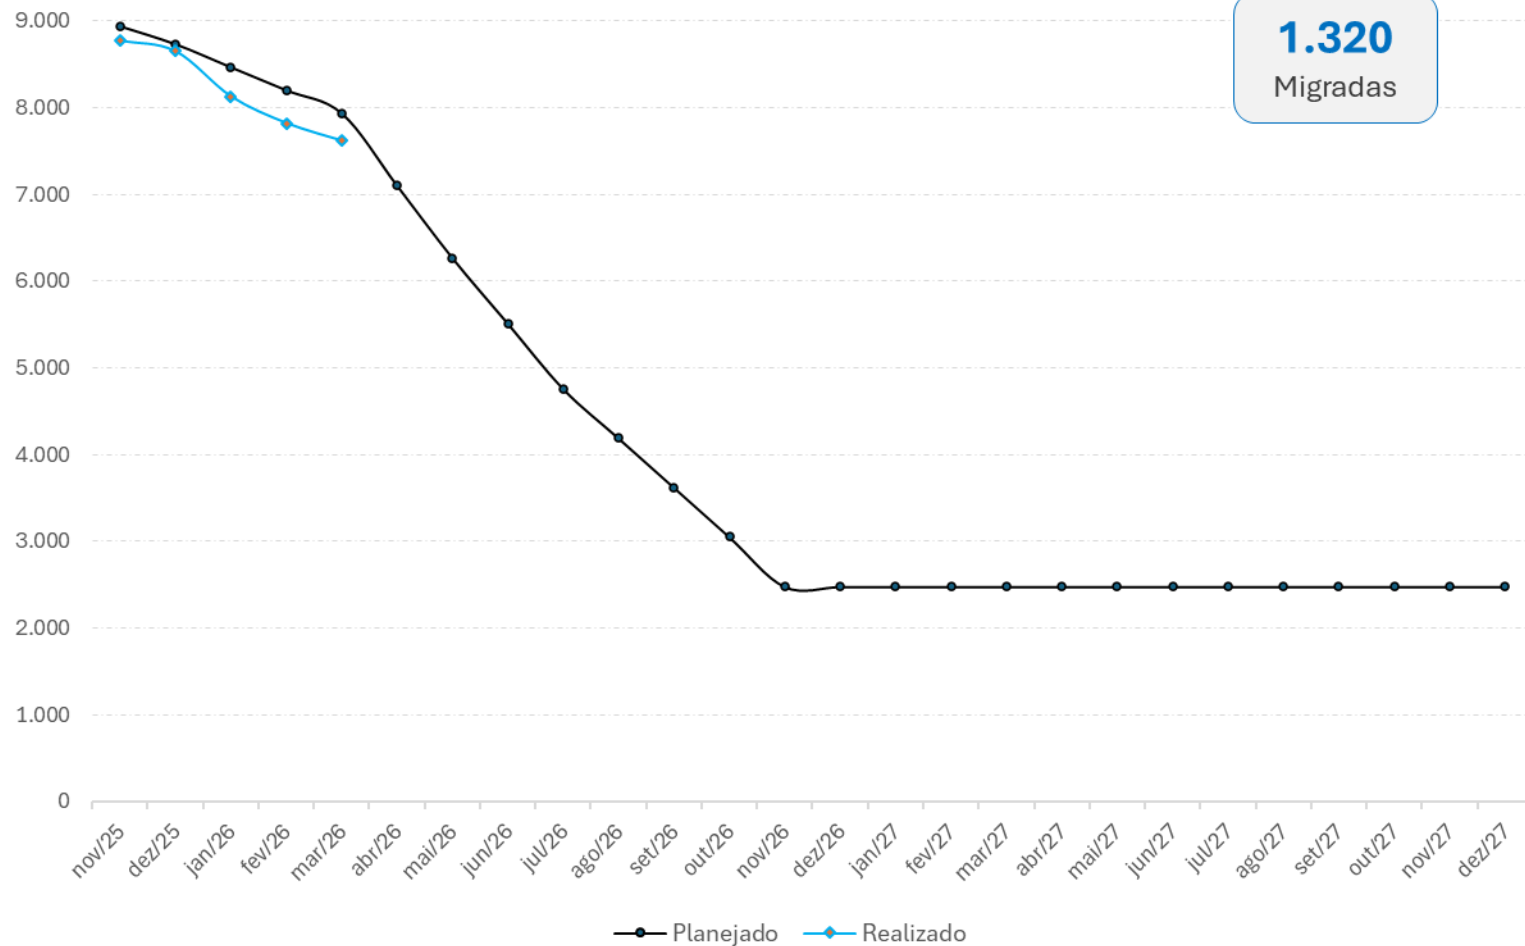

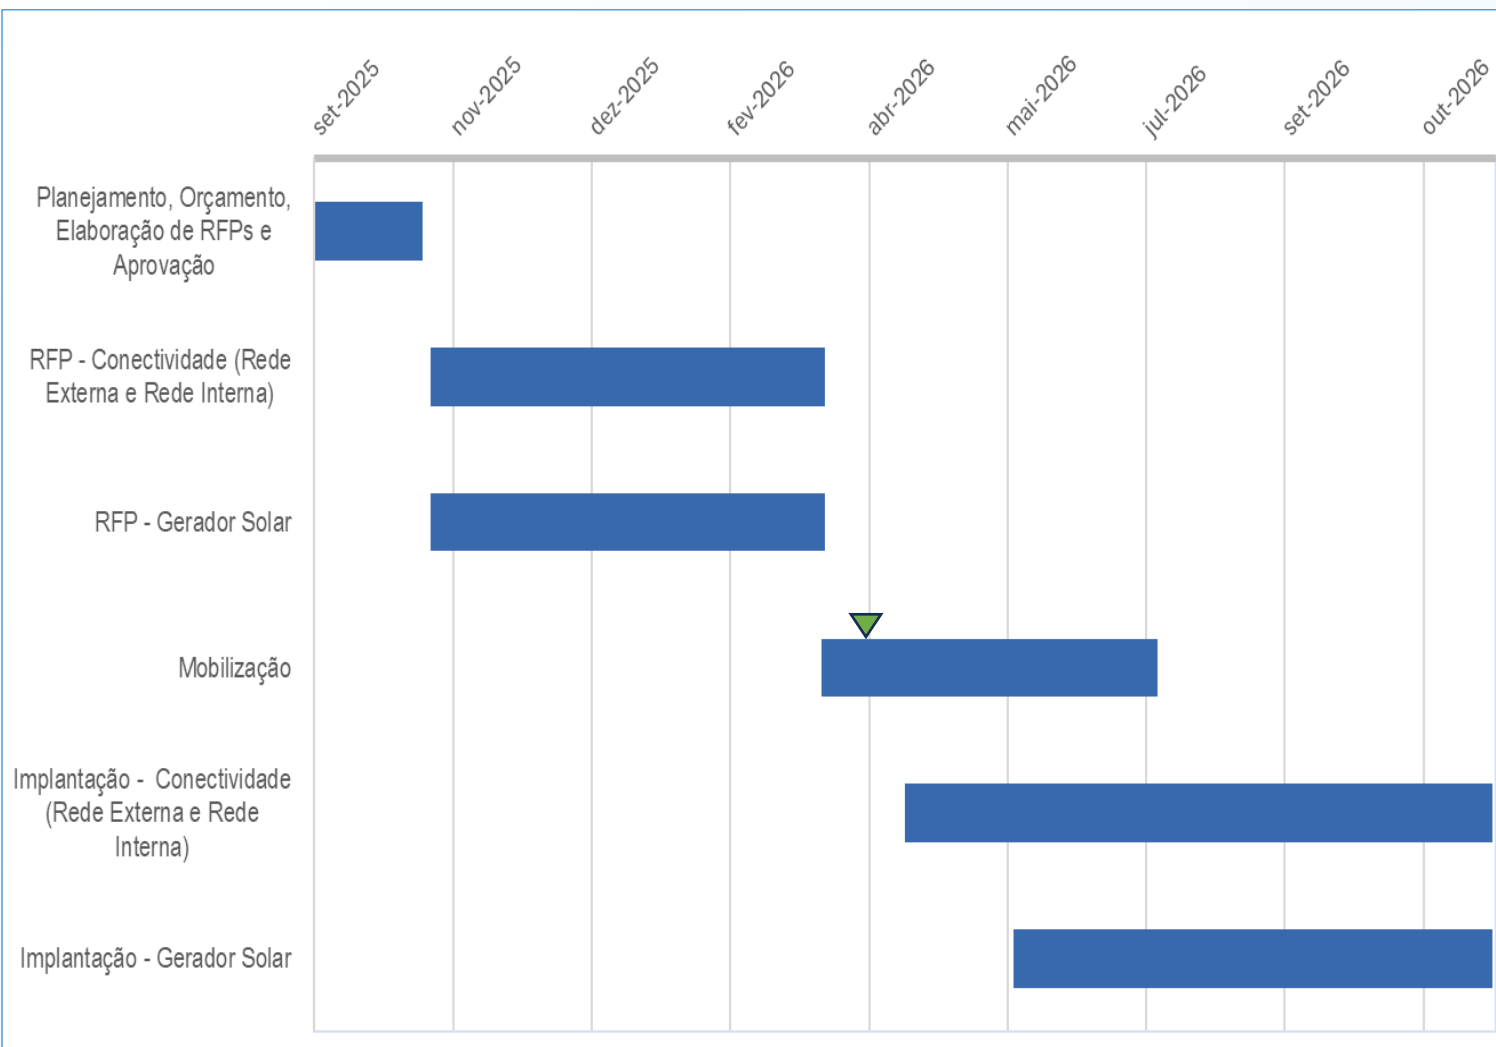**RFP – contratação concluída**

- 16.536/16.712 escolas com fornecedor contratado
 - RE+RI: 8 fornecedores
 - GS: 1 fornecedor

Mobilização dos fornecedores em andamento




- Kickoff concluído com 4 fornecedores

Aproximação com as secretarias em andamento

- Contato com as SEMEDs/SEDUCs
- Refinamento de informações [240 escolas já mapeadas desativadas/recusadas]


A definir

- 176 escolas sem viabilidade de atendimento por meio terrestre

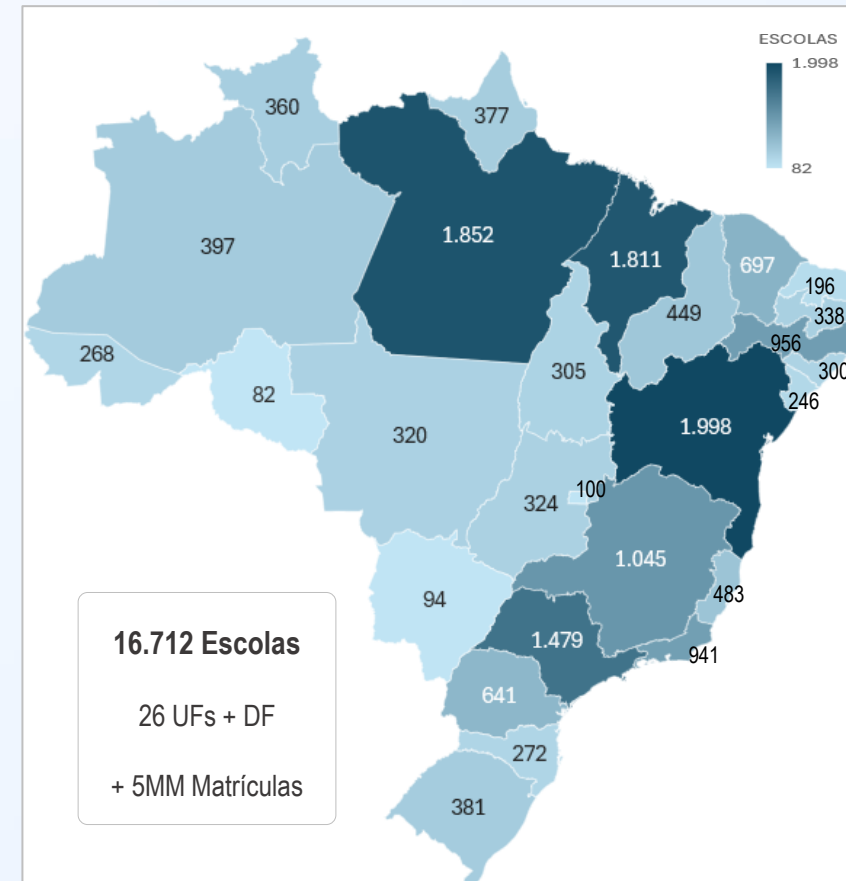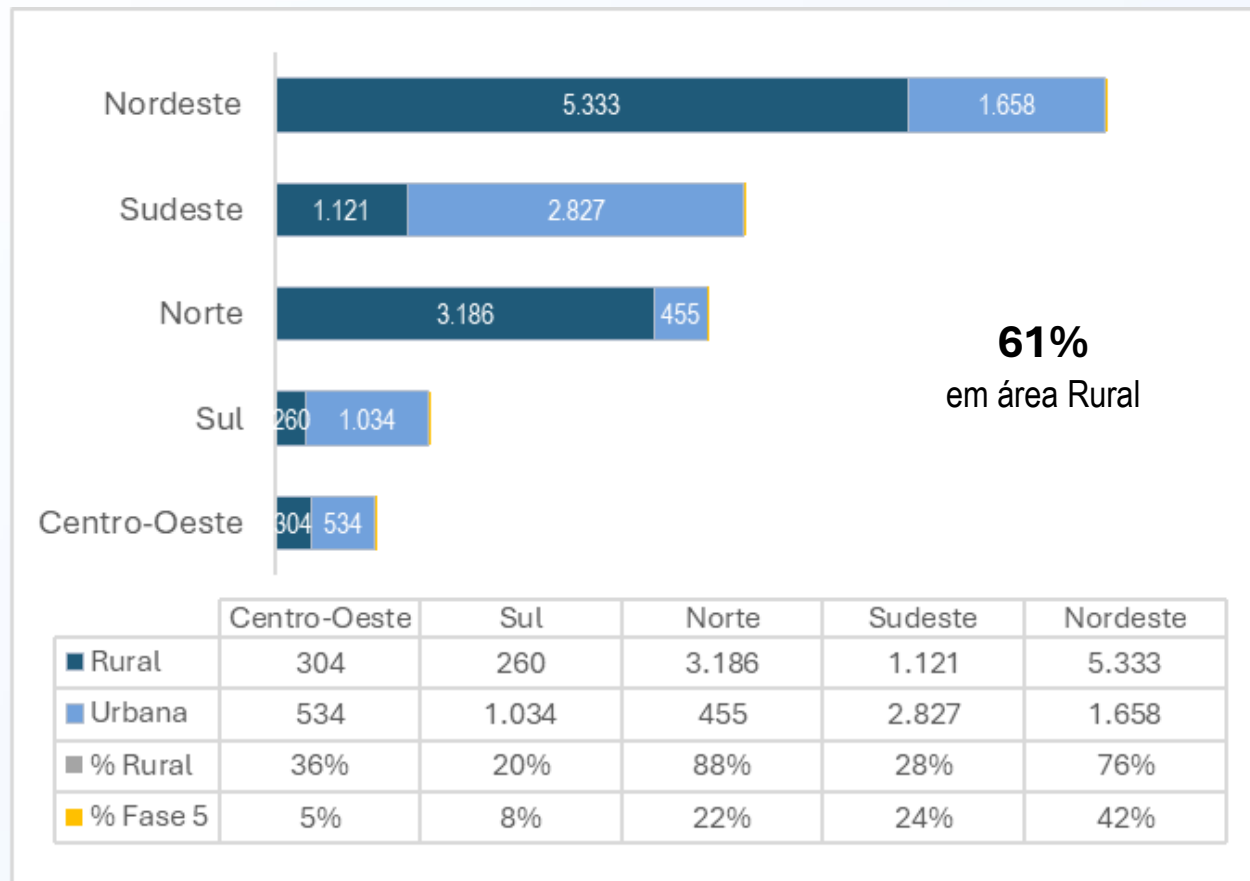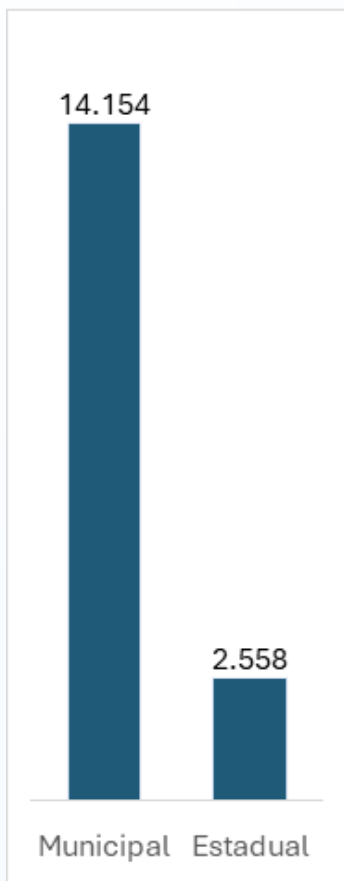

RACIONAL

- Atendimento simultâneo em todas as regiões geográficas do país com várias frentes de trabalho atuando com volume médio de ~1.400 escolas/lote
- Maximizar eficiência logística por meio de possíveis ganhos com sinergia regional
- Explorar perfil x capacidade de atendimento dos fornecedores
- Otimizar gestão operacional considerando organização regional

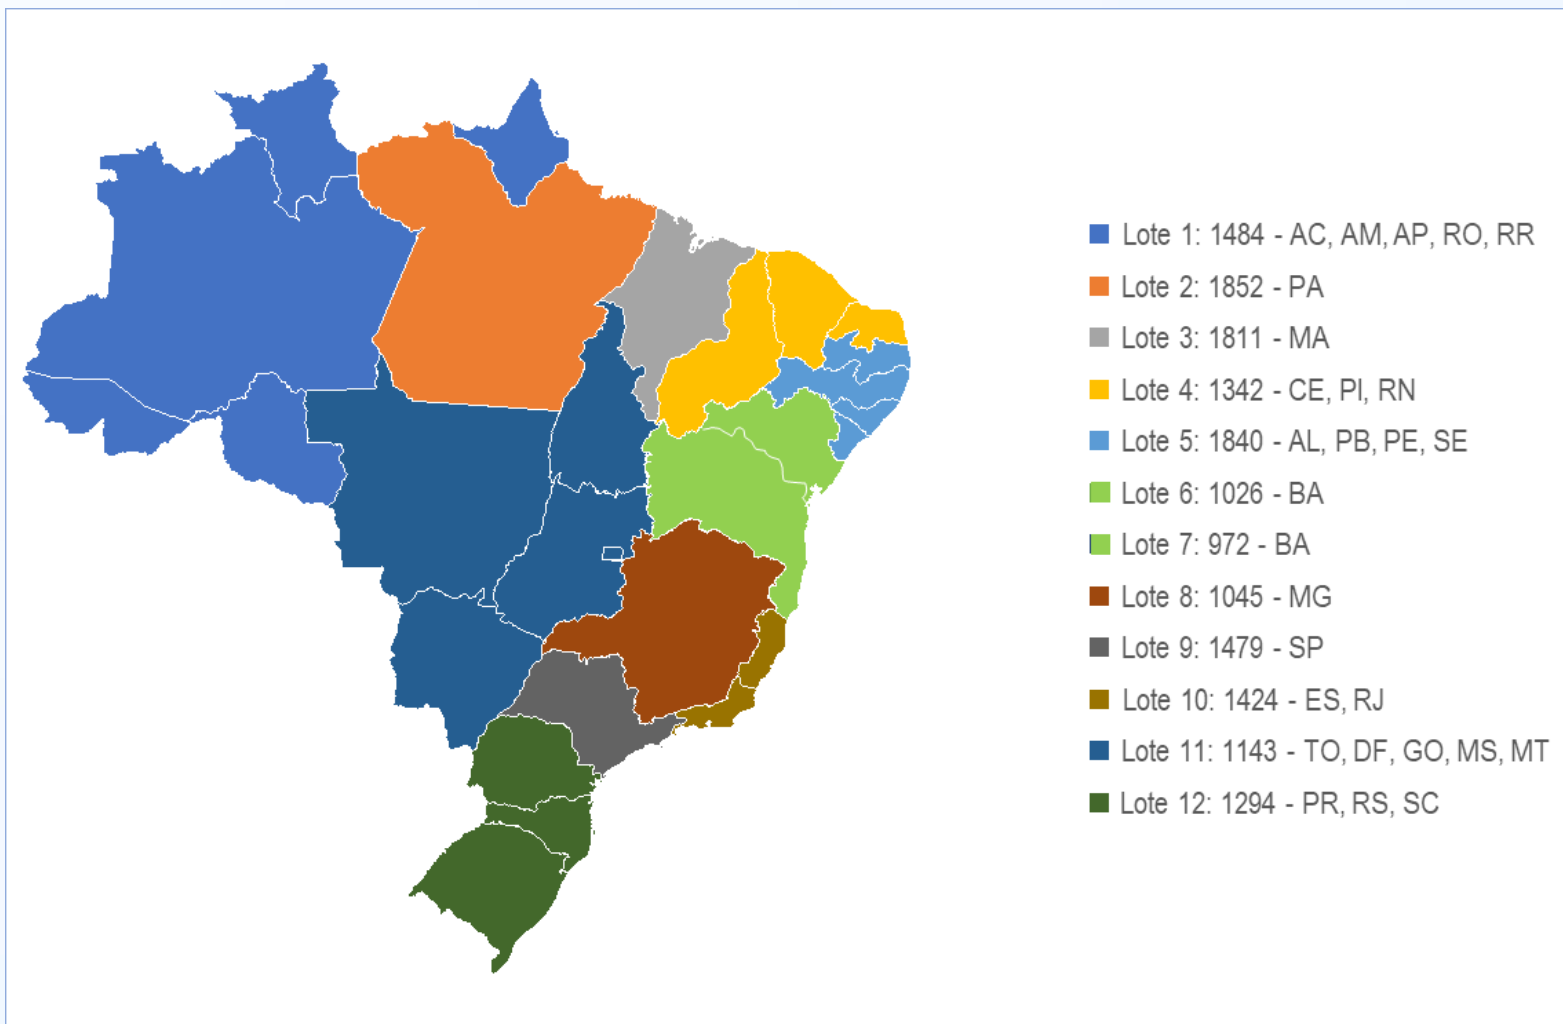

Ciclo na Cidade-Polo (Hubs)

☐ Visitas à SEMED

- ✓ Apresentação do programa
- ✓ Validação de lista de escolas
- ✓ Alinhamento de janelas de acesso

☐ Comunicação às Escolas


- ✓ Aviso das equipes e datas
- ✓ Confirmação de acesso às dependências
- ✓ Sensibilização dos gestores

☐ Direcionamento das Empresas

- ✓ Empresas saem da cidade-polo para:
 - o Implantar rede de Internet
 - o Instalar rede Wi-Fi
 - o Registrar evidências

☐ Fiscal volta às escolas

- ✓ Confere qualidade da instalação
- ✓ Usa checklist técnico
- ✓ Valida cobertura Wi-Fi
- ✓ Fecha o ciclo no polo com relatório consolidado

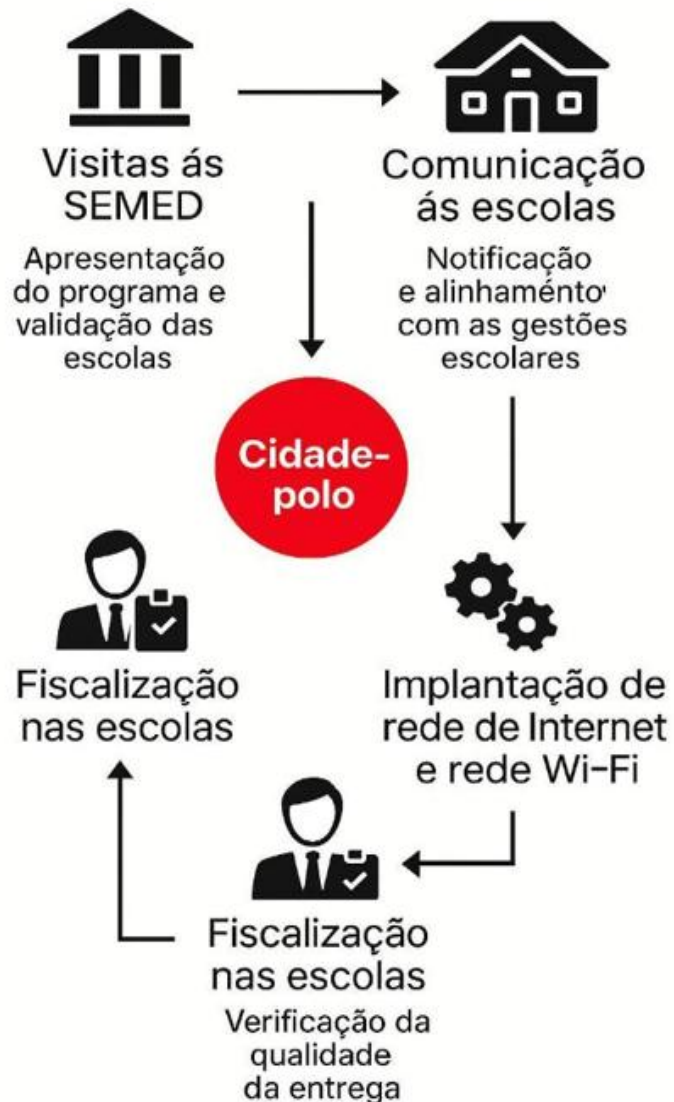

- Premissas do Modelo**

Planejamento baseado na capacidade declarada pelos fornecedores

Estruturação por equipes e produtividade

Ciclos operacionais (mobilização → produção)

Modelo orientado à escala

- Estrutura de Gestão**

Modelo único de planejamento

Acompanhamento contínuo da execução

Governança sobre fornecedores

Validação prática da execução em campo

- Impacto no Projeto**

Maior previsibilidade

Redução de riscos de atraso

Evolução na mgestão de fornecedores

Eficiência operacional

Ajuste dinâmico do plano

	UF	Quant	30D	60D	90D	120D	150D	180D
XXX	Lote 2	1811	Mobilização		295	472	554	490
	Lote 3	1455			251	355	444	405
	Total	3266			546	827	998	895
	UF	Eqp	30D	60D	90D	120D	150D	180D
XXX	Lote 2		Mobilização		43	82	80	70
	Lote 3				36	51	64	58
	Total				79	133	144	128
Produtividade		0,31	0,26	0,31	0,32			
		0,32	0,32	0,32	0,32			

Obrigado!
