



Panorama Ferroviário

# Transnordestina

Secretaria Nacional de  
Transporte Ferroviário



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO




# Ferrovia Transnordestina



Concessão Transnordestina Logística S.A.

## SITUAÇÃO ATUAL

- 65% das Obras executadas
- 232 km em obras
- 2.581 empregos diretos
- Início de operações em 2025
- Previsão de conclusão em 2027
- Saldo a executar: R\$ 7,9 Bilhões

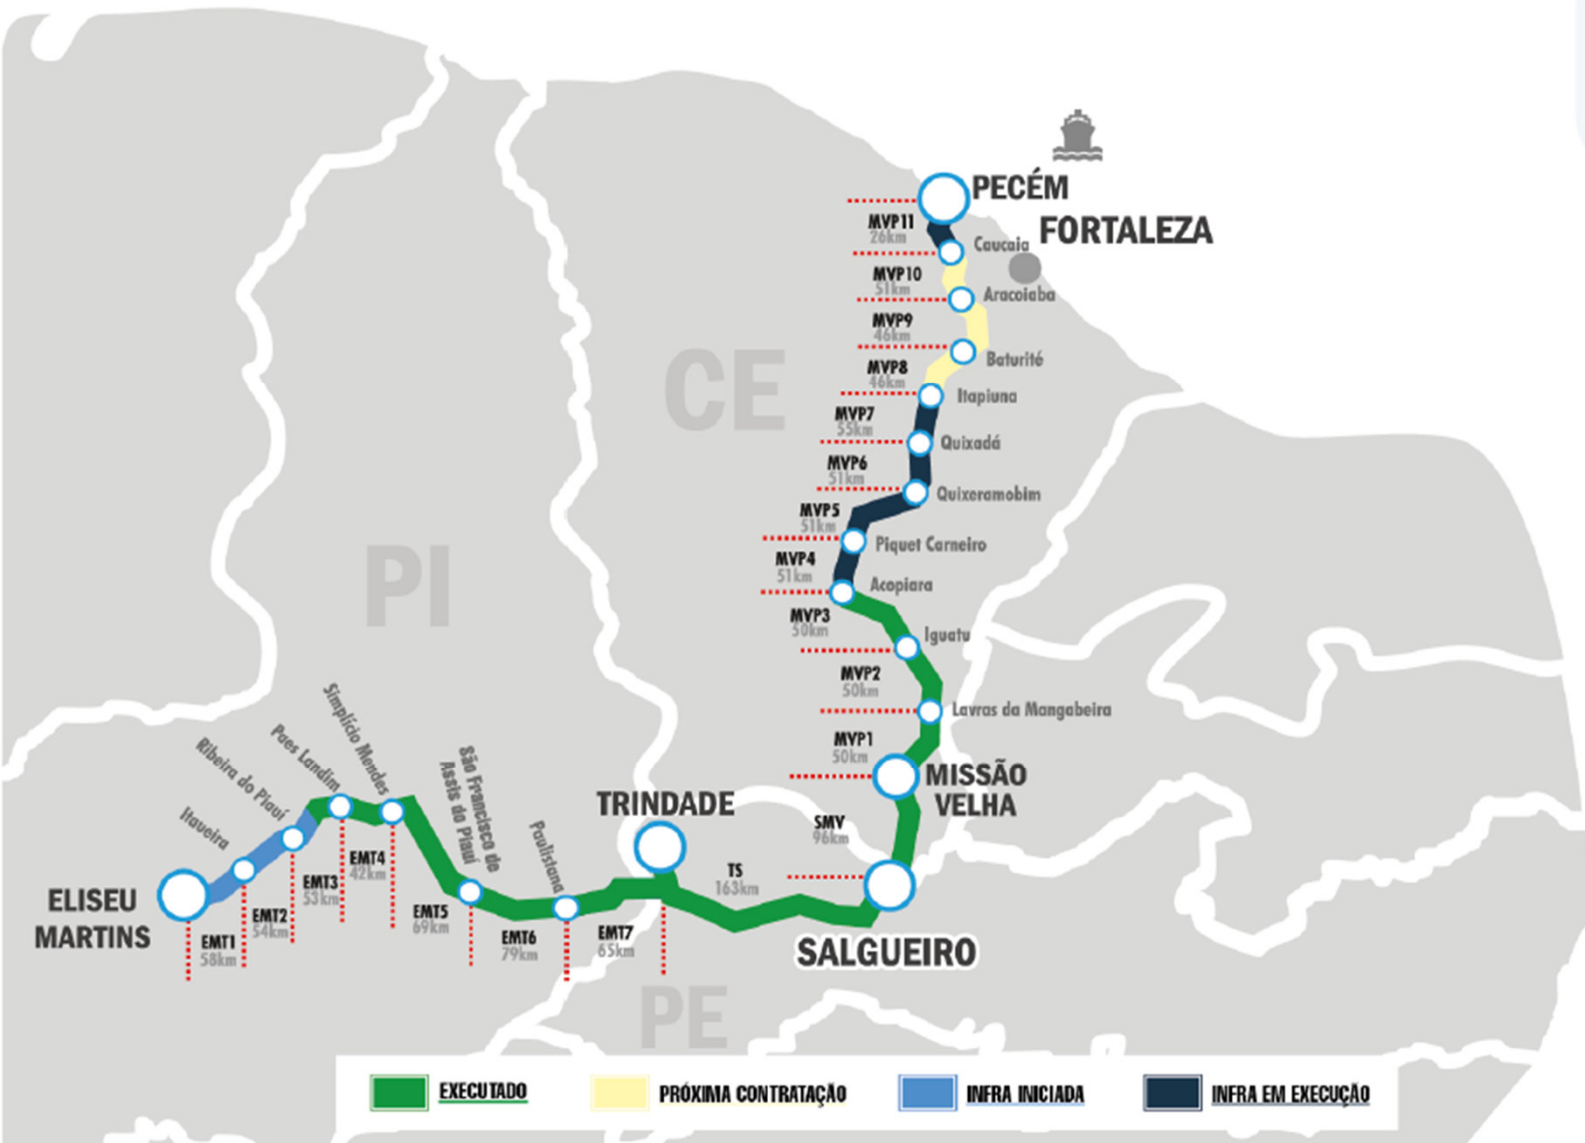





# Ferrovias Salgueiro - Suape



Trecho Pernambucano (INFRA S.A.)

## SITUAÇÃO ATUAL



EF - 232 Transnordestina - Trecho Salgueiro - Suape

|              | SALGUEIRO              |                        | IGREJA DE CUSTÓDIA     |                        |                        |                        |                        |                      | PORTO DE SUAPE       |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Lotes Atuais | SPS 01                 | SPS 02                 | SPS 03                 | SPS 04                 | SPS 05                 | SPS 06                 | SPS 07                 | SPS 08               | SPS 09               |
|              | 65 KM                  | 54 KM                  | 60 KM                  | 73 KM                  | 53 KM                  | 44 KM                  | 53 KM                  | 57 KM                | 85 KM                |
| Situação     | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 100% | Imissão na posse: 0% | Imissão na posse: 0% |
|              | Obra: 100%             | Obra: 100%             | Obra: 100%             | Obra: 37%              | Obra: 24%              | Obra: 0%               | Obra: 0%               | Obra: 0%             | Obra: 0%             |
| TRECHO A     |                        |                        | TRECHO B               |                        |                        | TRECHO C               |                        | TRECHO D             |                      |
|              |                        |                        | ~ 126 km               |                        |                        | ~ 97 km                |                        | ~ 142 km             |                      |



Ferrovia  
**Salgueiro - Suape**



## AVANÇOS

- **Levantamento de eventuais passivos existentes** desde as últimas obras realizadas pela TLSA em 2014
- **Retomada das Desapropriações** e eventuais ajustes nas desapropriações realizadas
- Obtenção da **Licença de Instalação** dos dois últimos lotes (SPS 8 e 9)
- **Assunção das Obras e demais atividades correlatas:**
  - ❖ Celebração do Convênio de Delegação entre DNIT e Infra S.A.
- **Contratação integrada das Obras (Lotes 4 e 7):**
  - ❖ Edital em Ago/2025
  - ❖ Contratação em Dez/2025
  - ❖ Obras no 1º semestre/2026



# Ferrovias Salgueiro - Suape



## ESTIMATIVA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS

|      |  |   |                 |              |
|------|--|---|-----------------|--------------|
| 2025 | <u>Publicação do Edital de contratação do lote SPS4 (bronwfield)</u> | Custódia /<br>Arcoverde<br>73 km          | R\$ 600 milhões | agosto-25    |
| 2025 | <u>Assinatura do contrato de obras do lote SPS4 (bronwfield)</u>     |   |                 | dezembro-25  |
| 2026 | Publicação do Edital de contratação do lote SPS5 (bronwfield)        | 35 km                                     | R\$ 350 milhões | março-26     |
| 2026 | Assinatura do contrato de obras do lote SPS5 (bronwfield)            |   |                 | julho-26     |
| 2026 | Publicação do Edital de contratação dos lotes SPS 5 e 6              | 62 km                                     | R\$ 725 milhões | fevereiro-26 |
| 2026 | Assinatura do contrato de obras dos lotes SPS 5 e 6                  |   |                 | junho-26     |
| 2025 | <u>Publicação do Edital de contratação do lote SPS7</u>              | Cachoeirinha /<br>Belém de Maria<br>53 km | R\$ 620 milhões | setembro-25  |
| 2025 | <u>Assinatura do contrato de obras do lote SPS7</u>                  |   |                 | dezembro-25  |
| 2026 | Publicação do Edital de contratação dos lotes SPS 8 e 9              | 160 km                                    | R\$ 1,6 bilhão  | maio-26      |
| 2026 | Assinatura do contrato de obras dos lotes SPS 8 e 9                  |   |                 | outubro-26   |



A nossa  
maior entrega  
é o futuro do  
*Brasil*



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
