

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DA SUDENE

4º ciclo de monitoramento  
e avaliação 2021



MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da Sudene  
4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2021**

**RECIFE/PE  
2021**

## **Sumário**

1.	Introdução	1
2.	Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários	1
3.	Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	8
4.	Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	19
5.	Indicadores de Gestão de Convênios	25
6.	Indicadores de Gestão de Pessoas	31
7.	Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	34
8.	Metas de desempenho institucional para o período out/2021 - set/2022	45
9.	Conclusão	51

## **Lista de Anexos**

ANEXO I - Planos Operativos do Monitoramento;

ANEXO II - Gestão Orçamentária e Financeira (Posição até dezembro/2021);

ANEXO III - Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene;

ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA;

ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da Sudene;

ANEXO VI – Planos Operativos Prioritários;

ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene;

ANEXO VIII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA;

ANEXO IX – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da Sudene.



## 1. Introdução

---

A Sudene, por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o **4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2021** dos Planos Operativos e indicadores elaborados e acompanhados pelas Coordenações-Gerais das Diretorias de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN) e Diretoria de Fundos e de Atração de Investimentos (DFIN). O referido ciclo manteve o processo de monitoramento de sua programação com base no planejamento estratégico vigente, tendo sido elaborado com base na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada pela 121ª reunião da Diretoria Colegiada em 01/11/2012.

Tendo em vista que o ciclo de monitoramento da Sudene é realizado trimestralmente, cabe destacar que este foi o último relatório do ano 2021, tendo como data de fixação para atualização dos dados 31/12/2021. Este documento compõe os resultados obtidos por meio dos indicadores de desempenho destinados a acompanhar tanto a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, como dos incentivos fiscais, dos convênios, da gestão de pessoas e da comunicação social e marketing. Adicionalmente, apresenta também todos os projetos e suas etapas por meio de planilhas eletrônicas que podem ser vistas nos (Anexos I e VI).

Neste último ciclo de 2021, foram monitorados **228** projetos, dos quais: 10 foram concluídos, 196 estão em andamento, 12 estão atrasados em sua execução, 5 estão paralisados e 5 a iniciar. Destaca-se que não houveram projetos cancelados neste ciclo.

É relevante destacar a importância desses ciclos de monitoramento na instituição, no sentido não apenas de analisar e acompanhar o andamento dos projetos, mas de permitir que os Gestores e demais interessados tenham conhecimento desde a fase de iniciação à fase de execução e encerramento de cada projeto, proporcionando uma visão abrangente das entregas e resultados da autarquia.

Com o objetivo de manter a transparência e o princípio da impessoalidade, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene por meio do *link*: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/gestao-institucional> para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e acesso à informação.

## 2. Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários.

---

Este tópico apresentará a situação dos Planos Operativos que são conduzidos pelas unidades finalísticas, de gestão e de suporte da Sudene. Entende-se como Planos Prioritários as atividades e projetos interdisciplinares e de alta complexidade ligados diretamente ao atingimento da finalidade da autarquia, que é a promoção do desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

É importante esclarecer que os planos prioritários foram submetidos e aprovados pela Diretoria Colegiada, por meio dos documentos: ata da 304ª reunião da Diretoria Colegiada, de 16 de maio de 2018 e Resolução nº 281/2017. Isso explica o fato de estarem separados por anos 2017 e 2018.

## 2.1 – Resultados Gerenciais do 4º Ciclo de Monitoramento 2021.

Neste ciclo, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional atualizou, juntamente com as unidades responsáveis, os *status* e etapas dos projetos e apresentou por meio do quadro a seguir o quantitativo de projetos por Coordenações-Gerais e suas respectivas Diretorias. A fim de proporcionar melhor entendimento, os projetos da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Sustentável - CGDS foram especificados separadamente dos que ficam sob a responsabilidade da COCIC, unidade vinculada à citada Coordenação-Geral.

**Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 4º ciclo 2021,  
por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status**

STATUS	DPLAN				DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	COCIC	CGDF	CGGP	CPTCE	-
A Iniciar	2		2			1		5
Concluído	1	3	2	2	1	1		10
Em Andamento	14	10	7	142	21	1	1	196
Atrasado	1	1		5	5			12
Cancelado								
Paralisado	3			1	1			5
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>150</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>228</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Neste relatório, apresenta-se um comparativo com todos os ciclos anteriores do ano 2021, enfatizando os projetos paralisados, cancelados, atrasados, a fim de demonstrar as variações percebidas:


**Imagem 1 - Comparativo dos projetos com status críticos nos ciclos de 2021:**



De acordo com a imagem, conclui-se que os ciclos mais críticos com projetos em atraso foram os 1º e 2º, havendo um discreto aumento neste 4º em comparação ao 3º. Em relação aos projetos paralisados, houve estabilidade nos 3 primeiros ciclos do ano, havendo diminuição neste último. Por fim, observa-se que os projetos cancelados apresentam números relativamente baixos, chegando a zerar nos 2º e 4º do ano em referência.

Abaixo, segue gráfico com o quantitativo dos projetos por status, contemplando todos os ciclos de monitoramento dos anos 2020 e 2021.

**Gráfico 1 - Comparativo dos Projetos nos ciclos anteriores**

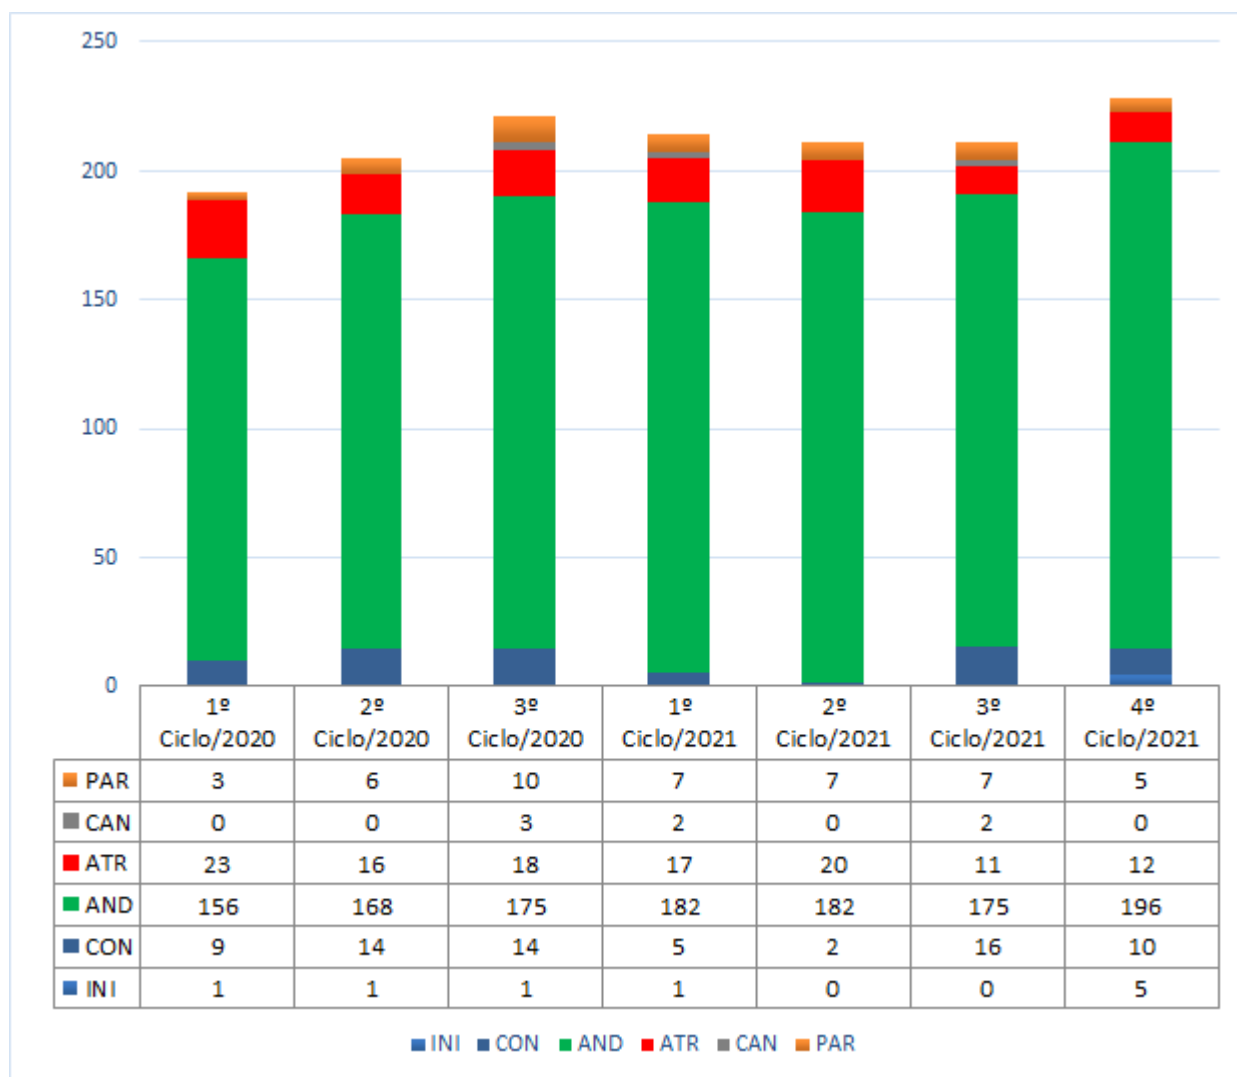

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

**Imagem 2 - Identificação dos projetos críticos no 4º ciclo de monitoramento/2021:**



Os projetos que aparecem na imagem 2 destacados na cor verde, apresentaram o mesmo status no 3º ciclo de monitoramento/2021.

As tabelas 1, 2 e 3 a seguir mostram a distribuição e performance dos projetos, respectivamente, segundo diretrizes e objetivos estratégicos da Sudene; os programas e as ações do PPA; e segundo as unidades administrativas. E o Gráfico 1, em sequência, apresenta a evolução dos projetos monitorados na Sudene ao longo dos ciclos de monitoramento de 2020 até o presente ciclo de 2021.

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo  
Dimensão e Objetivos Estratégicos, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2021**

Dimensão	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1	201	7.203.997,49	4.473.700,47	1	5	178	12		5	201
	2	16	8.770,52	5.191,68	3	3	10				16
<b>Sub-Total</b>		<b>217</b>	<b>7.212.768,01</b>	<b>4.478.892,15</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>188</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>217</b>
2	3	4	1.064,57	1.064,57		1	3				4
	4	2	0,00	0,00			2				2
	5	1	969,57	969,57			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>7</b>	<b>2.034,14</b>	<b>2.034,14</b>		<b>1</b>	<b>6</b>				<b>7</b>
3	7	1	0,00	0,00			1				1
	8										
	9										
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1</b>				<b>1</b>
4	10	2	100,00	9,41	1		1				2
	11	1	50,00	10,80		1					1
<b>Sub-Total</b>		<b>3</b>	<b>150,00</b>	<b>20,21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>7.214.952,16</b>	<b>4.480.946,51</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>228</b>

Posição em dezembro/2021.

4º Ciclo 2021

**Notas:**

<sup>1</sup>As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos**; **2.1.** - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.2.** - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido; **2.3**-Promover a

sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

<sup>2</sup>Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

<sup>3</sup>Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

<sup>4</sup> Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2021**

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029/2017	0355	27	7.102.749,44	4.419.370,34		1	20	5		1	27
	20N7	1	343,59	343,59				1			1
	8689	2	989,48	989,48		1	1				2
	8902	3	1.686,89	339,52			2			1	3
	8917	1	969,57	969,57			1				1
	20WQ	12	7.860,18	2.974,65		2	9	1			12
	7K66	130	79.864,59	41.533,50	1	1	125	2		1	130
	214S	24	14.243,65	10.061,86		1	20	3			24
	8340	11	5.129,80	3.583,08			9			2	11
	4640	2	765,00	560,74			2				2
<b>Sub-Total</b>		<b>213</b>	<b>7.214.602,18</b>	<b>4.480.726,33</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>189</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>213</b>
2111/0032	2000	4	<b>150,00</b>	<b>20,21</b>	1	1	2				4
<b>Sub-Total</b>		<b>4</b>	<b>150,00</b>	<b>20,21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>4</b>
Ações Internas		11	199,97	199,97	3	3	5				<b>11</b>
<b>Sub-Total</b>		<b>11</b>	<b>199,97</b>	<b>199,97</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>				<b>11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>7.214.952,16</b>	<b>4.480.946,51</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>228</b>

Posição em Dezembro/2021.

4º Ciclo 2021

**Notas:**

<sup>1</sup>Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2020-2024: **Programa 2217** - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (Ações: **20WQ** -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; **214S** - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; **8340** - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; **8917**- Fortalecimento das Administrações Locais; **7K66** – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado -**0355** – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; **20N7** – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; **8689** – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; **8902** – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica -

**Ação 4640** - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

<sup>2</sup>Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.<sup>3</sup>Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. <sup>4</sup> Recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2021**

Diretoria	Unidade Adm.	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	21	8.648,44	4.645,20	2	1	14	1		3	21
	CGEP	14	3.524,11	1.754,19		3	10	1			14
	CGCP	11	7.512,24	3.987,67	2	2	7				11
	COCIC	150	92.367,92	51.168,89		2	142	5		1	150
<b>Sub-Total</b>		<b>196</b>	<b>112.052,71</b>	<b>61.555,96</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>173</b>	<b>7</b>		<b>4</b>	<b>196</b>
DFIN	CGDF/FDNE	28	7.102.749,44	4.419.370,34		1	21	5		1	28
	<b>Sub-Total</b>	<b>28</b>	<b>7.102.749,44</b>	<b>4.419.370,34</b>		<b>1</b>	<b>21</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>28</b>
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00			1				1
	CGGP	3	150,00	20,21	1	1	1				3
<b>Sub-Total</b>		<b>4</b>	<b>150,00</b>	<b>20,21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>4</b>
<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>7.214.952,16</b>	<b>4.480.946,51</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>228</b>

Posição em dezembro/2021.

4º Ciclo 2021

**Notas:**


<sup>1</sup>As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/siglas-outubro-2019-pdf>

<sup>3</sup>Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

### 3. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

#### 3.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{21 \times 100}{21} = 100\%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 100,00%
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: Não informado.
- g) Representação gráfica de resultados:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.


**Nota:**<sup>1</sup> até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

#### 3.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{78}{3} = 26,00 \text{ análises/técnico}$



- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor).
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Representação gráfica dos resultados:

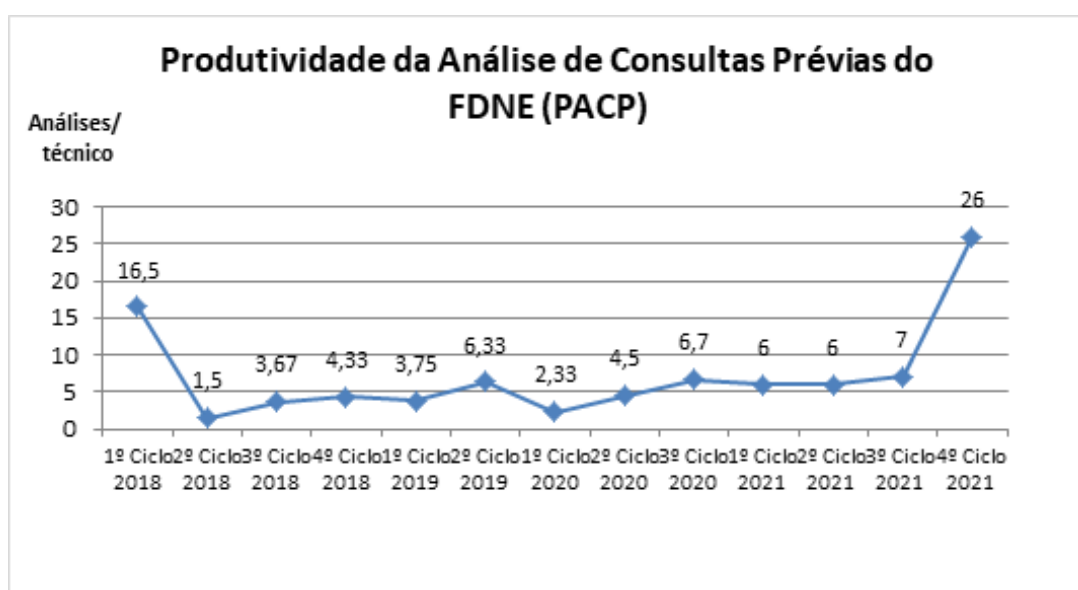


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.  
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

### 3.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{28 \times 100}{78} = 36\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela Sudene).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica dos resultados:

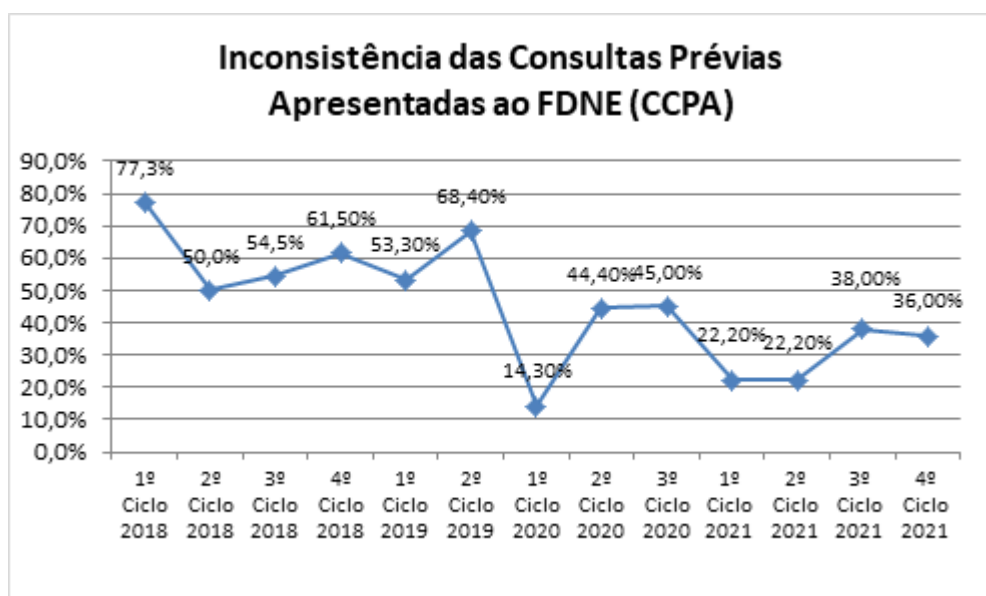

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:

<sup>1</sup> Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a Sudene para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

### 3.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

#### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,00$

#### a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{62,9 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,41$

#### a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): igual ou menor que 1 (um).

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**


f) Comentários: O prazo considerado inclui as prorrogações legais previstas (Art. 20 do Regulamento do FDNE aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012). Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF.

g) Representação gráfica dos resultados:

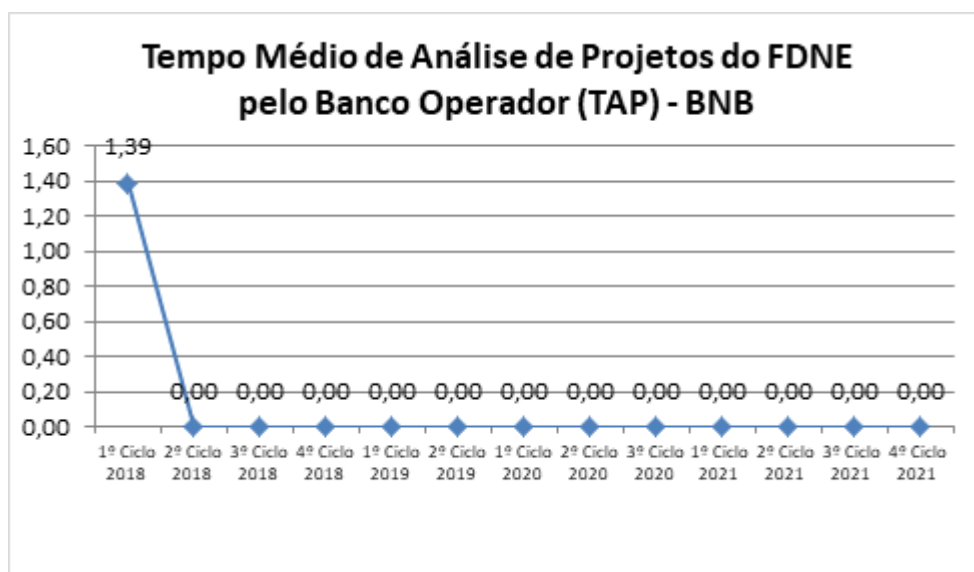


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

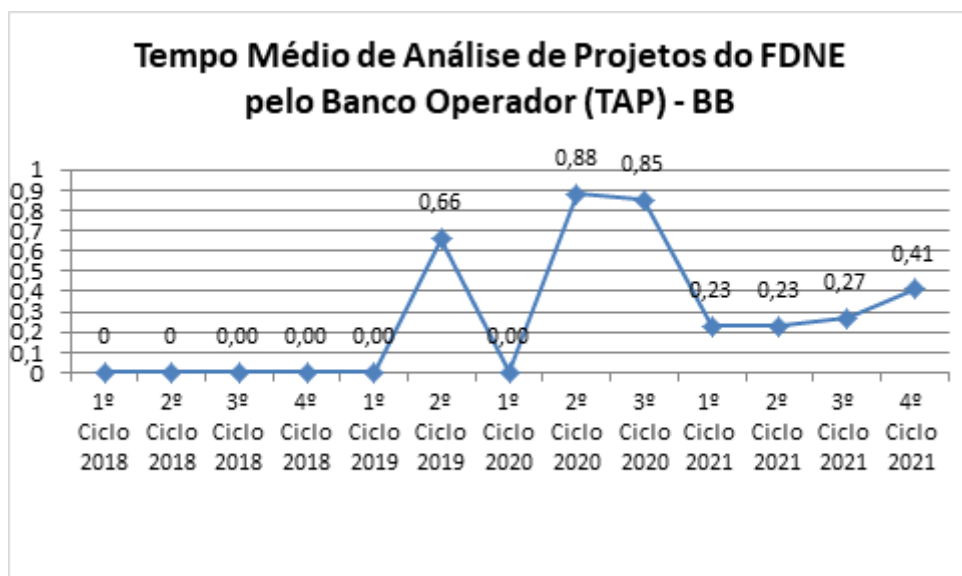

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

**Notas:**

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados, podendo estender-se até 150 dias.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos despendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

### 3.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP).

#### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

#### a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{15} = 6,6\%$$

#### a.3) Caixa Econômica Federal – CEF


$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**


f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Representação gráfica dos resultados:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

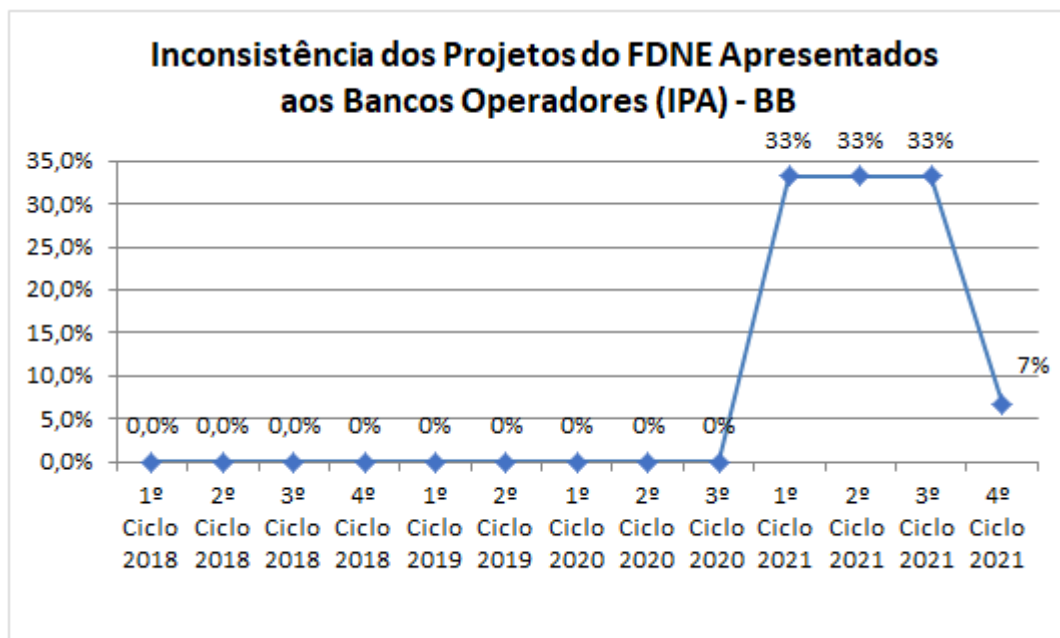

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

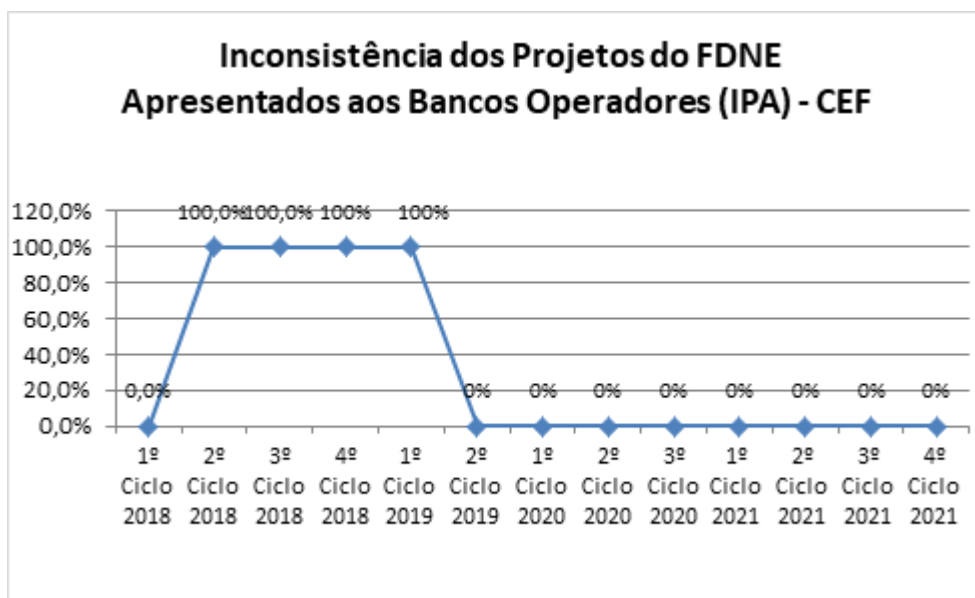


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

### 3.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE).

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Valor empenhado 2021} \times 100}{\text{Dotação 2021}} = \frac{3.063.347.402,0 \times 100}{3.063.347.402,0} = 100\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Representação gráfica dos resultados:

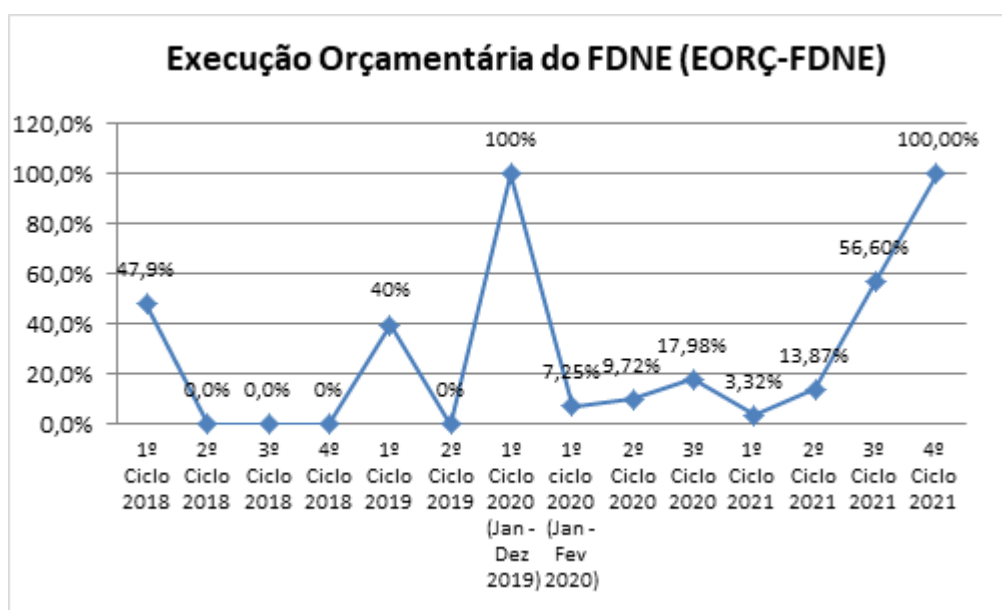

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

### 3.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE).

a) Fórmula:  $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{592.330.701,34 \times 100}{3.063.347.402,0} = 19,3\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): 100,00 %

e) Referência da aferição: **Jan a Dez/2021.**

f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Representação gráfica dos resultados:

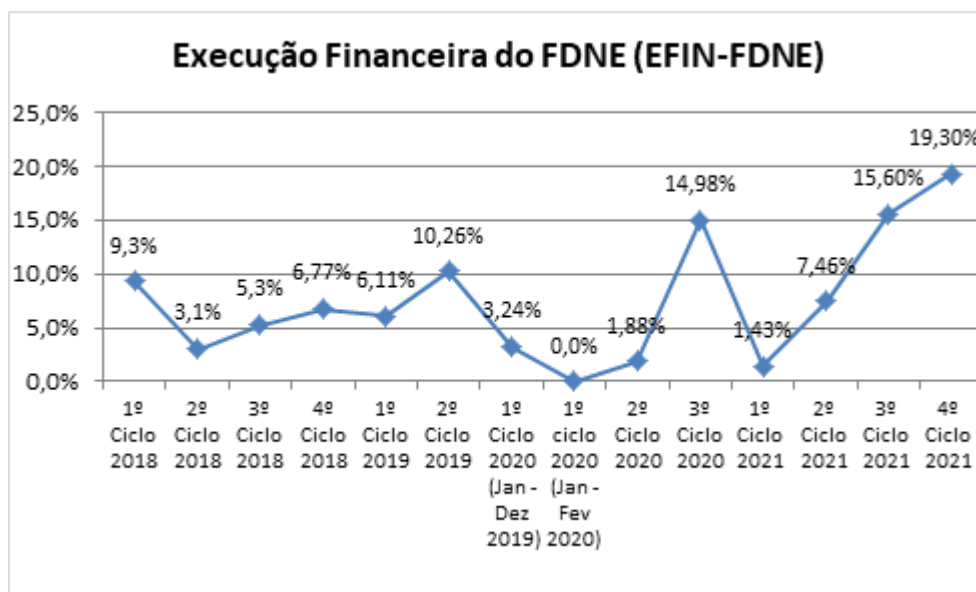


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

### 3.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

- a) Fórmula:  $\frac{M_1}{\text{dias}^1} = \frac{20}{30} = 0,67$
- b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor).
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Representação gráfica dos resultados:



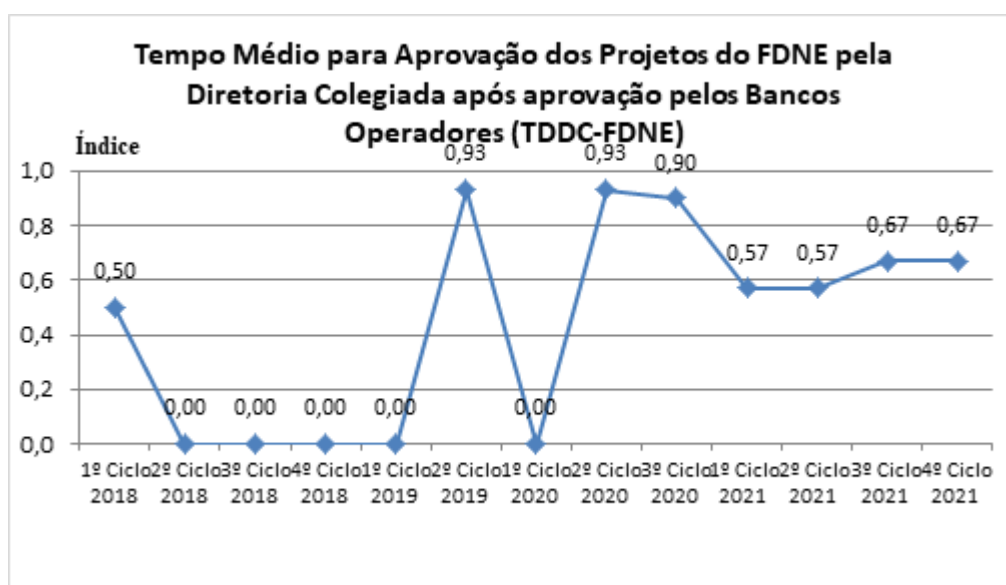

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

### Convenção:


**M<sub>1</sub>** – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

### Nota:

<sup>1</sup> 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

## 3.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

- a) Fórmula:  $T_m = \frac{T}{N} = \frac{285 \text{ dias}}{12} = 23,75 \text{ dias/financiamento aprovado}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor).
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Representação gráfica dos resultados:

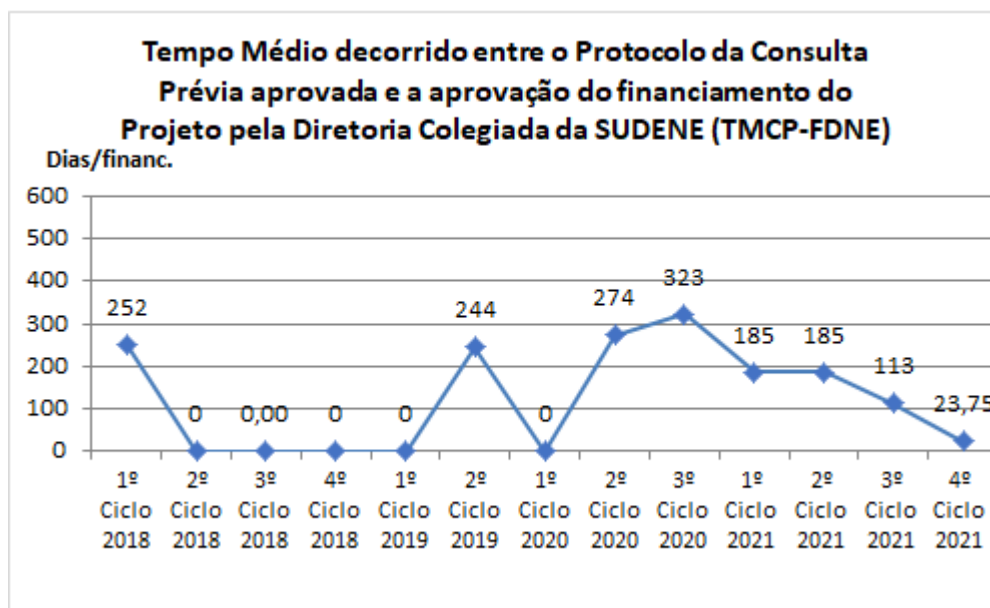

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

#### Notas:


- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

### 3.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{8}{8} = 1,00$
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor).
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: Não informado.
- g) Representação gráfica dos resultados:

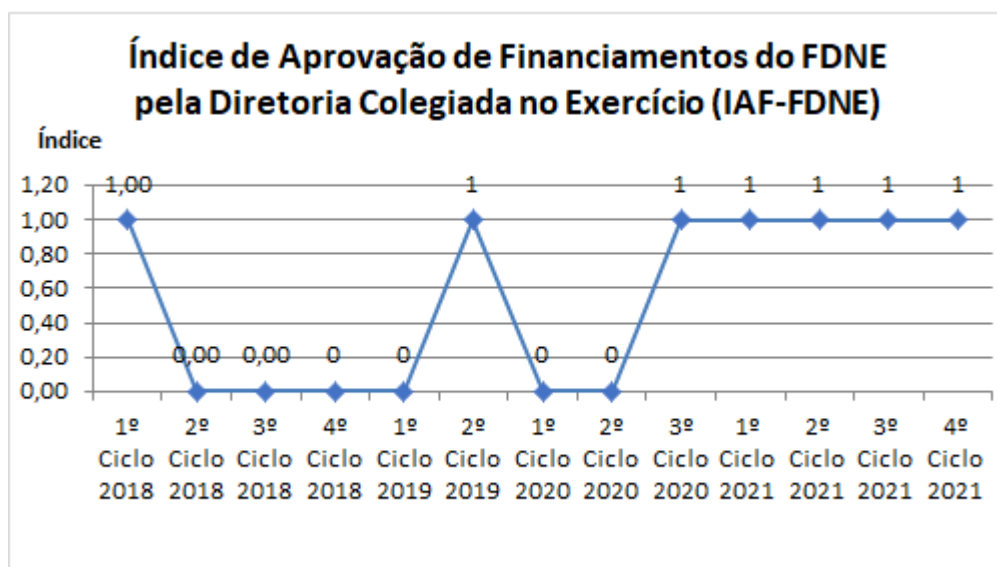

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

**Nota:** resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

#### 4. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

##### 4.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

a) Fórmula: 
$$\frac{T_1}{N} = \frac{20.257}{272} = 74,5 \text{ dias}$$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.


c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.

d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**

f) Comentários: O presente período de avaliação (janeiro a dezembro de 2021) ainda continua com a realização de vistorias virtuais, ainda por conta da Pandemia da COVID-19, que provocou a suspensão das vistorias presenciais a partir de abril de 2020, até o momento em que a Diretoria Colegiada aprovou, em julho de 2020, proposta de vistoria remota feita pela DFIN/CGIF como forma de examinar os pleitos em carteira, em virtude da impossibilidade de presença física por parte dos técnicos, o que foi feito com a edição da Resolução nº 555/2020. Nada obstante, o prazo também foi afetado pela demora no encaminhamento da documentação solicitada. Com a aprovação da Resolução nº 622/2021, que entrou em vigor em 1º de agosto de 2021, foi estabelecido prazo máximo para encaminhamento dos dados solicitados, findo o qual o pleito poderá ser arquivado caso a empresa não cumpra a sua parte. O prazo médio para a realização das vistorias passou de **86,2 dias** na última avaliação (Jan-set 2021) para **74,5 dias** na presente avaliação.

g) Representação gráfica dos resultados:

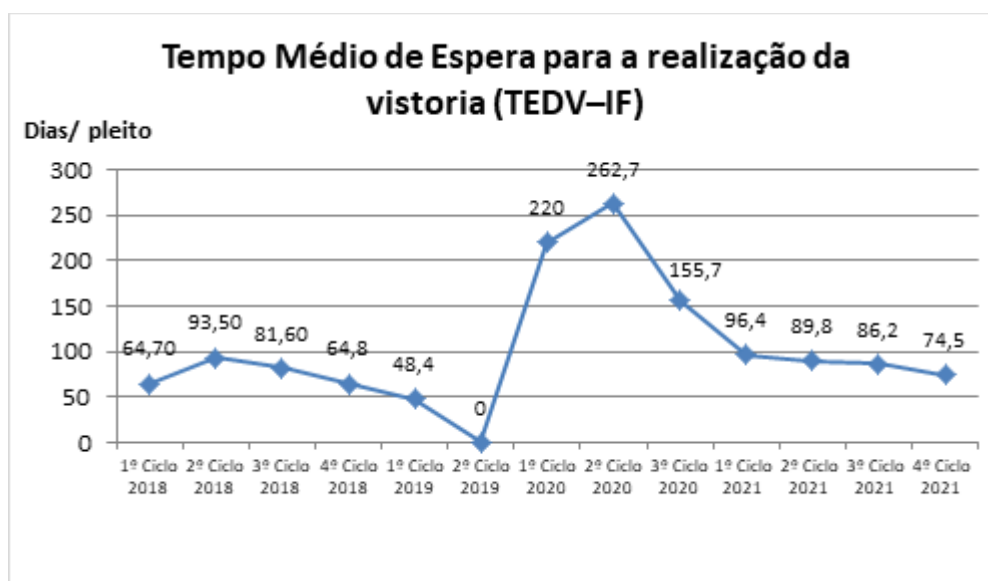

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T1 = Média aritmética do @ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado.

#### 4.2- Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF\_UF-IF).

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{310} = 0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**

f) Comentários: no exercício não ocorreu rejeição de pleitos recebidos vez que todos os encaminhados pelas empresas se enquadram nos normativos existentes.

g) Representação gráfica dos resultados:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Notas:


- (1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.
- (4) O número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado entre 1º de janeiro de 2021 até 31 de março de 2021 (31 processos, acrescido dos ainda em exame).

#### 4.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF).

- a) Fórmula: 
$$\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} = \frac{310 \times 100}{310} = 100\%$$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor.
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: no período, foram concluídas 310 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 100% dos pleitos ingressados. O número de pleitos protocolados no período de 01.01.2021 a 31.12.2021, e que ainda se encontram em exame, totalizou 44 processos. Por outro lado,

dos 310 pleitos aprovados no período 44 foram protocolados em 2020, fora, portanto, do cálculo e perfazendo assim um total de 310 pleitos protocolados.

g) Representação gráfica dos resultados:

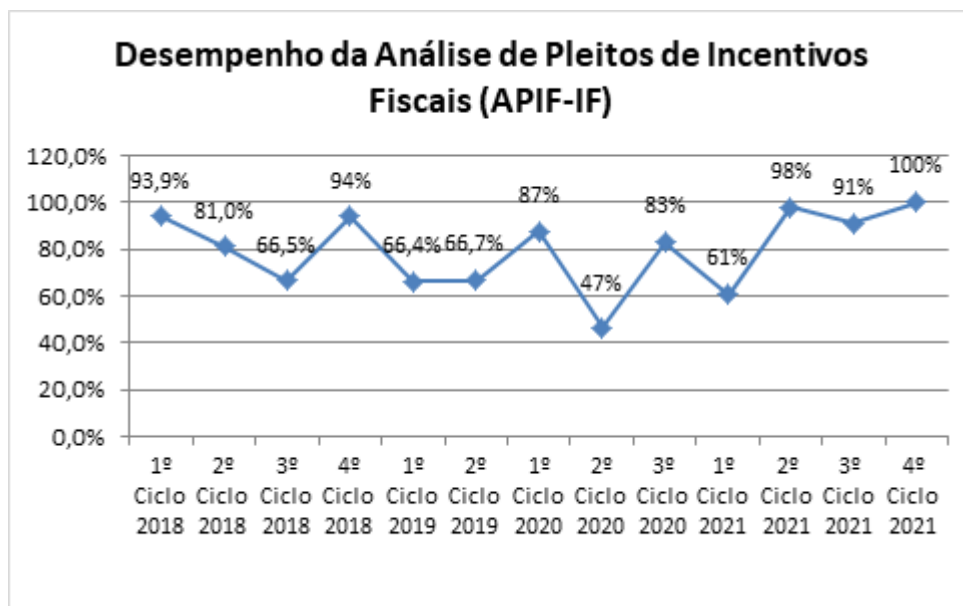


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

#### 4.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF).

- a) Fórmula:  $\frac{T1}{N} = \frac{26.836}{310} = 86,6$  dias
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: aqui vale o mesmo comentário feito para o tempo médio de espera para a realização da vistoria. O prazo médio foi impactado diretamente pelo prazo médio das vistorias uma vez que o processo somente pode ser concluído após a realização da vistoria.
- g) Representação gráfica dos resultados:

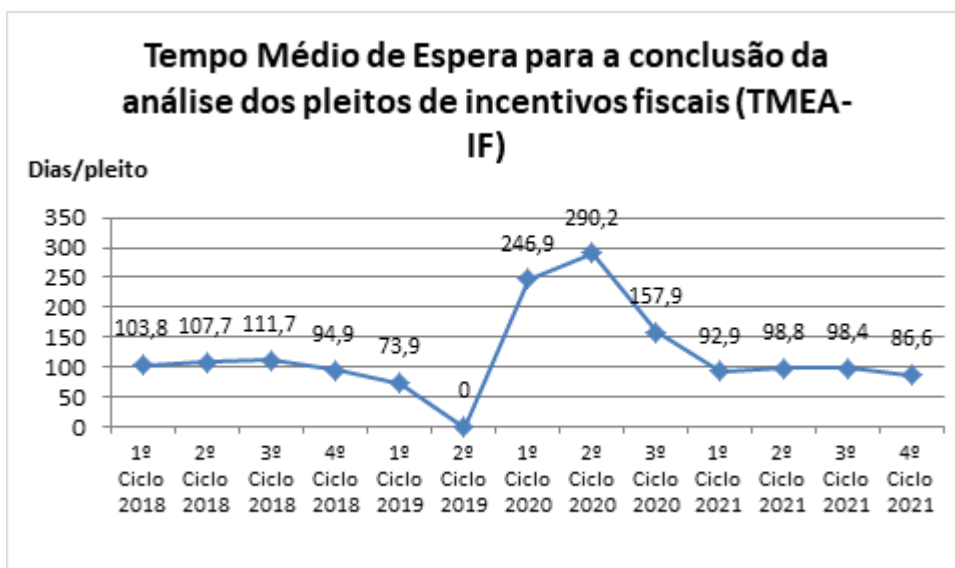

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.


Convenção:

T1 = © do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

#### 4.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF).

- a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{310}{14} = 22,1 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: (re) orientar a programação de análise ou a (re) organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: A partir do avanço dos meses o número de pleitos analisados vai sendo ampliado, com o que o número de análise por técnicos também aumenta. Nada obstante, trata-se do melhor desempenho observado nos últimos períodos.
- g) Representação gráfica dos resultados:

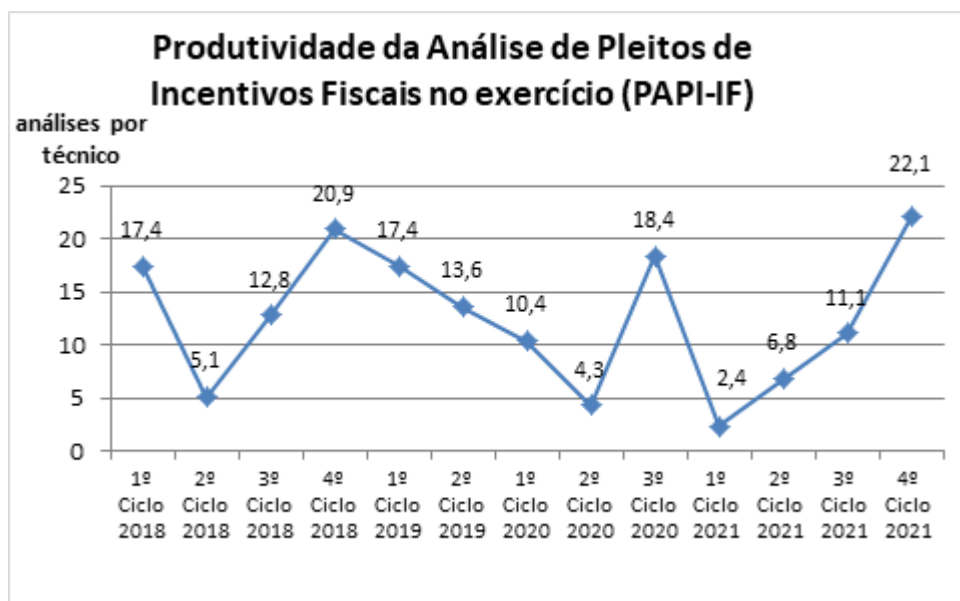


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

#### 4.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de vitórias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{272}{7} = 38,8$  vitórias/equipe
- b) Objetivo: (re) orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.
- e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: provável fruto da vitória virtual, uma vez que nessa modalidade não há necessidade de toda a logística que a vitória presencial demanda, observa-se que no período em causa a média alcançada também foi a maior dos últimos períodos.
- g) Representação gráfica dos resultados:



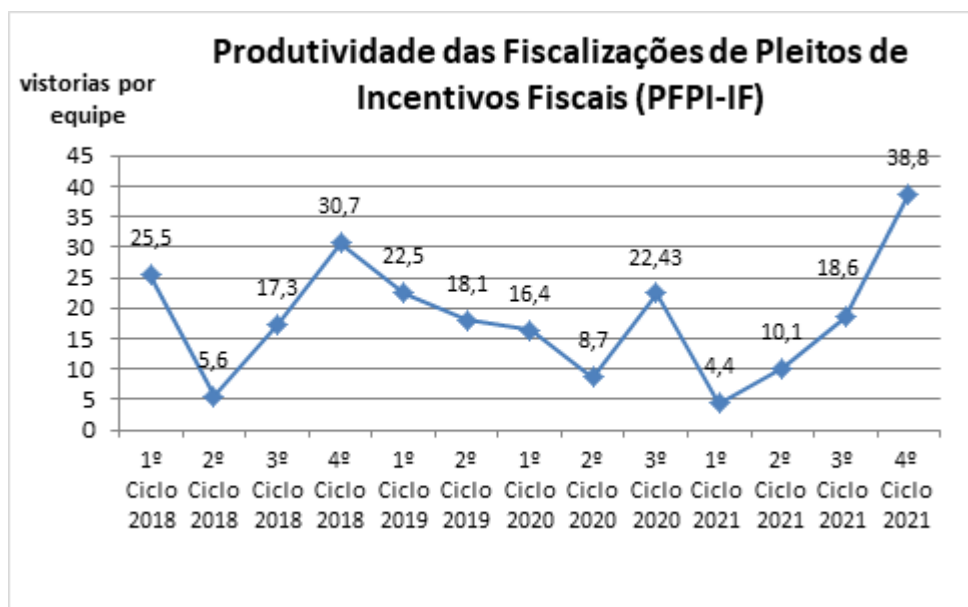

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos, cumprindo determinação do Tribunal de Contas da União – TCU.

## 5. Indicadores de Gestão de Convênios

### 5.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC).

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{32 \times 100}{32} = 100\%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).
- e) Período da aferição: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: Os pleitos protocolados referem-se às propostas de convênios válidos, encaminhadas para análise técnica. Os pleitos protocolados têm o mesmo número dos pleitos analisados que são 32 no total.
- g) Representação gráfica dos resultados:

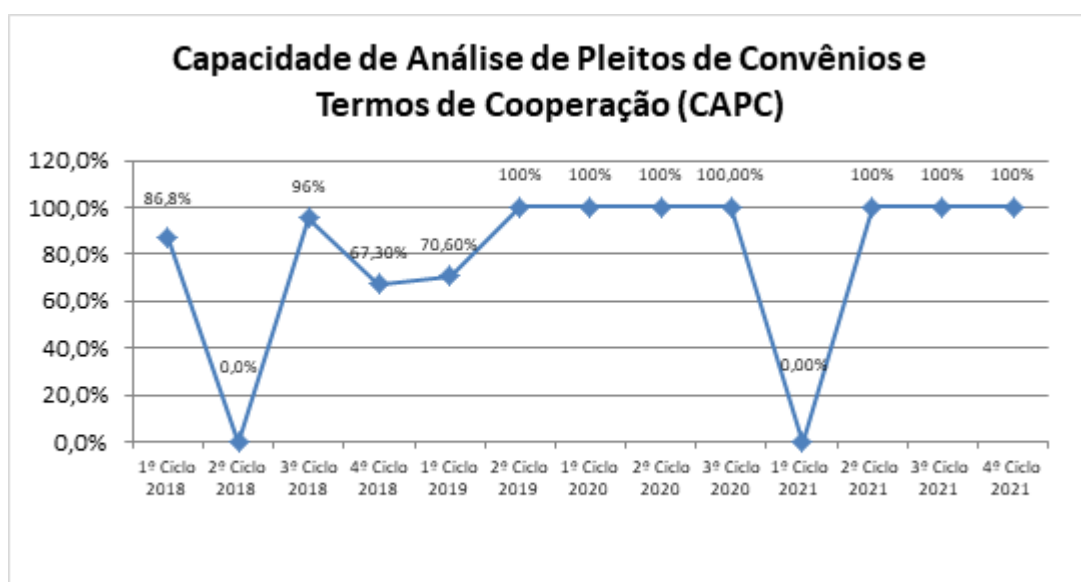


Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

## 5.2 – Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{26 \times 100}{32} = 81,25\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.
- d) Resultado ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: **Jan a Dez/2021.**
- a) Comentários: considera-se aqui que os pleitos protocolados tem o mesmo número dos pleitos analisados que são 32 no total. Observou-se uma consistência de 81,25%, com a aprovação de 26 dos pleitos.
- f) Representação gráfica dos resultados:

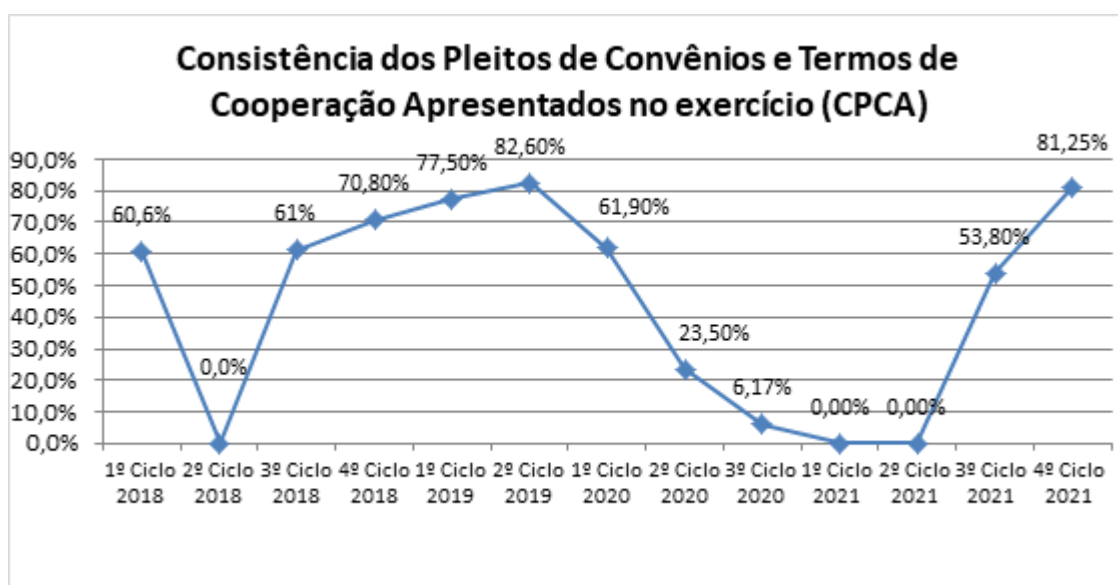


Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

### 5.3 - Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos de Conv. e Termos de Coop. rejeitados no ex.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{6 \times 100}{32} = 18,75$
- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).
- e) Período da aferição: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: observou-se um grau de indeferimento de 18,75%, com a rejeição de 06 pleitos dos 32 protocolados e analisados. Os pleitos aprovados, rejeitados e o grau de indeferimento são respectivamente 14,4 e 15,4% no período em análise.
- g) Representação gráfica dos resultados:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

**Notas:**

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

#### 5.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{11 \times 100}{37} = 29,7\%$ .
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela Sudene.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.
- d) Resultado Ideal (%): 100%
- e) Período da aferição: **Jan a Dez/2021.**
- f) Comentários: foram realizadas 11 visitas de campo (fiscalizações). Das trinta e sete visitas programadas, 26 não foram realizadas, em virtude das dificuldades de locomoção causadas pela Pandemia do Covid-19. Destacamos ainda que houveram reuniões virtuais de articulação e acompanhamento realizadas pela CODEM/CGDS junto aos parceiros em TEDs e convênios.
- g) Representação gráfica dos resultados:

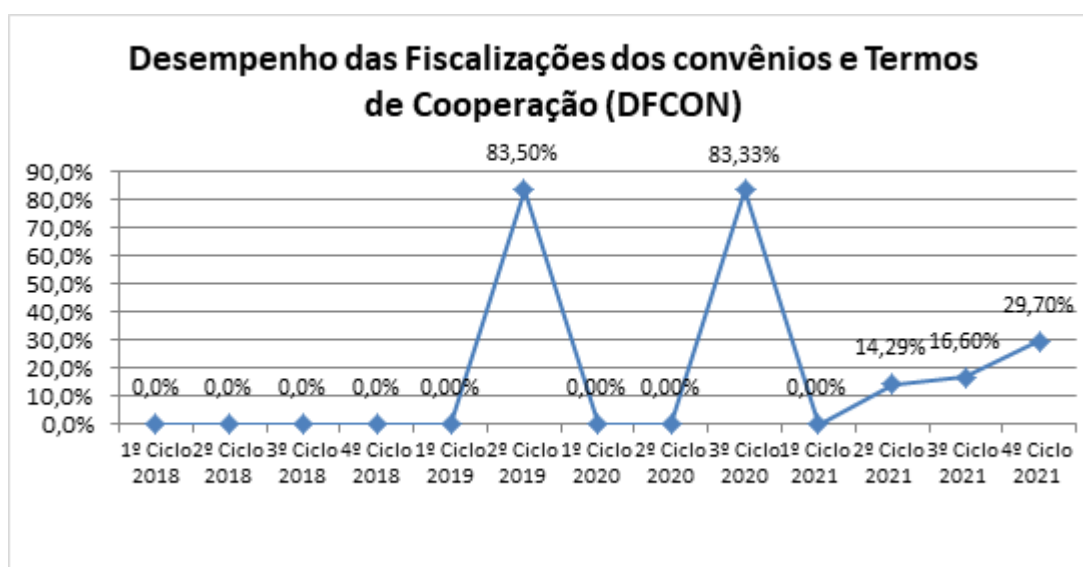

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

## 5.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula: 
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{553}{5} = 110,6 \text{ dias por pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**

f) Comentários: das propostas de convênios apresentadas, 5 foram celebradas.

g) Representação gráfica dos resultados:

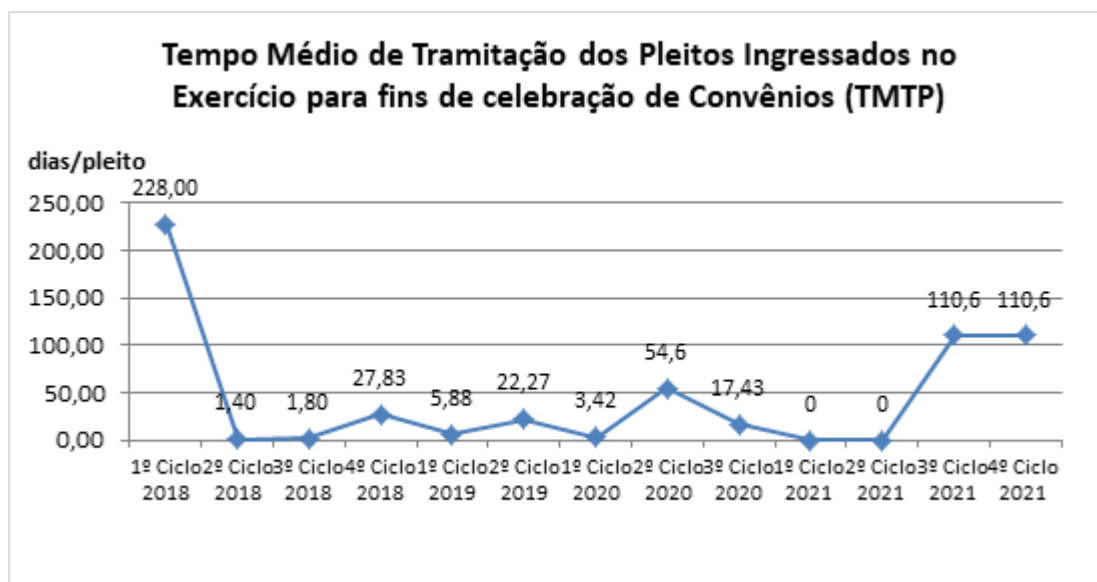

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da Sudene ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

**Notas:**

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.


## 5.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

- a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não Houve}$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.
- d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**

a) Comentários: entre os meses de Janeiro e Dezembro de 2021 não foram recebidos ou realizados pleitos de celebração de termos de cooperação.

f) Representação gráfica dos resultados anteriores:

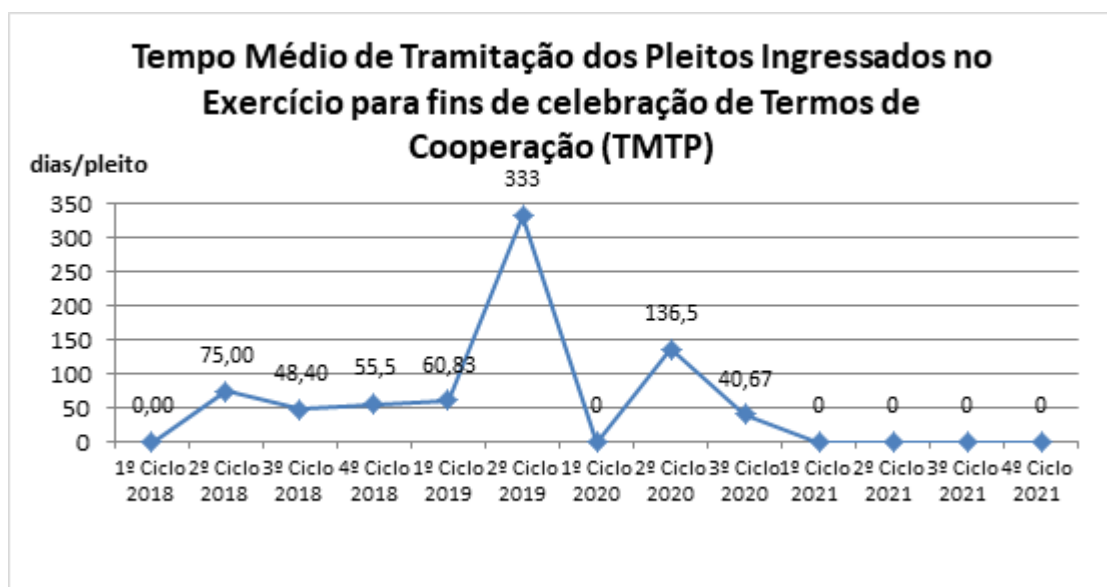

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

## 6. Indicadores de Gestão de Pessoas

### 6.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{50 \times 100}{60} = 83,33\%$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.


c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.

d) Resultado Ideal (%): 100%

e) Período da aferição: **Jan a Dez/2021**.

f) Comentários: de janeiro a dezembro de 2021, foram capacitados 50 servidores de diferentes setores da autarquia – considerando apenas os cursos efetivamente concluídos. Além disso, foi iniciado por dois servidores o MBA em Data Science e Analytics, com previsão de conclusão em 2023. Também, no final de 2021, foram concluídos os trabalhos de apoio à equipe técnica da CGGI na ação de realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional (Processo SEI 59336.002304/2019-81).

f) Representação gráfica dos resultados:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 6.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{51 \times 100}{40} = 127,5\%$

b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.


d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).

e) Período da aferição: **Jan a Dez/2021**.



g) Comentários: de janeiro a dezembro de 2021, os servidores da Sudene participaram de 51 eventos de capacitação (incluindo diferentes turmas), todos na modalidade EAD – considerando apenas as capacitações concluídas. Além disso, foi iniciado por dois servidores o MBA em Data Science e Analytics, com previsão de conclusão em 2023. Também, no final de 2021, foram concluídos os trabalhos de apoio à equipe técnica da CGGI na ação de realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional (Processo SEI 59336.002304/2019-81).

f) Representação gráfica dos resultados:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

### 6.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{12.470,00 \times 100}{200.000,00} = 6,23\%$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.


c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Dez/2021.**

f) Comentários: os cursos planejados no PDP Sudene 2021 foram, em sua maioria, realizados junto a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), conforme orientações da Manifestação Técnica do órgão Central, ou promovidos por outros órgãos federais, como MDR, não apresentando custo para a Sudene com inscrições ou diárias/passagens.

g) Representação gráfica dos resultados:

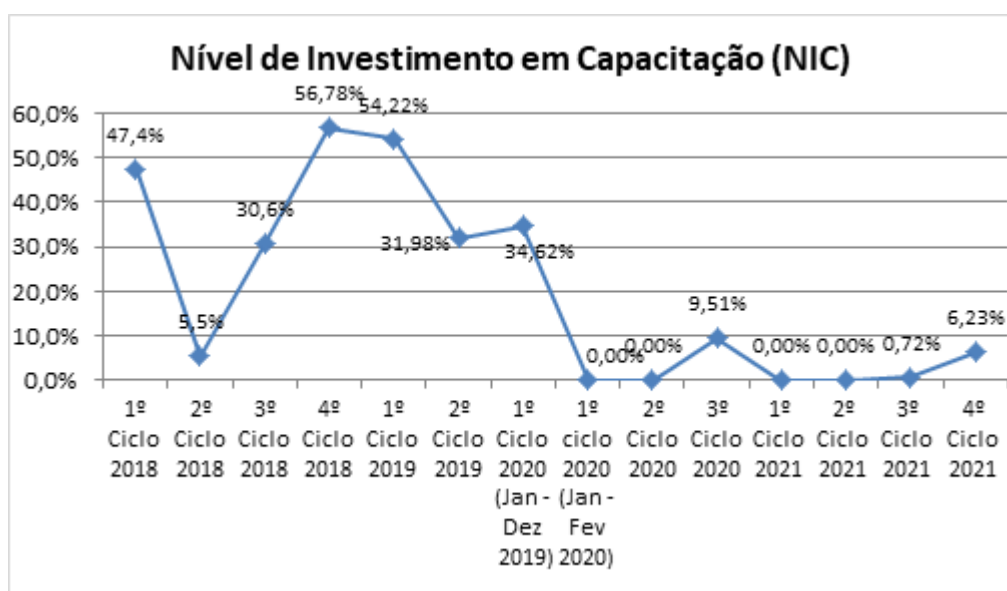


Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 7. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

### 7.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

- a) Fórmula: Média de acessos = **27.861 (Google Analytics)**  
(Google Analytics)
- b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. A ideia é fazer a aferição de forma recorrente para, a partir dos resultados alcançados, buscar formas de potencializar o espaço eletrônico como meio didático e eficiente de comunicação pública.
- e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021.**
- f) Comentários: desde a migração para o portal Gov.br, temos percebido um novo comportamento do usuário, com menos acessos ao site institucional. Durante o ciclo, a equipe manteve o site como principal plataforma de detalhamento de conteúdo, priorizando a divulgação de links diretos para o portal, a exemplo do que era feito antes da adoção obrigatória do Gov.br. Novas análises sobre este novo perfil de interação com o site poderão ser feitas a partir dos índices dos próximos ciclos.
- g) Representação gráfica dos resultados:

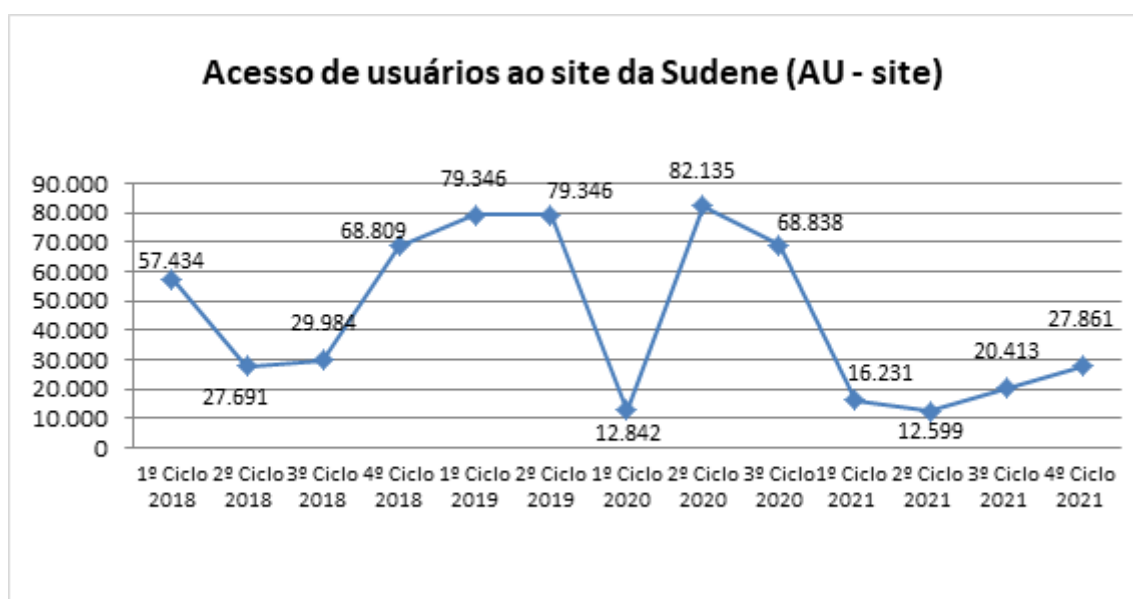

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

## 7.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site).

a) Fórmula: Tempo de permanência = **1'58"**  
(Google Analytics)

b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.


c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.

d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.

e) Período da aferição: **jan/2021 a Dez/2021.**

f) Comentários: resultados compatíveis com a análise feita no item anterior.

g) Representação gráfica dos resultados:

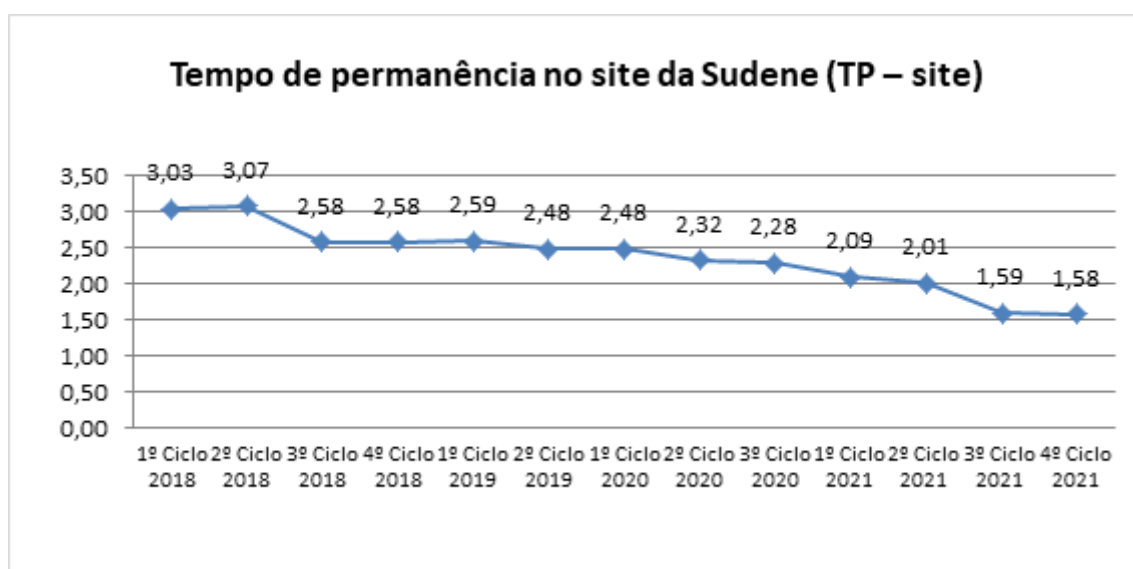

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

### 7.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

a) Fórmula: Taxa de Rejeição = **63,42%**  
(Google Analytics)

b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.


d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes. De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021**.

f) Comentários: ligeiro crescimento, mas dentro da margem tolerável.

g) Representação gráfica dos resultados:




Fonte:

Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

#### 7.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Curtidas = **2775**.  
(Facebook)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.
- e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021**.
- f) Comentários: Houve discreta queda. A unidade está analisando a estratégia de divulgação de conteúdo no espaço de modo a retomar o crescimento, mesmo diante de um novo padrão de consumo de informação do usuário, com preferência para o Instagram.
- g) Representação gráfica dos resultados:




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

## 7.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 1.273.  
(Twitter)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- e) Período da aferição: a) **jan/2021 a dez/2021.**
- f) Comentários: resultados esperados, comprovando tendência global de predileção dos usuários pelo Instagram em detrimento de outras redes sociais.
- g) Representação gráfica dos resultados:




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

## 7.6 - Seguidores no Instagram da Sudene

- a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: **2779**.
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.
- e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021**.
- f) Comentários: resultados positivos, evidenciando tendência global de aumento de engajamento no Instagram.
- g) Representação gráfica dos resultados:




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

### 7.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- a) Fórmula:  $\sum \text{Matérias Publicadas} = 180 \text{ na internet} + 34 \text{ na intranet} = 214$   
(Internet + Intranet)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021.**
- f) Comentários: resultados positivos.
- g) Representação gráfica dos resultados:





Fonte:


Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

## 7.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- a) Fórmula:  $\sum$  Sugestões de Pauta Publicadas = **89**.
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021**.
- f) Comentários: produção de conteúdo acima da média.

g) Representação gráfica dos resultados:




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 7.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- a) Fórmula:  $\sum$  Produções em Vídeo e Áudio = **25 produções.**
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- h) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021.**
- e) Comentários: As produções audiovisuais são atividades de complexidade técnica elevada, que leva mais tempo para produção. Ainda considerando a redução da equipe, a produção está dentro da média.
- f) Representação gráfica dos resultados:




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 7.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- a) Fórmula:  $\sum$  Produções em Ações de Publicidade e Design = **314** (Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
- ° Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
  - ° Produções para jornalismo;
  - ° Produções para demandas internas;
  - ° Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
  - ° Peças digitais / impressos.
- e) Período da aferição: **jan/2021 a dez/2021.**
- f) Comentários: produção acima da média.
- g) Representação gráfica dos resultados:



Fonte:

Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

## 8. Metas de desempenho institucional para o período out/2021 - set/2022.

O quadro abaixo apresenta o percentual de atingimento das metas de desempenho institucional no período de out/2021 a set/2022. As citadas metas foram publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 138, de 22 de dezembro de 2021, a qual encontra-se disponível no site da Sudene por meio do [link: https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/anexo\\_0310368\\_anexo\\_portaria\\_138.pdf](https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/anexo_0310368_anexo_portaria_138.pdf). Foi observado no momento da apuração dos dados algumas inconsistências em relação ao quadro geral das metas, que já foram encaminhadas para providências pelos setores responsáveis. A meta 1 será repactuada pela CGCP até o fim do ciclo avaliativo, em função da necessidade de cancelamento de produtos, conforme se observa no plano operativo correspondente. Já a meta 2 será excluída do quadro de metas em virtude de erro formal da sua inclusão neste ciclo. O projeto e seus produtos foram concluídos no ciclo anterior. Tais metas, por ainda estarem em vigor, serão consideradas no cálculo do quadro abaixo, com as devidas ressalvas.

**Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional**  
**Resultado do período out/2021-set/2022 com base na Portaria nº 138, de 22 de dezembro de 2021**

Nº Ordem	Dimensão Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico Sudene e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)	Unidade Responsável
1	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Nota Técnica	2 (100%)	50%	40	Projeto: Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste PRDNE (PO CGCP/2020001).  Obs: Meta será repactuada.	CGCP/DPLAN

2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Nota Técnica	1 (100%)	-	-	Projeto: Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE. <b>PO CGCP/2020003</b>  Obs: Meta será retificada.	CGCP/DPLAN
3	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	5 (100%)	20% (1 Parecer)	16	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. <b>PO CGCP 2021006.</b>	CGCP/DPLAN CGEP/DPLAN
4	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e	Parecer Técnico	8 (100%)	0%	0	Projeto: Fortalecer uma rede policêntrica de 52 cidades polo das regiões intermediárias da área de atuação da Sudene de forma a	CGCP/DPLAN

		econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional					contribuir para implementar o Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). <b>PO CGCP 2022003.</b>	
5	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	1 (100%)	0%	0	Projeto: Propor as Diretrizes e Prioridades para aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para 2022. <b>PO CGCP 2022002.</b>	CGCP/DPLAN CGDF/DFIN
6	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual do Projeto	50%	100%	80	Projeto: Atualizar a delimitação do Semiárido. <b>PO CGEP/2021001.</b>	CGEP/DPLAN
7	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	1 (100%)	0%	0	Projeto: Propor as Diretrizes e Prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) para 2023. <b>PO CGCP 2022001.</b>	CGCP/DPLAN CGDF/DFIN
8	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do	Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado	6	16,6% (1 ACT celebrado)	13	Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. <b>PO CGEP 2021002.</b>	CGEP/DPLAN

		desenvolvimento regional						
9	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades para a promoção do desenvolvimento regional	Celebração efetivada	1	100%	80	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.  Meta institucional - Celebração de Avença para contratação da avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. <b>PO CGEP 2020008.</b>	CGEP/DPLAN
10	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual do Projeto	100%	0%	0	Projeto: Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias por meio de Emendas Parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene. <b>PO CGDS 2022002.</b>	CGDS/DPLAN
11	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Evento/Webinário	4	0%	0	Realização de eventos de articulação de parceiros e difusão tecnológica: webinários abordando temáticas trabalhadas pela CGDS/DPLAN. <b>PO CGDS 2022001.</b>	CGDS/DPLAN



12	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Percentual	10% (100%)	0%	0	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Sub-projeto de Desenvolvimento de ações para a recomposição da Força de Trabalho. <b>PO CGGP 2021001.</b>	CGGP/DAD
13	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Percentual do Projeto.	20% (100%)	50% (Foi realizado 10% da meta fixada)	40	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Sub-projeto de Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho <b>PO CGGP/2018001</b>	CGGP/DAD
14	4. Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho.	Percentual do Projeto.	35%	100%	80	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Sub-projeto de elaboração de indicadores de Gestão de Pessoas. <b>PO CGGP/2020001</b>	CGGP/DAD
15	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Relatórios	4	0	0	Atividade: Acompanhar a aplicação de recursos do FNE pelo BNB por meio da elaboração de relatórios.	CGDF/DFIN
16	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual	100%	100% (33 Pleitos)	80	Atividade: Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	CGDF/DFIN
17	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de	Percentual	100%	100% (7 pleitos)	80	Atividade: Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até	CGDF/DFIN

		fomento e do incentivo à inovação.					30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	
18	1. Resultados para a Sociedade	-	Pleitos Aprovados	320	48,75% (156 pleitos)	39	Atividade: Aprovação de Pleitos de incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da Sudene.	CGIF/DFIN
TOTAL ALCANÇADO (média aritmética)						30,4		

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

## 9. Conclusão

---

Como parâmetro para realizar este Relatório, comparou-se os dados dos ciclos anteriores com a finalidade de destacar os avanços observados dos Planos operativos que estão sob a responsabilidade das Diretorias e Coordenações-Gerais desta autarquia. Foi levado em consideração os projetos críticos que apresentam status em “atraso” e “paralisados”, destacando os que estão nessa condição por mais de um ciclo consecutivo.

Houve, especificamente neste ciclo, um diferencial nos números de projetos com status a “iniciar” que aumentou significativamente, o que revela o compromisso da instituição em permanecer envidando esforços em prol do desenvolvimento regional.

Os desafios da pandemia do Covid-19 continuam influenciando o andamento dos projetos na Sudene e, conforme observado pelos dados dos projetos e indicadores, apresenta significativo impacto nos trabalhos da autarquia, inclusive com a necessidade de se manter projetos paralisados.

Em relação aos indicadores apresentados neste relatório, destaca-se os indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional, que em sua quase totalidade tiveram elevação. Ainda sobre esses indicadores, faz-se necessária a retificação de alguns valores informados no 3º ciclo/2021, quais sejam: correção no índice de Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site) para 20.413; índice de Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site) para 1’59”; valor das Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS) para 2782. Salienta-se que neste Relatório os gráficos já estão com os valores corrigidos.

A Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN também apresentou elevação no índice de Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF), onde o número das vistorias realizadas passou de 18,6 (3º ciclo) para 38,8. Esse crescimento é fruto das novas adaptações ao momento atual, onde passou-se a realizar vistorias virtuais.

Os índices de execução orçamentária e de execução financeira do FDNE permanecem em destaque, tendo aumentado neste ciclo em relação ao anterior, respectivamente, de 56,6% para 100% e de 15,60% para 19,30%.

Por fim, salienta-se que a autarquia tem avançado no sentido de aprimorar o acompanhamento, revisão e ajuste dos projetos para atender aos objetivos de desempenho definidos nas metas institucionais e permanece com o objetivo de otimizar o processo de monitoramento por meio de sistema eletrônico, a fim de torná-lo mais efetivo para a organização, para os usuários e a sociedade em geral.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultado para a sociedade.</b>	<b>Número do Projeto: PO</b>	<b>CGDS/2012001</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	<b>Processo (s) SEI:</b>	<b>59335.000119/2012-95</b>
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornece instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
<b>Problema (causa):</b>	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
<b>Projeto:</b>	<b>Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.</b>		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	Pago até o ano anterior	R\$ 530.482,50
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	A realizar no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>530.482,50</b>	<b>58.942,50</b>	<b>589.425,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 530.482,50

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Vigência: 28/12/2012 a 31/12/2022.</b>

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente:	Juliana Borges, Vera Assunção, Víctor Uchôa Silva - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	<b>Seleção de propostas</b>	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Lançamento do Chamamento Público</b>	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise de propostas</b>	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Resultado do Chamamento Público</b>	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
2	<b>Ajustes do projeto para formalizar convênio</b>	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
3	<b>Formalização do convênio</b>	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
4	<b>Assinatura do convênio</b>	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
5	<b>Publicação do convênio</b>	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	<b>Concluído</b>		
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>57,0%</b>	<b>Em Andamento</b>		
	<b>Liberação da 1ª parcela</b>	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	<b>R\$ 265.241,25</b>	15/08/2013	15/08/2013	<b>R\$ 265.241,25</b>	100,0%	<b>Concluído</b>		
6	<b>Realização de proc. Licitatório</b>	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	24/06/2020	--	15/11/2014	06/12/2019	--	100,0%	<b>Concluído</b>	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordeste.	

7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	24/06/2020	--	08/12/2014	--	--	100,0%	Concluído	
7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	Concluído	
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias	SEMAS/PE	09/07/2018	24/06/2020	--	09/07/2018	30/07/2019	--	100,0%	Concluído	
7.3	Realizar Seminário Nordeste	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	24/06/2020	--		--	--	40,0%	Em Andamento	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Conveniente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	24/06/2020	--	01/05/2014	04/03/2021	--	100,0%	Concluído	
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	24/06/2020	--	17/02/2020	04/03/2021		100,0%	Concluído	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/03/2019	11/07/2019	--	20/03/2019	11/07/2019	--	100,0%	Concluído	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrópolis/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/01/2022	31/12/2022	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 530.482,50	77%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

**Observações:**

\* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio realizados. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a convenente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repactuadas e atualizadas no PO. A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019. O convênio foi aditivado ampliando a vigência para 24/06/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	PO CGDS/2014001 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ano:	2014
		Processo (s) SEI:	59335.000543/2014-00
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Previsão de Conclusão:	26/12/2021	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	31/12/2021	Vigência até: 26/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas Souto/ Vera Lúcia Assunção - EMPAER/PB - Wandrick Haus de Sousa
--	---

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 343.585,70
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ -
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 343.585,70

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>										
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>										
										50,5%	Paralisado	Este convênio foi aditivado, em função da pandemia, que paralisou algumas de suas atividades. Desta forma, foi aditivado, passando a ter a sua vigência até 26/12/2021.
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído	
11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	21/09/2015	22/03/2020	-	24/10/2015		-	96%	Paralisado	Foram distribuídos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia. A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.

12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMPAER-PB	13/10/2015	22/03/2020	-	03/12/2015		-	80%	Paralisado	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	21/09/2015	22/12/2019	-	14/09/2015	04/01/2019	-	100%	Concluído	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento	
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	22/03/2020	-	27/11/2015		-	65%	Em Andamento	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado devido à pandemia.  *A situação ainda não permitiu realizar as atividades faltantes, em particular, as capacitações. No período até 30/06/21, como encaminhamento da reunião de acompanhamento ocorrida na 2ª quinzena de março, a EMPAER enviou por email proposta de ajuste do plano de trabalho, para análise, considerando a retomada das ações pendentes, quando possível.	*Acompanhamento remoto do projeto; realização de reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento e análise preliminar da proposta de ajuste do plano de trabalho.  Recebimento de solicitação de ajuste do Plano de Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, visando adequações para a retomada e conclusão das atividade do projeto.  A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto.  Aguarda-se a apresentação do Relatório Final deste projeto.
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100%	Concluído	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita. A Empaer informou que concluiu o módulo restante.	A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto.  Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Conveniente, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	26/12/2021	26/12/2022	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 343.585,70	70%	Atrasado	Status do Projeto	Como foi encerrado o prazo de execução e restantam etapas em aberto, colocou-se o status de atrasado. Porém, a posição final deste projeto deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final, quando poderá ser aferido o percentual final da realização.

<b>Parceiros Institucionais:</b> EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
<b>Observações:</b> Em decorrência de atrasos motivados por problemas de ordem administrativa (a EMEPA passou por alterações e passou a incorporar uma nova entidade criada pelo Governo da Paraíba) e dificuldades em fazer as licitações para contratação de serviços, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 13/02/2019, a qual foi acatada parcialmente, tendo sido sua vigência prorrogada para <b>30/09/2019</b> . Devido à pandemia este convênio foi prorrogado de Ofício até <b>31/12/2020</b> , entretanto, a Conveniente ainda precisa ajustar o seu Plano de Trabalho para esse novo período de execução.  * Vigência do CV ampliada até 26/12/2021, considerando a pandemia do COVID-19 e a conclusão das atividades pendentes.    ** Agendada e realizada reunião de acompanhamento, em 19/03/2021, pela manhã, entre coordenações técnicas, EMPAER e CODEM/CGDS e equipe técnica CODEM, para saber dos impactos da pandemia    na região envolvida e das perspectivas/alternativas de retomada e conclusão das atividades pendentes, paralizadas pela pandemia.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultado para a sociedade.</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGDS/2015001 (ex PO 04)</b>
		<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Processo (s) SEI:</b>	<b>59335.000219/2015-64</b>
<b>Programa:</b>	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
<b>Problema (causa):</b>	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
<b>Projeto:</b>	<b>Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.</b>		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>R\$ 459.000,00</b>	<b>R\$ 365.276,25</b>	<b>nov/15</b>	<b>R\$ 824.276,25</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/05/2018	<b>Termo de Execução Descentralizada N° 002/2015</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Vigência: 31/03/2017</b>

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel / Felipe Barbosa

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	<b>Concluído</b>		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	<b>Concluído</b>		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	<b>Concluído</b>		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	<b>Concluído</b>		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	<b>Concluído</b>		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>60,0%</b>	<b>Concluído</b>		
10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	<b>Concluído</b>		
11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	31/03/2016		100%	<b>Concluído</b>	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia.	

11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	31/03/2016		100%	Concluído	
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	A SUDENE participou do <b>Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos</b> indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído	
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	14/03/2017		100%	Concluído	
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										20,0%	Concluído	

17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	30/12/2021		100%	Concluído	Foi elaborado, no âmbito da CODEM/CGDS, o Parecer Técnico Nº 187/2021 - SEI/SUDENE, que conclui recomendando sob o aspecto estritamente técnico a aprovação e conclusão deste TED. A CGDS/DPLAN elaborou a minuta de Voto a ser submentido à Diretoria Colegiada. Neste sentido, foi elaborado o Voto DC Nº 263/2021 para a apreciação da Diretoria Colegiada quanto a homologação do encerramento do Termo de Execução Descentralizada (TED) Nº 2/2015, celebrado com Ministério do Meio Ambiente (MMA). Aguarda-se a realização da reunião da Diretoria Colegiada para essa deliberação.	
				Valor Previsto:	R\$ 459.000,00	Valor realizado:	R\$ 459.000,00	100%	Concluído	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:	
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	
Observações:	
O servidor Carlos Almiro Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto. O servidor José Alido Sabino foi realocado para a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas (CGEP).	

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	PO CGDS/2020005 (ex PO 06)
		Ano:	2020
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.</b>	<b>Processo (s) SEI:</b>	<b>59336.003242/2019-24</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	-
<b>Ação:</b>	<b>4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade</b>	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	-
<b>Finalidade da ação:</b>	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas espec		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
<b>Problema (causa):</b>	A carência de mão de obra é sistemática em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em infraestrutura para criação de cursos de formação e capacitação nas tecnologias emergente. A área de gerenciamento de Datacenters e desenvolvimento de tecnologias para a Computação em Nuvem são setores que atualmente não contam cursos especializados em Pernambuco		
<b>Projeto:</b>	<b>Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem).</b>		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 425.000,00	426.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

**Convênio SICONV 893892/2019**  
**Vigência 30/12/2022**

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	CGDS/SUDENE:	José Farias, Leonardo Moraes
	UPE	Prof. Paulo Hugo, Prof. Bruno Carvalho

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 425.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 319.360,49
Valor liberado no Exercício	R\$ 319.360,49
Saldo a liberar	R\$ 105.639,51
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 319.360,49

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira</b>	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise jurídica</b>	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Elaboração do Termo de Convênio</b>	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Assinatura do Convênio</b>	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.5	<b>Publicação do Convênio</b>	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	<b>Concluído</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 70%)</b>								<b>51%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	<b>Liberação da primeira parcela de recursos</b>	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/04/2021	30/04/2021	<b>R\$ 319.360,49</b>	20/05/2021	20/05/2021	<b>R\$ 319.360,49</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
2.2	<b>Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.</b>	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	01/05/2021	30/11/2021		05/02/2020	--		50,0%	<b>Em Andamento</b>	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de capacitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das JOrnadas, adiaram este Convênio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022, em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto.

2.3	Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	01/04/2021	30/10/2021		28/08/2020	--		60,0%	Em Andamento	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distancia, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	30/01/2022		30/09/2021			30,0%	Em Andamento		
2.4	Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em	UPE	01/07/2020	30/09/2021		07/01/2021			90,0%	Em Andamento	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência ate a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/07/2021	28/02/2021	R\$ 105.639,51				20,0%	Em Andamento	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.	
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/10/2021	10/11/2021					0,0%	A Iniciar		A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1ª de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		16/11/2021	30/11/2021		01/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/12/2021	15/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/12/2021	30/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 425.000,00	Valor realizado:			R\$ 319.360,49	71%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Universidade de Pernambuco - UPE

**Observações:**

Processo SEI n.º 59336.003242/2019-24

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	PO CGDS/2020006 (ex PO 07)
		Ano:	2020
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Processo (s) SEI:	59336.003248/2019-00
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Elxo temático (MDR):	-
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializ		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra e sistematiza em varios setores da area de TIC, sendo necessario o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalizacao da economia e seus impactos na industria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carencia destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.		
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação - PE 4.0		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalizacao da industria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construçao de planos de acao pratica em 10 industrias de setores diversos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 340.000,00	R\$ 341.000,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Convênio SICONV 893056/2019  
Vigência 30/06/2022

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias, Juliana Borges
	UPE	Prof. Djalma Guimarães

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 340.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exerc	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 241.376,80
Valor liberado no Exercício	R\$ 241.376,80
Saldo a liberar	R\$ 340.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 98.623,20
Total Liberado até o exercício	R\$ 241.376,80

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								57%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2021	30/03/2021	R\$ 241.376,80	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 241.376,80	100,0%	Concluído	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.
2.2	Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	30/09/2020	30/05/2020		05/02/2020	15/09/2020		100,0%	Concluído	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas
2.3	Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	O Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados	UPE	30/09/2020	30/08/2021		30/09/2020			90,0%	Em Andamento	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnóstico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021.	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	31/07/2021		05/05/2021			60,0%	Em Andamento	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.	
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/06/2021	28/02/2022	R\$ 98.623,20				0,0%	A Iniciar	Prestação de contas da primeira parcela em andamento	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.

2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/09/2021	30/03/2022					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 340.000,00		Valor realizado:			R\$ 241.376,80	77%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Universidade de Pernambuco - UPE	
Observações:	
Processo SEI n.º 59336.003248/2019-00	

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	PO CGDS/2020007 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ano:	2020
		Processo (s) SEI:	59336.003160/2019-80
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Os provedores na nuvem dependem hoje de data centers distribuídos, que hospedam servidores e dispositivos de rede. Propõe-se a criação da primeira plataforma da América Latina para preparar profissionais e empresas, uma vez que há uma carência de cursos em gerenciamento de Datacenters.		
Projeto:	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.		
Objetivo do projeto:	Capacitar estudantes e profissionais em computação na nuvem para atuarem em células de desenvolvimento em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 649.777,57	651.777,57

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Convênio SICONV 892599/2019  
Vigência: 31/12/2022

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias, Leonardo Moraes
	UPE	Bruno Carvalho

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 649.777,57
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 649.777,57
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								14%	Em Andamento		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/12/2019	28/2/2022	R\$ 649.777,57				0,0%	A Iniciar		
2.2	META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	30/12/2019	30/06/2022		05/02/2020			40,0%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram repactuados os prazos deste convênio	Foi feita a lista dos equipamentos a ser adquiridos, sem perder o objeto e objetivo do convênio
2.3	META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	01/07/2021	30/09/2022		05/02/2020			50,0%	Em Andamento	Diversas reuniões foram realizadas, sendo última reunião de acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final para lançamento da concorrência. Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em outubro.	Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em outubro. Com a variação alta do dólar, houve nova dificuldade em conseguir outras cotações. Espera-se que em janeiro a licitação esteja em processo e em março de 2022, finalizada.
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/03/2022	31/04/2022					0,0%	A Iniciar		A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.



3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 649.777,57		Valor realizado:		R\$ 0,00		34%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.003160/2019-80													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão	Resultados para a sociedade.			Número do Projeto:	PO CGDS/2020008
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.			Ano:	2020
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)			Processo (s) SEI:	
Ação do PPA:	8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas			Objetivo estratégico (MDR):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva, buscando a melhoria da produtividade e competitividade de empreendimentos agros de médio e pequeno porte				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	CODEM/CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Dificuldades de acesso a tecnologias por empreendimentos agros de médio e pequeno porte				
Projeto:	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte				
Objetivo do projeto:	Implantar 6 (seis) unidades piloto de produção de biogás adaptadas para empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte localizados nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio grande do Norte e Ceará para ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$550.000,00	R\$550.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2022
Data Atualização:	31/12/21

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDSDPLAN/SUDENE - Lautemyr Canel e Leonardo Moraes / INSA: Mônica Tejo.
--	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 550.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 550.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	30%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	15/12/20	23/12/20		15/12/20	23/12/20		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/20	25/12/20		21/12/20	25/12/20		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	17/12/20	21/12/22		17/12/20	21/12/20		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	23/12/20	23/12/23		23/12/20	23/12/20		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	28/12/20	28/12/20		28/12/20	28/12/20		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								12%	Em Andamento		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	28/12/20	28/12/20	R\$ 550.000,00	28/12/20	26/2/21	R\$ 550.000,00	100,0%	Concluído	Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram definitivamente liberados em 26/02/2021	

2.2	META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	01/01/21	31/12/22					0,0%	Paralisado	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto realizada em 27/05/2021	Aguardando entrega do relatório e ofício do parceiro indicando o responsável técnico. A previsão era de que fosse entregue 15 dias após a 1ª reunião de acompanhamento. Até o presente momento não foi recebido nenhum documento pela equipe técnica SUDENE. O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.		
2.3	META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás em PE ETAPA 2.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	01/04/21	31/12/22					0,0%	Paralisado		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.		
2.4	META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA	Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	01/09/21	31/12/22					0,0%	Paralisado		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.		
2.5	META 4 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a ser definido pelo INSA	Etapa 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 4.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	01/01/21	31/12/22					0,0%	Paralisado		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar				
3.1	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2022	12/22					0,0%	A Iniciar				
				Valor Previsto:		R\$	550.000,00	Valor realizado:		R\$	550.000,00	42,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO - INSA
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.		Número do Projeto:	PO CGDS/2020009
			Ano:	2020
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Processo (s) SEI:	59336.001156/2020-11
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Objetivo PPA 2020-2023:	Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas.	
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340) - Programa SUDENE: "Tecnologia e Inovação para Convivência no Semiárido - Reuso de águas cinzas"	Objetivo estratégico (MDR):	Desenvolver a Capacidade Produtiva das Regiões	
Finalidade da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Escassez de água destinada a produção da agricultura familiar devido aos grandes períodos de seca, e a falta de projetos que visem a utilização de tecnologias sustentáveis para o reuso da água em sistemas produtivos no semiárido nordestino.			
Projeto:	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.		(Convênio n.º 903159/2020. Processo SEI 59336.001156/2020-11)	
Objetivo do projeto:	Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinza com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				R\$ 476.011,69	R\$ 477.011,69

Previsão de Conclusão:	31/12/2023	CONVÊNIO N.º 903159/2020 (Proposta: 009483/2020)
Data Atualização:	31/12/2021	Vigência: 28/12/2020 a 26/07/2023

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	
dez/20	R\$ 476.011,69	R\$ 1.000,00	R\$ 477.011,69	A realizar no exercício RAP	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$476.011,69	R\$ 1.000,00	R\$ 477.011,69	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 476.011,69
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 476.011,69
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE: José Farias e Juliana Borges Município São Raimundo Nonato: André Santos Landim
--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	25/06/2020	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS			-	06/07/2020	24/07/2020	-	100%	Concluído		
4	Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS			-	01/08/2020	13/08/2020	-	100%	Concluído		
5	Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB-SUDENE				12/08/2020	28/12/2020		100%	Concluído		
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		01/04/2021	31/12/2021					60%	A iniciar		
6	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	01/03/2021	30/05/2021		24/08/2021			20%	Em Andamento	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitatório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, ofício analisado, formato definido. Em 24/8/21, conveniente informa que o edital para chamamento público foi publicado.	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Próxima reunião de acompanhamento técnico agendada para 20/1/22.
7	Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
8	Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	04/05/2021	30/08/2021					0%	Atrasado	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	

9	Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
10	Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	01/02/2021	a definir					0%	A Iniciar	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
11	Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	28/12/2020	01/02/2021					0%	Atrasado	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
12	Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
13	Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	01/02/2021	01/04/2021					0%	Atrasado	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
14	Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
15	Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	01/04/2021	01/06/2021					0%	Atrasado	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
16	Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
17	Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/06/2022					0%	A Iniciar	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
18	Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
19	Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/12/2021					0%	A Iniciar	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
20	Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
21	Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	01/06/2022	26/07/2022					0%	A Iniciar	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
22	Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
23	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	25/09/2022	25/11/2022	-			-	0%	A Iniciar	
Valor Previsto:										R\$ 477.011,69	Valor realizado:	
										20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente).

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.		Número do Projeto:	PO CGDS/2020010
Objetivo estratégico:	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação		Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Exito temático (MDR):	Processo (s) SEI:	59336.000878/2020-58
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MDR):		
Finalidade da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Busca-se contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	É ainda incipiente a incorporação da área de saúde digital na formação dos novos profissionais de saúde, principalmente no interior e nas áreas rurais, bem como para aqueles que já se encontram ativos ou que estão tentando ingressar no mercado de trabalho. É fundamental preparar os profissionais para enfrentar os novos desafios trazidos pela incorporação tecnológica em suas práticas clínicas e ações interventivas no território, criando condições para ampliar o acesso e a qualidade da assistência ao paciente no SUS.			
Projeto:	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)			
Objetivo do projeto:	Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da tele-saúde na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população no SUS. Contribuir com o Programa de Melhoria da Saúde Pública do PRDNE, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNDR.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250532030	3	90	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00

Previsão de Conclusão:	13/05/2024	TED n.º 10/2020
Data Atualização:	31/12/2021	Vigência até: 13/5/2023

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Juliana Borges e Vera Assunção; coordenação CODEM/CGDS: Victor Uchôa / UFPE: Magdala Novaes (NUTES)
--	--

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 969.572,00
dez/20	R\$ 969.572,00		R\$ 969.572,00	A realizar no exercício RAP	
	R\$ 969.572,00	R\$ 0,00	R\$ 969.572,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 969.572,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Manguê Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos.	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos de esta secretaria.	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020	-	100%	Concluído	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020	-	100%	Concluído	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020	-	100%	Concluído	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto nº 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico nº 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		19/08/2020	21/08/2020	-	100%	Concluído	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.	
7	Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		20/08/2020	16/11/2020	-	100%	Concluído	Extrato publicado em 17/11/2020.	

		EXECUÇÃO (Peso 60%)								38,73%	Em Andamento		
8	Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2020	30/11/2020	R\$ 969.572,00	18/11/2020	15/12/2020	R\$ 969.572,00	100%	Concluído	18/11/2020, porém, UG da unidade	
9	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020	--	100%	Concluído	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
10	Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e	CODEM/SUDENE	01/02/2021	15/03/2021		02/02/2021	03/03/2021		100%	Concluído	técnica de acompanhamento, que entre	
11	Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	NUTES/UFPE CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	01/03/2021	31/03/2021		03/03/2021	12/05/2021		100%	Concluído	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Mandala para tratar do webinar sobre	
12	META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	01/01/2021	30/04/2021		01/03/2021	--	--	80%	Em Andamento	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.	
13		Etapa 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	01/01/2021	31/05/2021		01/03/2021	--	--	60%	Em Andamento	A identificação dos núcleos de telessaúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.	
14		Etapa 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	01/03/2021	30/06/2022		01/03/2021	--	--	80%	Em Andamento	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021	
15	Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	--	--		01/06/2021	30/09/2021	--	70%	Em Andamento	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dez/2021 foi transferida para 27/11/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta 1, alcançou um percentual de 75%, e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.
16	META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	01/05/2021	31/12/2022	--	06/12/2021	--	--	20%	Em Andamento	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022.	
17		Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar a estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	01/04/2021	13/05/2023	--	--	--	--	0%	Atrasado		
18	Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	--	--	--	--	--	--	0%	A Iniciar		De acordo com o NUTERS/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, ações de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
19	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	13/05/2023	13/05/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 969.572,00	Valor realizado:		R\$ 969.572,00	59%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>
UFPE/NUTES - Núcleo de Telessaúde da UFPE
<b>Observações:</b>
As articulações para formação e viabilização de proposta com foco em saúde digital foram iniciadas no ano de 2019, porém, só começaram a se materializar, chegando à formalização desta, em 2020, como demonstrado nas etapas elencadas na "Iniciação". 23/12/2020 - Sudene divulga em seu sítio institucional a parceria com o NUTES/UFPE para realização do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	PO CGDS/2020011
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Processo (s) SEI:	59336.002257/2020-17
Ação:	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Elxo temático (MDR):	-
Finalidade da ação:	desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias, estudos e projetos técnicos, promoção de capacitações, formação de multiplicadores, intercâmbio de produtores, instalação de unidades demonstrativas, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismo como opção de organização social e produtiva.	Objetivo estratégico (MDR):	-
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistemática em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalização da economia e seus impactos na indústria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carência destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.		
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação-NE 4.0		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 1.264.680,00	1.265.980,00

Previsão de Conclusão:	30/08/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Convênio SICONV 907660/2020  
Vigência 30/11/2022

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDE NE:	José Farias, Juliana Borges
	UPE	Prof. Djalma Guimarães, Prof. Alexandre Maciel

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 1.264.680,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.264.680,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres	CGDS	01/12/2020	30/12/2020		01/12/2020	30/12/2020		100,00%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/2020	29/12/2020		21/12/2020	29/12/2020		100,00%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2020	30/12/2020		26/12/2020	30/12/2020		100,00%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2020	30/12/2020		30/12/2020	30/12/2020		100,00%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	02/01/2020	17/01/2020		02/01/2020	17/01/2020		100,00%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								15%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/12/2020	31/12/2021	505.872,00	30/12/2021			80,00%	Em Andamento	Análise de ofício enviado pela UPE para ajustes no cronograma e valor das parcelas. Ajustado Convênio em duas parcelas	
2.2	Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilização de empresas e parceiros e diagnóstico/aplicação da metodologia NE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	01/02/2021	30/07/2021		01/02/2021	--		70,00%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 1/2/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021. Reuniões quinzenais com os coordenadores de cada pólo e com o coordenador geral do programa.	Equipe de Coordenadores dos Núcleos Estaduais montada. Identificação de empresas participantes em andamento e em processo de realização da adesão ao programa. Ajustes no termo de referência, diante da continuidade da pandemia e no processo de adesão ao programa. Parte da Meta 1 ajustada, evento será ao final da capacitação. Diagnóstico programado para iniciar em setembro/outubro. Aulas programadas para novembro/dezembro 2021.
2.3	Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores	O Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e universidades federais no Nordeste. Terão 4 núcleos, um em Pernambuco, outro no RGN, outro no Ceará e outro em Sergipe, aulas à distância e presenciais (quando as condições da pandemia permitirem). O programa terá duração de 18 meses, com 12 módulos de 30hs, em cada um dos núcleos atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de	UPE	01/10/2021	30/06/2022		01/10/2021	--		20,00%	Em Andamento	Grade finalizada. Início das construções do edital de seleção dos alunos; Seleção a se iniciar em agosto. Aulas programadas para início em novembro/dezembro de 2021. Convênio prorrogado para final de 2022.	Edital de seleção pronto. Abertura prevista para 4 de janeiro de 2022. Edital de seleção dos professores, a ser lançado dia 11 de janeiro. Aulas a iniciar na segunda quinzena de fevereiro.
2.4	Meta 3: Elaboração de planos de ação	Realização dos projetos/planos de ação em indústria 4.0, como resultado da Residência, em cada uma das 40 empresas participantes	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	01/07/2022	30/08/2022					0,00%	A Iniciar		
2.5	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/01/2022	28/02/2022					0,00%	A Iniciar		
2.6	1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	01/30/2022	30/03/2022					0,00%	A Iniciar		
2.7	Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	01/03/2022	30/05/2022	762.808,00				0,00%	A Iniciar		
2.8	2ª Prestação de contas parcial e final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE e Sudene	01/07/2022	30/09/2022					0,00%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,00%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	01/10/2022	15/10/2022					0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	16/10/2022	30/10/2022					0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/11/2022	30/11/2022					0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.264.680,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	35%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Universidade de Pernambuco - UPE	
Observações:	
Processo SEI n.º 59336.002257/2020-17	

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	PO CGDS/2020012
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
		<b>Processo (s) SEI:</b>	<b>59336.000769/2020-31</b>
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva,		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Necessidade de melhoria da qualidade do rebanho da ovinocaprinocultura nos polos do Nordeste e da assistência técnica mais próxima e adequada às necessidades dos produtores rurais		
Projeto:	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica		
Objetivo do projeto:	Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos da Rota do Cordeiro no Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	426.466,90	426.466,90

Previsão de Conclusão:	30/9/2022
Data Atualização:	31/12/2021

TED processo 59336.000769/2020-31

Vigência: 30/11/2021

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Mauro Póvoas, Mauro Bezerra.
	Embrapa	Marco Bonfim

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 426.466,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 0
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 426.466,90

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	19/05/2020	31/7/2020		19/05/2020	22/6/2020		100,00%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	01/07/2020	30/9/2020		01/07/2020	02/09/2020		100,00%	Concluído		
1.3	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	29/06/2020	29/7/2020		29/06/2020	23/7/2020		100,00%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	5/19/2020	10/30/2020		05/09/2020	10/20/2020		100,00%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								13%			
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 426.466,90	25/11/2020	30/12/2020	R\$ 426.466,90	100,00%	Concluído		
2.2	META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI.	Embrapa	01/11/2020	30/06/2021		05/02/2020			10,00%	Atrasado	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	
2.3	META 2. Análises e Licenciamentos	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiários para melhoria da qualidade da	Embrapa	01/07/2021	30/08/2021					0,00%	Atrasado		A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras solicitações do relatório de acompanhamento. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.
2.4	Meta 3 Capacitações	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	30/11/2020	30/09/2022					0,00%	Atrasado		
2.5	Meta 4. Apoio a Polos	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados gerados	Embrapa e Sudene	30/11/2020	30/4/2021					0,00%	Atrasado		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		01/10/2022	30/10/2022					0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2022	15/11/2022					0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/11/2022	30/11/2022					0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 426.466,90	Valor realizado:		426.466,90	33%	Em Andamento	Status do Projeto	Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode-se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas.

## Parceiros institucionais:

Embrapa Ovíno e Capríno

## Observações:

Processo SEI n.º 59336.000769/2020-31

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado




MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão	Resultados para a sociedade.			Número do Projeto:	PO CGDS/2020013
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.			Ano:	2020
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)		Eixo temático (MDR):	Processo (s) SEI:	59336.001673/2020-90
Ação do PPA:	8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas		Objetivo estratégico (MDR):		
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e con				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	CODEM/CGDS/DPLAN	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra CGDS/DPLAN	
Problema (causa):	A agricultura familiar está sendo impactada pela pandemia do Covid-19. O desconhecimento de técnicas e ferramentas por grande parte dos produtores rurais evidencia a inexistência do papel de empreendedor que agrega valor aos seus produtos e impulsiona seu negócio				
Projeto:	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ACELERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO PÓS PANDEMIA DE COVID-19				
Objetivo do projeto:	Fortalecer empreendimentos rurais do Semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica e social no Semiárido. Espera-se ainda, oferecer aos empreendimentos diferenciais competitivos que proporcione a estes, melhor posicionamento frente ao seu mercado.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED 11/2020	R\$465.839,00	R\$465.839,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/04/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/21

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	CGDS/DPLAN/SUDENE - Vera Lúcia Assunção, Lautemyr Canel/ INSA: Mônica Tejo.
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exerc	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 465.839,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 465.839,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		<b>PLANEJAMENTO (Peso 30%)</b>							-	30%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	15/10/2020	24/11/2020		15/10/2020	24/11/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	19/11/2020	19/11/2020		19/11/2020	19/11/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE / INSA	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	30/11/2020	30/11/2020		30/11/2020	30/11/2020		100,0%	Concluído		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								35%	Em Andamento		
2.1	Descentralização dos créditos	Transferencia de créditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	30/11/2020	30/11/2020	R\$ 465.839,00	30/11/2020	10/02/2021*	R\$ 465.839,00	100,0%	Concluído	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208, de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	

2.2	<b>Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semiárido brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.</b>	<p>Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa;</p> <p>Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base no modelo CERNE de gestão adaptado;</p> <p>Etapa 1.3. Executar 05 mentorias por unidade multiplicadora, de 05 horas/mentoria, a cada dois meses para acompanhar os grupos das quatro Unidades Multiplicadoras.</p>	INSA	01/12/2020	31/12/2021		10/02/2021	30/06/2021	100,0%	Concluído	Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da justificativa de ajuste/alteração do cronograma físico, em atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o período informado foi maio-junho/2021.	
2.3	<b>Meta 2 – Prospectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.</b>	<p>Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semiárido que fazem parte dos estados participantes do programa;</p> <p>Etapa 2.2 Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção;</p> <p>Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.</p>	INSA	01/02/2021	31/03/2021		22/03/2021	30/04/2021	100,0%	Concluído	De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do PaqTc PB <www.paqtc.org.br> Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021. Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos as comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não muito legíveis.	
2.4	<b>Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semiárido, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.</b>	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	01/03/2021	31/03/2021		26/05/2021	30/06/2021	100,0%	Concluído	A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a assinatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.	
2.5	<b>Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semiárido contemplados no programa.</b>	<p>Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas;</p> <p>Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado);</p>	INSA	01/12/2020	30/11/2022		01/06/2021	--	20,0%	Em Andamento	No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.	
2.6	<b>Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.</b>	<p>Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa;</p> <p>Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos.</p>	INSA	01/12/2020	31/01/2022		01/07/2021	--	50,0%	Em Andamento	<p>Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semiárido do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram tres delas:</p> <p>1.Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados);</p> <p>2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021);</p> <p>3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021);</p>	De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).

2.7	Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	01/02/2021	31/01/2022		--	--		0,0%	A Iniciar		
2.8	Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semiárido participantes do Programa de Aceleração.	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de	INSA	01/03/2021	30/11/2022		--	--		0,0%	A Iniciar		
2.9	Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	01/12/2020	30/11/2022		10/02/2021	--		50,0%	Em Andamento		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de Contas	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED,.	CGDS	01/02/2022	30/04/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 465.839,00	Valor realizado:		R\$ 465.839,00	64,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:													
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO - INSA													
Observações:													
Processo: nº 59336.001673/2020-90													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão	Resultados para a sociedade.		Número do Projeto:	CGDS/2022001
Objetivo estratégico:	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional		Ano:	2022
Programa:	Ação não orçamentária		Processo (s) SEI:	
Ação:	Ação não orçamentária	Eixo temático (MDR): Objetivo estratégico (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria II. Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-as a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Finalidade da ação:	OPLAN		Subunidade responsável:	
Diretor(a) responsável:	Raimundo Gomes de Matos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/OPLAN)	
Problema (causa):	Necessidade de uma maior divulgação e debates sobre temáticas voltadas ao desenvolvimento regional, sobretudo, fazendo as conexões com o PRONE.		Gestor da subunidade:	Beatriz Arante Bezerra de Menezes Lyra
Projeto:	Webinars para difusão do conhecimento e articulação de parceiros.			
Objetivo do projeto:	Difundir conhecimentos e articular parceiros, abordando temas trabalhados pela CODEM/CGDS/OPLAN e/ou relevantes para o desenvolvimento da região Nordeste (Meta Institucional nº 11, ciclo 2021/2022, Realização de eventos de articulação de parceiros e difusão tecnológica: webinários abordando temáticas trabalhadas pela CGDS/OPLAN).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros
	-	-	-			Pago até o ano anterior R\$ -
						A realizar no exercício R\$ -
						Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício (1) R\$ -
						Valor liberado no Exercício R\$ -
						Saldo a liberar R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/09/22
Data Atualização:	31/12/21

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/CGDS/SUDENE: Vera Lúcia Assunção, Juliana Borges, Mauro Povoa, Mauro Bezerra, José Farias, Lautemyr Canel, Marcelo Saki - CODEM/CGDS
	Coordenação: Victor Uchôa Silva

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
<b>1</b>	<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
1.1	Planejamento do Projeto - Meta Institucional 11, ciclo 2021/2022	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, metodologia, definição dos eventos, temas/focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	17/01/2022	31/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
1.2	Definição do modus operandi, Plataforma, para realização dos eventos On line	Reunião, contatos junto a Ascom e CGTI, para definição de ferramenta para realização dos eventos <i>on line</i> que permita participação do público e gravação das aulas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	01/03/2022	14/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
1.3	Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	01/03/2022	31/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
1.4	Plano de divulgação dos eventos do Projeto: incluindo os quatro webinars	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/04/2022	31/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
<b>2</b>	<b>EXECUÇÃO: Realização dos eventos (PESO 80%)</b>									<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
2.1	Evento On Line 1	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	01/03/2022	30/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.2	Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	01/03/2022	14/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.3	Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	01/03/2022	14/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.4	Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levantá em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	16/03/2022	14/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.5	Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações	CODEM/CGDS	16/03/2022	14/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.6	Realização do 1º evento <i>On line</i>	O evento será gravado para fins de disponibilização no you tube da SUDENE	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/04/2022	30/04/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.7	Evento On Line 2	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	01/04/2022	31/05/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.8	Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	01/04/2022	17/05/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.9	Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	01/04/2022	17/05/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.10	Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levantá em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	20/04/2022	17/05/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.11	Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	20/04/2022	17/05/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.12	Realização do 2º evento <i>On line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	02/05/2022	31/05/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.13	Evento On Line 3	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	01/06/2022	30/07/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.14	Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	01/06/2022	15/07/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		



2.15	Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	01/06/2022	15/07/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.16	Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	20/06/2022	20/07/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.17	Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	20/06/2022	20/07/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.18	Realização do 3º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/07/2022	30/07/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.19	Evento On Line 4	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	01/07/2022	31/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.20	Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	01/07/2022	17/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.21	Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	01/07/2022	17/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.22	Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	20/07/2022	17/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.23	Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	20/07/2022	17/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
2.24	Realização do 4º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/08/2022	31/08/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
3 PÓS-EVENTO: Relatório Técnico (Peso 20%)										0%	A Iniciar		
3.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 4 eventos.	A Meta Institucional 11 do ciclo 2021/2022 será concluída com um relatório que contemple os quatro eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	01/09/2022	30/09/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 0,00		Valor realizado:		R\$ 0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:													
Observações:													
Projeto 4 Meta Institucional, constante no anexo da Portaria Sudene nº 138 de 22 de dezembro de 2021. (META 11)													

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado







**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão:	Resultados para a sociedade			Número do Projeto:	PO CGEP/2019002 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			Ano:	2019
Programa do PPA:	-				
Ação do PPA:	-				
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Demanda do setor produtivo de palma por colheita mecanizada, a qual diminuirá os custos e aumentará o rendimento da produção				
Projeto:	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma				
Objetivo do projeto:	Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/05/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Aílido Sabino; Joyce Silva; Marcelo Saiki
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento									100%	Concluído		
1.1	Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	01/03/2019	31/03/2019	-	01/03/2019	31/03/2019	-	100%	Concluído		
2	Articulação									100%	Concluído		
2.1	1º Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	15/04/2019	15/04/2019	-	15/04/2019	15/04/2019	-	100%	Concluído	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2.2	2º Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aílido Sabino / Robson Brandão	15/08/2019	15/08/2019	-	15/08/2019	15/08/2019	-	100%	Concluído	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapii)

2.3	Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	16/10/2019	16/10/2019	-	16/10/2019	16/10/2019		100%	Concluído	Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapii
2.4	Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100%	Concluído	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
2.5	Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	01/11/2019	31/11/2019		01/11/2019	31/11/2019		100%	Concluído		
3	Planejamento de Evento (Reunião Técnica - TECHPALMA)									100%	Concluído		
3.1	Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100%	Concluído		
3.2	Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100%	Concluído	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
3.3	Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100%	Concluído		
3.4	Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100%	Concluído		
3.5	Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100%	Concluído		
3.6	Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100%	Concluído		
3.7	Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100%	Concluído		

4	Acompanhamento									83%	Em Andamento		
4.1	Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	01/03/2020	01/05/2020		01/03/2020	23/08/2020		100%	Concluído	<p>Durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dias 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA.</p> <p>Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheitadora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referências culturais para o desenvolvimento da colheitadora;</p>	
4.2	Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	01/05/2020	31/12/2021		23/08/2020			65%	Em Andamento	<p>Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma.</p> <p>A Casale deverá lançar o equipamento ainda em 2021;</p> <p>PO reprogramado para 2021;</p> <p>Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenvolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do protótipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no dia 22/09/21; A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 2021; Será realizado o 10º Congresso Internacional de Palma e Coconilha, no período de 28 a 31 de março de 2022, em João Pessoa (PB), por meio da parceria entre Faepa/PB, Sociedade Internacional de Ciência Hortícola (ISHS) e Rede de Cooperação Técnica Internacional sobre a Palma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO-ICARDA), oportunidade na qual as empresas irão apresentar as evoluções do desenvolvimento da Colheitadeira.</p>	

5	Avaliação									0%	A iniciar			
5.1	Avaliação dos resultados do projeto	Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	01/10/2021	30/03/2022					0%	A iniciar	PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021		
5.2	Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	30/03/2022	29/04/2022					0%	A iniciar			
5.3	Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	29/04/2022	29/05/2022					0%	A iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	76,5%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2019005 (ex PO 18)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>		<b>Ano:</b>	<b>2019</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos		<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de instrumento voltado para o planejamento do desenvolvimento sustentável			
<b>Projeto:</b>	Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Triha 3			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.481.361,00	R\$ 1.481.361,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/12/2020
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Miguel Araújo, Tássia Germano, Gabriela Isabel e Marina Barbosa.
---	--

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL		
R\$ 1.481.361,00			R\$ 1.481.361,00	Pago até o ano anterior	R\$ 120.403,17
				A realizar no exercício	R\$ 269.514,00
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 120.403,17

Nome da Etapa		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto			Realizado		Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
					Fim	Valor		Início	Fim	Valor				
1	Análise do Relatório P14	<p><b>P14 - Relatório de necessidades e requisitos de informação para monitoramento do PRDNE</b> (Documento de arquitetura da informação). A partir de reuniões presenciais na SUDENE, com sua equipe designada, serão realizados trabalhos especializados para elicitação de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação preliminarmente identificada será possível elaborar o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do PRDNE.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/09/2019	31/10/2019	R\$ 139.828,50		Não informado	10/12/2019	R\$ 120.403,17	100%	Concluído	O estudo está sendo realizado para a área de atuação da Sudene.	
2	Análise do Relatório P15	<p><b>P15 - Relatório de Metodologia de Monitoramento - Carteira de Projetos PRDNE.</b> Com a condução de especialista em indicadores e processos de acompanhamento de políticas públicas, a equipe do CGEE irá elaborar, com a participação dos técnicos da SUDENE, o processo e métodos de acompanhamento de carteira de programas e projetos relativos ao PRDNE. Reuniões de trabalho presenciais (pequenos workshops) com participação da equipe da SUDENE serão realizadas como meio de promover a troca de idéias e melhor integrar a metodologia com os procedimentos de trabalho, bem como coletar percepções sobre a melhor cesta de indicadores que permitam dimensionar e equacionar a relação recursos versus metas e antever as os esforços e capacidades necessários para seu alcance. O desenho da metodologia, construído em consenso com a Sudene e observando as estruturas de produção de dados e informações dos entes envolvidos com o PRDNE, promoverá, também um detalhamento da necessidade de informação prevista no produto P14.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	11/11/2019	30/11/2020	R\$ 269.514,00		Não informado	11/11/2019	-	50%	Atrasado	<p>Foi entregue versão preliminar em fevereiro de 2020. A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. A versão final foi enviada à Sudene no dia 18 de dezembro. A apreciação técnica do produto se deu pela COAE/CGEP, com o envio da Nota Técnica 2 (0216636) no dia 05/01/2021. Neste momento, a CGEP e CGCP aguardam o envio do produto revisado e com os ajustes solicitados. Em 31/03/2021, foi realizada reunião com CGEE para alinhar as solicitações realizadas no Nota Técnica 2 (SEI 0216636). Dentre os encaminhamentos da reunião, as partes acordaram que a nova versão do produto com os ajustes apontados na Nota Técnica se dará até o dia 20/04/2021.</p> <p>A segunda versão do Produto 15 foi encaminhada pelo CGEE em 22/04/21. Em razão da priorização de outros projetos que demandaram maior dedicação dos técnicos, a conclusão da análise se deu apenas em 02/06/21 por meio da Técnica 117 (SEI 0247260), que novamente apontou uma série de recomendações.</p> <p>A terceira versão do Produto 15 foi encaminhada pelo CGEE em 26/06/21, sendo encaminhada a área técnica em 28/06/21. O prazo acordado para o atendimento da demanda é o dia 20/07/2021, conforme consta no Despacho SEI 0255121. Em 20/07/2021, a equipe emitiu Nota Técnica nº 144 SEI 0259152, o qual opinou-se, novamente, pela não aprovação do Produto 15.</p> <p>Em 07/12/2021, o CGEE encaminha documento com justificativas do não atendimento das Notas Técnicas anteriores e proposta de novo capítulo a ser inserido ao documento. Em 22/12/2021, foi emitida Nota Técnica nº290 (SEI 0309658) que ratifica as solicitações anteriores.</p>	



3	Análise do Relatório P16	<p><b>P16 - Capacitação metodológica para monitoramento de carteira de projetos relativa ao PRDNE.</b> A metodologia de monitoramento de carteira de projetos desenvolvida será disseminada por meio de uma capacitação para técnicos e gestores da SUDENE a se realizar nas dependências da Superintendência. O trabalho também envolve a elaboração do ementário e material de curso, e contará atuação dos principais formuladores da metodologia. A oportunidade de apresentar a metodologia elaborada será utilizada, também, para coleta de percepções (críticas, sugestões e correções) dos técnicos da SUDENE e melhoria da metodologia. Em vista disso, está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	23/03/2020	31/12/2020	R\$	70.397,25			0%	Cancelado	<p>A atividade foi paralisaada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 12/04/2021 (início) a 21/05/2021 (término).</p> <p>Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021.</p> <p>Portanto, o produto em questão fora cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.</p>		
4	Análise do Relatório P17	<p><b>P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE.</b> O produto 17 se fundamenta na metodologia de monitoramento de carteira de projetos e na realização de evento reunindo grupo de trabalho do sistema nacional e estadual de informação. O objetivo será a montagem de processo e métodos que contemplem a captura e tratamento de dados e informações, disponibilizadas pelos entes do sistema nacional de informação e estaduais envolvidos com o PRDNE à Sudene, conforme a necessidade de informação prevista metodologia de monitoramento. Esses insumos serão trabalhados pela equipe do CGEE, juntamente com especialista em indicadores e equipe da SUDENE para a definição dos mecanismos e instrumentos (informatizados) para coleta e tratamento de dados advindos de fontes de dados digitais, e armazenamento em repositório digital de dados e informações a ser configurado, também como parte do trabalho.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/11/2020	28/02/2021	R\$	389.177,25			0%	Cancelado	<p>Repactuado conforme aditivo à carta acordo.No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 17/05/2021 (início) a 22/09/2021 (término)</p> <p>Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos Produtos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021.</p> <p>Portanto, o produto em questão fora cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.</p>		
5	Análise do Relatório P18	<p><b>P18 - Relatório descritivo dos instrumentos e mapas de conhecimento afetos à carteira de projetos do PRDNE.</b> A equipe do CGEE alocada ao projeto, realizará a adaptação do processo de Inteligência em CTI do CGEE para geração de informação de alto valor agregado com foco na gestão tática do PRDNE e de acompanhamento de indicadores de desenvolvimento regional advindos da metodologia de monitoramento. Em trabalho conjunto com os técnicos da SUDENE, o que envolve reuniões presenciais, será produzido modelo de processo de trabalho que descreve as atividades de geração de informação e conhecimento, a partir de repositórios de dados oriundos da metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações. Esses processos de trabalho são apoiados por ferramentas automatizadas de visualização de informação, por exemplo, em mapas (georreferenciamento), redes de relacionamento, hierarquias de assuntos e buscas textuais (ferramentas Insight), as quais serão disponibilizadas para a SUDENE. Neste produto constarão as atividades executadas durante o período de operação assistida que consiste no apoio à execução das metodologias e suporte ao uso dos instrumentos de informação.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/02/2021	31/05/2021	R\$	355.850,25			0%	Cancelado	<p>Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 02/06/2021 (início) a 11/11/2021 (término)</p> <p>Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021.</p> <p>Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.</p>		
6	Análise do Relatório P19	<p><b>P19 - Relatório da capacitação instrumental e operação assistida da metodologia e ferramentas de apoio de monitoramento do PRDNE.</b> A equipe do CGEE fará a capacitação para até 30 técnicos indicados pela Sudene na utilização de instrumentos de captação de dados e geração de informação previstos nas metodologias de Gestão de Fontes e de Mapas de Conhecimento, nas dependências da SUDENE. Está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação, bem como nos momentos posteriores para apoio no implementação da metodologia.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	30/06/2021	R\$	94.185,00			0%	Cancelado	<p>Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 11/10/2021 (início) a 18/11/2021 (término).</p> <p>Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021.</p> <p>Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.</p>		
7	Análise do Relatório P20	<p><b>P20 - Relatório da Trilha de Inteligência.</b> A partir de análise crítica da implementação das metodologias e insumos coletados das demais trilhas do projeto, a equipe do CGEE em conjunto com especialista em indicadores irá elaborar o resumo geral das metodologias implantadas e os resultados alcançados, bem como um documento de visão contendo especificações de alto nível de funcionalidades para um sistema de informação fundamentado nas metodologias implantadas. O trabalho irá requerir visita in loco para observação do funcionamento da metodologia, bem como coleta de percepções e discussão com a equipe da SUDENE.</p>	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	31/07/2021	R\$	162.408,75			0%	Cancelado	<p>Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 13/09/2021 (início) a 30/11/2021 (término)</p> <p>Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021.</p> <p>Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.</p>		
Valor Previsto:						R\$	1.481.361,00	Valor realizado:	R\$	120.403,17	38%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão:	Resultados para a sociedade			Número do Projeto:	PO CGEP/2020001 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):			
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):			
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves		
Problema (causa):	Ausência de mapeamento das empresas incentivadas através da redução de 75% do imposto sobre lucro da operação, na área de atuação da Sudene				
Projeto:	Estudo de georreferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75% ).				
Objetivo do projeto:	Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/01/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Marcelo Braga; José Alonso, Ludmila Calado
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Redução de 75% sobre IRPJ) da Área de Atuação da Sudene</b>			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019	18/11/2020		100%	<b>Concluído</b>	A data prevista para conclusão do produto precisou ser alterada em virtude das dificuldades de acessos aos dados e do trabalho remoto, decorrente da Pandemia COVID19.	Previsão de conclusão até 30/12/2020.
1.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020	-	100%	<b>Concluído</b>		
1.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com a redução de 75% do IRPJ para o georreferenciamento e formulação de mapas da Regiões intermediárias e municípios da área da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/02/2020	31/05/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	<b>Concluído</b>		
1.3	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/03/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	<b>Concluído</b>		
1.4	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias e suas atividades econômicas	Gerar tabelas e gráficos com os dados dos últimos 9 anos das principais atividades econômicas	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	31/07/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	<b>Concluído</b>		
1.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva das empresas georreferenciadas sobre as áreas de cidades-polo e regiões intermediárias e municípios, e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	<b>Concluído</b>		

2	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Reinvestimento) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019			100%	Concluído		
2.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020		100%	Concluído		
2.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com o reinvestimento para o georreferenciamento e formulação de mapas da regiões intermediárias e municipais	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
2.3	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com as regiões intermediárias	Gerar mapas dos dados dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/07/2020	31/07/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
2.4	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com os municípios da área da Sudene	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas pelo Reinvestimento dos municípios da área de atuação da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/08/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
2.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva dos mapas com as áreas das regiões intermediárias e municípios e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	Concluído	Existem inconsistências nos dados de Reinvestimentos do SIBF, que estão relacionados no relatório final	
2.6	Consultar e coletar dados no Banco de Dados SIBF para verificação de informações	Analisar, através de consultas, a base de dados SBIF para buscar informações que subsidiem a conclusão do relatório,	Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso, Thais Silva	13/09/2021	22/10/2021		01/10/2021	22/10/2021		100%	Concluído	Modificações na equipe envolvida em virtude de movimentações de servidores entre coordenações.	
2.7	Tabular e tratar dados coletados no Banco de Dados SIBF	Desenvolver a tabulação e tratamento dos dados, adequando-os para inclusão no Relatório	Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso, Thais Silva	25/10/2021	05/11/2021		25/10/2021	05/11/2021		100%	Concluído		
2.8	Discutir os resultados e ajustes na organização do documento	Fazer uma discussão dos resultados e promover os ajustes necessários para finalização do Relatório	Marcos Falcão, Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso	13/09/2021	19/11/2021		10/09/2021	26/11/2021		100%	Concluído	Etapa de discussão do Relatório Final acrescentada; Alterações na organização do documento, com ajustes necessários para sua finalização.	
2.9	Relatório Final	Elaboração do relatório final do estudo.	Marcos Falcão, Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso	13/09/2021	30/11/2021		10/09/2021	31/01/2022		100%	Concluído		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:
Observações:
Foi alterada a data de conclusão do projeto para 31/12/2021 em função da mudança de servidores que necessitou de ajustes no projeto (SUBSTITUI A DATA DE CONCLUSÃO DO PROJETO DE 30/09/2021 PARA 01/01/2022)

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para clientes, usuários, beneficiários e partes interessadas</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2020002 (ex PO 19)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE</b>	<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	-
<b>Ação do PPA:</b>	-	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	-
<b>Objetivo da ação:</b>	-		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de regionalização das políticas públicas de educação		
<b>Projeto:</b>	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaboração de um índice que norteie a regionalização de Políticas Públicas de Educação		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/04/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Glória Sistelos, Joyce, Gabriela Isabel.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>1</b>	<b>Dados</b>		Glória Sistelos	<b>01/01/2020</b>	<b>30/10/2020</b>	-	<b>01/01/2020</b>	<b>04/09/2020</b>		<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	
1.1	Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído	
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	Concluído	Em virtude da divulgação do resultado do IDEB 2019 em 15/09/20, sentiu-se a necessidade de incluir os novos dados no levantamento
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	Glória Sistelos	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	Concluído	
1.4	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	04/09/2020		100%	Concluído	Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados IDEB 2019
<b>2</b>	<b>Análise</b>		Glória Sistelos	<b>02/03/2020</b>	<b>30/01/2021</b>	-	<b>24/02/2020</b>	<b>30/01/2021</b>		<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	
2.1	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	Concluído	
2.2	Elaboração do ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	Concluído	
2.3	Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	30/01/2021		100%	Concluído	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE ). Novo prazo acordado: 25/10/2020
2.4	Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	02/03/2020	30/11/2020	-	13/10/2020	28/10/2020		100%	Concluído	Os mapas foram resultados do IDEB 2019
2.5	Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	01/04/2020	30/11/2020	-	28/10/2020	30/01/2021		100%	Concluído	
2.6	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/04/2020	30/12/2020	-	24/02/2020	30/01/2021		100%	Concluído	Falta incluir os dados do IDEB 2019

2.7	Revisão do Relatório Parcial	Revisar Relatório Parcial	Glória Sistelos	04/09/2020	30/01/2021		04/09/2020	30/01/2021		100%	Concluído	Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta atividade no PO	
3.	Panorama de Políticas Públicas de Educação		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
3.1	Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao cumprimento do IDEB	Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
3.2	Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as políticas encontradas	Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
3.2	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
4	Relatório final		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	30/04/2022	-	13/07/2020	-	-	33%	Em Andamento	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19). Solicitação de nova postergação do prazo devido à priorização dos processos: Avaliação do FNE (Processo SEI 59336.001165/2020-10); Estudo de Complexidade Econômica (Processo SEI 59336.000928/2020-05); Trilha da Inteligência Produto 15 (Processo SEI 59336.002520/2020-60); Delimitação do Semiárido (Processo SEI 59336.000463/2020-84) Novo prazo acordado: 30/04/2022	
4.1	Consolidação	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	31/03/2022	-	13/07/2020			65%	Em Andamento		
4.2	Revisão	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos	31/03/2022	30/04/2022	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	83%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Observações:

Em virtude da divulgação do resultado do IDEB 2019 em 15/09/20, foram ajustados os prazos e os percentuais de entrega das atividades, pois algumas delas precisarão ser refeitas

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2020003 (EX PO 20)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
<b>Programa do PPA:</b>	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		
<b>Ação do PPA:</b>	<b>Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação</b>		
<b>Objetivo da ação:</b>	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Importância da cultura da Palma para o Semiárido		
<b>Projeto:</b>	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIARIDO		
<b>Objetivo do projeto:</b>	de alguns problemas fitossanitários.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	3	90	R\$ 441.438,94	R\$ 441.438,94
	250 e 280	4	90	R\$ 38.410,15	R\$ 38.410,15
					<b>R\$ 479.849,09</b>

Ata 360º Reunião de Diretoria Colegiada

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/03/2024
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

Processo 59336.000816/2020-46 (TED Sudene/INSA nº 002/2020)

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino
	INSA:	JUCILENE SILVA ARAÚJO

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 211.365,00
Orçamento Aprov. no exercício (LOA)	R\$ 350.707,09
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 350.707,09
Valor liberado no Exercício	R\$ 350.707,09
Saldo a liberar	R\$ 129.142,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 350.707,09

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	Concluído		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>32%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	Liberção da primeira parcela de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 211.365,09	08/10/2020	14/10/2020	R\$ 211.365,09	100,0%	Concluído	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	

2.2	Subprojeto 1	Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético de opuntia spp visando a sua utilização como forrageira e prospectando novas potencialidades a partir da coleção do INSA.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 193.711,83				20,5%	Em Andamento		
2.2.1	Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 13.600,00	11/02/2021	31/03/2021		100,0%	Concluído		
2.2.2	Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	16/10/2020	08/07/2022	R\$ 8.500,00	11/02/2021			25,0%	Em Andamento		
2.2.3	Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 15.000,00	11/02/2021			40,0%	Em Andamento		
2.2.4	Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria.	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 28.400,00	01/02/2021			7,0%	Em Andamento		
2.2.5	Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	10/11/2021	08/07/2022	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.6	Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de híbridos S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	14/01/2021	08/07/2022	R\$ 10.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.7	Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	11/09/2021	01/10/2023	R\$ 25.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.8	Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	08/07/2022	01/10/2023	R\$ 35.000,00				0,0%	A Iniciar		



2.2.9	Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micrósporo (androgenese) e óvulos não-fertilizados (ginogenese).	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R\$ 10.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.10	Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R\$ 13.000,00	01/06/2021			40,0%	Em Andamento		
2.2.11	Meta 11: Reduzir o tempo de juvenilidade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenilidade	INSA	14/05/2021	10/11/2021	R\$ 6.611,83	01/09/2021			10,0%	Em Andamento		
2.2.12	Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progênies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R\$ 7.600,00	01/06/2021			15,0%	Em Andamento		
2.2.13	Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	11/10/2021	01/10/2023	R\$ 6.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.14	Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	16/10/2020	01/10/2023	Não se aplica	11/02/2021			50,0%	Em Andamento		
2.3	Subprojeto 2	Estratégia de manejo para controle da cochonilha-de-escama em palma forrageira.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 167.850,26				16,7%	Em Andamento		
2.3.1	Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	16/10/2020	03/06/2023	R\$ 15.000,00	11/03/2021			45,0%	Em Andamento		
2.3.2	Meta 2: Biologia de Diaspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	15/03/2021	04/05/2023	R\$ 25.000,00	01/04/2021			45,0%	Em Andamento		
2.3.3	Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama	Produto: Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	13/07/2021	04/01/2023	R\$ 35.850,24	01/09/2021			10,0%	Em Andamento		
2.3.4	Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	13/07/2021	04/04/2023	R\$ 15.000,00	01/09/2021			2,0%	Em Andamento		
2.3.5	Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	09/05/2022	03/07/2023	R\$ 25.000,00	01/05/2021			5,0%	Em Andamento		

2.3.6	Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	14/01/2021	03/02/2023	R\$ 27.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.7	Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R\$ 25.000,02	01/10/2021			10,0%	Em Andamento		
2.4	Subprojeto 3	Manejo integrado de doenças em palma forrageira no semiárido.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 118.287,00				40,0%	Em Andamento		
2.4.1	Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	16/10/2020	10/11/2021	R\$ 31.153,40	11/02/2021			100,0%	Concluído		
2.4.2	Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	13/06/2021	05/12/2022	R\$ 41.240,00	15/08/2021			40,0%	Em Andamento		
2.4.3	Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	06/10/2022	04/04/2023	R\$ 21.946,00	11/02/2021			25,0%	Em Andamento		
2.4.4	Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	05/11/2022	04/05/2023	R\$ 9.333,60	01/12/2021			20,0%	Em Andamento		
2.4.5	Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematoides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	05/11/2022	02/08/2023	R\$ 14.614,00	15/08/2021			30,0%	Em Andamento		
2.4.6	Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	13/06/2021	01/10/2023	Não se aplica	30/09/2021			25,0%	Em Andamento		
2.5	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021	-	01/04/2021	14/04/2021		100,0%	Concluído	O INSA encaminhou o 1º Relatório Técnico Parcial em 14/04/2021. Este foi analisado e aprovado em 23/06/2021, pelo Parecer Técnico 160.	
2.6	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 139.342,00	01/12/2021	10/12/2021	R\$ 139.342,00	100,0%	Concluído		
2.7	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022		27/07/2021	18/10/2021		100,0%	Concluído	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021	
2.8	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 129.142,00				0,0%	A Iniciar		
2.9	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2023	30/01/2023					0,0%	A Iniciar		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	01/10/2023	30/11/2023					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	01/12/2023	30/01/2024					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/01/2024	31/03/2024					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 479.849,09		Valor realizado:		R\$ 350.707,09	52%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
INSA													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.000816/2020-46 - TED 002/2020 - INSA PALMA													
Observação: Informações atualizadas com a ajuda da Sra. Jucilene Araújo, tecnologista MCTI/Instituto Nacional do Semiário.													
Fonte: CGEP													

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>PO CGEP/2020004 (EX PO 21)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.</b>	<b>2020</b>
<b>Programa do PPA:</b>	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	
<b>Ação do PPA:</b>	<b>Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação</b>	
<b>Objetivo da ação:</b>	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação.	
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b> Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b> Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de difusão de tecnologias e capacitação dos agricultores, familiares e técnicos atuantes nas comunidades dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, localizados no Estado do Rio Grande do Norte.	
<b>Projeto:</b>	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	
<b>Objetivo do projeto:</b>	Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas tecnologias às populações produtoras, dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, os quais possuem seus territórios limitados pelas margens do rio e têm representatividade na região em termos de produção de leite bovino.	

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	3	90	R\$ 251.412,28	R\$ 251.412,28
	250 e 280	4	90	R\$ 47.520,00	R\$ 47.520,00
				<b>R\$ 298.932,28</b>	

Ata 360a Reunião de Diretoria Colegiada

<b>Previsão de Conclusão:</b>	04/08/2023
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

Processo 59336.001084/2020-10 - TED Sudene INSA nº 001/2020

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	CGEP/SUDENE:	Mauro Bezerra e Aldo Sabino
	INSA:	GEOVERGUE RODRIGUES DE MEDEIROS

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício (2020 e 2021)	R\$ 218.511,98
Orçamento Aprov.no exercício (LOA)	R\$ 218.511,98
Valor Empenhado no Exercício (2020)	218.511,98
Valor liberado no Exercício	218.511,98
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 218.511,98

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependência da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	Concluído		
2		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								22%	Em Andamento		

2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 75.397,01	14/10/2020	19/02/2021	R\$ 75.397,01	100,0%	Concluído	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC000002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.	
2.2	Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte	Produto: diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 26.570,08	19/02/2021			60,0%	Em Andamento	Cada etapa da meta, quando finalizada equivale a 20%. 5 etapas x 20 = 100% Etapa 1.1. – está sendo feito o levantamento bibliográfico = 10% realizada; Etapa 1.2. Todos os atores (produtores, secretários e secretárias municipais e técnicos já foram mobilizados) – 20% realizado	
2.3	Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	15/03/2021	08/06/2022	R\$ 12.687,37	não informado			10,0%	Em Andamento	Meta iniciada.	
2.4	Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	14/01/2021	05/11/2022	R\$ 22.720,81	não informado			10,0%	Em Andamento	Meta iniciada. Foi concluída a capacitação da equipe responsável, pela coleta e análise.	
2.5	Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	13/02/2021	09/05/2022	R\$ 6.300,13	não informado			10,0%	Em Andamento	Meta iniciada. Foi realizado o processamento dos questionários.	
2.6	Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	14/01/2021	15/04/2022	R\$ 75.004,62	não informado			10,0%	Em Andamento	Meta iniciada. Foi concluída a capacitação da equipe responsável, pela coleta e análise.	
2.7	Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	13/07/2021	09/05/2022	R\$ 22.530,00				0,0%	A Iniciar		
2.8	Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA		04/01/2023	R\$ 23.726,04				0,0%	A Iniciar		

2.9	Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais adequados para a região da bacia hidrográfica Piranhas-Açu	Produto: Três artigos científicos	INSA	13/06/2021	03/02/2023	R\$ 4.500,00				0,0%	A Iniciar	
2.10	Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do	Produto: Seleção de equipe	INSA	15/12/2020	14/01/2021	R\$ 75.000,00	05/03/2021	28/04/2021		100,0%	Concluído	Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis L. Gurenco e Já foi enviado o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referente ao período de janeiro a junho/2021 SEI INSA (7198432). O terceiro relatório trimestral
2.11	Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	14/01/2021	08/06/2022	Não se aplica	19/02/2021			20,0%	Em Andamento	
2.12	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021	-	01/03/2021	25/03/2021		100,0%	Concluído	O primeiro relatório trimestral foi encaminhado pelo INSA em 25/03/2021. O documento foi analisado pela equipe técnica e aprovado em 25/05/2021 pelo Parecer Técnico 28.
2.13	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 143.114,97	19/08/2021	23/09/2021	R\$ 143.114,97	100,0%	Concluído	
2.14	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022						A Iniciar	
2.15	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 80.420,30				0,0%	A Iniciar	
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	03/02/2023	04/04/2023					0,0%	A Iniciar	
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	05/04/2023	04/06/2023					0,0%	A Iniciar	
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	05/06/2023	04/08/2023					0,0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:		R\$ 298.932,28	Valor realizado:		R\$ 218.511,98	42%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
INSA	
Observações:	
Processo SEI n.º 59336.001084/2020-10 - TED INSA LEITE. A diferença de R\$ 29.893,23 entre o valor previsto e o valor total do projeto diz respeito aos custos administrativos não incluídos no Plano de Trabalho original (Plano de Trabalho CGEP SEI 0184994)	

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2020008 (EX PO 28)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região</b>	<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
<b>Programa do PPA:</b>	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Elxo temático (MDR):</b>	
<b>Ação do PPA:</b>	<b>Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação</b>	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	
<b>Objetivo da ação:</b>	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	A Lei Nº 13.682, de 2018, incluiu o § 6º, no art. 20, da Lei Nº 7.827, determinando a destinação de um montante de recursos para contratação de atividades de avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais, de forma a permitir a aferição da eficácia, da eficiência e da efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.		
<b>Projeto:</b>	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	170	3 - Outras Despesas Correntes	90	A definir	A definir

<b>Previsão de Conclusão:</b>	15/11/2021
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Tássia Germano e Gabriela Isabel
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 400.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 399.945,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 199.972,50
Saldo a liberar	R\$ 199.972,50
Saldo a Empenhar no exercício	-
Total Liberado até o exercício	R\$ 199.972,50

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto		Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1.	Planejamento - Elaboração de Plano de Trabalho FNE - 2020/21 (Peso 30%)									30%	Concluído	
1.1	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) em resposta à Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020. O Plano de	COAE/CGEP	29/07/2020	30/10/2020	-	29/07/2020	28/10/2020	-	100%	Concluído	A Sudene encaminhou o Plano de Trabalho ao MDR por meio do Ofício nº 2319/2020-GAB/SUDENE, de 28 de outubro de 2020.
1.2	Ratificação do Plano de Trabalho pelo MDR e ME	Ratificação ou sugestão de mudanças do Plano de Trabalho pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia	MDR e ME	30/10/2020	30/11/2020	-	30/10/2020	04/02/2021		100%	Concluído	Segundo os prazos da Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, os ministérios deveriam enviar a análise do Plano de Trabalho em até 30 dias. Contudo, não houve resposta no tempo estimado. Em 04 de fevereiro de 2021, por meio do Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-MDR, os Ministérios encaminharam o resultado da apreciação conjunta dos Ministérios.
1.3	Alterações no Plano de Trabalho das avaliações do FNE - 2020/21	Alterações no Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) para inserção das considerações realizadas pelo MDR e ME.	COAE/CGEP	30/11/2020	04/12/2020		01/03/2021	19/03/2021		100%	Concluído	Por meio do Ofício Nº 573/2021/GAB/SUDENE, de 19 de março de 2021, a Sudene respondeu às considerações apontadas no Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-MDR, de fevereiro de 2021, e encaminhou nova versão do Plano de
2.	Planejamento - Edital e seleção de parceiro(s) para execução das avaliações do FNE (Peso 70%)									32%		
2.1	Elaboração de Termo de Abertura do Projeto - TAP e apresentação de proposta	Elaborar e apresentar TAP com a descrição dos objetivos, estratégias e etapas a serem seguidas para a contratação das avaliações definidas. É necessário aprovação do escopo pela Coordenação-Geral.	COAE/CGEP	17/02/2021	19/02/2021					0%	Cancelado	As atividades foram comprometidas devido a priorização para dar seguimento aos projetos: (i) Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19 na área de atuação da Sudene (Processo 59336.000790/2020-36); (ii) Índice de Confiança do Consumidor e de Expectativa do Empresário Industrial para os estados da região Nordeste; (iii) Plano de Ações e estudo sobre os desafios e potencialidades do setor têxtil em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.
2.2	Solicitação de autorização da DPLAN para prosseguir com as tratativas para elaboração e lançamento de edital de chamamento público	Elaborar e enviar documento solicitando autorização da DPLAN para seguir com as tratativas necessárias elaboração e publicação de edital de chamamento público para seleção de parceiro(s) executor(es) para as avaliações do FNE do 1º ano do ciclo de avaliações (Plano de Trabalho 2020/2021).	COAE/CGEP	22/02/2021	23/02/2021					0%	Cancelado	Além disso, no mês de março uma das servidoras alocadas no projeto gozou férias e a outra esteve envolvida com as atividades dos Cursos Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que Operam Transferências da União – MEG-Tr e de Planejamento Estratégico.
												Em razão de todas as etapas e prazos de análise e autorização internos que eram necessários para o lançamento de Edital de Chamamento Público e somado ao comprometimento dos técnicos com uma série de outras projetos e atividades, optou-se por não seguir neste ano com o Edital de Chamamento Público para seleção de proposta(s) para execução das avaliações do FNE, referente ao 1º ano do ciclo de avaliações.
												Em consulta realizada à Procuradoria junto à Sudene, em 26/05/2021, por videoconferência, houve orientação de que poderiam ser encaminhados Ofícios a Instituições, solicitando propostas de orçamento e metodologias, de modo a simplificar o processo diante das muitas demandas, obtendo alternativas como forma de melhor aquilatar quais as diversas possibilidades de

2.3	Apreciação da solicitação para abertura de Edital de Chamamento Público pela Diretoria Colegiada	Seguida a aprovação da DPLAN, o assunto deverá ser encaminhado ao Gabinete para ser apreciado e aprovado em reunião de Diretoria Colegiada, se for o caso.	DPLAN e Gabinete	23/02/2021	03/03/2021					0%	Cancelado	Assim, em 11 de junho de 2021, a CGEP encaminhou para a DPLAN 17 ofícios endereçados às Universidades Federais com solicitação de propostas de metodologia e orçamento, visando à celebração de parceria e formalização de Termo de Execução Descentralizada (Despachos SEI 0250225 e 0249586), os quais foram encaminhados para o Gabinete na mesma data (Despacho 0250255) sendo encaminhados às Universidades em 16 de junho.  Conforme explicitado nos Ofícios (ver Processo SEI 59336.001165/2020-10), foi designado um prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do ofício, para recebimento da proposta de metodologias visando à execução das avaliações, para que se possa analisar a viabilidade de formalização de parceria com alguma Universidade, em alinhamento ao orçamento da Sudene e, em caso positivo, produzir documento a ser submetido à apreciação das alçadas competentes desta Superintendência.
2.4	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital de Chamamento Público	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital para chamamento público que visa selecionar parceiro(s) para a execução das avaliações do FNE desenhadas no Plano de Trabalho 2020/21.	COAE/CGEP	22/02/2021	26/02/2021					0%	Cancelado	A avaliação pretendida, a ser implementada por meio da parceria, deve abordar as análises de eficiência, eficácia e efetividade, conforme determinado na Lei Nº 7.827 e na Portaria Interministerial Nº 7, além da análise do retorno econômico e social da aplicação dos recursos do FNE. Para construção das avaliações foi previsto um prazo de 12 meses para a vigência do TED a ser celebrado com a instituição(ões) com a(s) proposta(s) vencedora(s).
2.5	Reunião com a ASCOM para tratar sobre a divulgação do Edital	Apresentar a ASCOM os objetivos gerais do projeto e informar sobre a necessidade de divulgação da seleção nas redes das Sudene quando o edital estiver concluído.	COAE/CGEP e ASCOM	01/03/2021	01/03/2021					0%	Cancelado	
2.6	Elaboração de Edital de chamamento público	Elaborar edital de chamamento público a fim de selecionar entidade(s)/orgão(s) da União para executar as avaliações	COAE/CGEP	01/03/2021	12/03/2021					0%	Cancelado	
2.7	Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	08/03/2021	12/03/2021					0%	Cancelado	
2.8	Apreciação do Edital pela Coordenação Geral e DPLAN	Encaminhar o Edital para apreciação e deliberação da Coordenação Geral da CGEP e para a DPLAN	CGEP e DPLAN	15/03/2021	17/03/2021					0%	Cancelado	
2.9	Ajustes no Edital	Adequações no Edital após apreciação da CGEP e DPLAN e envio para publicação	COAE/CGEP	18/03/2021	22/03/2021					0%	Cancelado	
2.10	Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração de texto sobre o projeto e lançamento do edital para subsidiar a matéria de divulgação da ASCOM. Deve-se encaminhar o Edital para o Gabinete/Sudene e a ASCOM para divulgação no Diário Oficial e no site da Sudene.	CGEP	18/03/2021	25/03/2021					0%	Cancelado	
2.11	Solicitação para a publicação do Edital		COAE/CGEP	22/03/2021	23/03/2021					0%	Cancelado	
2.12	Publicação do Edital	Publicação do Edital no site da Sudene e no DOU	GABINETE/SUDENE e ASCOM	24/03/2021	26/03/2021					0%	Cancelado	
2.13	Divulgação do Edital de Chamamento Público	Divulgação do Edital no site e nas redes sociais da Sudene. Mobilização de possíveis parceiros por e-mail também.	ASCOM e COAE/CGEP	26/03/2021	09/04/2021					0%	Cancelado	Não se seguiu com o Edital de Chamamento Público para recepção de propostas de avaliação, mas sim, foi feita realizada solicitação às Universidades via Ofício e encaminhado e-mail às reitorias e coordenações de Pós-Graduação em Economia, em 16 de junho de 2021.
2.14	Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	COAE/CGEP	29/03/2021	30/04/2021		16/06/2021	01/07/2021		100%	Concluído	Em razão de todas as etapas e prazos de análise e autorização internos que eram necessários para o lançamento de Edital de Chamamento Público e somado ao comprometimento dos técnicos com uma série de outras projetos e atividades, optou-se por não seguir neste ano com o Edital de Chamamento Público para seleção de proposta(s) para execução das avaliações do FNE, referente ao 1º ano do ciclo de avaliações.  Em consulta realizada à Procuradoria junto à Sudene, em 26/05/2021, por videoconferência, houve orientação de que poderiam ser encaminhados Ofícios a Instituições, solicitando propostas de orçamento e metodologias, de modo a simplificar o processo diante das muitas demandas, obtendo alternativas como forma de melhor aquilatar quais as diversas possibilidades de se levar a avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE a cabo.  Assim, em 11 de junho de 2021, a CGEP encaminhou para a DPLAN 17 ofícios endereçados às Universidades Federais com solicitação de propostas de metodologia e orçamento, visando à celebração de parceria e formalização de Termo de Execução Descentralizada (Despachos SEI 0250225 e 0249586), os quais foram encaminhados para o Gabinete na mesma data (Despacho 0250255) sendo encaminhados às Universidades em 16 de junho. O prazo limite para recebimento das propostas foi entre 01 e 03 de julho, para aquelas que confirmaram a recepção do Ofício da



2.15	Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	COAE/CGEP	09/04/2021	09/04/2021		16/06/2021	30/06/2021		100%	Concluído	<p>Dado que se optou por não se seguir com a publicação de Edital de Chamamento Público, não houve a realização de consulta pública. Contudo, foi disponibilizado canal para tirar dúvidas via a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP, por meio do e-mail (coae@sudene.gov.br).</p> <p>Algumas universidades que receberam o Ofício da Sudene com a solicitação de propostas para as avaliações do FNE encaminharam dúvidas por e-mail, sendo respondidas pelo mesmo canal. Duas universidades solicitaram uma videoconferência para tratar de dúvidas e foram ouvidas. Outras, mantiveram contato telefônico direto com o Coordenador-Geral da CGEP.</p>
2.16	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	COAE/CGEP	09/04/2021	13/04/2021		16/06/2021	30/06/2021		100%	Concluído	
2.17	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	COAE/CGEP	13/04/2021	16/04/2021		16/06/2021	30/06/2021		100%	Concluído	
2.18	Análise técnica das propostas	Análise técnica das propostas e emissão de parecer técnico com a justificativa para celebração de TED para a(s) proposta(s) selecionada(s).	COAE/CGEP	12/07/2021	06/10/2021		12/07/2021	06/10/2021		100%	Concluído	<p>Em 16 de junho de 2021, foram encaminhados Ofícios às Universidades. A recepção das propostas se deu até o dia 03/07/2021.</p> <p>É necessário considerar um prazo maior para essa análise técnica, pois essa etapa também envolve possíveis negociações e considerações de ajustes das propostas recebidas e nova avaliação das propostas. Ao final desse processo, será emitido parecer técnico com as justificativas para celebração de TED em relação a(s) proposta(s) mais vantajosa. Estima-se adotar dois critérios para avaliação, primeiro a questão técnica para avaliar a qualidade da proposta e em seguida a análise da proposta financeira.</p> <p>Em razão do cronograma de conclusão e encaminhamento de outros projetos em curso, o prazo limite estimado pela Coordenação para análise das propostas foi o dia 16 de agosto de 2021 (SEI 0256752 - Processo 59336.001165/2020-10).</p> <p>Contudo, o prazo inicialmente estabelecido não pôde ser cumprido em face da priorização de outros projetos. A análise das propostas e os trâmites necessários para celebração do TED teve início programado para agosto de 2021. Mediante nova repactuação, para cumprimento de demandas externas, o prazo acordado para finalização desta atividade foi o dia 06/10/2021. Devido a estas alterações, as datas das demais atividades foram reprogramadas. (Despachos CGEP 0256752, 0271988, 0276756).</p> <p>Em 06/10/2021, conforme acordado no Despacho CGEP 0276756, a área técnica conclui a análise em relação as propostas metodológicas e orçamentárias que foram enviadas pelas Universidades para avaliação dos resultados do FNE referente ao 1º ano de avaliações. A Nota Técnica Nº 224/2021 - SEI/SUDENE (SEI 0279994) resultou na classificação das propostas e recomendações de ajustes em relação aos aspectos metodológicos e/ou orçamentários. Na sequência, observada a ordem de classificação final das propostas, a CGEP deu início às tratativas para discussão dos ajustes e adequações apontados como necessários pela área técnica a fim de celebrar a parceria por meio de TED.</p>
2.19	Análise e aprovação das propostas selecionadas para celebração de TED - CGEP e DPLAN	Solicitação de autorização da DPLAN para celebração de TED das propostas selecionadas.	CGEP e DPLAN	09/10/2021	10/10/2021		06/10/2021	10/11/2021		100%	Concluído	<p>O recebimento das propostas das universidades para as avaliações do FNE ocorreu entre o final de junho e os primeiros dias de julho. Em face da priorização de outros projetos, a análise das propostas e os trâmites necessários para celebração do TED teve início programado para agosto de 2021.</p> <p>Exaurida a apreciação técnica das propostas (SEI 0279994) e os trâmites para ajustes e adequações junto a instituição que ficou na primeira colocação e, em seguida, junto a segunda colocada, em 10/11/2021 foi solicitado à DPLAN autorização para prosseguimento das iniciativas relativas à formalização do TED (SEI 0291695). A autorização da Diretoria se deu na mesma data com o envio para o Gabinete desta Superintendência de Minuta de Ofício à Universidade selecionada a fim de formalização da intenção de celebração de TED (SEI 0291811).</p>
2.20	Análise e aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	11/10/2021	18/10/2021		04/12/2021	09/12/2021		100%	Concluído	<p>Observados os trâmites habituais para formalização de parceria, mediante assinatura de TED, procedeu-se com a orientação para elaboração do Plano de Trabalho para o TED, nos termos do Decreto 10.426/2020, pactuação de ajustes, solicitação e análise de documentos, apreciação do Plano de Trabalho e elaboração de Parecer Técnico recomendando a celebração da parceria e de Minuta de TED, encaminhamento do processo para a apreciação jurídica pela Procuradoria Federal junto à Sudene, até a aprovação do objeto na 406ª Reunião de</p>
2.21	Apreciação jurídica do processo pela Procuradoria Federal junto à Sudene	Elaborar parecer jurídico sobre a celebração do instrumento	Procuradoria Federal junto à Sudene	18/10/2021	01/11/2021		06/12/2021	09/12/2021		100%	Concluído	<p>A apreciação jurídica da matéria se deu em 09/12/2021, por meio do Parecer n. 00284/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU (SEI 0303803)</p>

2.22	Emissão de Parecer técnico final	Elaborar parecer técnico após a apreciação da Procuradoria Federal junto à Sudene	COAE/Sudene	01/11/2021	03/11/2021		--	--		0%	Cancelado	As recomendações apontadas no parecer da Procuradoria Federal junto à Sudene se seguiu diretamente no processo, não sendo necessário nova manifestação da área técnica da CGEP.	
2.23	Análise e trâmites para celebração de TED relacionados ao setor de contratos e convênios	Análise e trâmites para contratação relacionados ao setor de convênios	COCIC/Sudene	18/10/2021	01/11/2021		03/12/2021	09/12/2021		100%	Concluído	Devido aos ajustes de prazos neste projeto para também executar outras atividades e projetos novos e em curso na Coordenação, o cronograma como um todo foi afetado. Seguiu-se com um esforço conjunto entre a CGEP e a COCIC para dar celeridade aos trâmites administrativos cabíveis para que a parceria fosse formalizada e a descentralização dos créditos seguiu-se dentro prazo inicial estabelecido pela a alta Administração da Autarquia, tendo sido concluído esse processo com êxito.	
2.24	Elaboração do TED e checagem de documentos	Elaboração do TED e checagem de documentos para assinatura do instrumento	COCIC/Sudene	01/11/2021	06/11/2021		03/12/2021	09/12/2021		100%	Concluído		
2.25	Celebração do instrumento para contratação das avaliações	Assinatura do TED	Gabinete/Sudene e Parceiro executor	06/11/2021	10/11/2021	R\$ 199.972,50	09/12/2021	09/12/2021	R\$ 199.972,50	100%	Concluído		
2.26	Publicação do extrato do TED	Publicação do instrumento no Diário Oficial e no site da Sudene	Gabinete e ASCOM/Sudene	13/11/2021	15/11/2021		10/12/2021	10/12/2021		100%	Concluído		
				Valor Previsto:	R\$ 199.972,50	Valor realizado:	R\$ 199.972,50	100%	Concluído	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:
Observações:
Foram alteradas as datas de conclusão a partir da etapa 2.18 em função do atraso do MDR em definir pela aprovação do plano de trabalho. Data geral de conclusão também alterada para 15/11/2021.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas</b>			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2020009 (EX PO 29)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região</b>			<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
<b>Programa do PPA:</b>	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			<b>Eixo temático (MDR):</b>	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	<b>Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial</b>			<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
<b>Objetivo da ação:</b>	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN			<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Segurança hídrica no semiárido				
<b>Projeto:</b>	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Avaliar o Programa Cisternas Efeitos do Programa Cisternas 1ª Água por meio de indicadores de mercado de trabalho e de saúde dos beneficiados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	-	90	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/04/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:
	Marina Barbosa; Miguel Araújo.
	UFPE Breno Ramos Sampaio

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 384.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício	
Valor liberado/repassado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 384.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)									20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	11/11/2020	04/12/2020		11/11/2020	04/12/2020		100,0%	Concluído			
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	07/12/2020	22/12/2020		07/12/2020	22/12/2020		100,0%	Concluído			
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	07/12/2020	07/12/2020		07/12/2020	07/12/2020		100,0%	Concluído			
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído			
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	24/12/2020	28/12/2020		24/12/2020	28/12/2020		100,0%	Concluído			
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)									26%	Em Andamento		
2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 384.000,00	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 384.000,00	100,0%	Concluído			
2.2	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	Concluído	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/06/2021, conforme previsto, o Relatório parcial foi entregue pela UFPE.		

2.3	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	30/06/2021	30/09/2021		01/07/2021	10/09/2021		100,0%	Concluído	Conforme o Despacho CGEP 0255150, o prazo para realização da análise foi redefinido para 30/09/2021.	
2.4	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/10/2021	16/10/2021		20/09/2021	08/10/2021		100,0%	Concluído	Conforme o Despacho CGEP 0275255, o prazo para realização dos ajustes foi pactuado para 08/10/2021.	
2.5	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/10/2021	31/10/2021		15/10/2021	26/11/2021		100,0%	Concluído		
2.6	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/09/2021		01/01/2021	30/09/2021		100,0%	Concluído	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/09/2021, conforme previsto, o relatório parcial foi entregue pela UFPE.	
2.7	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/10/2021	31/10/2021		04/10/2021	09/11/2021		100,0%	Concluído		
2.8	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/11/2021	16/11/2021		09/11/2021			90,0%	Em Andamento	No dia 09 de novembro de 2021 foram solicitados ajustes na primeira versão do produto. No dia 25 de novembro de 2021 a versão ajustada foi enviada pela descentralizada. No dia 1º de dezembro de 2021 foram solicitados novos ajustes, tendo em vista que os primeiros ajustes não atenderam ao esperado. Os novos ajustes ainda são aguardados.	
2.9	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/11/2021	02/12/2021		25/11/2021			50,0%	Em Andamento		
2.10	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	01/01/2021	31/12/2021		01/01/2021			60,0%	Em Andamento	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. No dia 20 de setembro de 2021 foi realizada a segunda reunião de acompanhamento do TED 17/2020. O Projeto segue conforme previsto.	
2.11	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.12	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.13	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022					0,0%	A Iniciar		
2.14	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	15/02/2022					0,0%	A Iniciar		
2.15	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	16/02/2022	03/03/2022					0,0%	A Iniciar		
2.16	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	01/01/2021	31/12/2021		01/01/2021			40,0%	Em Andamento	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. No dia 20 de setembro de 2021 foi realizada a segunda reunião de acompanhamento do TED 17/2020. O Projeto segue conforme previsto.	
2.17	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.18	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		

2.19	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022					0,0%	A Iniciar		
2.20	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	16/02/2022					0,0%	A Iniciar		
2.21	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/02/2022	04/03/2022					0,0%	A Iniciar		
2.22	Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFPE e CGEP	31/12/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPE	01/01/2022	02/03/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	03/03/2022	02/05/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	03/05/2022	02/07/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 384.000,00	Valor realizado:		R\$ 384.000,00	46%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parcelos institucionais:												
Universidade Federal de Pernambuco												
Observações:												
Processo SEI 59336.001886/2020-11												

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão:	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas			Número do Projeto:	PO CGEP/2020010 (EX PO 30)
Objetivo estratégico:	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas		
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves		
Problema (causa):	Necessidade de avaliar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional				
Projeto:	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO				
Objetivo do projeto:	Avaliar:O impacto do Mecanismo de Repartição dos recursos da Cota-Parte Municipal do ICMS nos resultados educacionais do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais; Os efeitos da Educação da Infantil sobre a alfabetização e, ainda, analisar a relação entre a Oferta e as Metas do PNE, a Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil; e, Os efeitos da violência a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) sobre a perda de capital humano e econômica e, ainda, avaliar os efeitos das políticas (planos e programas) adotadas pelos estados da região nordeste do Brasil.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	-	90	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

<b>Previsão de Conclusão:</b>	21/06/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	CGEP/SUDENE: Tássia Germano; Marina Rogério; Miguel Vieira e Gabriela Isabel
	UFC: Guilherme Diniz Irfi

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 480.600,00
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício	
Valor liberado/repassado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 480.600,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	04/12/2020	16/12/2020		04/12/2020	16/12/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	17/12/2020	22/12/2020		17/12/2020	22/12/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	16/12/2020	23/12/2020		16/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	23/12/2020	28/12/2020		23/12/2020	28/12/2020		100,0%	Concluído		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>35%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	<b>R\$ 480.600,00</b>	28/12/2020	28/12/2020	<b>R\$ 480.600,00</b>	100,0%	Concluído		
2.2	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matriculas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	01/01/2021	30/04/2021		01/01/2021	29/04/2021		100,0%	Concluído	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irfi (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.  O Produto 1 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de abril de 2021.	

2.3	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	18/10/2021	29/10/2021		06/10/2021	19/10/2021		100,0%	Concluído	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)	
2.4	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	30/10/2021	14/11/2021		-	-		90,0%	Em Andamento	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 29/10/2021	
2.5	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	15/11/2021	29/11/2021		-	-		0,0%	A Iniciar		
2.6	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as legislações das Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobre o modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios.	UFC	01/01/2021	30/05/2021		01/01/2021	29/04/2021		100,0%	Concluído	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.  O Produto 1 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação cerca de um mês antes do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.	
2.7	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	04/10/2021	15/10/2021		15/10/2021	29/10/2021		100,0%	Concluído	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)	
2.8	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	16/10/2021	31/10/2021		01/12/2021	-		90,0%	Em Andamento		
2.9	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	01/11/2021	15/11/2021		-	-		0,0%	A Iniciar	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/10/2021	
2.10	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 1: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil das vítimas de CVLI para o Brasil com foco nos estados do Nordeste	UFC	01/01/2021	31/05/2021		01/01/2021	31/05/2021		100,0%	Concluído	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.  O Produto 1 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.	
2.11	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/11/2021	12/11/2021		01/11/2021	12/11/2021		100,0%	Concluído	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)	
2.12	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	13/11/2021	28/11/2021		01/12/2021	-		80,0%	Em Andamento		
2.13	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	29/11/2021	13/12/2021		-	-		0,0%	A Iniciar	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 12/11/2021	

2.14	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios.	UFC	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	Concluído	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irtf (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.  O Produto 2 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
2.15	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	16/11/2021	23/11/2021		06/12/2021	17/12/2021		100,0%	Concluído	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)	
2.16	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	24/11/2021	09/12/2021		-	-		0,0%	A Iniciar		
2.17	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	10/12/2021	24/12/2021		-	-		0,0%	A Iniciar	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 23/11/2021	
2.18	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil (PNAD 2015).	UFC	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	Concluído	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irtf (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.  O Produto 2 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
2.19	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	24/11/2021	01/12/2021		-	-		0,0%	A Iniciar	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)	
2.20	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	02/12/2021	17/12/2021		-	-		80,0%	A Iniciar		
2.21	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	18/12/2021	01/01/2022		-	-		0,0%	A Iniciar	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 01/12/2021	
2.22	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 2: Relatório contendo as estimativas de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos estados da região Nordeste	UFC	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	Concluído	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irtf (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.  O Produto 2 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
2.23	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	02/12/2021	15/12/2021		-	-		0,0%	A Iniciar	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)	
2.24	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	16/12/2021	31/12/2021		-	-		0,0%	A Iniciar		
2.25	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	01/01/2022	15/01/2022		-	-		0,0%	A Iniciar	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021  <i>Novo cronograma de cronograma para as</i>	



2.26	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 3: Relatório sobre as evidências da literatura em relação aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em análises de impacto na política de distribuição de cota parte municipal do ICMS, estratégia de identificação e estimação dos efeitos causais (avaliação de impacto) da distribuição de recursos da cota parte municipal do ICMS com base em resultados educacionais.	UFC	01/04/2021	20/12/2021		01/04/2021	20/12/2021		100,0%	Concluído		
2.27	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 3: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino Fundamental I e 2) Medidas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental	UFC	01/04/2021	20/12/2021		01/04/2021	13/12/2021		100,0%	Concluído		
2.28	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a	Produto 3: Relatório contendo a avaliação de impacto das políticas	UFC	01/04/2021	20/12/2021		01/04/2021	20/12/2021		100,0%	Concluído		
2.29	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021		01/12/2021	-		90,0%	Em Andamento	Há uma proposta de repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 2022. A entrega dos produtos revisados que já foram apreciados pela Coordenação também está prevista para o janeiro de 2022.	
2.30	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021		02/12/2021	-		90,0%	Em Andamento	A área técnica se coloca favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527)	
2.31	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021		03/12/2021	-		90,0%	Em Andamento		
2.32	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	21/12/2021	04/02/2022		-	-		0,0%	A Iniciar	Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites necessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN.	
2.33	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	05/02/2022	20/02/2022		-	-		0,0%	A Iniciar		
2.34	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	21/02/2022	07/03/2022		-	-		0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFC	21/12/2021	19/02/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	20/02/2022	21/04/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	22/04/2022	21/06/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 480.600,00	Valor realizado:		R\$ 480.600,00	55%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>	
Universidade Federal do Ceará	
<b>Observações:</b>	
Processo SEI 59336.002083/2020-84	

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2021001 (ex PO CGEP/2019003)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
Programa do PPA:	-		
Ação do PPA:	-		
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	A Proposição nº 105/2017, aprovada pelo CONDEL por meio da Resolução nº 107/2017, estabelece em seu Art. 3º que os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do Semiárido serão revistos em 2021 e a cada década, a partir de então.		
Projeto:	Redelimitação do Semiárido		
Objetivo do projeto:	Apresentar relatório ao Conselho Deliberativo da Sudene, com a relação de municípios que comporão a sub-região Semiárida inscrita na área de atuação da Sudene, inclusive a metodologia e os critérios técnicos e científicos aplicados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	19/12/2021
Data Atualização:	31/12/2021

Processo 59336.000463/2020-84

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, em cooperação com a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e apoio da Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas. Cooperação: ANA, CEPETEC/INPE e INMET.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
I – Instalação dos trabalhos		-								100%	Concluído		
1.1	Identificação da equipe constituinte do trabalho	Encaminhamentos administrativos internos.	Coordenador-Geral CGEP	04/08/2021	07/08/2021		28/07/2021	04/08/2021		100%	Concluído		
1.2	Formalização das indicações junto ao Diretor da DPLAN;		Coordenador-Geral CGEP	08/08/2021	10/08/2021		04/08/2021	05/08/2021		100%	Concluído		
1.3	Institucionalização do trabalho por portaria da Sudene e aprovação simultânea do plano de trabalho, incluindo publicação no DOU;		Superintendente da Sudene	11/08/2021	13/08/2021		20/07/2021	04/08/2021		100%	Concluído	Portaria nº 80/2021 assinada em 27/07/2021 e publicada na Seção 1, p. 118 do DOU de 04/08/2021 (Docs SEI 0262868, p1 e 0262870.p2 - pasta V).	
II – Desenvolvimento das atividades de delimitação		-								100%	Concluído		
2.1	Mapeamento da metodologia, incluindo revisão de literatura, e das instituições de importância para o trabalho;		Técnicos da CGEP, CGDS e CGEP,	14/08/2021	23/08/2021		27/05/2021	04/08/2021		100%	Concluído	Informações disponíveis e armazenadas no Processo 59336.000463/2020-84. Inclui reuniões para nivelamento da reprogramação trazida pela Portaria Sudene nº 80/2021.	
2.2	Comunicação formal do trabalho e convite aos potenciais parceiros externos		Diretor da DPLAN, Coordenador-Geral da CGEP	24/08/2021	28/08/2021		15/08/2021	15/08/2021		100%	Concluído	Em 13 de agosto foram assinados e enviados os ofícios 1694/2021 (para ANA), 1695 (para INPE) e 1696 (para INMET) (Doc SEI 0263246 - Pasta VI), do processo antes mencionado.	
2.3	Apresentação da proposta de trabalho aos participantes;		Diretor da DPLAN e Coordenador-Geral CGEP	24/08/2021	07/09/2021		11/08/2021	17/08/2021		100%	Concluído	Inclui reuniões com a equipe interna para abordagens metodológicas, reflexões técnicas, críticas, delegação de tarefas e nivelamento de posições, seleção de parceiros externos e emissão de convite.  Reuniões internas para essa etapa, visando discutir aproximação técnica e elaboração de estratégia de cooperação com os principais parceiros externos e utros, realizadas dias 11, 17 (incluiu INPE, ANA e INMET).	

2.4	Reuniões para discussão da metodologia, definição dos dados e identificação de responsabilidades para o processamento;
2.5	Apresentação e crítica dos primeiros resultados;
2.6	Ajustes/validações metodológicas;
2.7	Emissão das tabulações especiais finais;

**Encaminhamentos institucionais, reuniões, abordagens metodológicas, processamentos tabulares, simulações e entregas preliminares**

Coordenadores-Gerais da CGEP e CGDS	08/09/2021	22/09/2021		19/08/2021	09/09/2021		100%	Concluído	Inclui reuniões sucessivas para discussão das opções adotadas em 2017, simulações, escolhas metodológicas e de parametrizações.	Reuniões para essa etapa realizadas em 19/08, 23/08 e 09/09 (incluindo INPE, ANA e INMET) e interna em 25/08/2021.
Técnicos da CGDS e CGEP	23/09/2021	07/10/2021		09/09/2021	27/09/2021		100%	Concluído	Inclui planejamento, processamentos INPE, ANA e INMET, simulações, geração de grades com definição de graus de latitude e longitude, resultados preliminares e apresentação à Sudene.	Na reunião de 09/09/21 INPE e ANA informaram a disponibilidade de dados e intercâmbio que já vinha ocorrendo para análise das primeiras simulações. Em e-mail de 22/09, Caio Coelho (INPE) compartilhou com a Sudene os dados processados de precipitação, aridez e déficit hídrico. Em reunião de 27/09 a ANA (Geraldo Lucatelli) apresentou os resultados do geoprocessamento com base em precipitação igual ou inferior a 800mm, índice de aridez, déficit hídrico. Após o processamento dos dados de todos os municípios da área da Sudene, o resultado revelou 1.354 municípios, dos quais 1.213 são os mesmos de 2017, 141 são novos e 49 da relação de 2017 não se confirmaram. Em 2017 foram 1.262 municípios, nessa conta incluem-se 73 municípios por decisão do Condrel (49 que recorreram da decisão à época e 24 outros, de estados que alegaram municípios fronteiriços ao polígono).
Técnicos da CGDS e CGEP	08/10/2021	17/10/2021		28/09/2021	14/10/2021		100%	Concluído	Discussões técnicas entre INPE e ANA sobre processos, métodos e população estatística, ajustes de população por meio de interpolação para verificação de continuidade da mancha semiárida, outras medidas de solução de problemas técnicos caso necessário.	Realizada reunião em 04/10/21, 15h30, com INPE, ANA e INMET e técnicos da Sudene para ANA e INPE mostrarem o cotejamento de dados de sensoriamento (satélite), como reforço aos resultados encontrados (trabalho começou em 28/09 pela ANA), particularmente a preparação das providências para ajuste da relação em função da Lei Complementar nº 185, de 06/10/2021, que incluiu 84 novos municípios (81 de MG e 3 do ES) à área da Sudene. O ajuste no geoprocessamento elevou de 1.354 municípios para 1.425 os habilitados ao Semiárido. Estas novas informações foram apresentadas pela ANA na reunião realizada em 14/10/21.
Técnicos da CGDS e CGEP	18/10/2021	01/11/2021		06/10/2021	13/10/2021		100%	Concluído	Inclui tabelas com relação de municípios habilitados segundo critérios em formato de planilha, inclusive infográficos.	Na reunião de 14/10/2021 a ANA (Geraldo Lucatelli), com a anuência do INPE (Caio Coelho), deu como concluída a emissão de tabulações finais, inclusive infográficos atualizados com o geoprocessamento que incluiu os 84 municípios (81 de MG e 3 o ES) da Lei Complementar nº 185, de 06/01/2021, na área da Sudene. Esses dados foram objeto de apresentação pela ANA, por videoconferência, nesta mesma reunião. Nova relação com os 1.425 municípios abordando os 3 critérios, inclusive o de contiguidade, já foi enviado à Sudene pela ANA, inclusive shapefile.

2.8	Elaboração de relatório preliminar;		Técnicos da CGDS e CGEP	02/11/2021	16/11/2021		14/10/2021	09/11/2021		100%	Concluído	Elaboração de relatório refletindo os estudos e propostas considerados no trabalho, a metodologia, inclusive os critérios técnicos e científicos conforme base atualizada, o estabelecimento de periodicidade para futuras atualizações, se couber, a relação de municípios que passará a integrar a região semiárido brasileira, inclusive mapa que expresse a extensão total da área delimitada.	Realizada reunião em 26/10/21 para apresentação, pela ANA e CEPETEC/INPE, dos resultados da delimitação às demais instituições federais (IBGE, IBAMA, CODEVASF, INSA, BNB), MDR, CEMADEN, DNOCs foram convidados mas não compareceram. A ANA, por intermédio do Especialista, Geraldo Lucatelli, informou o término da Nota Informativa sobre toda a metodologia, dados gerados, passo a passo. Material encaminhado à Sudene por e-mail de 15/11/2021. Em 25/11/2021 a Estatística Gabriela Isabel e a Geógrafa Ludmilla apresentaram relatório preliminar a ser submetido à equipe participantes e à Diretoria Colegiada para deliberação e encaminhamento ao Condel.
2.9	Reunião para discussão da primeira versão do relatório;		Técnicos da CGDS e CGEP	17/11/2021	21/11/2021		09/11/2021	09/11/2021		100%	Concluído	Reunião para apresentação do texto, críticas e sugestões de ajuste.	Realizada articulação entre a redatora, Sra. Ludmilla e o Coordenador-Geral para discussão e alinhamento dos conteúdos.
2.10	Redação da versão final do relatório;		Técnicos da CGDS e CGEP	22/11/2021	26/11/2021		09/11/2021	25/11/2021		100%	Concluído	Redação final de texto que expresse os resultados encontrados, explicações necessárias, sugestões sobre futuras delimitações etc.	Foram produzidas 4 versões do relatório entre 09/11 e 25/11, culminando com a versão final entregue pela Sra. Gabriela Isabel.
III – Institucionalização da proposta		-								100%	Em Andamento		
3.1	Apresentação da versão final do relatório aos participantes, ao Superintendente e Diretores;		Coordenadores-Gerais da CGEP e CGDS	27/11/2021	29/11/2021		26/11/2021	30/11/2021		100%	Concluído	Apresentação dos resultados previamente ao Superintendente e Diretores da Sudene, e na sequência, a outras instituições para as quais os resultados da delimitação são essenciais em suas políticas de desenvolvimento setorial, local, subregional, regional ou nacional.	Versão final apresentadas a todos os agentes internos e externos em reunião realizada dia 30/11/2021.
3.2	Aprovação do relatório final pela Diretoria Colegiada com recomendação de encaminhamento ao Condel para Deliberação;		Diretoria Colegiada da Sudene	30/11/2021	06/12/2021		30/11/2021	30/11/2021		100%	Concluído	Para fins de validação oficial o relatório deve ser submetido ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação em conformidade com o previsto no inciso V, art. 10 da Lei Complementar nº 125, de 03/01/2007. Para isso, os resultados devem ser submetidos à Diretoria Colegiada da Sudene, para encaminhamento aos Conselheiros do Condel.	Relatório aprovado na 404ª reunião da Diretoria Colegiada de 30/11/2021 com proposta de transição para mant o apoio diferenciado do FDNe e FNE para aquelas empresas localizadas em municípios que serão excluídos na revisão de 2021, mas já estejam com projetos em tramitação na Sudene e no BNB na data de aprov da resolução da revisão.
3.3	Preparação de Proposição e minuta de Resolução ao Condel para deliberação, com prazo para apresentação, apreciação de recursos e deliberação na reunião seguinte;		Coordenadores-Gerais da CGEP e CGDS	07/12/2021	09/12/2021		22/11/2021	25/11/2021		100%	Concluído	A minuta de proposição e de Resolução ao Condel será preparada pela Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação após adeliberação da Diretoria Colegiada da Sudene, e encaminhada ao Gabinete para assinatura do Superintendente e composição do portfólio de assuntos a serem apreciados pelo Condel junto com os documentos que a integram.	As minutas de proposição, de resolução e de voto à Diretoria Colegiada foram entregues pelo Coordenador de Tecnologia e Inovação ao Coordenador-Geral da CGEP em 25/11/2021. Proposição aprovada em 30/11/2021 na 404ª reunião da DC, com proposta de inclusão de regras de transição para municípios excluídos do semiárido na revisão 2021. Proposição nº 151, 02/12/2021, assinada.
3.4	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	Entrega de versão consolidada, elaboração de proposta para apreciação de colegiados, deliberações e divulgação de resultados.	Superintendente da Sudene	10/12/2021	14/12/2021		09/12/2021	09/12/2021		100%	Concluído	A proposta de delimitação objeto de relatório específicos, será apreciada pelo Comitê Técnico do Condel, instância destinada a previamente discutir e consensuar encaminhamentos e, quando necessário, estratégias políticas para discussão da pauta,	Encaminhamento submetido ao Comitê na reunião de 09/12/2021, com sugestão para taratamento especial aos 50 municípios previstos para serem excluídos. Há proposta do MDR e da Sudene para minuta de Resolução, de forma que os 50 municípios só sejam excluídos na próxima revisão em 2031.

3.5	Apreciação e deliberação pelo Condel;	Secretaria Executiva da Sudene	15/12/2021	15/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	100%	Concluído	O assunto será apresentado pelo Secretário Executivo do Condel, papel exercido pelo Superintendente da Sudene, e posto em votação para deliberação por maioria simples.	Aprovada a Resolução 150, de 13/12/2021 com inserção de proposta do MDR dos parágrafos 4º e 5º, possibilitando a manutenção dos 50 municípios excluídos até que esses municípios sejam ouvidos e o assunto seja deliberado na próxima reunião do Condel. Proposta: "§4º Concluídos os trabalhos de que trata o §1º o Relatório Técnico consolidando as contribuições recebidas, deverá ser submetido ao CONDEL/SUDENE para apreciação. (NR) §5º Até a deliberação pelo CONDEL/SUDENE de que trata o §4º, permanecem como integrantes da delimitação da região semiárida brasileira os 50 municípios excluídos na nova delimitação proposta pelo Relatório Técnico que apresenta os resultados da revisão da delimitação do Semiárido 2021. (NR)"
3.6	Publicação da Resolução do Condel no DOU e envio de comunicação ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos Governadores dos Estados e demais membros do Condel.	ASCOM e GAB/Sudene	16/12/2021	18/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	100%	Concluído	A publicação da Resolução do Condel no DOU é medida que visa dar publicidade. Além disso, ela será publicizada também, no site da Sudene, em página eletrônica dedicada ao Condel.	Publicação da Resolução nº 150/2021 feita no DOU de 30/12/2021, Seção 1.
3.7	Publicação dos resultados no site da Sudene via ASCOM.	ASCOM/Sudene	19/12/2021	19/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	100%	Concluído	Medida de rotina para todas as decisões do Condel.	
			Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Prazos repactudados. Parceiros que deverão ser convidados pela Sudene para a nova delimitação serão, a princípio, os mesmos que compuseram o GT-2017 (MDR, MMA, DNOCS, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB e Cemaden), não sendo esta uma lista exaustiva."
Obs.: O presente PO considera que a fase de planejamento teve que ser readequada e reprogramada em razão de diferentes fatores como equipe e estratégia, inclusive por que técnicos apontados no processo inicial hoje estão cedidos a outros órgãos.
Nota: Este Plano Operativo substitui o PO CGEP 2019003 em razão do estabelecimento de novos referenciais para condução dos trabalhos conforme Portaria Sudene nº 80/2021, publicada no DOU, Seção 1, de 04/08/2021.
Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>2021002 (Ex-PO CGEP/2020006)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa do PPA:</b>	-		
<b>Ação do PPA:</b>	-		
<b>Objetivo da ação:</b>	-		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Dificuldades operacionais para celebração de instrumentos que viabilizem a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE no custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional nos termos do § 2º, art. 3º da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24/08/2021, alterado pelo art. 19 da Lei Complementar nº 125, de 03/01/2007, pouca clareza nas medidas orçamentárias e financeiras para aplicação dos recursos e desarticulação entre players do ecossistema de inovação da área da Sudene.		
<b>Projeto:</b>	Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Apoiar projetos de P,D&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE para o custeio de atividades de Pesquisa e desenvolvimento alinhadas com os eixos do PRDNE e os objetivos estratégicos da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/06/2025	Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002418/2020-64.
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Processo principal: 59336.002353/2021-38, Processo "filho": 59336.003426/2021-17-FAPEAL</b>

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Marcos Falcão Gonçalves, Manoel Barreiros, José Amauri, Carmen Fonseca e Gabriela Lins
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPES MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação dentro do Programa Centelha II da FINEP.		MCTI, FINEP, Sudene	01/06/2020	15/10/2021		01/06/2020	19/10/2021		100%	Concluído		
1.1	<b>Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel</b>	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100%	Concluído		
1.2	<b>Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)</b>	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100%	Concluído	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a Procuradoria a custódia dos recursos pelo BNB nos termos estabelecidos para aplicação dos recursos com base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 13.682/2018, onde a custódia será operacionalizada pelo Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo.
1.3	<b>Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P,D&amp;I</b>	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100%	Concluído	Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700</a>	
1.4	<b>Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P,D&amp;I.</b>	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100%	Concluído	Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469</a>	

1.5	Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do retorno das operações do FDNE para gestão pelo agente de custódia e pela Sudene, no âmbito de suas competências.		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	13/05/2020	09/06/2021		13/05/2020	29/06/2021		100%	Concluído	Os encaminhamentos aqui tratados documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	
1.6	Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021		100%	Concluído	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custódia Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
1.7	Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo de Cooperação Técnica com as FAPES MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES e SEBRAE/RN.		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	19/10/2021		100%	Concluído		
2	Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		FAPES, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	02/06/2021	07/01/2022		02/06/2021			100%	Concluído		
2.1	Articulação com MCTI, FINEP, FAPES para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPES MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	21/10/2021		100%	Concluído	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPES, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
2.2	Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPES e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Centelha II		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	21/10/2021	21/10/2021		21/10/2021	21/10/2021		100%	Concluído	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene.	
2.3	Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	21/10/2021	22/10/2021		22/10/2021	22/10/2021		100%	Concluído	Emitida a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.	
2.4	Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto às demais FAPES e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.002353/2021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	25/10/2021	17/11/2021		22/10/2021	12/11/2021		100%	Concluído	Emitido o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.
2.5	Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	18/11/2021	18/11/2021		12/11/2021	16/11/2021		100%	Concluído	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp.	
2.6	Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	19/11/2021	03/12/2021		16/11/2021	01/12/2021		100%	Concluído	Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPS", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE - ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convencionado como padrão.	
2.7	Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPES para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	01/12/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021		100%	Concluído	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPES para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPES, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPES, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direitos e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.

2.8	Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021		100%	Concluído		Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
2.9	Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	03/12/2021	14/12/2021		03/12/2021	14/12/2021		100%	Concluído		
2.10	Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	14/12/2021	22/12/2021		14/12/2021	22/12/2021		100%	Concluído		Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.
2.11	Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021		100%	Concluído	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos para o Gabinete do Superintendente visando apreciação do assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
2.12	Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	23/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100%	Concluído	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	Esse ACT servirá como padrão para os de outras fundações de Amparo à Pesquisa.
2.13	Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	23/12/2021	31/12/2021		23/12/2021	28/12/2021		100%	Concluído	Inclui a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
2.14	Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE	31/12/2021	07/01/2022		30/12/2021	30/12/2021		100%	Concluído		
3	Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	03/01/2022	30/06/2022		30/12/2021			1%	Em Andamento		
3.1	Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usuário externo SEI.		FAPes e SEBRAE/RN	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa	
3.2	Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPes e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	
3.3	Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.4	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.5	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.6	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.7	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		



3.8	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.9	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.10	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.11	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.12	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.13	Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.14	Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar		
3.15	Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	03/01/2022	30/06/2022		30/12/2021			9%	Em Andamento	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato co ACT e PT celebrado.	Em 30/12/21 foi enviado cópia do extrato à FAPEAL para publicação também no DOE.
4	Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P,D&I (2022/2024)			03/01/2022	30/06/2024					0%	A Iniciar	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado.
4.1	Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2022, com base em ACTs.	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	03/01/2022	30/06/2022					0%	A Iniciar	Não se trata de disponibilidade na LOA ou de valor empenhado, mas do valor proposto pela Coordenação-Geral da CGEP ao Diretor da DPLAN para o exercício em questão, a partir da disponibilidade transferida ao BNB, para aplicação no exercício de forma a melhorar a gestão, o controle e a efetividade da aplicação.	As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R\$ 586.674,00. (R\$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R\$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 66.000,00, resultando no total de R\$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 60.000,00, resultando no total de R\$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R\$ 6.036.066,00
5	Processo de acompanhamento da execução do ACT			30/03/2022	30/06/2025					0%	A Iniciar		
5.1	Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPES e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPES e SEBRAE/RN	30/03/2022	30/06/2025					0%	A Iniciar		
5.2	Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	30/03/2022	30/06/2025					0%	A Iniciar		

5.3	Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPes e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL - comunicação de	Sudene	30/03/2022	30/06/2025					0%	A Iniciar		
5.4	Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPes e SEBRAE/RN	31/01/2024	30/06/2025					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	40,1%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2021003</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	
<b>Objetivo da ação:</b>	Elaboração de estudos estratégicos para o desenvolvimento regional.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Dada a relevância dos setores Têxtil/Confecções para a Região, e visando aumentar a competitividade e o desenvolvimento da área de atuação da Sudene, é de fundamental importância que se disponha de informações sobre estágio atual e perspectivas para esses setores, de modo que seja possível elaborar estratégias que visem ao seu desenvolvimento.		
<b>Projeto:</b>	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.		

Previsão de Conclusão:	23/12/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
	R\$ -
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Tassia Germano, José Farias, José Luís Alonso, Ludmilla Calado
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto Início	Previsto Fim	Realizado Início	Realizado Fim	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
1.	<b>Abertura do Projeto e Definição dos Objetivos Básicos (Peso 10%)</b>							10%	Concluído		
1.1	Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	100%	Concluído	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Pólo de Confeções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).	
1.2	Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confeções para a região Nordeste	COAE	24/02/2021	09/03/2021	01/03/2021	18/03/2021	100%	Concluído		
1.3	Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	100%	Concluído	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
1.4	Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confeções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	10/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	100%	Concluído		
1.5	Elaboração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confeções do Aquecimento da Economia e Inovações (ANIEI) e o relatório dos diagnósticos para a contratação do estudo.	COAE/CGEP	15/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	26/03/2021	100%	Concluído		
1.6	Reunião interna COAE/CGEP		COAE/CGEP	26/03/2021	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	100%	Concluído		
2.	<b>Planejamento - Edital e seleção de parceiros para execução dos estudos (Peso 20%)</b>							14%			
2.1	Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confeções nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	03/05/2021	31/05/2021	17/05/2021	28/05/2021	100%	Concluído	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
2.2	Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração do escopo, objetivos e descrição das principais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	03/05/2021	31/05/2021	17/05/2021	28/05/2021	100%	Concluído		
2.3	Tratativas junto ao PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confeções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	01/06/2021	30/06/2021	01/06/2021	02/07/2021	100%	Concluído	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
2.4	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções e adequações ao Template	COAE/CGEP	01/06/2021	30/06/2021	01/06/2021	02/07/2021	100%	Concluído		
2.5	Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe	CGEP e PNUD	01/07/2021	07/07/2021	02/07/2021	20/07/2021	100%	Concluído		
2.6	Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	08/07/2021	12/07/2021	20/07/2021	28/07/2021	100%	Concluído	Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	
2.7	Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	30/07/2021	31/08/2021	30/08/2021	16/09/2021	100%	Concluído	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
2.8	Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	01/09/2021	07/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	100%	Concluído		
2.9	Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	08/09/2021	14/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	100%	Concluído	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil e de Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, todos estes formatados para contratação em parceria com o PNUD. A versão revisada desses TRs foi encaminhada para a Coordenação-Geral da CGEP, em 13/08/21.	
2.10	Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	15/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	100%	Concluído	Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos tanto no mês de agosto quanto em setembro. Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	

2.11	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	PNUD	21/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	27/10/2021	100%	Concluído	
2.12	Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos	COAE/CGEP	27/09/2021	29/09/2021	01/11/2021	03/11/2021	100%	Concluído	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019
2.13	Apreciação por parte da DPLAN		DPLAN/SUDENE	30/09/2021	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	100%	Concluído	
2.14	Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/COAE e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	19/11/2021	100%	Concluído	
2.15	Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	100%	Concluído	
2.16	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	18/10/2021	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021	100%	Concluído	
2.17	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	18/10/2021	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	100%	Concluído	
2.18	Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das	Gabinete/SUDENE	26/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	100%	Concluído	
2.19	Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	08/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	100%	Concluído	
2.20	Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confecções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	100%	Concluído	
2.21	Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	100%	Concluído	
2.22	Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	100%	Concluído	
2.23	Audiência prévia	videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas	Sudene e JOF-BR/PNUD	10/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	100%	Concluído	
2.24	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	10/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	100%	Concluído	Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo para realização da audiência prévia.
2.25	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	15/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	100%	Concluído	
2.26	Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	JOF-BR/PNUD e Sudene	25/11/2021	07/01/2021	25/11/2021	-	50%	Em Andamento	
2.27	Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	17/01/2022	04/02/2022			0%	A Iniciar	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação.
2.28	Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	07/02/2022	07/02/2022			0%	A Iniciar	
2.29	Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	07/02/2022	17/02/2022			0%	A Iniciar	
2.30	Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	18/02/2022	25/02/2022			0%	A Iniciar	
2.31	Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	03/03/2022	09/03/2022			0%	A Iniciar	
2.32	Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	10/03/2022	11/03/2022			0%	A Iniciar	
2.33	Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	11/03/2022	22/03/2022			0%	A Iniciar	
2.34	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	25/03/2022	25/03/2022			0%	A Iniciar	
2.35	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	28/03/2022	29/03/2022					
2.36	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	30/03/2022	31/03/2022			0%	A Iniciar	
2.37	Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	01/04/2022	11/04/2022			0%	A Iniciar	
3. Execução (Peso 60%)								0%		
3.1	Reunião de início do contrato	Reunião Inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	11/04/2022	18/04/2022			0%	A Iniciar	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.
3.2	Elaboração e envio do Produto 1	Detalhamento Metodológico	Contratada	11/04/2022	11/05/2022			0%	A Iniciar	
3.3	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	12/05/2022	25/05/2022			0%	A Iniciar	
3.4	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	26/05/2022	06/06/2022			0%	A Iniciar	
3.5	Aprovação do Produto 1	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	07/06/2022	20/06/2022			0%	A Iniciar	
3.6	Elaboração e envio do Produto 2	Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	31/05/2022			0%	A Iniciar	
3.7	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	01/06/2022	21/06/2022			0%	A Iniciar	Há um sobreposição entre a etapa de aprovação do Produto 1, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. Desta forma, foi estendido o prazo de análise em relação ao Produto 2.
3.8	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	22/06/2022	01/07/2022			0%	A Iniciar	
3.9	Aprovação do Produto 2	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	04/07/2022	15/07/2022			0%	A Iniciar	

3.10	Elaboração e envio do Produto 3	Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	19/08/2022			0%	A Iniciar		
3.11	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	22/08/2022	02/09/2022			0%	A Iniciar		
3.12	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	05/09/2022	15/09/2022			0%	A Iniciar		
3.13	Aprovação do Produto 3	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	16/09/2022	29/09/2022			0%	A Iniciar		
3.14	Elaboração e envio do Produto 4	Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	28/09/2022			0%	A Iniciar		
3.15	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	30/09/2022	14/10/2022			0%	A Iniciar		
3.16	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	17/10/2022	26/10/2022			0%	A Iniciar		
3.17	Aprovação do Produto 4	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	27/10/2022	11/11/2022			0%	A Iniciar		
3.18	Elaboração e envio do Produto 5	RESUMO EXECUTIVO COM OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4)	Contratada	11/04/2022	28/10/2022			0%	A Iniciar		
3.19	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	31/10/2022	28/11/2022			0%	A Iniciar	Há um sobreposição entre a etapa de aprovação do Produto 4, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 5. Desta forma, foi estendido o prazo de análise em relação ao Produto 5.	
3.20	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	29/11/2022	09/12/2022			0%	A Iniciar		
3.21	Aprovação do Produto 5	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	12/12/2022	23/12/2022			0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	Valor realizado:	24%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGEP/2021004</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	
<b>Objetivo da ação:</b>	Elaboração de estudos estratégicos para o desenvolvimento regional.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Marcos Falcão Gonçalves
<b>Problema (causa):</b>	Dada a importância do setor de Calçados, e visando aumentar a competitividade e o desenvolvimento da área de atuação da Sudene, é de fundamental importância que se disponha de informações sobre estágio atual e perspectivas para esse setor, de modo que seja possível elaborar estratégias que visem ao seu desenvolvimento.		
<b>Projeto:</b>	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos dos setores de Calçados da área de atuação da Sudene.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto
	100, 150, 350	3 - Outras Despesas Correntes	Transferências ao Exter	A definir

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/12/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Gabriela Isabel, Miguel Araújo, Lautemyr Canel, Ludmilla Calado
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto Início	Previsto Fim	Realizado Início	Realizado Fim	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
<b>1.</b>	<b>Abertura do Projeto e Definição dos Objetivos Básicos (Peso 10%)</b>							<b>10%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	100%	Concluído		
1.2	Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	01/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	30/04/2021	100%	Concluído		
1.3	Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	16/04/2021	16/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	100%	Concluído	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.).	
1.5	Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	03/05/2021	07/05/2021	03/05/2021	07/05/2021	100%	Concluído		
<b>2.</b>	<b>Planejamento - Edital e seleção de parceiro(s) para execução dos estudos (Peso 20%)</b>							<b>13%</b>			
2.1	Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	03/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	30/06/2021	100%	Concluído	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
2.3	Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	01/06/2021	30/06/2021	01/06/2021	30/06/2021	100%	Concluído		
2.4	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	01/07/2021	30/07/2021	01/07/2021	30/07/2021	100%	Concluído	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
2.5	Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	02/08/2021	13/08/2021	02/08/2021	09/08/2021	100%	Concluído		
2.6	Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões técnicas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da	COAE/CGEP	16/08/2021	20/08/2021	09/08/2021	23/08/2021	100%	Concluído	Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajustada da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data.	
2.7	Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	23/08/2021	10/09/2021	24/08/2021	16/09/2021	100%	Concluído		
2.8	Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	06/09/2021	08/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	100%	Concluído	Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confecções e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP.	
2.9	Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	08/09/2021	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	100%	Concluído	Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
2.10	Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP.	CGEP	15/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	100%	Concluído	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	
2.11	Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	27/09/2021	29/09/2021	01/11/2021	03/11/2021	100%	Concluído	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	
2.12	Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação por parte da DPLAN/Sudene e encaminhamentos	DPLAN/SUDENE	30/09/2021	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	0%	Concluído		
2.13	Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos	DAD/SUDENE	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	19/11/2021	100%	Concluído		
2.14	Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	100%	Concluído		
2.15	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	18/10/2021	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021	100%	Concluído		
2.16	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	18/10/2021	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	100%	Concluído		
2.17	Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas	Gabinete/SUDENE	26/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	100%	Concluído		

2.18	Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	08/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	100%	Concluído	
2.19	Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadista área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	100%	Concluído	
2.20	Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	10/12/2022	10/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	100%	Concluído	
2.21	Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	100%	Concluído	
2.22	Audiência prévia	Videocomferência com possíveis interessados para apresentar os projetos do projeto e suas possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	100%	Concluído	
2.23	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	14/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	100%	Concluído	
2.24	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	15/12/2021	17/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	100%	Concluído	
2.25	Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	25/11/2021	07/01/2022	25/11/2021	-	50%	Em Andamento	
2.26	Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	17/01/2022	04/02/2022			0%	A Iniciar	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação.
2.27	Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	07/02/2022	07/02/2022			0%	A Iniciar	
2.28	Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	07/02/2022	17/02/2022			0%	A Iniciar	
2.29	Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	18/02/2022	25/02/2022			0%	A Iniciar	
2.30	Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	03/03/2022	09/03/2022			0%	A Iniciar	
2.31	Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	10/03/2022	11/03/2022			0%	A Iniciar	
2.32	Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê, Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	11/03/2022	22/03/2022			0%	A Iniciar	
2.33	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	25/03/2022	25/03/2022			0%	A Iniciar	
2.34	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	28/03/2022	29/03/2022					
2.35	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	30/03/2022	31/03/2022			0%	A Iniciar	
2.37	Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	01/04/2022	11/04/2022			0%	A Iniciar	
3. Execução (Peso 60%)								0%		
3.1	Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	11/04/2022	18/04/2022			0%	A Iniciar	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.
3.2	Elaboração e envio do Produto 1	Detalhamento Metodológico	Contratada	11/04/2022	11/05/2022			0%	A Iniciar	
3.3	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	12/05/2022	25/05/2022			0%	A Iniciar	
3.4	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	26/05/2022	06/06/2022			0%	A Iniciar	
3.5	Aprovação do Produto 1	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	07/06/2022	20/06/2022			0%	A Iniciar	
3.6	Elaboração e envio do Produto 2	Identificação dos principais polos regionais do setor de Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	31/05/2022			0%	A Iniciar	
3.7	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	01/06/2022	21/06/2022			0%	A Iniciar	Há um sobreposição entre a etapa de aprovação do Produto 1, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. Desta forma, foi estendido o prazo de análise em relação ao Produto 2.
3.8	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	22/06/2022	01/07/2022			0%	A Iniciar	

3.9	Aprovação do Produto 2	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	04/07/2022	15/07/2022			0%	A Iniciar		
3.10	Elaboração e envio do Produto 3	Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	19/08/2022			0%	A Iniciar		
3.11	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	22/08/2022	02/09/2022			0%	A Iniciar		
3.12	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	05/09/2022	15/09/2022			0%	A Iniciar		
3.13	Aprovação do Produto 3	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	16/09/2022	29/09/2022			0%	A Iniciar		
3.14	Elaboração e envio do Produto 4	Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	28/09/2022			0%	A Iniciar		
3.15	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	30/09/2022	14/10/2022			0%	A Iniciar	O início da etapa de análise do Produto 4 coincide com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 3, após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi estendido o prazo para a análise do Produto 4.	
3.16	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	17/10/2022	26/10/2022			0%	A Iniciar		
3.17	Aprovação do Produto 4	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	27/10/2022	11/11/2022			0%	A Iniciar		
3.18	Elaboração e envio do Produto 5	Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação da Sudene	Contratada	11/04/2022	28/10/2022			0%	A Iniciar		
3.19	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	31/10/2022	28/11/2022			0%	A Iniciar	O início da etapa de análise do Produto 5 coincide com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 4, após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi estendido o prazo para a análise do Produto 5.	
3.20	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	29/11/2022	09/12/2022			0%	A Iniciar		
3.21	Aprovação do Produto 5	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	12/12/2022	23/12/2022			0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		Valor realizado:		23%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão estratégica:	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGCP/2020001 (EX PO 31)
Objetivo estratégico:	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional		Ano:	2021
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira	
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
Projeto:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Objetivo do projeto:	Planejar e promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.644.040,39	R\$ 1.644.040,39

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2021
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 708.040,89
				A realizar no exercício	R\$ 935.999,50
R\$ 1.644.040,39			R\$ 1.644.040,39	Orçamento (LOA+Crédito) no exercí	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 708.040,89

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Relatório de planejamento da estrutura de execução, articulação e monitoramento do PRDNE	Este relatório produto 1 planejará em detalhe as atividades consoantes entre as três trilhas e aprofundará os conteúdos previstos para cada produto, planejando a articulação de atores e o cronograma sincronizados de atividades; especificando os vínculos dos processos de articulação do PRDNE à trilha de inteligência.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	29/7/2019	27/9/2019	R\$ 205.154,25	29/7/2019	18/11/2019	R\$ 205.154,25	100%	Concluído		
2	Relatório estratégico de internalização do PRDNE nos Grupo de Trabalho Sudene	O produto 2 tem como alvo a internalização na Sudene da estruturação do plano à luz dos seis eixos estratégicos; constituindo uma experiência que se materializa com a formação e consolidação de grupos de trabalho (GT PRDNE Sudene) e discussão em detalhes dos eixos do PRDNE e os programas e projetos acordados nos plano.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	2/9/2019	15/10/2019	R\$ 359.231,25	2/9/2019	18/11/2019	R\$ 347.781,25	100%	Concluído		
3	Relatório da estratégia de articulação e comunicação do PRDNE na região	O produto 3 levará em consideração os seis eixos estratégicos e apresentará uma proposta para a comunicação e o desenvolvimento de ações, em articulação com os estados e atores no escopo de atuação da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	23/9/2019	31/10/2019	R\$ 207.690,00	1/11/2019	10/12/2019	R\$ 155.105,39	100%	Concluído		
4	Detalhamento dos Projetos Prioritários	O produto 4 organiza em Fichas Técnicas os projetos prioritários do PRDNE, conforme modelo aprovado por Sudene e CGEE. Reuniões técnicas entre CGEE e os GTs da Sudene serão realizadas para aprovar as Fichas Técnicas preenchidas. Tais Fichas servirão como instrumentos de negociação além de insumos para a consolidação da metodologia de monitoramento entregue no processo de gestão da Trilha de Inteligência do PRDNE, compromisso esse firmado entre o CGEE e a Sudene. Tem como objetivo central organizar 60 (sessenta) Fichas de Projetos priorizados pelos GTs da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	9/7/2021	17/9/2021	R\$ 385.500,25	1/8/2020			30%	Cancelado	O Produto 4 deveria ter sido entregue em 17/09/2021 (Aditivo), porém, houve atraso na elaboração do P6 (entregue apenas em 18/10/2021) e a contratada atrasou a elaboração deste produto.  As datas previstas para início e fim desta etapa foram atualizadas.	Em 29/12/2021 foi encaminhado aditivo ao PNUD (SEI 313766) com solicitação de supressão do Produto 4, o que foi aprovado em Diretoria Colegiada pela Sudene (SEI 315648).

5	Relatório de Reposicionamento Estratégico do PRDNE Revisado	O produto 5 é um relatório com revisão do PRDNE, analisando a pertinência das ações, a consistência interna e a viabilidade técnica, levando em conta eventuais mudanças no cenário do contexto do produto. O produto 5 será um relatório com recomendações para revisão anual do PRDNE com base em Consulta Estruturada utilizando a ferramenta Insight Survey do CGEE junto aos principais stakeholders da SUDENE em preparação a nova pactuação do PRDNE. As equipes técnicas, os consultores e equipes internas dos grupos técnicos da SUDENE dialogarão com representantes de governos dos estados da região de abrangência do PRDNE e colherão subsídios adicionais para validação das propostas. Constituem objetivo do produto a coletar insumos para revisão do PRDNE validando propostas e descrever recomendações para revisão do PRDNE com base nos insumos e inferências compiladas através de processo de Consulta Estruturada (instituições, sociedade civil).	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$ 197.909,25	1/7/2020	5/7/2021	R\$ 197.014,34	100%	Concluído	O Produto 5 foi aprovado tecnicamente pela equipe da Sudene em 05/07/2021.	
6	Relatório contendo insumos para revisão do PRDNE		SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	30/1/2020	R\$ 352.590,00	1/8/2020	28/10/2021		100%	Concluído	Um dos insumos do produto é a consulta estruturada, que foi realizada entre os dias 04/12/2020 a 15/12/2020. Porém, o objetivo da consulta não foi alcançado uma vez que houve pouca participação de atores estratégicos. Está em curso uma nova proposta de consulta estruturada, após formalização do aditivo.  O Produto 6 revisado foi recebido pela equipe da Sudene em 18/10/2021. Atualmente está em análise técnica.	Foi assinado um novo Termo Aditivo (SEI 277353), onde foram retirados os produtos 7,10,13,16,17,18,19,20 da Carta de Acordo.  O Produto foi aprovado pelo Parecer Técnico 399 (SEI 287018).
7	Nova Versão Revisada do PRDNE	O produto 7 será um relatório de revisão completa do PRDNE. Apresentará uma análise por eixo estratégico do plano, assim como uma revisão no desenvolvimento das conquistas do PRDNE e seu alcance face ao novo cenário e seus impactos, contemplando a Revisão dos indicadores e das metas de resultado dos programas do Plano e avaliação da aderência do PRDNE com a ENDES e a PNDR, em especial, ao foco em reposicionar o desenvolvimento do Nordeste pela via da inovação e à estratégia territorial. É prevista a apresentação e discussão da nova versão nas Câmaras Temáticas, a não apresentação, no entanto, não implicará em prejuízo ou trará impactos na conclusão e entrega deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/12/2020	30/6/2021	R\$ 259.854,00	-	-	-	0%	Cancelado	A iniciar	
				Valor Previsto:		R\$ 1.644.040,39	Valor realizado:		R\$ 905.055,23	76%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão estratégica:	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas			Número do Projeto:	PO CGCP/2020002 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE			Ano:	2021
Programa:	ação não orçamentária	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	ação não orçamentária	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		
Finalidade da ação:	Articular e coordenar acordos de cooperação técnica com instituições financeiras com o objetivo de priorizar e estruturar os projetos do PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira		
Problema (causa):	Necessidade da otimização da prospecção de investimentos com impacto potencial sobre a economia e a qualidade de vida da população nordestina.				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.				
Objetivo do projeto:	Planejamento preliminar e implementação de ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	ação não orçamentária				

<b>Previsão de Conclusão:</b>	12/12/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	BNDES		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercíc	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Minuta de Acordo de Cooperação</b>	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	1/10/2019	30/10/2019	R\$ 0,00	30/10/2019	27/11/2019	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>		
2	<b>Elaboração de Nota Técnica</b>	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/11/2019	R\$ 0,00	27/11/2019	28/11/2019	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>	Parecer Técnico nº 329/2019	
3	<b>Elaboração de Plano de Trabalho específico.</b>	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/11/2020	R\$ 0,00	17/1/2020	13/7/2020	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	

4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	30/10/2019	30/1/2020	R\$ 0,00	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 0,00	100%	Concluído		
5	Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/2/2020	12/12/2022	R\$ 0,00	6/1/2020			60%	Em Andamento	Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários.	Em 30/12/2021 foi assinado novo aditivo a Carta de Acordo em que o P4 (Fichas de Projetos) é retirado. A retirada do P4 foi solicitada pela contratada que não conseguiu atender ao previsto no instrumento. Com a nova contratação para o município de Feira de Santana (Processo: 59336.000817/2021-71) será possível ter um conjunto de projetos detalhados como subsídio para continuidade das atividades do ACT.
6	Avaliação do ACT	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/6/2022	30/7/2022	R\$ 0,00				0%	A Iniciar		
7	Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/12/2022	12/12/2022	R\$ 0,00				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	66%	Em Andamento	Status do Projeto	

**Parceiros institucionais:**

BNDES

**Observações:**

(1) Parecer Técnico nº 329/2019 (SEI nº 0123625)

(2) Para o ano Ciclo de Avaliação 2020, foram consideradas as atividades previstas no cronograma com prazo até 30/09/2020, tendo em vista a vigência de 2 anos do ACT, e haverá etapas a serem realizadas em 2021 e 2022, constarão como metas institucionais para os próximos ciclos de avaliação.

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGCP 2021001</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>			<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340- Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	Apoio a projetos de tecnologia e inovação que fortaleçam e integrem a rede regional de inovação, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos serviços públicos. Implantação de núcleos de apoio à inovação, identificação espacial dos focos emergentes e empecilhos à competitividade, articulação de empreendedores e fontes de financiamento da inovação				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN			<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Problemas de segurança pública podem ser resolvidos com a utilização de tecnologias, de forma a potencializar a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Campina Grande vem demonstrando nos últimos anos queda na taxa de homicídios, apresentando 13,2% em 2019 e no primeiro semestre de 2020 houve um				
<b>Projeto:</b>	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB. A proposta visa contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a cadeia produtiva associada ao mercado de soluções de Cidades Inteligentes.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		Capital		R\$ 1.998.021,94	2.091.862,94

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/3/2023
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL		
R\$ 1.998.021,94			R\$ 1.998.021,94	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ 1.998.021,94
				Orçamento (LOA+Crédito) no exerc	R\$ 1.998.021,94
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 1.998.021,94
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.998.021,94

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Abertura do Programa SICONV</b>	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	15/11/2020	02/12/2020	R\$ 0,00	15/11/2020	02/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise e aprovação de propostas</b>	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	03/12/2020	10/12/2020	R\$ 0,00	03/12/2020	10/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise jurídica</b>	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/12/2020	20/12/2020	R\$ 0,00	11/12/2020	20/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Elaboração da minuta do Convênio</b>	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	21/12/2020	24/12/2020	R\$ 0,00	21/12/2020	24/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Assinatura do Convênio</b>	Assinatura do Convênio	Superintendente	28/12/2020	30/12/2020	R\$ 0,00	28/12/2020	30/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.5	<b>Publicação do Convênio</b>	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 0,00	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>43%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	<b>Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.</b>	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	01/01/2021	30/06/2021	R\$ 0,00	01/01/2021	30/06/2021	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Aceite dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021	
2.2	<b>Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática</b>	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	01/03/2021	30/11/2021	R\$ 0,00	01/03/2021	25/11/2021		100,00%	<b>Concluído</b>	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021).  <b>A data prevista para início desta etapa foi antecipada.</b>	

2.3	Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	01/02/2021	31/10/2021	R\$ 0,00	01/02/2021	05/11/2021		100,00%	Concluído	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos.  A data prevista para final desta etapa foi alterada.	A inauguração da área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na ocasião (SEI 302354).
2.4	Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	01/08/2021	15/08/2021	R\$ 0,00	23/07/2021	30/07/2021	R\$ 0,00	100,00%	Concluído		
2.5	Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGCP	16/08/2021	30/08/2021	R\$ 1.998.021,94	30/07/2021	14/09/2021	R\$ 1.998.021,94	100,00%	Concluído		
2.6	Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	01/08/2021	31/12/2022	R\$ 0,00				0,00%	Em Andamento		
2.7	Meta 5: 05 (cinco) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	01/02/2023	28/02/2023	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	01/03/2023	30/03/2023	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 2.091.862,94	Valor realizado:		R\$ 1.998.021,94	63%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

ABDI

Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGCP 2021002</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	O objeto desse trabalho é a elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGRS) do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, nos termos do artigo 19 da Lei 12.305 de 2010, para um horizonte de 20 anos com revisões a cada 4 (quatro) anos, nos 31 municípios do semiárido da abrangência da SUDENE.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Propor instrumento de gestão proporcionando destinação e disposição adequadas de resíduos; mitigar os efeitos dos passivos ambientais; promover condições de sustentabilidade financeira e econômica aos municípios e buscar inovação tecnológica para o tratamento dos		
<b>Projeto:</b>	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos; Atender a legislação relacionada ao saneamento/resíduos sólidos; Atender 100% da área urbana e rural com eficiência nos serviços prestados; Propor ferramentas de melhorias da gestão dos resíduos sólidos; Implementar soluções inovadoras e tecnológicas no tratamento dos resíduos; Mitigação do passivo ambiental nos municípios do CODANORTE no território da SUDENE		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Contrapartida (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros	
		280	Custeio		R\$725.810,00	R\$728.480,00	R\$ 2.670,00	Parcela única - SUDENE		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
<b>Término da Vigência do Convênio:</b>	30/6/2022										A realizar no exercício	R\$ 725.810,00
<b>Término da Prestação de Contas:</b>	29/8/2022	<b>Convênio nº</b>	907282/2020								Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Processo SEI</b>	59336.002461/2020-20								Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ 725.810,00
											Saldo a liberar	R\$ -
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ 725.810,00

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Isis Moreira e Danilo Campêlo.
---	--------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Abertura do Programa SICONV</b>	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de	CGCP	21/10/20	11/11/20	R\$ 0,00	21/10/20	11/11/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
1.2	<b>Seleção e análise das propostas</b>	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da	CGCP	30/11/20	31/12/20	R\$ 0,00	30/11/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise jurídica</b>	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Elaboração da minuta do Convênio</b>	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Assinatura do Convênio</b>	Assinatura do Convênio	Superintendente	31/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	31/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.5	<b>Publicação do Convênio</b>	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/20	05/01/21	R\$ 0,00	31/12/20	05/01/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>28%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	<b>Análise do Termo de Referência</b>	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do conveniente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	23/12/20	27/05/21	R\$ 0,00	23/12/20	27/05/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)	
2.2	<b>Processo Licitatório</b>	Elaboração dos procedimentos para realização do	CODANORTE	27/05/21	25/08/21	R\$ 0,00	27/05/21	10/09/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
2.3	<b>Aceite do processo licitatório</b>	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	25/08/21	30/08/21	R\$ 0,00	10/09/21	01/10/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Parecer Técnico 319 (278927)	
2.4	<b>Liberação da Parcela Única</b>	Liberação da Parcela Única	CGAF	30/08/21	30/08/21	R\$ 725.810,00	01/10/21	01/10/21	R\$ 725.810,00	100,00%	<b>Concluído</b>	SEI 281376	

2.5	<b>META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS</b>	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	30/08/21	28/12/21	R\$ 0,00	20/12/21			70,00%	Em Andamento	As etapas 1.1, 1.2 foram concluídas mas ainda não foi encaminhado o relatório para análise técnica.	
2.6	<b>META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS</b>	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	28/12/21	27/04/22	R\$ 0,00				0,00%	Em Andamento		
2.7	<b>Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2</b>	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	30/08/21	27/04/22	R\$ 0,00				0,00%	Em Andamento		
2.8	<b>META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE</b>	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão	CODANORTE	27/04/22	27/05/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.9	<b>META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE</b>	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e	CODANORTE	27/05/22	30/06/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.10	<b>Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4</b>	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	27/04/22	30/06/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)</b>								<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
3.1	<b>Prestação de contas final</b>	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	30/06/22	30/07/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.2	<b>Elaboração de Relatório Final</b>	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	30/07/22	14/08/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.3	<b>Análise da prestação de contas financeiras</b>	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	30/06/22	29/08/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
				<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 725.810,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 0,00	52%	Em Andamento	Status do Projeto	

**Parceiros institucionais:**

Codanorte

**Observações:**

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGCP 2021004</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaboração de Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Município de Guarabira – PB		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Guarabira é considerada uma cidade estratégica do estado da Paraíba. Diante deste contexto, faz-se necessária a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Guarabira com o objetivo de melhor compreender quais as Dimensões desse raio de		
<b>Projeto:</b>	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Guarabira, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Contrapartida (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros	
		280	Custeio		R\$481.189,57	R\$483.189,57	R\$ 2.000,00	Parcela única - SUDENE		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
											A realizar no exercício	R\$ 481.189,57
<b>Término da Vigência do Convênio:</b>	31/12/2022							R\$481.189,57			Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>Término da Prestação de Contas:</b>	1/3/2022	<b>Convênio nº</b>	907457/2020								Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Processo SEI</b>	59336.002483/2020-90								Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	-R\$ 481.189,57
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Teresa Barbosa e Paula Aragão
---	-------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Abertura do Programa SICONV</b>	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de	CGCP	21/10/20	11/11/20	R\$ 0,00	21/10/20	11/11/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
1.2	<b>Seleção e análise das propostas</b>	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da	CGCP	30/11/20	31/12/20	R\$ 0,00	30/11/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise jurídica</b>	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Elaboração da minuta do Convênio</b>	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Assinatura do Convênio</b>	Assinatura do Convênio	Superintendente	31/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	31/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.5	<b>Publicação do Convênio</b>	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/20	05/01/21	R\$ 0,00	31/12/20	05/01/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>9%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	<b>Análise do Termo de Referência</b>	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do conveniente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica do Município de Guarabira e Equipe Técnica CGCP	23/12/20	29/06/21	R\$ 0,00	23/12/20	29/06/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 164 (0254046)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
2.2	<b>Processo Licitatório</b>	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica do Município de Guarabira	29/06/21	27/09/21	R\$ 0,00	29/06/21			50,00%	<b>Atrasado</b>	A licitação realizada em Setembro/2021 foi cancelada pela prefeitura em razão da inadequação da empresa habilitada ao processo.	Será indicado nova data para procedimento licitatório.
2.3	<b>Aceite do processo licitatório</b>	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	27/09/21	02/10/21	R\$ 0,00				0,00%	<b>Atrasado</b>	A licitação realizada em Setembro/2021 foi cancelada pela prefeitura em razão da inadequação da empresa habilitada ao processo.	Será indicado nova data para procedimento licitatório.
2.4	<b>Liberação da Parcela Única</b>	Liberação da Parcela Única	CGAF	01/03/22	01/03/22	R\$ 483.189,57				0,00%	<b>A Iniciar</b>		

2.5	Etapa 1	ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	01/03/22	21/03/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.6	Etapa 2	CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	21/03/22	10/04/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.7	Acompanhamento e Fiscalização Etapas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	01/03/22	10/04/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.8	Etapa 3	DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E PROPOSIÇÕES	Equipe Técnica do Município de	10/04/22	10/05/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.9	Etapa 4	ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA	Equipe Técnica do Município de Guarabira	10/05/22	31/12/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.10	Acompanhamento e Fiscalização Etapa 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	10/04/22	31/12/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Município de Guarabira	31/12/22	30/01/23	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	30/01/23	14/02/23	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/12/22	01/03/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 483.189,57	Valor realizado:		R\$ 0,00	36%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Guarabira												
Observações:												

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGCP 2021005</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaboração de estudo de vocações e potencialidades específico sobre Estado da Paraíba, no intuito de identificar os eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico, visando aperfeiçoar a atuação da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP) nos municípios e Arranjos Produtivos Locais (APL's), assim como nortear a elaboração de políticas públicas e alocação de recursos financeiros que visem ampliar a eficiência e gerar desenvolvimento no Estado da Paraíba		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Baixa especificidade dos setores estratégicos ao desenvolvimento no estado da Paraíba.		
<b>Projeto:</b>	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Diagnosticar os principais setores da economia paraibana e priorizar um destes setores como um "Eixo Prioritário" de desenvolvimento do estado, prevendo planos táticos que indiquem o que é preciso ser realizado em termos de políticas públicas, investimentos estruturantes e apoio institucional que permita o fortalecimento deste Eixo Prioritário na Paraíba, de tal forma a permitir a inserção competitiva do estado no cenário Regional, Nacional e Global nesta área específica.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Contrapartida (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
								Parcela única - SUDENE			TOTAL		
		280	Custeio		R\$750.000,00	R\$780.000,00	R\$ 30.000,00	R\$750.000,00			R\$ 750.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
<b>Término da Vigência do Convênio:</b>	31/12/2021											A realizar no exercício	R\$ 750.000,00
<b>Término da Prestação de Contas:</b>	1/3/2022	<b>Convênio nº</b>	907743/2020									Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Processo SEI</b>	59336.002462/2020-74									Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
												Valor liberado no Exercício	R\$ -
												Saldo a liberar	-R\$ 750.000,00
												Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
												Total Liberado até o exercício	R\$ -
<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>		Teresa Barbosa e Danilo Cesar											

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Abertura do Programa SICONV</b>	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de	CGCP	21/10/20	11/11/20	R\$ 0,00	21/10/20	11/11/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
1.2	<b>Seleção e análise das propostas</b>	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da	CGCP	30/11/20	31/12/20	R\$ 0,00	30/11/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise jurídica</b>	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Elaboração da minuta do Convênio</b>	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Assinatura do Convênio</b>	Assinatura do Convênio	Superintendente	31/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	31/12/20	31/12/20	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
1.5	<b>Publicação do Convênio</b>	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/20	05/01/21	R\$ 0,00	31/12/20	05/01/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>11%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	<b>Análise do Termo de Referência</b>	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do conveniente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	23/12/20	30/06/21	R\$ 0,00	23/12/20	30/06/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 23 (0220716), 136 (0249542), 171 (0254469) e Nota Técnica 24 (0224241)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
2.2	<b>Ajustes no Plano de Trabalho</b>	Incorporação dos ajustes executados no Termo de Referência ao Sistema da Plataforma +Brasil e elaboração de Termo Aditivo	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	30/06/21	31/07/21	R\$ 0,00	30/06/21	09/08/21	R\$ 0,00	100,00%	<b>Concluído</b>		
2.3	<b>Processo Licitatório</b>	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica da CINEP	30/06/21	31/08/21	R\$ 0,00				0,00%	<b>Atrasado</b>	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma.

2.4	Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	31/08/21	05/09/21	R\$ 0,00				0,00%	Atrasado	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.5	Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	05/09/21	05/09/21	R\$ 750.000,00				0,00%	Atrasado	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.6	Meta 1	Preparatória: Detalhamento Metodológico	Equipe Técnica da CINEP	05/09/21	05/10/21	R\$ 0,00				0,00%	Atrasado	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.7	Meta 2	Mapeamento das vocações e potencialidades da Paraíba	Equipe Técnica da CINEP	05/09/21	04/11/21	R\$ 0,00				0,00%	Atrasado	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.8	Meta 3	Priorização do Eixo Estratégico e seu diagnóstico detalhado: Por mesorregião	Equipe Técnica CGCP	04/11/21	04/12/21	R\$ 0,00				0,00%	Atrasado	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.9	Meta 4	Cenarização e carteira estratégica do eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	04/12/21	02/02/22	R\$ 0,00				0,00%	Atrasado	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.10	Meta 5	Planos táticos para o eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	02/02/22	02/07/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
2.11	Acompanhamento e Fiscalização	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	30/06/21	02/07/22	R\$ 0,00				10,00%	Em Andamento		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)									0,00%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica da CINEP	02/07/22	01/08/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	01/08/22	16/08/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	02/07/22	01/03/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 750.000,00		Valor realizado:			R\$ 0,00	37%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:
CINEP - Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGCP 2021006</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	Subsidiar a Sudene e o Ministério para elaborar instrumentos de planejamento de desenvolvimento regional sustentável e articulação dos atores sociais representativos da Região Nordeste		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de obter informações sobre as potencialidades econômicas que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas de desenvolvimento regional		
<b>Projeto:</b>	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Planejamento de ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Contrapartida (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
							Produto 1	Produto 2	Produto 3	TOTAL		
	280	Custeio		R\$893.809,13	R\$893.809,13	-					Pago até o ano anterior	R\$ -
							R\$22.345,23	R\$ 178.761,83	R\$ 245.797,51	R\$ 893.809,13	A realizar no exercício	R\$ 893.809,13
											Orçamento (LOA+Crédito) no exerci	R\$ -
											Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ 201.107,06
											Saldo a liberar	-R\$ 692.702,07
							R\$ 44.690,46	R\$ 44.690,46	R\$ 178.761,83	R\$ 178.761,81	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ 201.107,06

<b>Término do Contrato</b>	10/4/2022	<b>PRODOC SUDENE PNUD</b>	BRA/17
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Processo SEI</b>	59336.000928/2020-05

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Danilo Campêlo, Isis Moreira, Gabriela Isabel Nascimento, Marina Barbosa
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	08/05/20	01/09/20	R\$ 0,00	08/05/20	01/09/20	R\$ 0,00	100,00%	Concluído	Nota Técnica 187 (0173494), Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) CGCP 0183823	
1.2	Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de	CGCP/PNUD	02/09/20	28/09/20	R\$ 0,00	02/09/20	28/09/20	R\$ 0,00	100,00%	Concluído		
1.2	Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	06/10/20	09/11/2020	R\$ 0,00	06/10/20	04/12/2020	R\$ 0,00	100,00%	Concluído		
1.3	Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF	04/12/20	05/03/21	R\$ 0,00	04/12/20	05/03/21	R\$ 0,00	100,00%	Concluído	Portaria 80 (0200601), Processo 59336.000244/2021-86, Nota Técnica 4 (0217167) ,	
1.4	Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	PNUD/JOF/Consórcio RHA	15/04/21	15/04/21	R\$ 0,00	15/04/21	15/04/21	R\$ 0,00	100,00%	Concluído	CONTRATO - PNUD-RHA (0237685)	
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>33%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	15/04/21	10/04/22	R\$ 0,00	15/04/21	10/04/22	R\$ 0,00	100,00%	Concluído		
2.2	Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	15/04/21	05/05/21	R\$22.345,23	15/04/21	05/05/21	R\$22.345,23	100,00%	Concluído	Aprovado mediante Nota Técnica 104/2021 de 17/05/2021.	
2.3	Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	05/06/21	18/08/21	R\$178.761,83	05/06/21	29/09/21	R\$178.761,83	100,00%	Concluído		
2.4	Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	05/07/21	17/09/21	R\$245.797,51	05/07/21	13/12/21	R\$245.797,51	100,00%	Concluído	Aprovado mediante Nota Técnica 509/2021 (SEI 305600).	

2.5	Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	18/06/21	16/10/21	R\$44.690,46	18/06/21			20,00%	Atrasado	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Em novo cronograma pactuado, a contratada prevê a entrega do Produto 4 até 10/03/2022.
2.6	Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	18/06/21	16/10/21	R\$44.690,46	18/06/21			20,00%	Atrasado	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Em novo cronograma pactuado, a contratada prevê a entrega do Produto 5 até 10/02/2022.
2.7	Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	02/10/21	05/12/21	R\$178.761,83				0,00%	Em Andamento		
2.8	Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	01/11/21	03/01/22	R\$178.761,81				0,00%	Em Andamento		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)									0,00%	A Iniciar		
3.1	Encerramento do Projeto	Relatório Final de Encerramento do Projeto	Consórcio RHA-VERTRAG	03/01/22	04/03/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise e elaboração de parecer final de Projeto	Sudene/PNUD	04/03/22	19/03/22	R\$ 0,00				0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$893.809,13	Valor realizado:		R\$446.904,57	57%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
PNUD, CONSÓRCIO RHA, VERTRAG
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão estratégica:	1. Resultados para a Sociedade			Número do Projeto:	PO CGCP 2022001
Objetivo estratégico:	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional			Ano:	2022
Programa:	ação não orçamentária	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	ação não orçamentária	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira		
Problema (causa):	Apontar diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).				
Projeto:	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).				
Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar a aplicação dos recursos subsidiados do FNE para potencializar o desenvolvimento regional.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

<b>Término do Projeto</b>	31/8/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exerci	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>A Iniciar</b>		
1.1	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DPLAN/CGCP	01/06/22	30/06/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
1.2	Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGCP	01/06/22	30/06/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
1.2	Consulta a atores de referência	Consulta a atores de referência	DPLAN/CGCP	30/06/22	15/07/2022	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
1.3	Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP	30/06/22	15/07/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 80%)</b>									<b>A Iniciar</b>		
2.1	Elaboração de Parecer Técnico conjunto CGCP/CGDF	Elaboração de Parecer Técnico conjunto CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	01/07/22	31/07/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
				<b>Valor Previsto:</b>		R\$0,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$0,00	#DIV/0!	<b>A Iniciar</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros Institucionais:</b>
PNUD, CONSÓRCIO RHA, VERTRAG
<b>Observações:</b>

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão estratégica:	1. Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGCP 2022002
Objetivo estratégico:	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional		Ano:	2022
Programa:	ação não orçamentária	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	ação não orçamentária	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Finalidade da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira	
Problema (causa):	Apontar diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			
Projeto:	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			
Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar a aplicação dos recursos subsidiados do FDNE para potencializar o desenvolvimento regional.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

<b>Término do Projeto</b>	31/12/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exerc	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>		<b>PLANEJAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>A Iniciar</b>		
1.1	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DPLAN/CGCP	01/10/22	31/10/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
1.2	Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGCP	01/10/22	31/10/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
1.3	Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP	16/10/22	31/10/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO (Peso 80%)</b>									<b>A Iniciar</b>		
2.1	Elaboração de Parecer Técnico conjunto CGCP/CGDF	Elaboração de Parecer Técnico conjunto CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	31/10/22	30/11/22	R\$ 0,00					<b>A Iniciar</b>		
				<b>Valor Previsto:</b>		R\$0,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$0,00	#DIV/0!	<b>A Iniciar</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>	PNUD, CONSÓRCIO RHA, VERTRAG
<b>Observações:</b>	

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGCP 2022003</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	<b>Ano:</b>	<b>2022</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	Subsidiar a Sudene e o Ministério para elaborar instrumentos de planejamento de desenvolvimento regional sustentável e articulação dos atores sociais representativos da Região Nordeste		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Fortalecer uma rede policêntrica de 52 cidades polo das regiões intermediárias da Área de Atuação da Sudene de forma a contribuir para implementar o Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE)		
<b>Projeto:</b>	Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Melhorar o planejamento urbano e territorial integrado entre 52 cidades intermediárias priorizadas pela SUDENE, com base nos princípios da Nova Agenda Urbana		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		US\$ 309.985,00	US\$ 309.985,00

<b>Término do Projeto</b>	31/06/2022	<b>PRODOC SUDENE PNUD</b>	BRA/17
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Processo SEI</b>	59336.000790/2021-17

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Coordenação de Cooperação e Articulação de Políticas
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 309.985,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1.1	Etapa 0	Plano de Trabalho	OnuHabitat/CGCP	00/01/00	30/01/00	US\$ 52.435,00	22/09/21	22/10/21	US\$ 52.435,00	100,00%	Concluído		
1.2	Etapa 1	Estratégia de Comunicação e Advocacy	OnuHabitat/CGCP	01/10/21	31/12/21	US\$ 68.451,00	01/10/21	31/12/21	US\$ 0,00	50,00%	Concluído		
		Oficina de Intercâmbio	OnuHabitat/CGCP	01/01/22	28/02/22		01/01/22	28/02/22			A Iniciar		
1.2	Etapa 2	Avaliação e priorização das necessidades de capacitação do conjunto de municípios da rede	OnuHabitat/CGCP	01/01/22	28/02/2022	US\$ 133.484,00			US\$ 0,00	0,00%	A Iniciar		
		Módulos de treinamento para o desenvolvimento de capacidades	OnuHabitat/CGCP	01/03/22	31/03/2022					0,00%	A Iniciar		
1.3	Etapa 3	Realização do Desafio de Inovação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos Digitais, relacionados aos ODS	OnuHabitat/CGCP	01/04/22	30/05/22	US\$ 55.615,00			US\$ 0,00	0,00%	A Iniciar		
		Evento virtual público de apresentação dos resultados dos produtos construídos de maneira compartilhada e assinatura de Carta de adesão à rede	OnuHabitat/CGCP	30/05/22	31/06/2022					0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$309.985,00	Valor realizado:		R\$52.435,00	25%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

PNUD, ONUHABITAT

Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		CGDF/2008001 (ex PO 34)	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano: 2008	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).			
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLISA			
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

Previsão de Conclusão Física:	19/09/2016
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	31/12/2021

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	Liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	Liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	Liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	-	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco										92%	Paralisado	

17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	3.876.491.700,00		3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	------------------	--	------------------	--------	------------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).	
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.	
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.	
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.	
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.	
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.	
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.	
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.	
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.	
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto	
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto	
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).	
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.	
Obs16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).	
Obs17: A TLSA efetuou a recomposição do saldo da conta reserva em 23/10/19, no valor de R\$ 112.647.260,64.	
Obs18: Foi concedida prorrogação, pelo prazo de 30 dias, do vencimento da amortização programada para 19/09/2020, em caráter cautelar, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da Sudene nº 569/2020 (SEI nº 0182999).	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão:	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO	CGDF/2008002 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2008	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

<b>Previsão de Conclusão Física:</b>	04/04/2018	Data prevista para implantação do empreendimento.
<b>Previsão de Conclusão ADM:</b>	15/02/2019	
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-		100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-		100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-		100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto ( O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-		100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/07/08</b>	<b>31/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>24/07/08</b>	<b>15/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00		100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/03/12</b>	<b>20/04/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>21/03/12</b>	<b>01/06/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14			100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,0%	Atrasado	O BNB emitiu CCE com erro na legislação do Fundo, se referindo ao decreto 7838 ao invés do 6952. Foi solicitada alteração em março de 2020, mas o banco não enviou o documento.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	15/02/19	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs:2 A Sudene aprovou em 28/10/2018, a incorporação da Candeias Energia S/A ("CESA") pela Companhia Energética Candeias ("CEC").											
Obs:3 Aguardando a emissão da versão final do CCE.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO	CGDF/2011001 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído	as datas de realização das fiscalizações serão informadas no envio do certificado.
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	Foi realizada reunião com o BNB no dia 14/10/2021 para dirimir dúvidas em relação à emissão dos CCEs
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	50%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.700.000,00	Valor realizado:		59.700.000,00	90,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.										

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO	CGDF/2011002 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para implantação do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	31/12/2021	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído	as datas de realização das fiscalizações serão informadas no envio do certificado.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	Foi realizada reunião com o BNB no dia 14/10/2021 para dirimir dúvidas em relação à emissão dos CCEs	
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	50%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		54.900.000,00	Valor realizado:		54.900.000,00	90,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade	Número do Projeto:	PO CGDF/2011003 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ano:	2011
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	31/12/2021	

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído	as datas de realização das fiscalizações serão informadas no envio do certificado.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	Foi realizada reunião com o BNB no dia 14/10/2021 para dirimir dúvidas em relação à emissão dos CCEs	
Encerramento (Banco)			-	-	0,00	-	-	0,00	50%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	90,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade			Número do Projeto:	PO	CGDF/2014001 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.			Ano:	2014	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)					
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2021
Previsão de Conclusão ADM:	30/06/2022
Data Atualização:	31/12/2021

	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33
A realizar no exercício	R\$ 89.500.527,01
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	89.500.527,01
Saldo a liberar	R\$ 2.571.146,18
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 413.011.416,34

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94		30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00		19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	15/12/20	14/01/21	5.675.760,33	08/07/21	22/09/21	74.497.533,01	100,00%	Concluído		
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/05/21	31/05/21	86.395.912,86	19/11/21	23/12/21	15.002.994,00	100,00%	Concluído		
13	Liberação 8	SUDENE/CEF							0,00%	A Iniciar	Recursos não solicitado sem previsão definida por parte do Banco	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/05/21	415.582.562,52	21/02/14	23/12/21	413.011.416,34	88,89%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									94%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	415.582.562,52	Valor realizado:	R\$	413.011.416,34	80%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	-----	----------------	------------------	-----	----------------	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.											
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs5:											
Obs5:											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2019001 (EX PO 48)	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2019
Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque edílico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 85.228.132,65
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 85.228.132,65

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 529/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/18	22/08/19	0,00	19/12/18	23/08/19	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	14.279.547,22	23/10/19	08/11/19	14.279.547,22	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	8.103.276,36	08/01/20	03/03/20	8.103.276,36	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	6.458.271,68	20/04/20	29/04/20	6.458.271,68	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	4.138.815,59	02/07/20	12/08/20	4.138.815,59	100,00%	Concluído		
8	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	52.248.843,99	30/10/20	12/11/20	52.248.221,80	100,00%	Concluído	Resta um saldo de R\$ 622,19 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			23/08/19	31/10/20	85.228.754,84	23/08/19	12/11/20	85.228.132,65	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	Concluído	no certificado não foram informadas as datas das fiscalizações			
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		30/07/21	30/07/21	-	100,00%	Concluído				
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	30/07/21	0,00	100,00%	Concluído				
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$	85.228.754,84	Valor realizado:		R\$	85.228.132,65	100%	Concluído	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:														
Observações:														
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.														
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.														
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.														
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.														
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.														
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.														

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2020002 (EX PO 51)
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	Ventos de São Fernando IV Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	228.672.439,20	361.120.732,00

Previsão de Conclusão Física:	31/03/2021
Previsão de Conclusão ADM:	30/09/2021
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)s técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 186.977.152,86
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 41.695.286,34
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 228.672.439,20

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	27/12/20	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	26/05/20	23/10/20	-	26/05/20	13/08/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	13/08/20	12/09/20	-	13/08/20	11/09/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			11/12/19	12/09/20	0,00	11/12/19	11/09/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	11/09/20	10/11/20		11/09/20	22/09/20		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	27/10/20	26/11/20	105.116.695,74	27/10/20	12/11/20	105.116.695,74	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	13/11/20	13/12/20	37.312.882,51	13/11/20	26/11/20	37.312.882,51	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	03/12/20	02/01/21	44.547.574,61	03/12/20	28/12/20	44.547.574,61	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	22/01/21	21/02/21	21.149.995,99	22/01/21	05/02/21	21.149.995,99	100,00%	Concluído		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	11/02/21	13/03/21	5.497.253,53	11/02/21	26/02/21	5.497.253,53	100,00%	Concluído		
10	Liberção 6	SUDENE/BB	30/04/21	30/05/21	15.048.036,82	30/04/21	20/05/21	15.048.036,82	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			11/09/20	13/03/21	228.672.439,20	11/09/20	20/05/21	228.672.439,20	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	228.672.439,20	Valor realizado:	R\$	228.672.439,20	83%	Atrasado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.											
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.											
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.											
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2020003	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO I S.A			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	113.680.904,39	189.470.934,65

Previsão de Conclusão Física:	31/10/2023
Previsão de Conclusão ADM:	31/12/2023
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 113.680.904,39
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ 113.680.904,39
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	26/12/19	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	18/09/20	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/09/20	19/10/20	-	19/09/20	19/10/20	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			11/12/19	19/10/20	0,00	11/12/19	19/10/20	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/20	18/12/20		19/10/20	04/12/20			100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/01/21	02/03/21	13.834.000,00					0,00%	Atrasado	O banco tem que apresentar documentos pendentes	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/21	31/05/21	4.001.000,00					0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	30/08/21	18.483.000,00					0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/21	30/11/21	7.593.000,00					0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/22	02/03/22	35.299.000,00					0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/22	31/05/22	23.567.000,00					0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/22	30/08/22	10.061.000,00					0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/10/22	30/11/22	841.000,00					0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/20	18/12/20	113.679.000,00	19/10/20			0,00	11,11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco										56%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	113.680.904,39	Valor realizado:	R\$	-	37%	Em Andamento	Status do Projeto	
----------------------------	--	--	-----------------	-----	----------------	------------------	-----	---	-----	--------------	-------------------	--

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.

Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.

Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
Em	Em Andamento
Atrasado	Atrasado
Cancelado	Cancelado
Paralisado	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2020004	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO II S.A			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	102.312.813,95	170.523.841,18

Previsão de Conclusão Física:	31/10/2023
Previsão de Conclusão ADM:	31/12/2023
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 39.521.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 102.312.813,95
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	#REF!

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	18/09/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/09/20	19/10/20	-	19/09/20	19/10/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			11/12/19	19/10/20	0,00	11/12/19	19/10/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/20	18/12/20		19/10/20	04/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/01/21	02/03/21	12.451.000,00				0,00%	Atrasado	O banco tem que apresentar documentos pendentes	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/03/21	30/04/21	3.601.000,00				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	30/08/21	16.635.000,00				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/21	30/11/21	6.834.000,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/22	02/03/22	31.769.000,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/22	31/05/22	21.210.000,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/22	30/08/22	9.055.000,00				0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/10/2022	30/11/22	757.000,00				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/20	18/12/20	102.312.000,00	19/10/20		0,00	11,11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$	102.312.813,95	Valor realizado:	R\$	-	37%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	-----	----------------	------------------	-----	---	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.

Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.

Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2020005
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	VILA ESPÍRITO SANTO 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			
Objetivo do projeto:	Implantação de parque edício			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	103.459.637,40	172.432.729,00

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/01/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	
A realizar no exercício	R\$ 4.227.243,10
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 99.232.394,30
Saldo a liberar	R\$ 4.227.243,10
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 99.232.394,30

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Diego Veras	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	29/12/19	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	19/10/20	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/10/20	18/11/20	-	19/10/20	17/11/20	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/11/19	18/11/20	0,00	29/11/19	17/11/20	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20			100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	19/03/21	18/04/21	70.157.041,59	19/03/21	06/04/21	70.157.041,59		100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	25.425.490,00	02/07/21	19/07/21	19.746.649,89		100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	7.877.105,81	29/10/21	12/11/21	9.328.702,82		100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	N/D	N/D	4.227.243,10					0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/11/20	31/10/21	70.157.041,59	17/11/20		99.232.394,30		80,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco										90%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	103.459.637,40	Valor realizado:	R\$	99.232.394,30	61%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	-----	----------------	------------------	-----	---------------	-----	--------------	-------------------

Parcelos institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.												
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.												
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2020006	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	VILA ESPÍRITO SANTO 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	90.858.400,56	151.430.667,60

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/01/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto: Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 4.105.843,83
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 86.752.556,73
Saldo a liberar	R\$ 4.105.843,83
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 86.752.556,73

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	20/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	15/10/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/10/20	18/11/20	-	19/10/20	17/11/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/11/19	18/11/20	0,00	29/11/19	17/11/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	19/03/21	18/04/21	19.807.254,22	19/03/21	06/04/21	19.807.254,22	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	43.167.800,00	02/07/21	19/07/21	47.021.856,73	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	27.883.346,34	29/10/21	12/11/21	19.923.445,78	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	N/D	N/D	4.105.843,83				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/11/20	31/10/21	90.858.400,56	17/11/20		86.752.556,73	80,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									90%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	90.858.400,56	Valor realizado:	R\$	86.752.556,73	45%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.												
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.												
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.												
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2020007
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	VILA ALAGOAS II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque edício			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.786.889,22	92.978.148,60

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/01/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 2.770.118,77
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 53.016.770,45
Saldo a liberar	R\$ 2.770.118,77
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.016.770,45

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	15/10/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	15/10/20	14/11/20	-	15/10/20	11/12/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/11/19	14/11/20	0,00	29/11/19	11/12/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	19/03/21	18/04/21	15.891.285,35	19/03/21	05/04/21	15.891.285,35	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	23.937.650,00	02/07/21	19/07/21	26.437.744,05	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	15.957.953,87	29/10/21	12/11/21	10.687.741,05	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	N/D	N/D	2.770.118,77				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/11/20	31/10/21	55.786.889,22	00/01/00		53.016.770,45	80,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									90%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	55.786.889,22	Valor realizado:	R\$	53.016.770,45	78%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.												
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.												
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas		Número do Projeto:	PO CGDF/2021001 (EX PO 50)
Objetivo estratégico:		3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região		Ano:	2021
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):			
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):			
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento	
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.				
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.				
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2021. <a href="#">Relatórios dos períodos jan-mar/2021; jan-jun/2021; jan-set/2021 e jan-dez/2021.</a>				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	2	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias
--	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2021	25/04/2021	-	01/04/2021	26/04/2021	-	100%	Concluído	Os dados foram enviados com informações incompletas	
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2021	06/05/2021	-	26/04/2021	07/06/2021	-	100%	Concluído	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados referentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2021	-	-	02/07/2021	15/07/2021	-	100%	Concluído		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2021	25/06/2021	-	01/06/2021	29/07/2021	-	100%	Concluído	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados referentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação	
5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2021	06/07/2021	-	29/07/2021	27/08/2021	-	100%	Concluído		
6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2021	-	-	31/08/2021	02/09/2021	-	100%	Concluído		
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2021	25/10/2021	-	01/10/2021	22/10/2021	-	100%	Concluído		

8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2021	05/11/2021	-	22/10/2021	03/12/2021	-	100%	Concluído				
9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2021	-	-	-	22/12/2021	-	100%	Concluído				
10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2021	25/01/2021	-	-	-	-	0%	A Iniciar				
11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2021	05/02/2021	-	-	-	-	0%	A Iniciar				
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2021	-	-	-	-	-	0%	A Iniciar				
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	75%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:														
BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações														
BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdirm@bnb.gov.br)														
Observações:														
Processo nº -														

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2021002	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	EOLICA CANUDOS II SPE S A			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	183.361.938,16	305.603.230,26

Previsão de Conclusão Física:	01/04/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 183.361.938,16
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 88.049.841,59
Saldo a liberar	R\$ 95.312.096,57
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 88.049.841,59

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	24/08/20	23/09/20	-	24/08/20	23/09/20	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	03/02/21	03/07/21	-	03/02/21	08/02/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/02/21	10/03/21	-	08/02/21	03/03/21	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/08/20	10/03/21	0,00	24/08/20	03/03/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	31/05/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	36.829.244,50	16/07/21	03/08/21	35.444.673,28	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	128.804.144,44	04/11/21	12/11/21	36.136.600,99	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	17.728.549,22	01/12/21	23/12/21	16.468.567,32	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB							0,00%	A Iniciar	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
Competência da SUDENE /Banco			04/03/21	00/01/00	183.361.938,16	04/03/21		88.049.841,59	90%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	183.361.938,16	Valor realizado:	R\$	88.049.841,59	70%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros Institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.												
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.												
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2021003	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
<b>Programa do PPA:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Breno Arruda Soares de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	EOLICA CANUDOS III SPE S A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	183.361.938,16	305.603.230,26

<b>Previsão de Conclusão Física:</b>	01/04/2022
<b>Previsão de Conclusão ADM:</b>	01/04/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 183.361.938,16
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 73.972.965,21
Saldo a liberar	R\$ 109.388.972,95
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 73.972.965,21

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	24/08/20	23/09/20	-	24/08/20	23/09/20	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	04/02/21	04/07/21	-	04/02/21	08/02/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/02/21	10/03/21	-	08/02/21	25/02/21	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/08/20</b>	<b>10/03/21</b>	<b>0,00</b>	<b>24/08/20</b>	<b>25/02/21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	31/05/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	36.829.244,50	16/07/21	03/08/21	28.947.510,76	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	128.804.144,44	04/11/21	12/11/21	15.092.448,98	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	17.728.549,22	01/12/21	23/12/21	29.933.005,47	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB							0,00%	A Iniciar	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>04/03/21</b>	<b>00/01/00</b>	<b>183.361.938,16</b>	<b>04/03/21</b>		<b>73.972.965,21</b>	<b>80,00%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>90%</b>	<b>Em Andamento</b>		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	183.361.938,16	Valor realizado:	R\$	73.972.965,21	70%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros Institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.												
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.												
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2021004	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.			
Objetivo do projeto:	Implantação de linha de transmissão			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	60.000.000,00	317.976.844,97

Previsão de Conclusão Física:	21/03/2023
Previsão de Conclusão ADM:	21/03/2023
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 60.000.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 60.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Anita de Cassia	25/11/20	25/12/20	-	25/11/20	23/12/21	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	17/05/21	14/10/21	-	17/05/21	05/08/21	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	14/10/21	13/11/21	-	05/08/21	02/09/21	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			25/11/20	13/11/21	0,00	25/11/20	02/09/21	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	02/09/21	01/11/21		02/09/21	08/09/21			100,00%	Concluído	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	15/11/21	15/12/21	60.000.000,00					100,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			02/09/21	15/12/21	60.000.000,00	02/09/21		0,00	100,00%		Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$	60.000.000,00		Valor realizado:		R\$	-	71%
											Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)												

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2021005	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	CENTRAL EÓLICA CATANDUBA I			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	140.841.810,36	235.602.017,76

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2024
Previsão de Conclusão ADM:	30/04/2024
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 140.841.810,36
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 140.841.810,36
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Teles	04/12/20	03/01/21	-	04/12/20	21/12/20	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/07/21	20/12/21	-	23/07/21	23/11/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/12/21	20/01/22	-	24/11/21	16/12/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			04/12/20	20/01/22	0,00	04/12/20	16/12/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		16/12/21	27/12/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	Em 2022	N/D	1.127.760,36				0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	Em 2023	N/D	12.705.920,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	Em 2024	31/01/24	127.008.130,00				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/03/21	31/01/24	140.841.810,36	16/12/21			25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 140.841.810,36	Valor realizado:		R\$ -	44%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)												

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2021005	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	CENTRAL EÓLICA CATANDUBA II			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	140.841.810,36	235.602.017,76

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2024
Previsão de Conclusão ADM:	30/04/2024
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 127.008.130,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 140.841.810,36
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Anita Teles	04/12/20	03/01/21	-	04/12/20	21/12/20	-	100,00%	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/07/21	20/12/21	-	23/07/21	23/11/21	-	100,00%	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/12/21	20/01/22	-	24/11/21	16/12/21	-	100,00%	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			04/12/20	20/01/22	0,00	04/12/20	16/12/21	0,00	100,00%	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/01/22	21/03/22		02/12/21	17/12/21		100,00%	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	Em 2022	N/D	1.127.760,36				0,00%	0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	Em 2023	N/D	12.705.920,00				0,00%	0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	Em 2024	31/01/24	127.008.130,00				0,00%	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/01/22	31/01/24	140.841.810,36	02/12/21			25,00%	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco										63%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar			
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar			
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar			
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$	140.841.810,36	Valor realizado:		R\$	-	44%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:													
Observações:													
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.													
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)													

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2021007
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Exo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	PARNAÍBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	274.179.982,11	548.359.964,22

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2025
Previsão de Conclusão ADM:	01/05/2025
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 274.179.962,11
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 274.179.962,11
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Anita Teles	29/12/20	28/01/21	-	29/12/20	28/01/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/08/21	17/01/22	-	20/08/21	08/11/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	18/01/22	17/02/22	-	09/11/21	26/11/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/12/20	17/02/22	0,00	29/12/20	26/11/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	31/05/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	Em 2022	N/D	109.298.073,15				0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	Em 2023	N/D	164.881.888,96				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB							0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB							0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/03/21	00/01/00	274.179.962,11	04/03/21		0,00	20,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									60%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: R\$ 274.179.982,11		Valor realizado: R\$ -				40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto: PO CGDF/2021008	
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	LIGHTSOURCE MILAGRES I GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque edílico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	77.808.580,65	145.227.536,37

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2023
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2023
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 77.808.580,64
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 77.808.580,64
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir Vllaça	02/02/21	04/03/21	-	02/02/21	25/02/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/08/21	17/01/22	-	20/08/21	21/09/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/09/21	21/10/21	-	21/09/21	19/10/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			02/02/21	21/10/21	0,00	02/02/21	19/10/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/21	18/12/21		19/10/21	19/11/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	10/2022	N/D	30.128.421,32				0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	20/2022	N/D	32.509.261,49				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/2022	N/D	12.249.128,89				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	40/2022	N/D	2.921.768,94				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/21	N/D	77.808.580,64	19/10/21		0,00	20,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									60%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 77.808.580,65	Valor realizado:		R\$ -	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2021009
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	LIGHTSOURCE MILAGRES II GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	77.808.580,65	145.227.536,37

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2023
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2023
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 77.808.580,64
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 77.808.580,64
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Ademir Vlaça	02/02/21	04/03/21	-	02/02/21	25/02/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/08/21	17/01/22	-	20/08/21	21/09/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/09/21	21/10/21	-	21/09/21	19/10/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			02/02/21	21/10/21	0,00	02/02/21	19/10/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/21	18/12/21		19/10/21	19/11/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	10/2022	N/D	30.128.421,32				0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	20/2022	N/D	32.509.261,49				0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	30/2022	N/D	12.249.128,69				0,00%	A Iniciar		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	40/2022	N/D	2.921.768,94				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/21	N/D	77.808.580,64	19/10/21		0,00	20,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									60%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: R\$ 77.808.580,65			Valor realizado: R\$ -			40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão		Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:		PO CGDF/2021010			
Objetivo estratégico:		1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.				Ano:		2021	
Programa do PPA:		2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):		Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação do PPA:		0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):		Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:									
Diretoria responsável:		Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:		DFIN/CGDF			
Diretor:		Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:		Breno Arruda Soares de Oliveira			
Problema (causa):									
Projeto:		LIGHTSOURCE MILAGRES III GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.							
Objetivo do projeto:		implantação de parque eólico							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	77.808.580,65	145.227.536,37

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 77.808.580,64
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 77.808.580,64
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir Vllaça	02/02/21	04/03/21	-	02/02/21	25/02/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/08/21	17/01/22	-	20/08/21	21/09/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/09/21	21/10/21	-	21/09/21	19/10/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			02/02/21	21/10/21	0,00	02/02/21	19/10/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/21	18/12/21		19/10/21	19/11/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	1Q/2022	N/D	30.128.421,32				0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	2Q/2022	N/D	32.509.261,49				0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	3Q/2022	N/D	12.249.128,89				0,00%	A Iniciar		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	4Q/2022	N/D	2.921.768,94				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/21	N/D	77.808.580,64	19/10/21		0,00	20,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									60%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 77.808.580,65	Valor realizado:		R\$ -	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2021011
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Exo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	LIGHTSOURCE MILAGRES IV GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	111.715.126,17	201.738.445,58

Previsão de Conclusão Física:	01/04/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 111.715.126,17
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 111.715.126,17
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir Vllaça	02/02/21	04/03/21	-	02/02/21	25/02/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/08/21	17/01/22	-	20/08/21	21/09/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/09/21	21/10/21	-	21/09/21	19/10/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			02/02/21	21/10/21	0,00	02/02/21	19/10/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/21	18/12/21		19/10/21	19/11/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	1Q/2022	N/D	49.606.847,71				0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	2Q/2022	N/D	42.346.634,19				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	3Q/2022	N/D	15.955.741,74				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	4Q/2022	N/D	3.805.902,53				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/21	N/D	111.715.126,17	19/10/21		0,00	20,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									60%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: R\$ 111.715.126,17		Valor realizado: R\$ -		40%	Em Andamento	Status do Projeto			

## Parceiros institucionais:

## Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2021012
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Exo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	LIGHTSOURCE MILAGRES V GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	77.808.580,65	145.227.536,37

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2022
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 77.808.580,64
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 77.808.580,64
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	02/02/21	04/03/21	-	02/02/21	25/02/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/08/21	17/01/22	-	20/08/21	21/09/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/09/21	21/10/21	-	21/09/21	19/10/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			02/02/21	21/10/21	0,00	02/02/21	19/10/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/21	18/12/21		19/10/21	19/11/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	1Q/2022	N/D	30.128.421,32				0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	2Q/2022	N/D	32.509.261,49				0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	3Q/2022	N/D	12.249.128,89				0,00%	A Iniciar		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	4Q/2022	N/D	2.921.768,94				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/21	N/D	77.808.580,64	19/10/21		0,00	20,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									60%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 77.808.580,65	Valor realizado:		R\$ -	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2021013
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	ASSURUÁ 5 I ENERGIA S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	136.700.004,97	244.475.964,71

Previsão de Conclusão Física:	01/02/2024
Previsão de Conclusão ADM:	01/05/2024
Data Atualização:	31/12/2021

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto

Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 136.700.004,97
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 136.700.004,97
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	09/12/20	08/01/21	-	09/12/20	07/01/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	06/07/21	03/12/21	-	06/07/21	01/12/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	04/12/21	03/01/22	-	04/12/21	22/12/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			09/12/20	03/01/22	0,00	09/12/20	22/12/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/01/22	05/03/22		22/12/21	27/12/21		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/06/22	01/07/22	15.280.590,06				0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/12/22	31/12/22	32.762.657,47				0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/06/23	01/07/23	88.656.757,44				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/01/22	01/07/23	136.700.004,97	22/12/21		0,00	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 244.475.964,71	Valor realizado:		R\$ -	44%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a Sociedade		Número do Projeto:	PO CGDF/2021014
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.		Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	ASSURUÁ 5 II ENERGIA S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	127.304.765,68	240.043.674,04

Previsão de Conclusão Física:	01/02/2024
Previsão de Conclusão ADM:	01/05/2024
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável técnico(s) pelo Projeto: Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 127.304.765,67
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 127.304.765,67
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	09/12/20	08/01/21	-	09/12/20	07/01/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	06/07/21	03/12/21	-	06/07/21	01/12/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	04/12/21	03/01/22	-	04/12/21	22/12/21	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			09/12/20	03/01/22	0,00	09/12/20	22/12/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/01/22	05/03/22		22/12/21	27/12/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/22	01/07/22	14.916.428,49				0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/12/22	31/12/22	21.634.580,46				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/06/23	01/07/23	90.753.756,72				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/01/22	01/07/23	127.304.765,67	22/12/21		0,00	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: R\$ 127.304.765,68		Valor realizado: R\$ -		44%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão	Resultados para a Sociedade			Número do Projeto:	PO CGDF/2021015
Objetivo estratégico:	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.			Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	ASSURUÁ 5 III ENERGIA S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	134.805.486,72	231.401.368,42

Previsão de Conclusão Física:	01/02/2024
Previsão de Conclusão ADM:	01/05/2024
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 132.005.031,29
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 132.005.031,29
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	09/12/20	08/01/21	-	09/12/20	07/01/21	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	06/07/21	03/12/21	-	06/07/21	01/12/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	04/12/21	03/01/22	-	04/12/21	22/12/21	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			09/12/20	03/01/22	0,00	09/12/20	22/12/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/01/22	05/03/22		22/12/21	27/12/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/22	01/07/22	13.682.253,05				0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/12/22	31/12/22	21.485.985,41				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/06/23	01/07/23	96.836.792,83				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/23	31/12/23	2.800.455,43				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/01/22	31/12/23	132.005.031,29	22/12/21		0,00	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$	134.805.486,72	Valor realizado:	R\$	-	44%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	-----	----------------	------------------	-----	---	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão:	Resultados para a sociedade			Número do Projeto:	PO COCIC/2021001 (EX POs 51 e 52)
Objetivo:	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.			Ano:	2021
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	7K66 - Apoio à infraestrutura produtiva.	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres		
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>ñ se aplica</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>31/12/2021</b>

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	William Augusto de Souza
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1 Processo nº 59335.000200/2018-61 - Itapetinga - BA (SIAFI nº 872771), Emissão de Nota Técnica 223/2021 (Doc SEI nº 0279618)	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	28/09/2021	13/10/2021	ñ se aplica	06/10/2021	06/10/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
2 Processo nº 59335.000182/2017-36 - Campo Alegre de Lourdes - BA (SIAFI nº 847045), Emissão de Nota Técnica 229/2021 (Doc SEI nº 0283850)	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	13/10/2021	28/10/2021	ñ se aplica	20/10/2021	20/10/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
3 Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica - RN (SIAFI nº 850628), Emissão de Nota Técnica 230/2021 (Doc SEI nº 0284611)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	17/09/2021	02/10/2021	ñ se aplica	09/11/2021	09/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
4 Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi - BA (SIAFI nº 850212), Emissão de Nota Técnica 220/2021 (Doc SEI nº 0279015)	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	08/09/2021	23/09/2021	ñ se aplica	05/10/2021	05/10/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
5 Processo nº 59336.000597/2019-61 - Lucrécia - RN (SIAFI nº 882999), Emissão de Nota Técnica 221/2021 (Doc SEI nº 0279149)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	28/09/2021	13/10/2021	ñ se aplica	05/11/2021	05/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
6 Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo de passivos da Sudene, Emissão de NOTA TÉCNICA Nº222/2021 (Doc SEI nº 0279172).	Heber Leandro Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	04/10/2021	19/10/2021	ñ se aplica	04/10/2021	04/10/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
7 Processo nº 59335.000128/2018-71 - Município de Pindobaçu - BA (SIAFI nº 865841), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 268/2021 (Doc SEI nº 0292656).	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	09/11/2021	24/11/2021	ñ se aplica	12/11/2021	12/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
8 Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão - BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 256/2021 (Doc SEI nº 0289574)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	21/10/2021	05/11/2021	ñ se aplica	09/11/2021	09/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
9 Processo nº 59336.001934/2018-57 - Sátiro Dias - BA (SIAFI nº 881046), Emissão de Nota Técnica 276/2021 (Doc SEI nº 0299476)	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	29/11/2021	14/12/2021	ñ se aplica	30/11/2021	30/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
10 Processo nº 59336.000606/2019-14 - São Gonçalo do Amarante - RN (SIAFI nº 865731), Emissão de Nota Técnica 269/2021 (Doc SEI nº 0293493)	Glaucio Pereira Maciel (COCIC - Núcleo de Análise)	27/08/2021	11/09/2021	ñ se aplica	16/11/2021	16/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
11 Processo nº 59336.003233/2019-33 - Cumaru/PE (SIAFI nº 895620), Emissão de Nota Técnica 260/2021 (Doc SEI nº 0290060)	Glaucio Pereira Maciel (COCIC - Núcleo de Análise)	24/09/2021	09/10/2021	ñ se aplica	05/11/2021	05/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		
12 Processo nº 03054.000025/1998-26 - PNUD (SIAFI nº não há), Emissão de Nota Técnica 275/2021 (Doc SEI nº 0298470)	Heber Leandro Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/11/2021	11/12/2021	ñ se aplica	26/11/2021	26/11/2021	ñ se aplica	100%		Concluído		

13	Processo nº 59336.001934/2018-57 - Município de Sátiro Dias - BA (SIAFI nº 881046), Emissão de Nota Técnica 282/2021 (Doc SEI nº 0302922)	Clovis Emídio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	29/11/2021	14/12/2021	ñ se aplica	07/12/2021	07/12/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo nº 59336.003233/2019-33 - Cumaru/PE (SIAFI nº 895620), Emissão de Nota Técnica 281/2021 (Doc SEI nº 0302172)	Glauco Pereira Maciel (COCIC - Núcleo de Análise)	24/09/2021	09/10/2021	ñ se aplica	06/12/2021	06/12/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
15	Processo nº 59336.003233/2019-33 - Cumaru/PE (SIAFI nº 895620), Emissão de Nota Técnica 283/2021 (Doc SEI nº 0306260)	Glauco Pereira Maciel (COCIC - Núcleo de Análise)	24/09/2021	09/10/2021	ñ se aplica	14/12/2021	14/12/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
16	Processo nº 59336.003233/2019-33 - Cumaru/PE (SIAFI nº 895620), Emissão de Nota Técnica 284/2021 (Doc SEI nº 0307069)	Glauco Pereira Maciel (COCIC - Núcleo de Análise)	24/09/2021	09/10/2021	ñ se aplica	15/12/2021	15/12/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
17	Processo nº 59335.000083/2017-54 - Jaborandi - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 33/2021 (Doc SEI nº 0280282)	Clovis Emídio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	27/09/2021	12/10/2021	ñ se aplica	15/10/2021	15/10/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi - BA (SIAFI nº 850212), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 35/2021 (Doc SEI nº 0284721)	Clovis Emídio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	18/10/2021	02/11/2021	ñ se aplica	26/10/2021	26/10/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
20	Processo nº 59335.000121/2018-50 - Município de Bala da Traição - PB (SIAFI nº 865918), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 158/2021 (Doc SEI nº 262309).	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	03/11/2021	18/11/2021	ñ se aplica	03/11/2021	-	ñ se aplica	75%	Em Andamento		
19	Processo nº 59335.000144/2018-64 - Teixeira de Freitas - BA (SIAFI nº 865862), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 35/2021 (Doc SEI nº 0287127)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	11/05/2021	26/05/2021	ñ se aplica	11/05/2021	-	ñ se aplica	75%	Atrasado		
21	Processo nº 59335.000111/2018-14 - Pé de Serra - BA (SIAFI nº 865850), Emissão de Nota Técnica 154/2021 (Doc SEI nº 0261642)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	09/06/2021	24/06/2021	ñ se aplica	09/06/2021	-	ñ se aplica	75%	Atrasado		
22	Processo nº 59335.000144/2018-64 - Teixeira de Freitas/BA (SIAFI nº 875543), Emissão de Nota Técnica 71/2021 (Doc SEI nº 0237277)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	10/03/2021	25/03/2021	ñ se aplica	10/03/2021		ñ se aplica	75%	Atrasado		
23	Processo nº 59335.000068/2017-14 - Município de Bom Jesus - RN (SIAFI nº 850667), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 301/2020 (Doc SEI nº 199741)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	03/08/2020	18/08/2020	ñ se aplica	20/11/2020		ñ se aplica	75%	Atrasado		

			Valor Previsto:	ñ se aplica	Valor realizado:	ñ se aplica	95%	Em Andamento	Status do Projeto
--	--	--	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:
Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:
Os POs 51 (2019) e 52 (2020) foram consolidadas nessa planilha.

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda		
	A Iniciar	
	Concluído	
	Em Andamento	
	Atrasado	
	Cancelado	
	Paralisado	



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão:</b>	Processos Internos			<b>Número do Projeto:</b>	PO 2021001 (ex PO 2020001)
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Aprimorar a gestão de processos			<b>Ano:</b>	2021
<b>Programa:</b>	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	CPTCE - Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial		
<b>Diretor:</b>	Aluizio Pinto de Oliveira	<b>Gestor da subunidade:</b>	Heber Leandro Nunes		
<b>Problema (causa):</b>	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
<b>Projeto:</b>	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>ñ se aplica</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>31/12/2021</b>

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Processo TCE nº 59335.000035/2011-70, Ref. Conv. DDS-107/00 SIAFI nº 406572 Gov. Estado de Sergipe (Processo Convênio nº 59313.000107/00-85) - Relatório de TCE nº 001/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020	12/03/2021	N/A	100%	Concluído	TCE encaminhada em 2019 à CGU e devolvida pela CGU em abril/2020, para reanálise. Renálise da TCE concluída em 12/03/2021	
2	Processo TCE nº 59335.000102/2011-57, Ref. Conv. CPE-084/00 SIAFI nº 406591 IPSA - Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (Processo Convênio nº 559313.000084/2000-17) - Relatório de TCE nº 002/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	30/06/2021	N/A	09/04/2020	14/04/2021	N/A	100%	Concluído		
3	Processo TCE nº 59335.000032/2010-56, Ref. Conv. DPS n.º 038/97, SIAFI nº 338592, Morro Cabeça no Tempo-PI (Processo Convênio nº 03057.000045/97-87) - Relatório de TCE nº 003/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	31/03/2021	29/06/2021	N/A	31/03/2021	14/04/2021	N/A	100%	Concluído		
4	Processo TCE n.º 59335.000720/2010-16, Ref. Conv. SIAFI n.º 406373, IPSA/PE (Processo n.º 59313.000114/00-87) - Relatório de TCE nº 004/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020	29/04/2021	N/A	100%	Concluído		
5	Processo TCE n.º 59335.000394/2009-11, Ref. Conv. SIAFI n.º 368482, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03057.000016/1998-60) - Relatório de TCE nº 005/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	19/04/2021	16/10/2021	N/A	19/04/2021	03/05/2021	N/A	100%	Concluído		
6	Processo TCE n.º 59335.000036/2008-10, Ref. Conv. SIAFI n.º 384007, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03045.000085/1999-48) - Relatório de TCE nº 006/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	29/04/2021	26/10/2021	N/A	29/04/2021	14/05/2021	N/A	100%	Concluído		
7	Processo TCE n.º 59335.000550/2009-36, Ref. Conv. SIAFI n.º 407080, Escada-PE (Processo n.º 59313.000103/2000-05) - Relatório de TCE nº 007/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	13/02/2021	12/08/2021	N/A	13/02/2021	10/06/2021	N/A	100%	Concluído		
8	Processo TCE n.º 59335.000060/2010-73, Ref. Conv. SIAFI n.º 328386, Flexeiras-AL (Processo n.º 03057.000004/1997-08) - Relatório de TCE nº 008/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	17/05/2021	13/11/2021	N/A	17/05/2021	25/06/2021	N/A	100%	Concluído		
9	Processo de TCE nº 59335.000184/2010-59, ref. Conv. SIAFI nº 348984 (proc. Nº 03055.000025/98-34), Governo do Estado de Alagoas. - Relatório de TCE nº 009/2021	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2019	30/09/2019	N/A	03/04/2019	01/07/2021	N/A	100%	Concluído		

10	Processo TCE n.º 59335.000356/2009-08 Ref. Conv. SIAFI n.º 406593 (Processo n.º 59313.000095/2000-99) - AEDA - Autarquia Educacional do Araripe - Relatório de TCE nº 010/2021	gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	08/07/2021	04/01/2022	N/A	08/07/2021	31/08/2021	N/A	100%	Concluído	
11	Processo TCE n.º 59335.000365/2011-66 Ref. Conv. SIAFI n.º 580885 (Processo n.º 59333.000146/2006-30) - Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA - Relatório de TCE nº 011/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	02/08/2021	29/01/2022	N/A	02/08/2021	31/08/2021	N/A	100%	Concluído	
12	Processo de TCE nº 59335.000005/2012-45, Ref. Conv. SIAFI nº 406129 (Processo n.º 59313.000006/2000-12), Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP - Relatório de TCE nº 012/2021	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	22/04/2021	19/10/2021	N/A	22/04/2021	21/09/2021	N/A	100%	Concluído	
13	Processo de TCE nº 59335.000544/2009-89, Ref. Conv. SIAFI nº 371426 (Processo n.º 03057.00002/1999-36), Fundação Quinteto Violado - Relatório de TCE nº 013/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	20/08/2021	16/02/2022	N/A	20/08/2021	27/09/2021	N/A	100%	Concluído	
14	Processo de TCE nº 59335.000103/2011-00, Ref. Conv. SIAFI nº 406420 (Processo n.º 59313.000067/2000-71), Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA - Relatório de TCE nº 014/2021	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	24/08/2021	20/02/2022	N/A	24/08/2021	11/11/2021	N/A	100%	Concluído	
15	Processo de TCE nº 59335.000571/2009-51, Ref. Conv. SIAFI nº 407096 (Processo n.º 59313.000098/2000-22), Autarquia Educacional do Araripe - AEDA - Relatório de TCE nº 015/2021	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	17/11/2021	16/05/2022	N/A	17/11/2021	01/12/2021	N/A	100%	Concluído	
16	Processo de TCE nº 59335.000063/2010-15, Ref. Conv. SIAFI nº 406134 (Processo n.º 59313.000065/2000-82), Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE – IDSTP - Relatório de TCE nº 016/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	30/09/2021	29/03/2022	N/A	30/09/2021	02/12/2021	N/A	100%	Concluído	
17	Processo de TCE nº 59333.000402/2006-16, Ref. Conv. SIAFI nº 338794 (Processo n.º 03055.000056/1997-87), Governo do Estado do Piauí - Relatório de TCE nº 017/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	14/09/2021	13/03/2022	N/A	14/09/2021	06/12/2021	N/A	100%	Concluído	
18	Processo de TCE nº 59336.000406/2021-86, Ref. Conv. SIAFI nº 737121 (Processo n.º 59335.000172/2010-24), GRUPO GESTÃO - PESQUISA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL - Relatório de TCE nº 018/2021	Heber Nunes (CPTCE)	24/02/2021	23/08/2021	N/A	24/02/2021	21/12/2021	N/A	100%	Concluído	
19	Processo de TCE nº 59335.000049/2010-11, ref. Conv SIAFI nº 400444 (Processo nº 59313.000005/00-60) - Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE - - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	18/08/2021	14/02/2022	N/A	18/08/2021		N/A	25%	Em Andamento	
Valor Previsto:			ñ se aplica		Valor realizado:		ñ se aplica		N/A	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:	
P.O. - 4º ciclo/2021	

Fonte: CPTCE (Comissão Permanete de Tomadas de Contas Especial)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Aprendizado e Crescimento			Número do Projeto:	PO CGGP/2018001 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais			Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI			Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade			Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira			Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene				
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 25.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/03/2022
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 9.414,51
A realizar no exercício	R\$ -00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -00
Valor liberado no Exercício	R\$ -00
Saldo a liberar	R\$ -00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -00
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.414,51

N.E	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	<b>Capacitação sobre Força de Trabalho</b>	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R\$ 9.414,51	100%	Concluído		
2	<b>Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho</b>	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	28/02/2019	R\$ -00	30/07/2018	17/05/2019	R\$ -00	100%	Concluído	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
3	<b>Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho</b>	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios quantitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	01/03/2019	31/08/2019	R\$ 15.000,00	19/07/2018	31/08/2019	R\$ -00	100%	Concluído	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas. Não estando previstos outros gastos com este PO.	
4	<b>Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho</b>	Levantamento dos qualitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP	01/03/2019	31/08/2021	R\$ -00	05/04/2020	31/08/2021		100%	Concluído	Realização de reuniões técnicas da CGGP no período para definição de dados e deliberação do estudo técnico.	

5	Apresentação do Resultado	Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação	CGGP	01/09/2021	28/02/2022					90%	Em Andamento	<p>O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, pelos seguintes motivos. Na etapa 5 (Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação), tendo em vista que a consolidação das respostas/informações das unidades administrativas, colacionadas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05, o documento técnico exigiu grande esforço e tempo da equipe envolvida, 2 servidores.</p> <p>O Relatório com o Resultado do Documento Técnico foi concluído em 31/12/2021, porém os 10% estão atribuídos a apresentação do mesmo à validação da Diretoria Colegiada.</p>	<p>Enviado OFÍCIO Nº 1812/2021/CGGP/DAD/SUDENE. DE 03 de setembro de 2021 aos Gestores da Unidade da Sudene, com a finalidade de atualização do Lotacionograma para compor o Planejamento das Ações do Dimensionamento da Força de Trabalho da Sudene, com a juntada das respostas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05.</p> <p>Considerando a transição de Titularidade da Superintendência, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022.</p> <p>Trabalho Concluso aguardando apresentação do resultado e do plano de ação ao Superintendente, para posterior apresentação e deliberação final da Diretoria Colegiada, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022.</p>
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	01/11/2021	31/03/2022					50%	Em Andamento	<p>o percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, pelos seguintes motivos.</p> <p>A Etapa 6 - Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho foi iniciado em 01/12/2021, e está com 50% do trabalho em andamento, não sendo ainda finalizado para apresentação, cuja proposta é o mesmo ser apresentado junto com o Relatório do Documento Técnico para apreciação da Diretoria Colegiada validar. Os 50% posteriores seriam a apresentação aos Gestores do Resultado do Documento Técnico e do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho.</p>	<p>Considerando a transição de Titularidade da Superintendência, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022.</p> <p>Trabalho Concluso aguardando apresentação do resultado e do plano de ação ao Superintendente, para posterior apresentação e deliberação final da Diretoria Colegiada, para apresentação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho aos Gestores</p>
				Valor Previsto:		R\$ 25.000,00	Valor realizado:		R\$ 9.414,51	90%	Em Andamento		

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Data repactuada em função do relatório com o Resultado do Documento Técnico ter sido concluído em 31/12/2021, faltando os 10% atribuídos a apresentação do mesmo à validação da Diretoria Colegiada, onde também será apresentado o plano de trabalho (etapa 6) que está com 50% do trabalho concluído.	

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

DIMENSÃO	Aprendizado e Crescimento			Número do Projeto:	PO CGGP/2020001 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	Promover a qualidade de vida no trabalho			Ano:	2020
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
Diretor :	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes		
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais				
Projeto:	Indicadores de Gestão de Pessoas				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		R\$ 50.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2021
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Carla Paes, Márcia Santos de Melo, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 10.800,00
A realizar no exercício	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -00
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ -00
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 10.800,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapa	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Estudos sobre Indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas</b>	Estudos sobre o tema indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas - pesquisas de modelos, pesquisa na literatura	CGGP	01/09/20	30/09/20		01/09/20	30/09/20		100%	Concluído	Estudos para compreensão do tema - prévia a capacitação formal	
2	<b>Capacitação da Equipe e Elaboração de Plano de Ação</b>	Participação em evento de capacitação e Elaboração de Projeto/Plano de Ação para execução do projeto	CGGP	01/09/20	29/10/20	R\$ 50.000,00	01/09/20	29/10/20	R\$ 10.800,00	100%	Concluído	Foi gasto com capacitação no exercício de 2020, o valor de R\$10.800,00, não estando previstos outros gastos com este PO.	
3	<b>Análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP</b>	Estudo e análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP, assim como normativos referenciais para auxiliar na definição de processos críticos de monitoramento - conforme	CGGP (Gestores e Técnicos)	01/02/21	31/03/21	R\$ -00	01/02/21	31/03/21	-	100%	Concluído		
4	<b>Seleção dos processos críticos para monitoramento - CGGP</b>	Definir Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP/DIDAS/DICAD para monitoramento	CGGP (Gestores)	01/04/21	30/04/21	R\$ -00	12/04/21	30/04/21		100%	Concluído		
5	<b>Definir Ordem de estudos das subunidades da CGGP</b>	Definir ordem de trabalho para definição de indicadores (CGGP, DICAD, DIDAS)	CGGP (Gestores)	01/05/21	31/05/21	R\$ -00	26/04/21	31/05/21		100%	Concluído		



6	<b>Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 1</b>	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$ -00	01/05/21	31/05/21		100%	Concluído		Definição de indicadores DIDAS Capacitação
7	<b>Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 1</b>	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$ -00	01/05/21	31/05/21		100%	Concluído		Definição de indicadores DIDAS Capacitação
8	<b>Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 1</b>	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$ -00	01/05/21	31/05/21		100%	Concluído		
9	<b>Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 1</b>	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	01/07/21	31/07/21	R\$ -00	01/07/21	31/07/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	
10	<b>Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 1</b>	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	01/07/21	31/07/21	R\$ -00	01/07/21	31/07/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	
11	<b>Apresentação dos resultados - Subunidade 1</b>	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	01/08/21	31/08/21	R\$ -00	01/08/21	31/08/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	
12	<b>Ajustes e validação - Subunidade 1</b>	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	01/08/21	31/08/21	R\$ -00	01/08/21	31/08/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	Acompanhamento no Processo 59336.00288/2021-17
13	<b>Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 2</b>	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/07/21	30/07/21	R\$ -00	01/07/21	30/07/21		100%	Concluído		
14	<b>Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 2</b>	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas	CGGP	02/08/21	13/08/21	R\$ -00	02/08/21	13/08/21		100%	Concluído		
15	<b>Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 2</b>	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/08/21	17/08/21	R\$ -00	16/08/21	17/08/21		100%	Concluído		
16	<b>Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 2</b>	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	18/08/21	10/09/21	R\$ -00	18/08/21	10/09/21		100%	Concluído		
17	<b>Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 2</b>	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	13/09/21	30/09/21	R\$ -00	13/09/21	30/09/21		100%	Concluído		Acompanhamento no Processo 59336.002888/2021-17
18	<b>Apresentação dos resultados - Subunidade 2</b>	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	01/10/21	01/10/21	R\$ -00	01/10/21	01/10/21		100%	Concluído		
19	<b>Ajustes e validação - Subunidade 2</b>	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	04/10/21	15/10/21	R\$ -00	01/10/21	01/10/21		100%	Concluído		
20	<b>Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 3</b>	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	18/10/21	29/10/21	R\$ -00	18/10/21	29/10/21		100%	Concluído		

21	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 3	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	01/11/21	12/11/21	R\$ -00	01/11/21	12/11/21		100%	Concluído	Ficha técnica elaborada: Índice de Qualidade de vida no Trabalho e Índice de clima organizacional
22	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 3	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/11/21	17/11/21	R\$ -00	16/11/21	17/11/21		100%	Concluído	
23	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 3	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	22/11/21	03/12/21	R\$ -00	22/11/21	03/12/21		100%	Concluído	Definição de formas de medição para 2022 - realização em 2022 de pesquisa de clima e pesquisa de QVT
24	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 3	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	06/12/21	17/12/21	R\$ -00	06/12/21	17/12/21		100%	Concluído	Definição de formas de medição para 2022 - realização em 2022 de pesquisa de clima e pesquisa de QVT
25	Apresentação dos resultados - Subunidade 3	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	20/12/21	20/12/21	R\$ -00	20/12/21	20/12/21		100%	Concluído	
26	Ajustes e validação - Subunidade 3	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	20/12/21	30/12/21	R\$ -00	20/12/21	29/12/21		100%	Concluído	Ajustes de indicadores Capacitação e QVT conforme trabalho de Revisão das Metas da Proposta de Painel de Indicadores e Metas (21.12.2021).   Inclusão de Indicador de execução do Programa de QVT - Rodada Piloto conforme dados 2019   Acompanhamento no Processo
				Valor Previsto:		R\$ 50.000,00	Valor realizado:		R\$ 10.800,00	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>DIMENSÃO</b>	<b>Aprendizado e Crescimento</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO CGGP 2021001</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais</b>	<b>Ano:</b>	<b>2021</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MDR):</b>	
<b>Ação do PPA:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
<b>Diretor:</b>	Aluizio Pinto de Oliveira	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carla dos Santos Macedo Paes
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de recompor a força de trabalho da Sudene		
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho : Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 75.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2024
<b>Data Atualização:</b>	13/01/2022

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -00
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	

N.º	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo</b>	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	01/04/2022	31/05/2022	R\$ -00				0%	<b>A Iniciar</b>	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
2	<b>Consolidação do Levantamento da força de trabalho</b>	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/06/2022	30/09/2022	R\$ 15.000,00				0%	<b>A Iniciar</b>	Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
3	<b>Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação</b>	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso público de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 15.000,00				0%	<b>A Iniciar</b>	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
4	<b>Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração</b>	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	01/01/2023	30/06/2023	R\$ 10.000,00				0%	<b>A Iniciar</b>	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
5	<b>Elaboração de Projeto de Processo Seletivo</b>	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/07/2023	31/12/2023	R\$ 17.500,00				0%	<b>A Iniciar</b>	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto.	

6	Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/01/2024	30/04/2024	R\$ 17.500,00				0%	A Iniciar	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
7	Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/05/2024	31/12/2024	R\$ -00				0%	A Iniciar	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
				Valor Previsto:		R\$ 75.000,00	Valor realizado:			0%	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
**ORÇAMENTO 2021 - POSIÇÃO ATÉ 31/12/2021**

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2021 ( a )	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/CANCEL AMENTOS/BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = ( a + b )	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO ( d )	%	VALOR PAGO/REPASSADO ( e )	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = ( c - d )
<b>1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2</b>	<b>8.362.378,00</b>	<b>35,93</b>	<b>2.422.683,00</b>	<b>10.785.061,00</b>	<b>7.396.755,06</b>	<b>29,83</b>	<b>5.832.476,96</b>	<b>3.388.305,94</b>
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	7.808.433,00	33,55	2.403.883,00	10.212.316,00	7.216.296,73	29,10	5.666.061,96	2.996.019,27
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	400.000,00	1,72	0,00	400.000,00	12.470,00	0,05	12.470,00	387.530,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0020	153.945,00	0,66	18.800,00	172.745,00	167.988,33	0,68	153.945,00	4.756,67
<b>2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2</b>	<b>1.431.146,00</b>	<b>6,15</b>	<b>3.167.982,00</b>	<b>4.599.128,00</b>	<b>3.928.636,97</b>	<b>15,84</b>	<b>1.521.453,47</b>	<b>670.491,03</b>
<b>Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001</b>	<b>399.817,00</b>	<b>1,72</b>	<b>1.492.281,00</b>	<b>1.892.098,00</b>	<b>1.221.663,67</b>	<b>4,93</b>	<b>1.046.663,67</b>	<b>670.434,33</b>
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000	206.874,00		1.099.059,00	1.305.933,00	635.500,00		460.500,00	670.433,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	192.943,00		393.222,00	586.165,00	586.163,67		586.163,67	1,33
<b>Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001</b>	<b>825.484,00</b>	<b>3,55</b>	<b>756.728,00</b>	<b>1.582.212,00</b>	<b>1.582.156,00</b>	<b>6,38</b>	<b>199.972,50</b>	<b>56,00</b>
Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004	215.638,00		966.573,00	1.182.211,00	1.182.211,00		0,00	0,00
Fortalecimento das Políticas Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Serviços Especializados de Informação - 20WQ/0001 - PO 0006	1,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	215.637,00		-215.637,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	394.208,00		5.792,00	400.000,00	399.945,00		199.972,50	55,00
<b>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001</b>	<b>33.746,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1.091.072,00</b>	<b>1.124.818,00</b>	<b>1.124.817,30</b>	<b>4,54</b>	<b>274.817,30</b>	<b>0,70</b>
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	33.746,00		1.091.072,00	1.124.818,00	1.124.817,30		274.817,30	0,70
<b>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001</b>	<b>67.490,00</b>	<b>0,29</b>	<b>-67.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	67.490,00		-67.490,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001</b>	<b>104.609,00</b>	<b>0,45</b>	<b>-104.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	101.235,00		-101.235,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Acompanhamento e Fiscalização "+ Gestão Municipal" - 8917/0001 - PO 0002	3.374,00		-3.374,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 6 E RP 7</b>	<b>13.480.138,00</b>	<b>57,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480.138,00</b>	<b>13.474.958,00</b>	<b>54,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00</b>
<b>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.820,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00</b>
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0031 - (PTRES 202407) - No Estado de Minas Gerais (RP 6)	200.000,00		0,00	200.000,00	194.820,00		0,00	5.180,00
<b>Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66</b>	<b>13.280.138,00</b>	<b>57,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280.138,00</b>	<b>13.280.138,00</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66 - (PTRES 202408) - No Estado do Ceará (RP 6)	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66 - (PTRES 202409) - No Estado de Pernambuco (RP 6)	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66 - (PTRES 202411) - Aquisição de Máquina (RP 7)	7.280.138,00		0,00	7.280.138,00	7.280.138,00		0,00	0,00

TOTAL	23.273.662,00	100,00	5.590.665,00	28.864.327,00	24.800.350,03	100,00	7.353.930,43	4.063.976,97
-------	---------------	--------	--------------	---------------	---------------	--------	--------------	--------------

PO = Plano Orçamentário

ANEXO III - RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

ANEXO III - Planos Operativos segundo Dimensões e Objetivos Estratégicos

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2014001 (EX PO 3)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Atrasado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
2	CGDS/2020005 (ex PO 6)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 319.360,49	75%	CGDS
3	CGDS/2020006 (ex PO 7)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 241.376,80	71%	CGDS
4	CGDS/2020007 (es PO 8)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	0%	CGDS
5	CGDS/2020008	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
6	CGDS/2020009	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 476.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
7	CGDS/2020011	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
8	CGDS/2020012	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 426.466,90	100%	CGDS
9	CGDS/2020013	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro. Pós Pandemia de Covid-19.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 465.839,00	R\$ 465.839,00	100%	CGDS
10	CGEP/2019005 (EX PO 18)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
11	CGDF/2008001 (EX PO 34)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
12	CGDF/2008002 (EX PO 35)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
13	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF

ANEXO III - RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

ANEXO III - Planos Operativos segundo Dimensões e Objetivos Estratégicos

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	CGDF/2011002 (Ex PO 37)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
15	CGDF/2011003 (Ex PO 38)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
16	CGDF/20014001 (EX PO 43)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 413.011.416,34	99%	CGDF
17	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	85.228.754,84	85.228.132,65	100%	CGDF
18	CGDF/2020002	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 228.672.439,20	R\$ 228.672.439,20	100%	CGDF
19	CGDF/2020003	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 113.680.904,39	R\$ 0,00	0%	CGDF
20	CGDF/2020004	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 102.312.813,95	R\$ 0,00	0%	CGDF
21	CGDF/2020005	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 103.459.637,40	R\$ 99.232.394,30	96%	CGDF
22	CGDF/2020006	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 90.858.400,56	R\$ 86.752.556,73	95%	CGDF
23	CGDF/2020007	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.786.889,22	R\$ 53.016.770,45	95%	CGDF
24	CGDF/2021002	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 88.049.841,59	48%	CGDF
25	CGDF/2021003	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 73.972.965,21	40%	CGDF
26	CGDF/2021005	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Catanduba I	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 140.841.810,36	R\$ 0,00	0%	CGDF



ANEXO III - RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

ANEXO III - Planos Operativos segundo Dimensões e Objetivos Estratégicos

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
27	CGEP/2020001 (EX PO 17)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75% ).	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
28	CGDF/2021006	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Catanduba II	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 140.841.810,36	R\$ 0,00	0%	CGDF
29	CGDF/2021007	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Parnaíba II Geração de Energia S.A	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 274.179.982,11	R\$ 0,00	0%	CGDF
30	CGDF/2021008	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
31	CGDF/2021009	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
32	CGDF/2021010	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
33	CGDF/2021011	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 111.715.126,17	R\$ 0,00	0%	CGDF
34	CGDF/2021012	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
35	CGDF/2021013	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assuruá 5 I Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 136.700.004,97	R\$ 0,00	0%	CGDF
36	CGDF/2021014	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assuruá 5 II Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 127.304.765,68	R\$ 0,00	0%	CGDF
37	CGDF/2021015	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assuruá 5 III Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 134.805.486,72	R\$ 0,00	0%	CGDF
38	CGDF/2021004	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 60.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDF

ANEXO III - RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

ANEXO III - Planos Operativos segundo Dimensões e Objetivos Estratégicos

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
39	CGEP/2019002 (EX PO 14)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
40	COCIC/2021001	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 Apoio à infraestrutura produtiva.	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCC
41	CGEP/2021002 (ex PO CGEP/2020006)	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
42	CGEP/2021003	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
43	CGEP/2021004	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos dos setores de Calçados da área de atuação da Sudene.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
44	CGDS/2022002	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias provenientes de emendas parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene	2218 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 Apoio à infraestrutura produtiva.	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
		Total do Objetivo 1						7.109.172.165,23	4.421.837.372,53	62%	
45	CGEP/2020003 (EX PO 20)	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 350.707,09	-	CGEP
46	CGEP/2020004 (EX PO 21)	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 218.511,98	-	CGEP
47	CGCP/2020001 (EX PO 31)	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 1.644.040,39	R\$ 708.040,89	43%	CGCP
48	CGCP/2021001	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340-Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Em Andamento	R\$ 1.998.021,94	R\$ 1.998.021,94	100%	CGCP
49	CGEP/2021001 (ex PO 2019003)	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
50	CGCP/2021002	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 725.810,00	R\$ 725.810,00	100%	CGCP
51	CGCP/2021004	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 481.189,57	R\$ 0,00	0%	CGCP

ANEXO III - Planos Operativos segundo Dimensões e Objetivos Estratégicos

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
52	CGCP/2021005	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
53	CGCP/2021006	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Delta do	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 893.809,13	R\$ 201.107,06	23%	CGCP
54	CGDS/2012001	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
55	CGDS/2015001 (ex po 4)	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Concluído	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
56	CGDS/2022001	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Webinars para difusão do conhecimento e articulação de parceiros.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
57	CGCP/2022001	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
58	CGCP/2022002	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
59	CGCP/2022003	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene - OnuHabitat	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ	Em Andamento	R\$ 309.985,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
Total do Objetivo 2								8.571.119,90	5.191.681,46	61%	
TOTAL DA DIMENSÃO 1								7.117.743.285,13	4.427.029.053,99	62%	
60	CGEP/2020008 (EX PO 28)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 199.972,50	R\$ 199.972,50	-	CGEP
61	CGDF/2021001	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDF
62	CGEP/2020009 (EX PO 29)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
63	CGEP/2020010 (EX PO 30)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
Total do Objetivo 3								R\$ 1.064.572,50	R\$ 1.064.572,50	100%	
64	CGEP/2020002 (EX PO 19)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
65	CGCP/2020002 (ex po 32)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
Total do Objetivo 4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	

ANEXO III - Planos Operativos segundo Dimensões e Objetivos Estratégicos

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
66	CGDS/2020010	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas.	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação.	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
Total do Objetivo 5								R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	
TOTAL DA DIMENSÃO 2								2.034.144,50	2.034.144,50	100%	
67	CPTCE/2021001	3. Processos internos.	7. Aprimorar a Gestão de Processos.	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
Total do Objetivo 7								R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DA DIMENSÃO 3								0,00	0,00	#DIV/0!	
68	CGGP/2018001 (EX PO 54)	4. Aprendizado e Crescimento.	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
69	CGGP/2021001	4. Aprendizado e Crescimento.	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	0%	CGGP
Total do Objetivo 10								R\$ 100.000,00	R\$ 9.414,51	9%	
70	CGGP/2020001 (ex PO 55)	4. Aprendizado e Crescimento.	11. Promover a qualidade de vida no trabalho.	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
Total do Objetivo 11								R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	
TOTAL DA DIMENSÃO 4								150.000,00	20.214,51	13%	
TOTAL GERAL								7.119.927.429,63	4.429.083.413,00	62,2%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.  
Referência dos dados: 4º Ciclo 2021  
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.  
Posição: Dezembro/2021

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

ANEXO IV - Planos Operativos segundo Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDF/2008001 (EX PO 34)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
2	CGDF/2008002 (EX PO 35)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
3	CGDF/2011001 (EX PO 36)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
4	CGDF/2011002 (EX PO 37)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
5	CGDF/2011003 (EX PO 38)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
6	CGDF/2014001 (EX PO 43)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 413.011.416,34	99%	CGDF
7	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	85.228.754,84	85.228.132,65	100%	CGDF
8	CGDF/2020002	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 228.672.439,20	R\$ 228.672.439,20	100%	CGDF
9	CGDF/2020003	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 113.680.904,39	R\$ 0,00	0%	CGDF
10	CGDF/2020004	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 102.312.813,95	R\$ 0,00	0%	CGDF
11	CGDF/2020005	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 103.459.637,40	R\$ 99.232.394,30	96%	CGDF
12	CGDF/2020006	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 90.858.400,56	R\$ 86.752.556,73	95%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

ANEXO IV - Planos Operativos segundo Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	CGDF/2020007	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.786.889,22	R\$ 53.016.770,45	95%	CGDF
14	CGDF/2021002	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 88.049.841,59	48%	CGDF
15	CGDF/2021003	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 73.972.965,21	40%	CGDF
16	CGDF/2021004	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 60.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDF
17	CGDF/2021005	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Catanduba I	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 140.841.810,36	R\$ 0,00	0%	CGDF
18	CGDF/2021006	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Catanduba II	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 140.841.810,36	R\$ 0,00	0%	CGDF
19	CGDF/2021007	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Parnaíba II Geração de Energia S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 274.179.982,11	R\$ 0,00	0%	CGDF
20	CGDF/2021008	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
21	CGDF/2021009	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
22	CGDF/2021010	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
23	CGDF/2021011	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 111.715.126,17	R\$ 0,00	0%	CGDF
24	CGDF/2021012	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

ANEXO IV - Planos Operativos segundo Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	CGDF/2021013	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assurua 5 I Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 136.700.004,97	R\$ 0,00	0%	CGDF
26	CGDF/2021014	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assurua 5 II Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 127.304.765,68	R\$ 0,00	0%	CGDF
27	CGDF/2021015	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assurua 5 III Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 134.805.486,72	R\$ 0,00	0%	CGDF
P 2217 - Ação 0355								7.102.749.443,37	4.419.370.340,47	62%	
28	CGDS/2012001	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
29	CGDS/2015001 (EX PO 4)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Concluído	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
P 2217 - Ação 8689								989.482,50	989.482,50	100%	
30	CGDS/2020010	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação.	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
P 2217 - Ação 8917								969.572,00	969.572,00	100%	
31	CGEP/2019005 (EX PO 18)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
32	CGEP/2020009 (EX PO 29)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
33	CGEP/2020010 (EX PO 30)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
34	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 1.644.040,39	R\$ 708.040,89	43%	CGCP
35	CGCP/2021002	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 725.810,00	R\$ 725.810,00	100%	CGCP
36	CGCP/2021004	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 481.189,57	R\$ 0,00	0%	CGCP



RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

ANEXO IV - Planos Operativos segundo Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
37	CGCP/2021005	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
38	CGCP/2021006	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 893.809,13	R\$ 201.107,06	23%	CGCP
39	CGCP/2022003	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene - OnuHabitat	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 309.985,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
40	CGEP/2021003	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
41	CGEP/2021004	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor de Calçados da área de atuação da Sudene.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
P 2217 - Ação 20WQ								7.150.795,09	2.619.961,12	37%	
42	CGDS/2020005 (EX PO 6)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 319.360,49	75%	CGDS
43	CGDS/2020006 (EX PO 7)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 241.376,80	71%	CGDS
P 2217 - Ação 4640								765.000,00	560.737,29	73%	
44	CGDS/2020008	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
45	CGDS/2020009	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 476.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
46	CGDS/2020013	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 465.839,00	R\$ 465.839,00	100%	CGDS
47	CGEP/2020003 (EX PO 20)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 350.707,09	73%	CGEP



RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

ANEXO IV - Planos Operativos segundo Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
48	CGEP/2020004 (EX PO 21)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 218.511,98	73%	CGEP
49	CGCP/2021001	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340-Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Em Andamento	R\$ 1.998.021,94	R\$ 1.998.021,94	100%	CGCP
		P 2217 - Ação 8340						4.268.654,00	3.583.080,01	84%	
50	CGDS/2020007 (EX PO 8)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	0%	CGDS
51	CGDS/2020011	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
52	CGDS/2020012	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordero no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 426.466,90	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 214S						2.340.924,47	426.466,90	18%	
53	CGDS/2014001 (EX PO 3)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Atrasado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 20N7						343.585,70	343.585,70	100%	
54	CGDS/2022002	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias provenientes de emendas parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 Apoio à infraestrutura produtiva.	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDS
55	COCIC/2021001 (EX PO 51 e 52)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 Apoio à infraestrutura produtiva.	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	COCIC
		P 2217 - Ação 7K66						0,00	0,00	#DIV/0!	
		Total do Programa 2217						7.119.577.457,13	4.428.863.225,99	62%	
56	CPTCE/2021001	3. Processos internos	7. Aprimorar a Gestão de Processos	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CPTCE
57	CGGP/2018001 (EX PO 54)	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
58	CGGP/2020001 (ex PO 55)	4. Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho.	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluido	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

ANEXO IV - Planos Operativos segundo Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
59	CGGP/2021001	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	0%	CGGP
Total do Programa 2111								150.000,00	20.214,51	13%	
60	CGEP/2019002 (EX PO 14)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
61	CGEP/2020001 (EX PO 17)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75% ).	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
62	CGEP/2020002 (EX PO 19)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
63	CGEP/2020008 (EX PO 28)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 199.972,50	R\$ 199.972,50	100%	CGEP
64	CGEP/2021001 (ex PO 2019003)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
65	CGCP/2020002 (EX PO 32)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
66	CGCP/2022001	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
67	CGCP/2022002	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
68	CGDS/2022001	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Webinars para difusão do conhecimento e articulação de parceiros.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDS
69	CGEP/2021002 (ex PO CGEP/2020006)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
70	CGDF/2021001	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDF
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								199.972,50	199.972,50	100%	
TOTAL GERAL								7.119.927.429,63	4.429.083.413,00	62,2%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2021

Posição: Dezembro/2021

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO V - Planos Operativos segundo Unidades Administrativas da Sudene

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2012001	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
2	CGDS/2014001 (ex PO 3)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Atrasado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
3	CGDS/2015001 (ex PO 4)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Concluído	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
4	CGDS/2020005 (ex PO 6)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 319.360,49	75%	CGDS
5	CGDS/2020006 (ex PO 7)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 241.376,80	71%	CGDS
6	CGDS/2020007 (ex PO 8)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	0%	CGDS
7	CGDS/2020008	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
8	CGDS/2020009	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 476.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
9	CGDS/2020010	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação.	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
10	CGDS/2020012	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 426.466,90	100%	CGDS
11	CGDS/2020011	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
12	CGDS/2020013	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 465.839,00	R\$ 465.839,00	100%	CGDS
13	CGDS/2022001	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Webinars para difusão do conhecimento e articulação de parceiros.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO V - Planos Operativos segundo Unidades Administrativas da Sudene

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	CGDS/2022002	1. Resultados para a sociedade.	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias provenientes de emendas parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDS
<b>TOTAL CGDS/DPLAN</b>								<b>6.900.415,36</b>	<b>4.305.683,39</b>	<b>62%</b>	
15	COCIC/2021001 (ex PO 51 e 52)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 Apoio à infraestrutura produtiva.	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	COCIC
<b>TOTAL COCIC/DPLAN</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
16	CGEP/2019002 (ex PO 14)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
17	CGEP/2019005 (EX PO 18)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
18	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75% ).	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
19	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
20	CGEP/2020003 (ex PO 20)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 350.707,09	73%	CGEP
21	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 218.511,98	73%	CGEP
22	CGEP/2020010 (ex PO 30)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
23	CGEP/2020009 (ex PO 29)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
24	CGEP/2021001 (ex PO 2019003)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
25	CGEP/2020008 (ex PO 28)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 199.972,50	R\$ 199.972,50	100%	CGEP
26	CGEP/2021002 (ex PO CGEP/2020006)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
27	CGEP/2021003	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO V - Planos Operativos segundo Unidades Administrativas da Sudene

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	CGEP/2021004	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos dos setores de Calçados da área de atuação da Sudene.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGEP
<b>TOTAL CGEP/DPLAN</b>								<b>3.324.714,87</b>	<b>1.754.194,74</b>	<b>53%</b>	
29	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 1.644.040,39	R\$ 708.040,89	43%	CGCP
30	CGCP/2020002 (ex PO 32)	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
31	CGCP/2021001	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340-Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Em Andamento	R\$ 1.998.021,94	R\$ 1.998.021,94	100%	CGCP
32	CGCP/2021002	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 725.810,00	R\$ 725.810,00	100%	CGCP
33	CGCP/2021004	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 481.189,57	R\$ 0,00	0%	CGCP
34	CGCP/2021005	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
35	CGCP/2021006	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R\$ 893.809,13	R\$ 201.107,06	23%	CGCP
36	CGCP/2022001	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
37	CGCP/2022002	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGCP
38	CGCP/2022003	1. Resultados para a sociedade	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene - OnuHabitat	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ	Em Andamento	R\$ 309.985,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
<b>TOTAL CGCP/DPLAN</b>								<b>6.802.856,03</b>	<b>3.632.979,89</b>	<b>53%</b>	
<b>TOTAL DPLAN</b>								<b>17.027.986,26</b>	<b>9.692.858,02</b>	<b>57%</b>	
39	CGDF/2008001 (ex PO 34)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO V - Planos Operativos segundo Unidades Administrativas da Sudene

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
40	CGDF/2008002 (ex PO 35)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
41	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
42	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
43	CGDF/2011003 (ex PO 38)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
44	CGDF/2014001 (ex PO 43)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 413.011.416,34	99%	CGDF
45	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	85.228.754,84	85.228.132,65	100%	CGDF
46	CGDF/2020002	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 228.672.439,20	R\$ 228.672.439,20	100%	CGDF
47	CGDF/2020003	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 113.680.904,39	R\$ 0,00	0%	CGDF
48	CGDF/2020004	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 102.312.813,95	R\$ 0,00	0%	CGDF
49	CGDF/2020005	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 103.459.637,40	R\$ 99.232.394,30	96%	CGDF
50	CGDF/2020006	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 90.858.400,56	R\$ 86.752.556,73	95%	CGDF
51	CGDF/2020007	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.786.889,22	R\$ 53.016.770,45	95%	CGDF
52	CGDF/2021001	2. Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os Resultados e impactos das políticas e programas públicos na região.	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CGDF



RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO V - Planos Operativos segundo Unidades Administrativas da Sudene

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
53	CGDF/2021002	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 88.049.841,59	48%	CGDF
54	CGDF/2021003	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 73.972.965,21	40%	CGDF
55	CGDF/2021004	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 60.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDF
56	CGDF/2021005	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Catanduba I	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 140.841.810,36	R\$ 0,00	0%	CGDF
57	CGDF/2021006	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Central Eólica Catanduba II	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 140.841.810,36	R\$ 0,00	0%	CGDF
58	CGDF/2021007	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Parnaíba II Geração de Energia S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 274.179.982,11	R\$ 0,00	0%	CGDF
59	CGDF/2021008	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
60	CGDF/2021009	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
61	CGDF/2021010	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
62	CGDF/2021011	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 111.715.126,17	R\$ 0,00	0%	CGDF
63	CGDF/2021012	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 77.808.580,65	R\$ 0,00	0%	CGDF
64	CGDF/2021013	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assuruá 5 I Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 136.700.004,97	R\$ 0,00	0%	CGDF
65	CGDF/2021014	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assuruá 5 II Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 127.304.765,68	R\$ 0,00	0%	CGDF
66	CGDF/2021015	1. Resultados para a sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Assuruá 5 III Energia S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 134.805.486,72	R\$ 0,00	0%	CGDF
<b>TOTAL CGDF/DFIN</b>								<b>7.102.749.443,37</b>	<b>4.419.370.340,47</b>	<b>62%</b>	
<b>TOTAL DFIN</b>								<b>7.102.749.443,37</b>	<b>4.419.370.340,47</b>	<b>62%</b>	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO V - Planos Operativos segundo Unidades Administrativas da Sudene

Nº de Ordem	Nº PO	Dimensão	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
67	CPTCE/2021001	3. Processos internos	7. Aprimorar a Gestão de Processos	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	CPTCE
TOTAL CPTCE/DAD								0,00	0,00	0%	
68	CGGP/2018001 (ex PO 54)	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
69	CGGP/2020001 (ex PO 55)	4. Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho.	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
70	CGGP/2021001	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	0%	CGGP
TOTAL CGGP/DAD								150.000,00	20.214,51	13%	
TOTAL DAD								150.000,00	20.214,51	13%	
TOTAL GERAL								7.119.927.429,63	4.429.083.413,00	62,2%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.  
Referência dos dados: 4º Ciclo 2021

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2021

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento



# **PROJETOS PRIORITÁRIOS 2018**

**Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada  
16 de maio de 2018**

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão estratégica:	Resultados para a sociedade.		Número do Projeto: PO	CGEP/2018001 (Ex PO 4)
Objetivo estratégico:	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.		Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas			
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.			
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.			
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80

Processo SEI 59335.000222/2018-21

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2022	<b>Proposta SICONV 052519/2018</b>	<b>Nível Siconv IV</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Pré Convênio nº 875549/2018</b>	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
ABR/2019	106.536,26	500,00	107.036,26	A realizar no exercício	R\$ 199.399,80
Diárias	1.062,00		1.062,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
FEV/2020	90.385,54		90.385,54	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Diárias	1.416,00		1.416,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>199.399,80</b>	<b>500,00</b>	<b>199.899,80</b>	Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Marcus Paz; Marcelo Saiki
	Conveniente	Elisa Teshima

**Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018**

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	<b>Seleção de proposta</b>	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Disponibilização do Programa no SICONV</b>	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV N° 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise de propostas</b>	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
1.2.1	<b>Aprovação dos Ajustes/Complementação</b>	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Seleção da proposta</b>	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Aprovação da Diretoria Colegiada</b>	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	
2	<b>Análise do Plano de trabalho</b>	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018		100,0%	<b>Concluído</b>	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	

2.1	Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018		100,0%	Concluído	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo estará em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.	
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018		100,0%	Concluído		
5	Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019		100,0%	Concluído	Publicação no DOU 11/01/2019	
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>2,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
8	Licitação		UEFS	01/01/2019	01/04/2019		19/09/2019			50,0%	Atrasado	A Universidade iniciou vários processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de <b>setembro de 2019 até o mês de abril de 2020</b> e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, conveniente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022,a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é 31/12/2022	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)
9	Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019					0,0%	Atrasado	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o caso.	
10	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R\$ 106.536,26				0,0%	Atrasado	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório. Foram realizadas consultas à PF/Sudene e à COCIC/CGEP a respeito da possibilidade de interrupção do Convênio pela não execução financeira. Em termos legais, não há razão para extinção do convênio. No entanto, a COCF alertou que os recursos, inscritos em Restos a Pagar não liquidados de 2018, serão cancelados caso não sejam liberados até dezembro de 2021.	
11	Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	01/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado		

13	Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
14	Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	26/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
15	Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado	
16	Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico-químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
17	1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020					0,0%	Atrasado	
18	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.062,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00
19	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020	R\$ 90.385,54				0,0%	Atrasado	
20	Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	15/03/2020	30/10/2020					0,0%	Atrasado	
21	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.416,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R\$ 177,00
22	2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020					0,0%	Atrasado	
	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
23	Prestação de Contas Final		UEFS	30/11/2020	29/01/2021					0,0%	Atrasado	
24	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022				-	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 199.399,80	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 0,00	<b>22%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

**Observações:**

Em 23/12/2020 foi assinado o primeiro Termo Aditivo prorrogando o prazo do convênio para 31/12/2022 (Doc SEI 0211007-pasta VII)

Em 31/12/2020 foi providenciado o desbloqueio de RAP conforme Nota de Lançamento 2020NL000089. (Doc SEI 0210816 - pasta VII)

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Nota: Este convênio vem apresentando problema há algum tempo. Com o aviso da CGAF (e-mail de jul/21) sobre a possibilidade de cancelamento dos recursos em RAP não liquidados até dez/21 realizamos reunião interna dia 10/08, envolvendo a COCF/CGAF, a COCIC/CGDS e a equipe da COTI para acharmos uma solução haja vista que o problema advinda da própria UEFS/BA em razão da dificuldade para cumprir o plano de trabalho que foi elaborado para a realização em lote, de uma série de licitações. Outra reunião com a COCIC/CGDS se mostrou necessáriaaté como preparatória para reunião que queríamos fazer com a UEFS/BA. Em 01/09/2021 foi realizada essa reunião com a presença de representantes da UEFS, da CGAF/DAD/Sdene e nossa equipe para se discutir o destino deste convênio tendo em vista que caso os recursos não fossem utilizados até dez/2021 eles seriam cancelados (Restos a Pagar a Liquidar, de 2018). Até o momento a UEFS/BA não realizou processo de licitação completo para cumprir o que está no Plano de Trabalho. De acordo com a CGAF/DAD "a liquidação se refere a aquisição de bem, execução da obra e/ou realização do serviço respectivo. Os valores não liquidados e/ou liberados serão cancelados ao final do exercício (parágrafo 7º do artigo 67, Decreto Nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986)). Na reunião de 01/09/21 a UEFS/BA reconheceu a dificuldade de cumprir a agenda de licitações em razão das muitas demandas, porém levou o assunto para estudar e definir uma forma de viabilização ou o seu cancelamento. Em 09/12/2021 a UEFS enviou à Sudene o ofício nº 756/2021 onde informou a impossibilidade de cumprir o plano de trabalho no prazo até 31/12/2021, prazo esse, estabelecido pelo Ministério da Economia para, em caso de não execução de RAPS não liquidados de 2018, até essa data, o cancelamento dos recursos do exercício de 2018. Está em curso na Procuradoria a análise da possível rescisão deste convênio.

Contatos: Pro<sup>fa</sup> Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)
		Ano:	2018
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.</b>	<b>Processo (s) SEI:</b>	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	Viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos serviços públicos.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--

Previsão de Conclusão:	30/03/2018
Data Atualização:	31/12/2021

Ata 304ª Diretoria  
Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Mauro Souto, Victor Uchôa Silva (CODEM/CGDS)
--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.	

2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/0/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação "Ecologia del cultivo, manejo y usos do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.		
2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos advindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.		
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.		
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. <b>No momento, é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação.</b> Aguardando definição da gestão quanto ao encaminhamento a ser dado a este projeto.	
3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.		
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Paralisado	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO.		
4	Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018		--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralisada.		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:				R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto

## Parceiros Institucionais:

Embrapa; FAO.

## Observações:

Tradução - Publicação FAO - Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal.

Informação adicionada dezembro/2021 - Ação a ser tomada: abertura de processo no SEI para apreciação do Diretor de Planejamento sobre possíveis encaminhamentos, a fim de retomar o projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Processo (s) SEI:	59335.000292/2018-89
Ação:	DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO (8340) - REDE PALMA		
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 255.000,00	R\$ 256.000,00

Previsão de Conclusão:	24/12/2021	CONVÊNIO Nº 878402/2018
Data Atualização:	31/12/2021	Vigência: 27/12/2018 a 25/12/2021

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 255.000,00
	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá
--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>										
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	Concluído	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	Concluído	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	Concluído	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	Concluído	
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>										
										0,3%	Atrasado	
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	17/12/2019	--	--	10%	Em Andamento	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento da reformulação do processo licitatório (processos em elaboração).



8	<b>Liberação 1ª parcela (única)</b>	Liberação de recursos	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	<b>R\$ 255.000,00</b>	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	<p>A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados. Esses, analisados demandaram medidas de ajuste da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução.</p> <p>Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações da quantidade.</p> <p><b>A Epamig não apresentou o novo TR e justificativa, nem avançou nos processos de execução (licitações). Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.</b></p>
9	<b>Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química</b>	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 49.510,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
9.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.250,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
9.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 31.260,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
10	<b>Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira</b>	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 48.890,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
10.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 24.890,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
10.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 24.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
11	<b>Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos</b>	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiárido mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 24.350,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
11.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.350,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
11.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 6.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
12	<b>Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.</b>	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
12.1	<b>Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
13	<b>Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico</b>	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 29.900,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
13.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 29.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
13.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 900,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
14	<b>Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)</b>	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 62.750,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
14.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 34.050,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	

14.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 28.700,00	--	--	--	0%	Paralisado		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	Paralisado		
16	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	Paralisado		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	Paralisado		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/24/2022	24/04/2022	-			-	0%	Paralisado		
Valor Previsto:						R\$ 255.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Paralisado	Status do Projeto	A Epamig não apresentou o novo TR e justificativa, nem avançou nos processos de execução (licitações). Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.

**Parceiros Institucionais:**

EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

**Observações:**

Considerando a não conclusão/avanço dos processos de licitação, condição para aceite e liberação dos recursos da 1ª parcela ou parcela única, e tendo em vista o disposto no Decreto .... que regulamenta os RAP, entende-se que a tendência é de cancelamento do empenho inscrito em RAP 2018 e a extinção do Convênio.

**Informação adicionada em dezembro/2021: esse projeto será cancelado no 1º ciclo/2022.**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)
		Ano:	2018
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Processo (s) SEI:	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental		
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018		
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reúso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caraúbas/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1.00)
	-	-	-	R\$ 547.369,48	567.369,48

Previsão de Conclusão:	31/12/2023
Data Atualização:	31/12/2021

Ata 304, da  
Diretoria Colegiada  
2018

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 547.369,48
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 547.369,48
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS, Coordenação: Victor Uchôa
	Conveniente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Caraúbas/RN

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		CONTRATAÇÃO (Peso 20%)								15%	Em Andamento		
1.1	Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	Não informado		100,0%	Concluído		
1.3	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019	21/08/2020		100,0%	Concluído	O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019.	
1.4	Análise e aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019		31/08/2020	19/10/2020		100,0%	Concluído	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.	

1.5	Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	01/10/2020	30/11/2020		29/10/2020	03/02/2021		100,0%	Concluído	Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Conveniente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 2 parcelas, sendo a primeira alterada de R\$ 99.673,80 para R\$ 102.896,80.	
1.6	Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do conveniente	Caraúbas	01/01/2021	30/09/2021	R\$ 20.000,00	27/01/2021			33,0%	Em Andamento	1ª parcela no valor de R\$ 1.387,00 paga pelo conveniente em 27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro de 2021.	
1.8	Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 102.896,80	01/02/2021			0,0%	Paralisado	Em 3/2/2021, a CODEM solicita liberação da primeira parcela tendo como base o Parecer nº 6/2021 - SEI/SUDENE que aprova os ajustes do plano de trabalho e afirma não haver impedimento técnico para o repasse.	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016). Em 19/10/21, o conveniente continua impedido de receber recursos por registro no CAUC. Em 27/12/2021, a Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão para recebimento de recursos da Sudene por persistir pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.
2	Execução (Peso 60%)									0%	Paralisado		
2.1	Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	01/02/2021	28/02/2021					0,0%	Paralisado	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.2	Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2021	31/03/2021					0,0%	Paralisado	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.3	Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar	O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da instalação dos sistemas de reúso.	
2.5	1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	A Iniciar		
2.6	Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/09/2021	30/09/2021	444.472,52				0,0%	A Iniciar		

2.7	Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/09/2021	31/07/2022					0,0%	A Iniciar		
2.8	Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/08/2022	31/08/2022					0,0%	A Iniciar		
2.9	2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar		
2.10	2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/CGDS	01/09/2022	31/12/2022					0,0%	A Iniciar		
3	Encerramento (peso 20%)									0%	A Iniciar		
3.2	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	01/01/2023	28/02/2023					0,0%	A Iniciar		
3.3	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/01/2023	30/06/2023					0,0%	A Iniciar		
3.4	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	01/07/2023	31/12/2023					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 567.369,32	Valor realizado:		R\$ 0,00	15%	Paralisado	Status do Projeto	Em 27/12/2021, a Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão para recebimento de recursos da Sudene por persistir pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.

**Parceiros institucionais:**

Prefeituras de Caraúbas

**Observações:**

Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio n.º 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 19/09/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020. 2º Termo de convênio prorroga para 31/12/2022.

Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.

**Informação adicionada em dezembro/2021 - Projeto deverá apresentar status "cancelado" no 1º ciclo/2022.**

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente - CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.							Número do Projeto:		CGDS/2018005 (ex PO 9.2)	
								Ano:		2018	
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.							Processo (s) SEI:		59335.000278/2018-85	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano										
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica					Objetivo estratégico (MDR):		L.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.										
Diretoria responsável:	DPLAN					Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)			
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos					Gestor da subunidade:		Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra			
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental										
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO										
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Biágua, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.										

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		-	-	-	R\$ 339.517,00	R\$ 339.517,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		CGDS/SUDENE: Mauro Póvoas e Juliana Borges (CODEM/CGDS); Coordenação CODEM: Victor Uchôa
		EMBRAPA SEMIÁRIDO: Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

		Valores Orçamentários/ Financeiros			
Pago até o ano anterior	R\$	302.767,00			
A realizar no exercício	R\$	23.700,00			
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	36.750,00			
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$	36.750,00			
Valor liberado no Exercício	R\$	36.750,00			
Saldo a liberar	R\$	-			
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
Total Liberado até o exercício	R\$	339.517,00			

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado		Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
				Início	Fim	Início	Fim					
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)						20%	Concluído			
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018	100,0%	Concluído	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7- CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
1.2	Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018	100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018	100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / EMBRAPA	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018	100,0%	Concluído	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho	
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019	100,0%	Concluído	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)						45%	Em Andamento			
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018		07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100,0%	Concluído	
2.2	Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	01/11/2018	31/12/2018		19/02/2019	18/04/2019	R\$ 8.800,00	100,0%	Concluído	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida
2.3	Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Preparar material para publicação.	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021		13/02/2019		R\$ 1.200,00	70,0%	Em Andamento	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a caracterização ambiental nas comunidades rurais está sendo realizada com a confecção de mapas e imagens de drones.
2.4	Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de biágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema biágua familiar.	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021		13/02/2019		R\$ 19.410,00	20,0%	Em Andamento	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a viabilidade econômica do sistema quanto ao uso de energia solar e elétrica será realizada, os dados estão sendo coletados para essa avaliação e será apresentado no próximo relatório.

As metas que estão com o status de "em andamento" referem-se às informações prestadas no último relatório parcial, enviado em 10/6/21 para a Sudene. A finalização das metas estão previstas para término em 31/12/21 e as informações constarão do relatório final do projeto.	
A coordenadora do projeto, Dr.ª Roseli Freire, pesquisadora da Embrapa Semiárido, apresentou o projeto detalhando o sistema biágua familiar no Semiárido Show realizado na modalidade on line no período de 23 a 25/11/21.	

2.5	<b>Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade</b>	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 4.973,00	01/09/2020			50,0%	Em Andamento	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, a definição dos modelos a partir da instalação dos 12 sistemas bioágua e será feito também na Comunidade Sítio Coelho, de acordo o último relatório parcial datado de 10/6/21.	Fotos e mensagens compartilhadas com a coordenadora do projeto informaram o avanço da instalação dos sistemas na comunidade Sítio Coelho, que constarão do relatório final do projeto.
2.6	<b>Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação</b>	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/06/2021	R\$ 188.081,86	13/02/2019		R\$ 62.190,00	75,0%	Em Andamento	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O primeiro sistema de reúso foi instalado em fevereiro/2021, contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da pandemia, as atividades de campo foram suspensas e retomadas no segundo semestre de 2021. O relatório final do projeto trará informações sobre a finalização dos sistemas na Comunidade Sítio Coelho.	
2.7	<b>Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido</b>	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R\$ 19.000,00	01/10/2019	31/05/2021	R\$ 7.200,00	100,0%	Concluído	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. Foi também instalado um minhocário, no relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021, há informações sobre os outros cursos realizados.	
2.8	<b>Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar</b>	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	30/06/2021	R\$ 33.139,14	01/10/2019	31/05/2021		100,0%	Concluído	O relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021 traz informações de avaliação da qualidade da água e do solo.	
2.9	<b>Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente</b>	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 1.196,00	04/01/2021			50,0%	Em Andamento	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a integração com a galinha caipira está sendo realizada, incluindo as criações dos agricultores. Informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.	
2.10	<b>Meta 9: Avaliação do Projeto</b>	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reúso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	30/06/2021	R\$ 31.592,00	04/01/2021			50,0%	Em Andamento	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a meta está em andamento e mais informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.	
2.11	<b>1ª Prestação de contas parcial</b>	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019		100,0%	Concluído		
2.12	<b>Liberação da segunda parcela de recursos</b>	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	<b>R\$ 212.767,00</b>	05/06/2019	21/06/2019	<b>R\$ 212.767,00</b>	100,0%	Concluído	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.	Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R\$ 47.674,65 que não foi possível executar em 2019 referente ao 2º repasse do TED.
2.13	<b>2ª Prestação de contas parcial</b>	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019	19/05/2020		100,0%	Concluído	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou relatório de atividades do projeto referente ao período de dezembro de 2020 a maio de 2021.	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.
2.14	<b>Liberação da terceira parcela de recursos</b>	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	<b>R\$ 23.700,00</b>	14/03/2020	09/09/2020	<b>R\$ 36.750,00</b>	100,0%	Concluído	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R\$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.
2.15	<b>3ª Prestação de contas parcial</b>	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	30/06/2021	30/06/2022		01/05/2021			0,0%	A Iniciar	Esta linha deve ser retirada, pois não há necessidade da análise da prestação de contas parcial dessa parcela porque é a última. Então, deve-se apresentar a Prestação de Contas Final	

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar	
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	01/01/2022	31/12/2022		03/01/2022			0,0%	A Iniciar	
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/01/2022	31/12/2022					0,0%	A Iniciar	Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Embrapa Semiárido, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/01/2022	31/12/2022					0,0%	A Iniciar	
Valor Previsto:				R\$ 326.467,00		Valor realizado:		R\$ 339.517,00		65%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Embrapa Semiárido												
Observações:												
Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido												
O projeto foi apresentado no 1º Webinar de Reuso de Água da Sudene promovido pela Codem/CGDS em 9/6/2020. O projeto foi prorrogado para 30/06/2021, conforme 2º Termo Aditivo assinado em 21/08/2020. O 3º Termo Aditivo ao TED Nº 006 /2018 – SUDENE/Embrapa Semiárido, foi firmado em 30/06/2021, prorrogando a sua vigência até 31/12/2021. Há necessidade de ajustar o seu Plano de Trabalho a nova data de vigência.												
Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)												

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Ano:	2019
		Processo (s) SEI:	59336.003213/2019-62
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340)	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretor responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Implantação de dois campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Ampliar a oferta de mudas de palma resistentes à cochonilha do carmim, contribuindo sobremaneira para a sustentabilidade da atividade pecuária, sobretudo na agricultura familiar no semiárido.distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 206.730,00	R\$ 207.730,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	CONVÊNIO N° 892981/2019
Data Atualização:	31/12/2021	Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2022

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 206.730,00
	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá
--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	30/12/2019	30/12/2019	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>0,8%</b>	<b>Atrasado</b>		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	04/04/2021	--	--	10%	Atrasado	A Conveniente atendeu a todas as condições da Cláusula Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma pequena parte do todo.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 163.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação dos recursos da 1ª parcela está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e o aceite pela concedente. Até 30/06/2021,só uma parte dos processos de execução foram registrados (aquisição de: EPI's, Ferramentas,Fertilizantes) . Esses, analisados demandaram medidas da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações propostas. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização, não foram identificados avanços nos processos de licitação.

9	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 43.730,00	--	--	--	0%	Atrasado		
10	Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 102.180,63	--	--	--	0%	Atrasado		
11	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 56.453,84	--	--	--	0%	Atrasado		
12	Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 33.160,29	--	--	--	0%	Atrasado		
13	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 15.940,51	--	--	--	0%	Atrasado		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/03/2023	01/05/2023	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 206.730,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	21%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												
Informação adicionada em dezembro/2021 - O motivo do atraso não depende da Sudene, Processos licitatórios apresentados à Sudene com valores muito abaixo do valor total do projeto.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão		Resultados para a sociedade.				Número do Projeto:				CGDS/2020002 (ex PO 6.7)			
						Ano:				2020			
Objetivo estratégico:		Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.				Processo (s) SEI:				59336.001426/2020-93			
Programa:		2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano				Eixo temático (MDR):							
Ação:		8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação				Objetivo estratégico (MDR):							
Finalidade da ação:		Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.											
Diretoria responsável:		DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas				Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS					
Diretor:		Raimundo Gomes de Matos				Gestor da subunidade:		Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra					
Problema (causa):		Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.											
Projeto:		Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.											
Objetivo do projeto:		Implantação de produção de mudas no Campo Experimental de Jalba, EPAMIG NORTE, para distribuição a 160 agricultores do Território da Cidadania da Serra Geral.											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		144000000 / 0250532030	4	30	R\$ 200.000,00	R\$ 201.000,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -	
							mar/21	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 201.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 200.000,00	
											Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	
											Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
											Valor liberado no Exercício	R\$ -	
											Saldo a liberar	R\$ 200.000,00	
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
											Total Liberado até o exercício	R\$ -	
Previsão de Conclusão:		31/12/2024	CONVÊNIO Nº 903996/2020										
Data Atualização:		31/12/2021	Vigência até: 31/12/2023										
Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto			CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; Coordenação: Victor Uchôa; EPAMIG/MG										
N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE				10/09/2020	11/12/2020		100%	Concluído	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE			-	11/12/0200	05/01/2021	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 5/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,75%	Em Andamento		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	04/04/2021	--	--	10%	Em Andamento	Processo licitatório em elaboração.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	Contrapartida	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 1.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		

9	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados (aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram orientações e medidas de ajuste da EPAMIG.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização não foram identificados avanços nestes processos.
10	Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaiba - CEJA; 1.2) aquisição de mudas; 1.3)	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 102.957,48	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Meta 2 -Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 39.119,12	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 30.918,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 28.004,90	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 201.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	21%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.													
Observações:													

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente )

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade	Número do Projeto:	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Processo (s) SEI:</b>	
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	<b>Eixo temático (MDR):</b>	
<b>Finalidade da ação:</b>	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
<b>Problema (causa):</b>	Dois problemas principais dificultam a execução de políticas de convivência com o Semiárido para a pecuária no RN, a pequena área existente com cultivos de palma forrageira e a expansão da praga da coconilha-do-carmim.		
<b>Projeto:</b>	<b>Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a coconilha-do-carmim no RN.</b>		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da coconilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250532030	3, 4	30	R\$ 199.412,43	R\$ 199.612,04

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2024	<b>CONVÊNIO Nº 903995/2020</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Vigência até: 31/12/2023</b>

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas, Mauro Bezerra e Amauri Nascimento; Coordenação: Victor Uchôa; SAPE/RN
---	--

Cronograma de Desembolso (R\$1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
fev/21	100.000,00	199,61	100.199,61	A realizar no exercício RAP	R\$ 199.412,43
set/21	99.412,43	0,00	99.412,43	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
total	199.412,43	199,61	199.612,04	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 199.412,43
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUD ENE	6/4/2020	25/5/2020	-	06/04/2020	25/05/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	05/06/2020	05/07/2020	-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	06/07/2020	30/11/2020	-	06/07/2020	03/11/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
4	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	06/07/2020	31/12/2020		10/09/2020	23/12/2020		100%	<b>Concluído</b>	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
5	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDE NE	06/07/2020	31/12/2020	-	6/7/2020	31/12/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>0,90%</b>	<b>A Iniciar</b>		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	01/01/2021	31/01/2021		--	--	--	15%	<b>Em Andamento</b>	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
7	Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 199,61	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos.	
9	Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 9.441,80	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
		1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 8.202,00	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		

10	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Liberação 2ª parcela	E condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43	--	--	--		Atrasado		
13	mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 150.827,07	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	tolerantes à cochonilha do carmim por ano, com atendimento de 555	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmim - ampliação	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 31.141,17					A Iniciar		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	01/01/2024	31/12/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 199.612,04	Valor realizado:		R\$ 0,00	21%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

SAPE/RN; EMPARN, EMATER-RN, SENAR-RN, SEBRAE-RN e SEAPAC

Observações:

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente )

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

# **PROJETOS PRIORITÁRIOS 2017**

**Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada**

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>CGCP/2017001 (ex PO 2)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>	<b>Ano:</b>	<b>2017</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	<b>Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.</b>		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
<b>Projeto:</b>	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
							SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
		280	Custeio	20WQ	R\$ 709.382,21	R\$ 709.382,21					R\$	354.691,11
											R\$	354.691,11
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-
											R\$	-



4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação, em Parceria com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contração de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao <b>Produto 1: Plano de Trabalho</b>	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	R\$ 70.938,22	100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Produto aprovado, em vias de pagamento.	Solicitou-se ajuste no produto 1 havendo demora na resposta da contratada. Realizou-se aditamento de contrato.
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	<b>Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas</b> e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R\$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Diagnóstico com várias inconsistências contou com 2 pareceres técnicos solicitando ajustes antes da sua aprovação. Aditamento do contrato realizado.	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	<b>Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais.</b> Em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R\$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Oficinas realizadas e aprovadas após segundo parecer técnico	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.

13	Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas. Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	02/03/2019	28/06/2019	R\$ 212.814,66	01/05/2019			0%	Cancelado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Segundo aditamento do contrato realizado para a data de 31 de agosto de 2019. Baixa participação da prefeitura de Feira de Santana na avaliação do produto entregue e dos trabalhos realizados pela contratada em oficinas realizadas no município. A Sudene solicitou ajustes no produto IV, apresentado pela consultoria Ernst Young, no entanto, a consultoria não os atendeu. Isto posto, a equipe técnica da Sudene não aprovou o produto IV. Devido ao não atendimento do plano de trabalho pela contratada, a Sudene não aprovou o produto IV e não autorizou a prorrogação do contrato, cuja vigência se encerrou em 30 de outubro de 2019. Rescisão ainda não foi realizada. Em paralelo, será dado continuidade ao projeto através de uma nova contratação no PNUD (PO Construindo Feira de Santana 2030 - Processo 59336.000817/2021-71).	Conforme decisão da 360ª Diretoria Colegiada (SEI 178827), após solicitação da JOF/PNUD, não foi aprovado o pagamento parcial do produto, o que foi reiterado em 06/07/2021 pelo Parecer da Procuradoria e Despacho CGCP (SEI 256184). Em paralelo, a equipe técnica desta Coordenação Geral, em conjunto com a Prefeitura e o PNUD elaboraram um Termo de Referência para continuidade ao projeto (PO Construindo Feira de Santana 2030 - Processo 59336.000817/2021-71).
14	Realização da quarta etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira versão	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 70.938,22	25/06/2019			0%	Cancelado	Como o produto IV não foi aprovado, este produto foi automaticamente cancelado.	Conforme decisão da 360ª Diretoria Colegiada (SEI 178827), após solicitação da JOF/PNUD, não foi aprovado o pagamento parcial do produto, o que foi reiterado em 06/07/2021 pelo Parecer da Procuradoria e Despacho CGCP (SEI 256184). Em paralelo, a equipe técnica desta Coordenação Geral, em conjunto com a Prefeitura e o PNUD elaboraram um Termo de Referência para continuidade ao projeto (PO Construindo Feira de Santana 2030 - Processo 59336.000817/2021-71).
15	Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	06/07/2019	02/08/2019	R\$ 70.938,22				0%	Cancelado		
16	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	03/08/2019	15/08/2019					0%	Cancelado	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
17	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	20/08/2019	31/08/2019					0%	Cancelado	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	Embora na 360ª Diretoria Colegiada (SEI 178827) a Diretoria Colegiada tenha se manifestado contra o pagamento parcial do produto 4, posteriormente, houve manifestação do PNUD quanto ao reconhecimento de alguns itens contratados (SEI 0234755). O PNUD ainda encaminhou, como exemplo, uma Nota Técnica emitida por instituição do governo federal (Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário) que aprova pagamento parcial em um dos projetos desenvolvidos com o PNUD. Após esta manifestação do PNUD e consultada a Procuradoria Federal, a equipe técnica da Sudene recomendou o pagamento parcial do produto (SEI 0240460 e 0272795).  Foi realizado pagamento parcial do Produto 4 em 11/11/2021 (SEI 292140).  Uma nova contratação está em fase de licitação no PNUD/JOF para dar andamento ao projeto (Processo: 59336.000817/2021-71)
Valor Previsto:						R\$ 709.382,21	Valor realizado:	R\$ 354.691,11	71%	Concluído	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:**

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afetos ao tema.

**Observações:** Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 81; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado

	Paralisado
--	------------

Emendas 4º ciclo 2021																							
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários			% Orc./ Fin.	Inicição	Liberação				Status		Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado			1º	2º	3º	4º						
2016	COCIC/2016001	1	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.321,90	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	22/03/19	Atrasado		
2016	COCIC/2016002	2	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 262.868,86	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento		
2016	COCIC/2016003	3	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 514.509,40	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento		
2016	COCIC/2016004	4	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 813.633,43	81%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento		
2016	COCIC/2016005	5	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.957,85	R\$ 926.955,29	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	18/08/23	Em Andamento		
2016	COCIC/2016006	6	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 611.924,74	R\$ 559.952,79	93%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento		
2016	COCIC/2016008	7	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 503.901,97	R\$ 250.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento		
2016	COCIC/2016009	8	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 526.970,57	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	06/09/19	Concluído		
2017	COCIC/2017001	9	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/04/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017002	10	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017003	11	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	Atrasado	28/02/21	Atrasado		
2017	COCIC/2017004	12	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 385.000,00	R\$ 436.300,00	R\$ 384.999,99	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/02/24	Em Andamento		
2017	COCIC/2017005	13	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Atrasado	Atrasado	23/12/20	Atrasado		
2017	COCIC/2017008	14	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.274.003,42	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	21/01/22	Em Andamento		
2017	COCIC/2017009	15	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.991.738,23	R\$ 1.989.238,23	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	30/08/22	Em Andamento		
2017	COCIC/2017010	16	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.118,86	R\$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	01/03/22	Em Andamento		
2017	COCIC/2017011	17	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	09/11/21	Concluído		
2017	COCIC/2017012	18	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017013	19	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	R\$ 490.598,50	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017014	20	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.500,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento		
2017	COCIC/2017018	21	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,45	R\$ 44.381,79	18%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017019	22	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.341,55	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/08/23	Em Andamento		

Emendas 4º ciclo 2021																							
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orc./ Fin.	Iniciação	Liberação				Status		Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª			2ª	3ª	4ª	Visita					
2017	COCIC/2017020	23	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 264.608,17	R\$ 266.608,17	R\$ 52.921,63	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/04/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017021	24	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 390.020,00	R\$ 433.930,65	R\$ 390.020,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento		
2017	COCIC/2017022	25	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 350.000,00	R\$ 357.000,00	R\$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	17/08/21	Atrasado		
2017	COCIC/2017024	26	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.493,20	R\$ 260.930,41	R\$ 210.000,00	84%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/09/22	Em Andamento		
2017	COCIC/2017025	27	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.963,58	R\$ 700.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018001	28	Pavimentação - Município de Urucuça	BA	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento		
2018	COCIC/2018002	29	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/07/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018003	30	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 586.135,00	R\$ 633.025,80	R\$ 586.135,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018004	31	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/05/22	Em Andamento		
2018	COCIC/2018005	32	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,29	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018006	33	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018007	34	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,27	R\$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/01/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018008	35	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ -	0%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/24	Em Andamento		
2018	COCIC/2018009	36	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.755.787,09	R\$ 1.773.344,96	R\$ 841.262,37	48%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	27/09/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018010	37	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento		
2018	COCIC/2018011	38	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento		
2018	COCIC/2018012	39	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 451.239,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018013	40	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018014	41	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	R\$ 490.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento		
2018	COCIC/2018015	42	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.100,00	R\$ 995.818,64	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018016	43	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.607,22	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento		
2018	COCIC/2018017	44	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/22	Em Andamento		

Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./ Fin.	Inicição	Status				Previsão de Conclusão	Status	
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1º			2º	3º	4º	Visita			Emissão do Laudo
2018	COCIC/2018018	45	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.743,89	R\$ 46.629,00	19%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018019	46	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018020	47	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018021	48	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,48	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018022	49	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 258.523,52	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/05/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018023	50	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 802.936,73	R\$ 811.047,20	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018024	51	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 210.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018025	52	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018026	53	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018027	54	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018028	55	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,31	R\$ 115.000,00	46%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018029	56	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018030	57	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Paralisado
2018	COCIC/2018031	58	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.240,98	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018032	59	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.196,50	R\$ 3.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018033	60	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 380.000,00	R\$ 381.000,00	R\$ 380.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/06/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018034	61	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	R\$ 420.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018035	62	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 267.527,38	R\$ 159.708,52	61%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	17/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018036	63	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018037	64	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	R\$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018038	65	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018039	66	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 256.187,08	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Em Andamento

Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./ Fin.	Inicição	Status				Previsão de Conclusão	Status	
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª			2ª	3ª	4ª	Visita			Emissão do Laudo
2018	COCIC/2018040	67	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018041	68	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018042	69	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.440.476,88	R\$ 1.187.711,25	83%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018043	70	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/03/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018044	71	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.060.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/10/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018045	72	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.980,22	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/09/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018046	73	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.636,67	R\$ -	0%	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/10/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018047	74	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 300.400,00	R\$ 180.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018048	75	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/06/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018049	76	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 150.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018050	77	Aquisição de caminhão trucoado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraubas/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 332.853,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/06/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018051	78	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	17/08/21	Atrasado
2018	COCIC/2018052	79	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	1	1.1	2029	8902	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018053	80	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018054	81	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.065.661,71	R\$ 2.810.590,05	94%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018055	82	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018056	83	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 350.500,00	R\$ -	0%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/11/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018057	84	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018058	85	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ -	0%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019001	86	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.996,10	R\$ 162.500,00	65%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento

Emendas 4º ciclo 2021																						
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./ Fin.	Inicição	Status				Previsão de Conclusão	Status		
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	Liberação										
												1ª			2ª	3ª	4ª	Visita			Emissão do Laudo	
2019	COCIC/2019002	87	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 312.836,25	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/01/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019003	88	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.836,76	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/06/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019004	89	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 257.704,50	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/12/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019005	90	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019006	91	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019007	92	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 393.325,11	R\$ 320.000,00	100%		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019008	93	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 291.831,01	R\$ 292.431,01	R\$ 180.000,00	62%		Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/04/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019009	94	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,40	R\$ 900.000,00	100%		Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	08/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019010	95	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	07/09/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019011	96	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,09	R\$ 340.000,00	20%		Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019012	97	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 607.328,74	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019013	98	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019014	99	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.863,57	R\$ 50.000,00	20%		Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/06/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019015	100	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 220.086,98	85%		Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/07/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019016	101	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ 100.000,00	100%		Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019017	102	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,45	R\$ 280.000,00	40%		Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019018	103	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 305.115,05	R\$ 60.000,00	20%		Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019019	104	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 300.000,00	100%		Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/06/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019020	105	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.410.387,00	R\$ 3.237.722,30	R\$ 2.086.232,20	87%		Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019021	106	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.237.065,05	R\$ 1.447.000,00	72%		Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019022	107	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.999,99	R\$ 50.000,00	20%		Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/08/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019023	108	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,36	R\$ 340.000,00	20%		Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019024	109	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.756,73	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento



Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orc./ Fin.	Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	Inicição		Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
													1ª	2ª	3ª	4ª					
2019	COCIC/2019025	110	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 779.525,47	R\$ 810.705,19	R\$ 681.404,45	87%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019026	111	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.646,71	R\$ 736.111,49	74%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019027	112	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,21	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/12/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019028	113	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.027.825,85	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019029	114	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.519,98	R\$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019030	115	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 700.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019031	116	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019032	117	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.867,51	R\$ 240.000,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019033	118	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 770.735,13	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019034	119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019035	120	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019036	121	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ 70.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019037	122	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 800.000,00	R\$ 801.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020001	123	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuça/Ba	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/09/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020002	124	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE- RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.039,60	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/09/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020003	125	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020004	126	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/10/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020005	127	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020006	128	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualim no Município de Valença - BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020007	129	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,05	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020008	130	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 266.402,82	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/06/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020009	131	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 203.666,66	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020010	132	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/04/23	Em Andamento

Emendas 4º ciclo 2021																		
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status					
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./Fin.	Inicição	Liberação				Visita
														1º	2º	3º	4º	Emissão do Laudo
																		Previsão de Conclusão
2020	COCIC/2020011	133	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 350.167,88	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar
2020	COCIC/2020012	134	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		135	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.040,45	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		136	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 502.941,95	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 557.053,54	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		138	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 545.825,61	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		139	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROÁ/RAS - CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 534.343,80	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		140	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 307.230,00	R\$ 371.976,26	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		141	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		142	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 502.464,97	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		143	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		144	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 2.984.100,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		145	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 398.158,00	R\$ 398.158,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		146	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.021.207,87	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		147	O Objeto desse termo de parceria e aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		148	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 398.158,00	R\$ 398.158,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		149	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.808,01	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
TOTAL									R\$ 92.551.248,47	R\$ 97.109.861,72	R\$ 51.168.891,60							

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
	Não se Aplica

# **PROJETOS PRIORITÁRIOS 2018**

**Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada  
16 de maio de 2018**

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão estratégica:	Resultados para a sociedade.		Número do Projeto: PO	CGEP/2018001 (Ex PO 4)
Objetivo estratégico:	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.		Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas			
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.			
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.			
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80

Processo SEI 59335.000222/2018-21

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2022	<b>Proposta SICONV 052519/2018</b>	<b>Nível Siconv IV</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Pré Convênio nº 875549/2018</b>	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
ABR/2019	106.536,26	500,00	107.036,26	A realizar no exercício	R\$ 199.399,80
Diárias	1.062,00		1.062,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
FEV/2020	90.385,54		90.385,54	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Diárias	1.416,00		1.416,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>199.399,80</b>	<b>500,00</b>	<b>199.899,80</b>	Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Marcus Paz; Marcelo Saiki
	Conveniente	Elisa Teshima

**Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018**

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	<b>Seleção de proposta</b>	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.1	<b>Disponibilização do Programa no SICONV</b>	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV N° 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.2	<b>Análise de propostas</b>	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
1.2.1	<b>Aprovação dos Ajustes/Complementação</b>	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.3	<b>Seleção da proposta</b>	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.4	<b>Aprovação da Diretoria Colegiada</b>	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	<b>Concluído</b>	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	
2	<b>Análise do Plano de trabalho</b>	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018		100,0%	<b>Concluído</b>	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	

2.1	Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018		100,0%	Concluído	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo estará em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.	
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018		100,0%	Concluído		
5	Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019		100,0%	Concluído	Publicação no DOU 11/01/2019	
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>2,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
8	Licitação		UEFS	01/01/2019	01/04/2019		19/09/2019			50,0%	Atrasado	A Universidade iniciou vários processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de <b>setembro de 2019 até o mês de abril de 2020</b> e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, conveniente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022,a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é 31/12/2022	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)
9	Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019					0,0%	Atrasado	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o caso.	
10	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R\$ 106.536,26				0,0%	Atrasado	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório. Foram realizadas consultas à PF/Sudene e à COCIC/CGEP a respeito da possibilidade de interrupção do Convênio pela não execução financeira. Em termos legais, não há razão para extinção do convênio. No entanto, a COCF alertou que os recursos, inscritos em Restos a Pagar não liquidados de 2018, serão cancelados caso não sejam liberados até dezembro de 2021.	
11	Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	01/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado		

13	Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
14	Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	26/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
15	Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado	
16	Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico-químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
17	1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020					0,0%	Atrasado	
18	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.062,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00
19	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020	R\$ 90.385,54				0,0%	Atrasado	
20	Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	15/03/2020	30/10/2020					0,0%	Atrasado	
21	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.416,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R\$ 177,00
22	2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020					0,0%	Atrasado	
	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
23	Prestação de Contas Final		UEFS	30/11/2020	29/01/2021					0,0%	Atrasado	
24	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022				-	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 199.399,80	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 0,00	<b>22%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

**Observações:**

Em 23/12/2020 foi assinado o primeiro Termo Aditivo prorrogando o prazo do convênio para 31/12/2022 (Doc SEI 0211007-pasta VII)

Em 31/12/2020 foi providenciado o desbloqueio de RAP conforme Nota de Lançamento 2020NL000089. (Doc SEI 0210816 - pasta VII)

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Nota: Este convênio vem apresentando problema há algum tempo. Com o aviso da CGAF (e-mail de jul/21) sobre a possibilidade de cancelamento dos recursos em RAP não liquidados até dez/21 realizamos reunião interna dia 10/08, envolvendo a COCF/CGAF, a COCIC/CGDS e a equipe da COTI para acharmos uma solução haja vista que o problema advinda da própria UEFS/BA em razão da dificuldade para cumprir o plano de trabalho que foi elaborado para a realização em lote, de uma série de licitações. Outra reunião com a COCIC/CGDS se mostrou necessáriaaté como preparatória para reunião que queríamos fazer com a UEFS/BA. Em 01/09/2021 foi realizada essa reunião com a presença de representantes da UEFS, da CGAF/DAD/Sdene e nossa equipe para se discutir o destino deste convênio tendo em vista que caso os recursos não fossem utilizados até dez/2021 eles seriam cancelados (Restos a Pagar a Liquidar, de 2018). Até o momento a UEFS/BA não realizou processo de licitação completo para cumprir o que está no Plano de Trabalho. De acordo com a CGAF/DAD "a liquidação se refere a aquisição de bem, execução da obra e/ou realização do serviço respectivo. Os valores não liquidados e/ou liberados serão cancelados ao final do exercício (parágrafo 7º do artigo 67, Decreto Nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986)). Na reunião de 01/09/21 a UEFS/BA reconheceu a dificuldade de cumprir a agenda de licitações em razão das muitas demandas, porém levou o assunto para estudar e definir uma forma de viabilização ou o seu cancelamento. Em 09/12/2021 a UEFS enviou à Sudene o ofício nº 756/2021 onde informou a impossibilidade de cumprir o plano de trabalho no prazo até 31/12/2021, prazo esse, estabelecido pelo Ministério da Economia para, em caso de não execução de RAPS não liquidados de 2018, até essa data, o cancelamento dos recursos do exercício de 2018. Está em curso na Procuradoria a análise da possível rescisão deste convênio.

Contatos: Pro<sup>fa</sup> Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)
		Ano:	2018
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.</b>	<b>Processo (s) SEI:</b>	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	Viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos serviços públicos.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--

Previsão de Conclusão:	30/03/2018
Data Atualização:	31/12/2021

Ata 304ª Diretoria  
Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Mauro Souto, Victor Uchôa Silva (CODEM/CGDS)
--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.	



2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/0/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação "Ecologia del cultivo, manejo y usos do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.		
2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos advindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.		
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.		
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. <b>No momento, é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação.</b> Aguardando definição da gestão quanto ao encaminhamento a ser dado a este projeto.	
3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.		
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Paralisado	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO.		
4	Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018		--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralisada.		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:				R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto

**Parceiros Institucionais:**

Embrapa; FAO.

**Parceiros Institucionais:**

Embrapa; FAO.

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão		Resultados para a sociedade.						Número do Projeto:			CGDS/2018003 (ex PO 6.4)	
								Ano:			2018	
Objetivo estratégico:		Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.						Processo (s) SEI:			59335.000292/2018-89	
Programa:		2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano					Eixo temático (MDR):					
Ação:		DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO (8340) - REDE PALMA					Objetivo estratégico (MDR):					
Finalidade da ação:		Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.										
Diretoria responsável:		DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas					Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS			
Diretor:		Raimundo Gomes de Matos					Gestor da subunidade:		Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra			
Problema (causa):		Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.										
Projeto:		Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.										
Objetivo do projeto:		Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.										

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
							MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
		280	GND 3	30	R\$ 255.000,00	R\$ 256.000,00	mar/19	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
								R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 255.000,00
											Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
											Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	R\$ -
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:		24/12/2021	CONVÊNIO Nº 878402/2018	
Data Atualização:		31/12/2021	Vigência: 27/12/2018 a 25/12/2021	

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,3%	Atrasado		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	17/12/2019	--	--	10%	Em Andamento	A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender a legislação.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento da reformulação do processo licitatório (processos em elaboração).

8	<b>Liberação 1ª parcela (única)</b>	Liberação de recursos	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	<b>R\$ 255.000,00</b>	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	<p>A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados. Esses, analisados demandaram medidas de ajuste da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução.</p> <p>Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações da quantidade.</p> <p><b>A Epamig não apresentou o novo TR e justificativa, nem avançou nos processos de execução (licitações). Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.</b></p>
9	<b>Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química</b>	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 49.510,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
9.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.250,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
9.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 31.260,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
10	<b>Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira</b>	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 48.890,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
10.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 24.890,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
10.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 24.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
11	<b>Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos</b>	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiárido mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 24.350,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
11.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.350,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
11.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 6.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
12	<b>Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.</b>	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
12.1	<b>Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
13	<b>Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico</b>	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 29.900,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
13.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 29.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
13.2	<b>Condução dos Experimentos e Coleta de Dados</b>	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 900,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
14	<b>Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)</b>	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 62.750,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	
14.1	<b>Instalação dos experimentos</b>	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 34.050,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	

14.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 28.700,00	--	--	--	0%	Paralisado		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	Paralisado		
16	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	Paralisado		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	Paralisado		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/24/2022	24/04/2022	-			-	0%	Paralisado		
Valor Previsto:						R\$ 255.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Paralisado	Status do Projeto	A Epamig não apresentou o novo TR e justificativa, nem avançou nos processos de execução (licitações). Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.
											Paralisado		
Parcelas institucionais:													
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.													
Observações:													
Considerando a não conclusão/avanço dos processos de licitação, condição para aceite e liberação dos recursos da 1ª parcela ou parcela única, e tendo em vista o disposto no Decreto .... que regulamenta os RAP, entende-se que a tendência é de cancelamento do empenho inscrito em RAP 2018 e a extinção do Convênio.													
Informação adicionada em dezembro/2021: esse projeto será cancelado no 1º ciclo/2022.													
Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.	Número do Projeto:	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)
		Ano:	2018
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Processo (s) SEI:	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental		
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018		
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reúso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caraúbas/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1.00)
	-	-	-	R\$ 547.369,48	567.369,48

Previsão de Conclusão:	31/12/2023
Data Atualização:	31/12/2021

**Ata 304, da  
Diretoria Colegiada  
2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 547.369,48
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 547.369,48
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS, Coordenação: Victor Uchôa
	Conveniente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Caraúbas/RN

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		CONTRATAÇÃO (Peso 20%)								15%	Em Andamento		
1.1	Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	Não informado		100,0%	Concluído		
1.3	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019	21/08/2020		100,0%	Concluído	O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019.	
1.4	Análise e aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019		31/08/2020	19/10/2020		100,0%	Concluído	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.	

1.5	Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	01/10/2020	30/11/2020		29/10/2020	03/02/2021		100,0%	Concluído	Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Conveniente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 2 parcelas, sendo a primeira alterada de R\$ 99.673,80 para R\$ 102.896,80.	
1.6	Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do conveniente	Caraúbas	01/01/2021	30/09/2021	R\$ 20.000,00	27/01/2021			33,0%	Em Andamento	1ª parcela no valor de R\$ 1.387,00 paga pelo conveniente em 27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro de 2021.	
1.8	Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 102.896,80	01/02/2021			0,0%	Paralisado	Em 3/2/2021, a CODEM solicita liberação da primeira parcela tendo como base o Parecer nº 6/2021 - SEI/SUDENE que aprova os ajustes do plano de trabalho e afirma não haver impedimento técnico para o repasse.	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016). Em 19/10/21, o conveniente continua impedido de receber recursos por registro no CAUC. Em 27/12/2021, a Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão para recebimento de recursos da Sudene por persistir pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.
2	Execução (Peso 60%)									0%	Paralisado		
2.1	Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	01/02/2021	28/02/2021					0,0%	Paralisado	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.2	Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2021	31/03/2021					0,0%	Paralisado	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.3	Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar	O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da instalação dos sistemas de reuso.	
2.5	1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	A Iniciar		
2.6	Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/09/2021	30/09/2021	444.472,52				0,0%	A Iniciar		

2.7	Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/09/2021	31/07/2022					0,0%	A Iniciar		
2.8	Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/08/2022	31/08/2022					0,0%	A Iniciar		
2.9	2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar		
2.10	2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/CGDS	01/09/2022	31/12/2022					0,0%	A Iniciar		
3	Encerramento (peso 20%)									0%	A Iniciar		
3.2	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	01/01/2023	28/02/2023					0,0%	A Iniciar		
3.3	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/01/2023	30/06/2023					0,0%	A Iniciar		
3.4	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	01/07/2023	31/12/2023					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 567.369,32			Valor realizado:	R\$ 0,00	15%	Paralisado	Status do Projeto	Em 27/12/2021, a Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão para recebimento de recursos da Sudene por persistir pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.
Parceiros institucionais:													
Prefeituras de Caraúbas													
Observações:													
Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio n.º 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 19/09/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020. 2º Termo de convênio prorroga para 31/12/2022.													
Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.													
Informação adicionada em dezembro/2021 - Projeto deverá apresentar status "cancelado" no 1º ciclo/2022.													

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente - CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade.						Número do Projeto:		CGDS/2018005 (ex PO 9.2)																																															
							Ano:		2018																																															
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.						Processo (s) SEI:		59335.000278/2018-85																																															
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano																																																							
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica						Objetivo estratégico (MDR):		L.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																															
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.																																																							
Diretoria responsável:	DPLAN						Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)																																															
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos						Gestor da subunidade:		Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra																																															
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental																																																							
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO																																																							
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Biágua, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.																																																							
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018																																																	
		-	-	-	R\$ 339.517,00	R\$ 339.517,00																																																		
Previsão de Conclusão:		31/12/2021																																																						
Data Atualização:		31/12/2021																																																						
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		CGDS/SUDENE:	Mauro Póvoas e Juliana Borges (CODEM/CGDS); Coordenação CODEM: Victor Uchôa																																																					
		EMBRAPA SEMIÁRIDO:	Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira																																																					
<table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">Valores Orçamentários/ Financeiros</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Pago até o ano anterior</td><td>R\$</td><td colspan="2">302.767,00</td></tr><tr><td colspan="2">A realizar no exercício</td><td>R\$</td><td colspan="2">23.700,00</td></tr><tr><td colspan="2">Orçamento (LOA+Crédito) no exercício</td><td>R\$</td><td colspan="2">36.750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Empenhado no Exercício (1)</td><td>R\$</td><td colspan="2">36.750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor liberado no Exercício</td><td>R\$</td><td colspan="2">36.750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Saldo a liberar</td><td>R\$</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">Saldo a Empenhar no exercício</td><td>R\$</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">Total Liberado até o exercício</td><td>R\$</td><td colspan="2">339.517,00</td></tr></tbody></table>														Valores Orçamentários/ Financeiros			Pago até o ano anterior		R\$	302.767,00		A realizar no exercício		R\$	23.700,00		Orçamento (LOA+Crédito) no exercício		R\$	36.750,00		Valor Empenhado no Exercício (1)		R\$	36.750,00		Valor liberado no Exercício		R\$	36.750,00		Saldo a liberar		R\$	-		Saldo a Empenhar no exercício		R\$	-		Total Liberado até o exercício		R\$	339.517,00	
		Valores Orçamentários/ Financeiros																																																						
Pago até o ano anterior		R\$	302.767,00																																																					
A realizar no exercício		R\$	23.700,00																																																					
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício		R\$	36.750,00																																																					
Valor Empenhado no Exercício (1)		R\$	36.750,00																																																					
Valor liberado no Exercício		R\$	36.750,00																																																					
Saldo a liberar		R\$	-																																																					
Saldo a Empenhar no exercício		R\$	-																																																					
Total Liberado até o exercício		R\$	339.517,00																																																					
		Descrição das Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto		Realizado		Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																																												
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)							20%	Concluído																																														
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.		CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018	100,0%	Concluído	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7- CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)																																												
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico		PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018	100,0%	Concluído																																													
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED		CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018	100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho																																											
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED		GABINETE / Embrapa	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018	100,0%	Concluído																																													
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no DOU		GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019	100,0%	Concluído	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato																																											
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								45%	Em Andamento																																													
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018		07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100,0%	Concluído																																												
2.2	Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastrarmento das famílias beneficiárias nas comunidades.		Embrapa	01/11/2018	31/12/2018		R\$ 8.800,00	19/02/2019	18/04/2019	100,0%	Concluído	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida																																											
2.3	Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara material para publicação.		Embrapa	01/01/2019	30/06/2021		R\$ 20.275,00	13/02/2019		R\$ 1.200,00	70,0%	Em Andamento	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a caracterização ambiental nas comunidades rurais está sendo realizada com a confecção de mapas e imagens de drones.	As metas que estão com o status de "em andamento" referem-se às informações prestadas no último relatório parcial, enviado em 10/6/21 para a Sudene. A finalização das metas estão previstas para término em 31/12/21 e as informações constarão do relatório final do projeto.																																									
2.4	Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.		Embrapa	01/03/2019	30/06/2021		R\$ 19.410,00	13/02/2019		R\$ 19.410,00	20,0%	Em Andamento	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a viabilidade econômica do sistema quanto ao uso de energia solar e elétrica será realizada, os dados estão sendo coletados para essa avaliação e será apresentado no próximo relatório.	A coordenadora do projeto, Dr.ª Roseli Freire, pesquisadora da Embrapa Semiárido, apresentou o projeto detalhando o sistema bioágua familiar no Semiárido Show realizado na modalidade on line no período de 23 a 25/11/21.																																									



2.5	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 4.973,00	01/09/2020		50,0%	Em Andamento	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, a definição dos modelos a partir da instalação dos 12 sistemas bioágua e será feito também na Comunidade Sítio Coelho, de acordo o último relatório parcial datado de 10/6/21.	Fotos e mensagens compartilhadas com a coordenadora do projeto informaram o avanço da instalação dos sistemas na comunidade Sítio Coelho, que constarão do relatório final do projeto.	
2.6	Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/06/2021	R\$ 188.081,86	13/02/2019	R\$ 62.190,00	75,0%	Em Andamento	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O primeiro sistema de reúso foi instalado em fevereiro/2021, contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da pandemia, as atividades de campo foram suspensas e retomadas no segundo semestre de 2021. O relatório final do projeto trará informações sobre a finalização dos sistemas na Comunidade Sítio Coelho.		
2.7	Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R\$ 19.000,00	01/10/2019	31/05/2021	R\$ 7.200,00	100,0%	Concluído	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. Foi também instalado um minhocário, no relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021, há informações sobre os outros cursos realizados.	
2.8	Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	30/06/2021	R\$ 33.139,14	01/10/2019	31/05/2021		100,0%	Concluído	O relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021 traz informações de avaliação da qualidade da água e do solo.	
2.9	Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 1.196,00	04/01/2021		50,0%	Em Andamento	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a integração com a galinha caipira está sendo realizada, incluindo as criações dos agricultores. Informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.		
2.10	Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reúso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	30/06/2021	R\$ 31.592,00	04/01/2021		50,0%	Em Andamento	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a meta está em andamento e mais informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.		
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019	100,0%	Concluído			
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	R\$ 212.767,00	05/06/2019	21/06/2019	R\$ 212.767,00	100,0%	Concluído	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.	Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R\$ 47.674,65 que não foi possível executar em 2019 referente ao 2º repasse do TED.
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019	19/05/2020	100,0%	Concluído	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou relatório de atividades do projeto referente ao período de dezembro de 2020 a maio de 2021.	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.	
2.14	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	R\$ 23.700,00	14/03/2020	09/09/2020	R\$ 36.750,00	100,0%	Concluído	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R\$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.
2.15	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	30/06/2021	30/06/2022		01/05/2021		0,0%	A Iniciar	Esta linha deve ser retirada, pois não há necessidade da análise da prestação de contas parcial dessa parcela porque é a última. Então, deve-se apresentar a Prestação de Contas Final		

3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	01/01/2022	31/12/2022		03/01/2022		0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/01/2022	31/12/2022				0,0%	A Iniciar	Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Embrapa Semiárido, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.	
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/01/2022	31/12/2022				0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 326.467,00		Valor realizado:		R\$ 339.517,00		65%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:												
Embrapa Semiárido												
Observações:												
Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido												
O projeto foi apresentado no 1º Webinar de Reuso de Água da Sudene promovido pela Codem/CGDS em 9/6/2020. O projeto foi prorrogado para 30/06/2021, conforme 2º Termo Aditivo assinado em 21/08/2020. O 3º Termo Aditivo ao TED Nº 006 /2018 – SUDENE/Embrapa Semiárido, foi firmado em 30/06/2021, prorrogando a sua vigência até 31/12/2021. Há necessidade de ajustar o seu Plano de Trabalho a nova data de vigência.												

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



Dimensão		Resultados para a sociedade.						Número do Projeto:			CGDS/2019001 (ex PO 6.5)	
								Ano:			2019	
Objetivo estratégico:		Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.						Processo (s) SEI:			59336.003213/2019-62	
Programa:		2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano				Eixo temático (MDR):						
Ação:		Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340)				Objetivo estratégico (MDR):						
Finalidade da ação:		Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.										
Diretoria responsável:		DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas				Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS				
Diretor:		Raimundo Gomes de Matos				Gestor da subunidade:		Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra				
Problema (causa):		Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.										
Projeto:		Implantação de dois campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.										
Objetivo do projeto:		Ampliar a oferta de mudas de palma resistentes à cochonilha do carmin, contribuindo sobremaneira para a sustentabilidade da atividade pecuária, sobretudo na agricultura familiar no semiárido.distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		280	GND 3	30	R\$ 206.730,00	R\$ 207.730,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
							mar/19	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 206.730,00
								R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
											Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	R\$ -
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:		31/12/2022				CONVÊNIO Nº 892981/2019		Res. DC nº 281/2017				
Data Atualização:		31/12/2021				Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2022						
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pres/ Laura de Sá										
N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	20,0%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	30/12/2019	30/12/2019	-	100%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,8%	Atrasado	
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	04/04/2021	--	--	10%	Atrasado	A Conveniente atendeu a todas as condições da Cláusula Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma pequena parte do todo.
												Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 163.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações propostas. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização, não foram identificados avanços nos processos de licitação.

9	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 43.730,00	--	--	--	0%	Atrasado	
10	Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 102.180,63	--	--	--	0%	Atrasado	
11	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 56.453,84	--	--	--	0%	Atrasado	
12	Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 33.160,29	--	--	--	0%	Atrasado	
13	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 15.940,51	--	--	--	0%	Atrasado	
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/03/2023	01/05/2023	-			-	0%	A Iniciar	
Valor Previsto:						R\$ 206.730,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	21%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais: EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações: Informação adicionada em dezembro/2021 - O motivo do atraso não depende da Sudene, Processos licitatórios apresentados à Sudene com valores muito abaixo do valor total do projeto.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021

Dimensão						Resultados para a sociedade.				Número do Projeto:		CGDS/2020002 (ex PO 6.7)			
Objetivo estratégico:						Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.				Ano:		2020			
Programa:						2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano				Eixo temático (MDR):					
Ação:						8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação				Objetivo estratégico (MDR):					
Finalidade da ação:						Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.									
Diretoria responsável:						DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas				Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS			
Diretor:						Raimundo Gomes de Matos				Gestor da subunidade:		Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra			
Problema (causa):						Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.									
Projeto:						Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.									
Objetivo do projeto:						Implantação de produção de mudas no Campo Experimental de Jalba, EPAMIG NORTE, para distribuição a 160 agricultores do Território da Cidadania da Serra Geral.									

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		144000000 / 0250532030	4	30	R\$ 200.000,00	R\$ 201.000,00

Previsão de Conclusão:		31/12/2024	CONVÊNIO Nº 903996/2020	
Data Atualização:		31/12/2021	Vigência até: 31/12/2023	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto		CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; Coordenação: Victor Uchôa; EPAMIG/MG	
--	--	---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE				10/09/2020	11/12/2020		100%	Concluído	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE			-	11/12/0200	05/01/2021	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 5/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,75%	Em Andamento		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	04/04/2021	--	--	10%	Em Andamento	Processo licitatório em elaboração.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	Contrapartida	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 1.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		

9	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados (aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram orientações e medidas de ajuste da EPAMIG.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização não foram identificados avanços nestes processos.
10	Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaiba - CEJA; 1.2) aquisição de mudas; 1.3)	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 102.957,48	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Meta 2 -Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 39.119,12	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 30.918,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 28.004,90	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 201.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	21%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.													
Observações:													

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente )

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

Dimensão	Resultados para a sociedade	Número do Projeto:	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2020</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Processo (s) SEI:</b>	
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	<b>Eixo temático (MDR):</b>	
<b>Finalidade da ação:</b>	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
<b>Problema (causa):</b>	Dois problemas principais dificultam a execução de políticas de convivência com o Semiárido para a pecuária no RN, a pequena área existente com cultivos de palma forrageira e a expansão da praga da coconilha-do-carmim.		
<b>Projeto:</b>	<b>Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a coconilha-do-carmim no RN.</b>		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da coconilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250532030	3, 4	30	R\$ 199.412,43	R\$ 199.612,04

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2024	<b>CONVÊNIO Nº 903995/2020</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/12/2021	<b>Vigência até: 31/12/2023</b>

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas, Mauro Bezerra e Amauri Nascimento; Coordenação: Victor Uchôa; SAPE/RN
---	--

Cronograma de Desembolso (R\$1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
fev/21	100.000,00	199,61	100.199,61	A realizar no exercício RAP	R\$ 199.412,43
set/21	99.412,43	0,00	99.412,43	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
total	199.412,43	199,61	199.612,04	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 199.412,43
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUD ENE	6/4/2020	25/5/2020	-	06/04/2020	25/05/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	05/06/2020	05/07/2020	-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	06/07/2020	30/11/2020	-	06/07/2020	03/11/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
4	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	06/07/2020	31/12/2020		10/09/2020	23/12/2020		100%	<b>Concluído</b>	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
5	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDE NE	06/07/2020	31/12/2020	-	6/7/2020	31/12/2020	-	100%	<b>Concluído</b>	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
		<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>0,90%</b>	<b>A Iniciar</b>		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	01/01/2021	31/01/2021		--	--	--	15%	<b>Em Andamento</b>	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
7	Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 199,61	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	--	--	--	0%	<b>Paralisado</b>	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos.	
9	Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 9.441,80	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
		1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 8.202,00	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		

10	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Liberação 2ª parcela	E condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43	--	--	--		Atrasado		
13	mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 150.827,07	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	tolerantes à cochonilha do carmim por ano, com atendimento de 555	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmim - ampliação	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 31.141,17					A Iniciar		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	01/01/2024	31/12/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 199.612,04	Valor realizado:		R\$ 0,00	21%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

SAPE/RN; EMPARN, EMATER-RN, SENAR-RN, SEBRAE-RN e SEAPAC

Observações:

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente )

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



# **PROJETOS PRIORITÁRIOS 2017**

**Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada**

4º ciclo 2021



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2021**

<b>Dimensão estratégica:</b>	<b>1. Resultados para a Sociedade</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>CGCP/2017001 (ex PO 2)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>	<b>Ano:</b>	<b>2017</b>
<b>Programa:</b>	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	<b>Eixo temático (MDR):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Objetivo estratégico (MDR):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>	<b>Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.</b>		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Raimundo Gomes de Matos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira
<b>Problema (causa):</b>	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
<b>Projeto:</b>	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros		
		280	Custeio	20WQ	R\$ 709.382,21	R\$ 709.382,21	SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 354.691,11
											A realizar no exercício	R\$ 354.691,11
											Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
											Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	R\$ -
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ 354.691,11
Previsão de Conclusão:		31/08/2019		Res. DC nº 281/2017 E Ata 304ª Reunião da Diretoria Colegiada								
Data Atualização:		31/12/2021										
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto			Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP									

4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação, em Parceria com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contratação de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao <b>Produto 1: Plano de Trabalho</b>	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	R\$ 70.938,22	100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Produto aprovado, em vias de pagamento.	Solicitou-se ajuste no produto 1 havendo demora na resposta da contratada. Realizou-se aditamento de contrato.
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	<b>Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas</b> e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R\$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Diagnóstico com várias inconsistências contou com 2 pareceres técnicos solicitando ajustes antes da sua aprovação. Aditamento do contrato realizado.	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	<b>Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais.</b> Em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R\$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Oficinas realizadas e aprovadas após segundo parecer técnico	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.

13	Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas. Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	02/03/2019	28/06/2019	R\$ 212.814,66	01/05/2019			0%	Cancelado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Segundo aditamento do contrato realizado para a data de 31 de agosto de 2019. Baixa participação da prefeitura de Feira de Santana na avaliação do produto entregue e dos trabalhos realizados pela contratada em oficinas realizadas no município. A Sudene solicitou ajustes no produto IV, apresentado pela consultoria Ernst Young, no entanto, a consultoria não os atendeu. Isto posto, a equipe técnica da Sudene não aprovou o produto IV. Devido ao não atendimento do plano de trabalho pela contratada, a Sudene não aprovou o produto IV e não autorizou a prorrogação do contrato, cuja vigência se encerrou em 30 de outubro de 2019. Rescisão ainda não foi realizada. Em paralelo, será dado continuidade ao projeto através de uma nova contratação no PNUD (PO Construindo Feira de Santana 2030 - Processo 59336.000817/2021-71).	Conforme decisão da 360ª Diretoria Colegiada (SEI 178827), após solicitação da JOF/PNUD, não foi aprovado o pagamento parcial do produto, o que foi reiterado em 06/07/2021 pelo Parecer da Procuradoria e Despacho CGCP (SEI 256184). Em paralelo, a equipe técnica desta Coordenação Geral, em conjunto com a Prefeitura e o PNUD elaboraram um Termo de Referência para continuidade ao projeto (PO Construindo Feira de Santana 2030 - Processo 59336.000817/2021-71).
14	Realização da quarta etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira versão	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 70.938,22	25/06/2019			0%	Cancelado	Como o produto IV não foi aprovado, este produto foi automaticamente cancelado.	Conforme decisão da 360ª Diretoria Colegiada (SEI 178827), após solicitação da JOF/PNUD, não foi aprovado o pagamento parcial do produto, o que foi reiterado em 06/07/2021 pelo Parecer da Procuradoria e Despacho CGCP (SEI 256184). Em paralelo, a equipe técnica desta Coordenação Geral, em conjunto com a Prefeitura e o PNUD elaboraram um Termo de Referência para continuidade ao projeto (PO Construindo Feira de Santana 2030 - Processo 59336.000817/2021-71).
15	Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	06/07/2019	02/08/2019	R\$ 70.938,22				0%	Cancelado		
16	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	03/08/2019	15/08/2019					0%	Cancelado	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
17	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	20/08/2019	31/08/2019					0%	Cancelado	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	Embora na 360ª Diretoria Colegiada (SEI 178827) a Diretoria Colegiada tenha se manifestado contra o pagamento parcial do produto 4, posteriormente, houve manifestação do PNUD quanto ao reconhecimento de alguns itens contratados (SEI 0234755). O PNUD ainda encaminhou, como exemplo, uma Nota Técnica emitida por instituição do governo federal (Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário) que aprova pagamento parcial em um dos projetos desenvolvidos com o PNUD. Após esta manifestação do PNUD e consultada a Procuradoria Federal, a equipe técnica da Sudene recomendou o pagamento parcial do produto (SEI 0240460 e 0272795).  Foi realizado pagamento parcial do Produto 4 em 11/11/2021 (SEI 292140).  Uma nova contratação está em fase de licitação no PNUD/JOF para dar andamento ao projeto (Processo: 59336.000817/2021-71)
Valor Previsto:						R\$ 709.382,21	Valor realizado:	R\$ 354.691,11	71%	Concluído	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:**

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afetos ao tema.

**Observações:** Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 81; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



Emendas 4º ciclo 2021																								
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários			% Orc./ Fin.	Iniciação	Liberação				Status		Previsão de Conclusão	Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado			1ª				2ª	3ª			4ª	Visita	Emissão do Laudo
2017	COCIC/2017020	23	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 264.608,17	R\$ 266.608,17	R\$ 52.921,63	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/04/23	Em Andamento			
2017	COCIC/2017021	24	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 390.020,00	R\$ 433.930,65	R\$ 390.020,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento			
2017	COCIC/2017022	25	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 350.000,00	R\$ 357.000,00	R\$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	17/08/21	Atrasado			
2017	COCIC/2017024	26	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.493,20	R\$ 260.930,41	R\$ 210.000,00	84%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/09/22	Em Andamento			
2017	COCIC/2017025	27	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.963,58	R\$ 700.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018001	28	Pavimentação - Município de Urucuça	BA	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento			
2018	COCIC/2018002	29	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/07/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018003	30	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 586.135,00	R\$ 633.025,80	R\$ 586.135,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018004	31	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/05/22	Em Andamento			
2018	COCIC/2018005	32	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,29	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018006	33	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018007	34	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,27	R\$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/01/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018008	35	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ -	0%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/24	Em Andamento			
2018	COCIC/2018009	36	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.755.787,09	R\$ 1.773.344,96	R\$ 841.262,37	48%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	27/09/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018010	37	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento			
2018	COCIC/2018011	38	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento			
2018	COCIC/2018012	39	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 451.239,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018013	40	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018014	41	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	R\$ 490.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento			
2018	COCIC/2018015	42	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.100,00	R\$ 995.818,64	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018016	43	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.607,22	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento			
2018	COCIC/2018017	44	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/22	Em Andamento			

Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orç./ Fin.	Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status		
												1ª		2ª	3ª					4ª	
2018	COCIC/2018018	45	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.743,89	R\$ 46.629,00	19%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018019	46	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018020	47	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018021	48	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,48	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018022	49	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 258.523,52	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/05/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018023	50	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 802.936,73	R\$ 811.047,20	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018024	51	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 210.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018025	52	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018026	53	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018027	54	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018028	55	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,31	R\$ 115.000,00	46%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018029	56	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018030	57	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Paralisado
2018	COCIC/2018031	58	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.240,98	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018032	59	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.196,50	R\$ 3.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018033	60	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 380.000,00	R\$ 381.000,00	R\$ 380.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/06/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018034	61	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	R\$ 420.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018035	62	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 267.527,38	R\$ 159.708,52	61%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	17/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018036	63	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018037	64	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	R\$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018038	65	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018039	66	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 256.187,08	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Em Andamento

Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./ Fin.	Inicição	Status					Previsão de Conclusão	Status
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	Liberação				Visita	Emissão do Laudo				
												1ª			2ª			3ª	4ª		
2018	COCIC/2018040	67	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018041	68	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018042	69	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.440.476,88	R\$ 1.187.711,25	83%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018043	70	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/03/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018044	71	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.060.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/10/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018045	72	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.980,22	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/09/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018046	73	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.636,67	R\$ -	0%	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/10/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018047	74	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 300.400,00	R\$ 180.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018048	75	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/06/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018049	76	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Caraubais/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 150.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018050	77	Aquisição de caminhão trucado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraubas/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 332.853,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/06/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018051	78	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	17/08/21	Atrasado
2018	COCIC/2018052	79	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	1	1.1	2029	8902	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018053	80	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018054	81	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.065.661,71	R\$ 2.810.590,05	94%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018055	82	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018056	83	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 350.500,00	R\$ -	0%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/11/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018057	84	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2018	COCIC/2018058	85	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ -	0%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019001	86	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.996,10	R\$ 162.500,00	65%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento



Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./Fin.	Inicição	Status				Previsão de Conclusão	Status	
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª			2ª	3ª	4ª	Visita			Emissão do Laudo
2019	COCIC/2019002	87	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 312.836,25	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/01/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019003	88	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.836,76	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/06/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019004	89	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 257.704,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/12/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019005	90	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019006	91	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019007	92	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 393.325,11	R\$ 320.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019008	93	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 291.831,01	R\$ 292.431,01	R\$ 180.000,00	62%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/04/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019009	94	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,40	R\$ 900.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	08/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019010	95	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	07/09/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019011	96	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,09	R\$ 340.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019012	97	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 607.328,74	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019013	98	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019014	99	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.863,57	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/06/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019015	100	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 220.086,98	85%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/07/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019016	101	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019017	102	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,45	R\$ 280.000,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019018	103	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 305.115,05	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019019	104	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/06/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019020	105	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.410.387,00	R\$ 3.237.722,30	R\$ 2.086.232,20	87%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019021	106	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.237.065,05	R\$ 1.447.000,00	72%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019022	107	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.999,99	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/08/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019023	108	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,36	R\$ 340.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019024	109	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.756,73	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento

Emendas 4º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./ Fin.	Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status		
												1ª		2ª	3ª					4ª	
2019	COCIC/2019025	110	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 779.525,47	R\$ 810.705,19	R\$ 681.404,45	87%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019026	111	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.646,71	R\$ 736.111,49	74%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019027	112	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,21	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/12/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019028	113	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.027.825,85	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019029	114	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.519,98	R\$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019030	115	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 700.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019031	116	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019032	117	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.867,51	R\$ 240.000,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019033	118	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 770.735,13	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019034	119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019035	120	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019036	121	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ 70.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019037	122	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 800.000,00	R\$ 801.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020001	123	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuça/Ba	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/09/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020002	124	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE- RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.039,60	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/09/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020003	125	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020004	126	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/10/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020005	127	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020006	128	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualim no Município de Valença - BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020007	129	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,05	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020008	130	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 266.402,82	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/06/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020009	131	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 203.666,66	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020010	132	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/04/23	Em Andamento

Emendas 4º ciclo 2021																		
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status					
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Inicição	Liberação				Visita
														1º	2º	3º	4º	Emissão do Laudo
																		Previsão de Conclusão
2020	COCIC/2020011	133	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 350.167,88	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar
2020	COCIC/2020012	134	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		135	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.040,45	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		136	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 502.941,95	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 557.053,54	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		138	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 545.825,61	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		139	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROÁ/RAS - CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 534.343,80	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		140	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 307.230,00	R\$ 371.976,26	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		141	aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		142	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 502.464,97	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		143	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		144	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 2.984.100,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		145	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 398.158,00	R\$ 398.158,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		146	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.021.207,87	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		147	O Objeto desse termo de parceria e aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		148	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 398.158,00	R\$ 398.158,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
2021		149	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.808,01	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar
TOTAL									R\$ 92.551.248,47	R\$ 97.109.861,72	R\$ 51.168.891,60							

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
	Não se Aplica

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
2	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
3	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Paralisado	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	0%	CGDS
4	CGDS/2018005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 339.517,00	R\$ 339.517,00	100%	CGDS
5	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
6	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 199.412,43	R\$ 0,00	0%	CGDS
7	CGDS/2020002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
8	CGCP/2017001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,11	50%	CGCP
9	COCIC/2016001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC
10	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC
11	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COIC
12	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras nos Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 813.633,43	81%	COIC
13	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COIC
14	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
15	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COCIC
16	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
17	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
18	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
19	COCIC/2017003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
20	COCIC/2017004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 384.999,99	100%	COCIC
21	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
22	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
23	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.989.238,23	100%	COCIC
24	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
25	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
26	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
27	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COCIC
28	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
29	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COCIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
30	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
31	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 52.921,63	20%	COCIC
32	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 390.020,00	100%	COCIC
33	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
34	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.493,20	R\$ 210.000,00	84%	COCIC
35	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
36	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçua	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
37	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
38	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 586.135,00	100%	COCIC
39	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
40	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
41	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADELFA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
42	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
43	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
44	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COCIC



ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
45	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
46	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
47	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
48	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
49	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COCIC
50	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 995.818,64	100%	COCIC
51	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
52	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
53	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 46.629,00	19%	COCIC
54	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
55	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
56	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
57	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
58	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COCIC
59	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COCIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
60	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
61	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município. Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
62	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
63	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COCIC
64	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
65	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
66	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
67	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	100%	COCIC
68	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	100%	COCIC
69	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COCIC
70	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COCIC
71	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
72	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
73	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuipe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
74	COCIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC



ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
75	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
76	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
77	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.187.711,25	83%	COCIC
78	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
79	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
80	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
81	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
82	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COCIC
83	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
84	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%	COCIC
85	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
86	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
87	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
88	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroão – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
89	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COCIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
90	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
91	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
92	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
93	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
94	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 162.500,00	65%	COCIC
95	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
96	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
97	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
98	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
99	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
100	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	COCIC
101	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripa de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 291.831,01	R\$ 180.000,00	62%	COCIC
102	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	100%	COCIC
103	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
104	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 340.000,00	20%	COCIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
105	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
107	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana de Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
108	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 220.086,98	85%	COCIC
109	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
110	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 280.000,00	40%	COCIC
111	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
112	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COCIC
113	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 2.086.232,20	87%	COCIC
114	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.447.000,00	72%	COCIC
115	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRECIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
116	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 340.000,00	20%	COCIC
117	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
118	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 779.525,47	R\$ 681.404,45	87%	COCIC
119	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 736.111,49	74%	COCIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
120	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
121	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
122	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
123	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
124	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEMBÁ	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
125	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 240.000,00	40%	COCIC
126	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
127	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
128	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
129	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 70.000,00	20%	COCIC
130	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
131	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
132	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
133	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
134	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
135	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
136	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualbim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
138	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
139	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
140	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
141	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
142	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
143	COCIC/2021001		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PICARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
144	COCIC/2021002		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
145	COCIC/2021003		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
146	COCIC/2021004		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
147	COCIC/2021005		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
148	COCIC/2021006		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 307.230,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
149	COCIC/2021007		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 389.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC



ANEXO VII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIMENSÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
150	COCIC/2021008		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
151	COCIC/2021009		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 184.338,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
152	COCIC/2021010		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.984.100,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
153	COCIC/2021011		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 398.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
154	COCIC/2021012		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
155	COCIC/2021013		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 368.676,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
156	COCIC/2021014		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 398.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
157	COCIC/2021015		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
Total do Objetivo 1.1									94.825.326,26	51.863.099,71	55%	
158	CGEP/2018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
Total do Objetivo 1.2									199.399,80	0,00	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1									95.024.726,06	51.863.099,71	55%	
TOTAL GERAL									95.024.726,06	51.863.099,71	54,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.  
Referência dos dados: 4º Ciclo 2021  
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.  
Posição: Dezembro/2021

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGCP/2017001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,11	50%	CGCP
Total da Ação 20WQ									709.382,21	354.691,11	50%	
2	COCIC/2016001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
3	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
4	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
5	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 813.633,43	81%	COCIC
6	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COCIC
7	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COCIC
8	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COCIC
9	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
10	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
11	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COCIC
12	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Cangaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COCIC
14	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
15	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 52.921,63	20%	COCIC
16	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.493,20	R\$ 210.000,00	84%	COCIC
17	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
18	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçua	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
19	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
20	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
21	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
22	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
23	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COCIC
24	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
25	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TANHAUÇU BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC



ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
26	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
27	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
28	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COCIC
29	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sítiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 995.818,64	100%	COCIC
30	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
31	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
32	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 46.629,00	19%	COCIC
33	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
34	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
35	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
36	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
37	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COCIC
38	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
39	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
40	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
41	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	100%	COCIC
42	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	100%	COCIC
43	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COCIC
44	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COCIC
45	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
46	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
47	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
48	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
49	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
50	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitaitaia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.187.711,25	83%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
51	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
52	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
53	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
54	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
55	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COCIC
56	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
57	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Caraubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%	COCIC
58	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAUBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
59	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
60	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocco – LOTE 02 zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
61	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COCIC
62	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
63	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
64	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
65	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
66	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 162.500,00	65%	COCIC
67	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
68	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
69	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
70	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
71	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
72	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	COCIC
73	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 291.831,01	R\$ 180.000,00	62%	COCIC
74	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	100%	COCIC
75	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
76	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 340.000,00	20%	COCIC
77	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
78	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
79	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
80	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 220.086,98	85%	COCIC
81	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
82	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 280.000,00	40%	COCIC
83	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
84	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COCIC
85	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 2.086.232,20	87%	COCIC
86	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso Intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.447.000,00	72%	COCIC
87	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
88	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 340.000,00	20%	COCIC



ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
89	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
90	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 779.525,47	R\$ 681.404,45	87%	COCIC
91	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 736.111,49	74%	COCIC
92	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
93	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
94	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
95	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
96	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
97	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 240.000,00	40%	COCIC
98	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
99	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
100	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
101	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 70.000,00	20%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
102	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
103	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
104	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
105	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
107	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
108	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
109	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
110	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
111	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
112	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
113	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
114	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
115	COCIC/2021001		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
116	COCIC/2021002		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
117	COCIC/2021003		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
118	COCIC/2021004		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
119	COCIC/2021005		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS - CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
120	COCIC/2021006		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SERRITA/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 307.230,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
121	COCIC/2021007		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 389.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
122	COCIC/2021008		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
123	COCIC/2021009		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 184.338,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
124	COCIC/2021010		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.984.100,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
125	COCIC/2021011		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de maquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiânia/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 398.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
126	COCIC/2021012		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC



ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
127	COCIC/2021013		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 368.676,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
128	COCIC/2021014		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 398.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
129	COCIC/2021015		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
Total da Ação 7k66									79.864.585,18	41.533.498,38	52%	
130	CGEP/2018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
131	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
132	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
133	COCIC/2017003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
134	COCIC/2017004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 384.999,99	100%	COCIC
135	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
136	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
137	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.989.238,23	100%	COCIC
138	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
139	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
140	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 390.020,00	100%	COCIC
141	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
142	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 586.135,00	100%	COCIC
143	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
144	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
145	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana de Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
146	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
147	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COCIC
148	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COCIC
149	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
150	COCIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajaí/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
Total da Ação 214S									11.902.729,76	9.635.393,22	81%	

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
151	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
152	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
153	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
154	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 199.412,43	R\$ 0,00	0%	CGDS
155	CGDS/2020002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
			Total da Ação 8340						861.142,43	0,00	0%	
156	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Paralisado	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
157	CGDS/2018005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 339.517,00	R\$ 339.517,00	100%	CGDS
158	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
			Total da Ação 8902						1.686.886,48	339.517,00	20%	
			TOTAL DO PROGRAMA 2217						95.024.726,06	51.863.099,71	55%	
			TOTAL GERAL						95.024.726,06	51.863.099,71	54,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2021

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição:Dezembro/2021

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	COCIC/2016001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
2	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
3	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
4	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 813.633,43	81%	COCIC
5	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COCIC
6	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COCIC
7	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COCIC
8	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
9	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
10	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
11	COCIC/2017003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
12	COCIC/2017004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 384.999,99	100%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
14	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
15	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.989.238,23	100%	COCIC
16	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
17	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
18	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
19	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COCIC
20	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
21	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COCIC
22	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
23	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 52.921,63	20%	COCIC
24	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 390.020,00	100%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
26	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.493,20	R\$ 210.000,00	84%	COCIC
27	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
28	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urugua	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
29	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
30	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 586.135,00	100%	COCIC
31	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
32	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
33	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADELFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
34	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
35	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
36	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COCIC



ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
37	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
38	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
39	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
40	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
41	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COCIC
42	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 995.818,64	100%	COCIC
43	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
44	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
45	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 46.629,00	19%	COCIC
46	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
47	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
48	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana de Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
49	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
50	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COCIC
51	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COCIC
52	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
53	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
54	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
55	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COCIC
56	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
57	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
58	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias no Distrito de Maracajá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
59	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	100%	COCIC
60	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	100%	COCIC



ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
61	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COCIC
62	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COCIC
63	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
64	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
65	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
66	COCIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
67	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
68	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
69	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.187.711,25	83%	COCIC
70	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
71	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
72	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
73	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
74	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COCIC
75	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
76	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%	COCIC
77	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRACÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
78	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos: Teixeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
79	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
80	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
81	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COCIC
82	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
83	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
84	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
85	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
86	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 162.500,00	65%	COCIC
87	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
88	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
89	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
90	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
91	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
92	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	COCIC
93	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 291.831,01	R\$ 180.000,00	62%	COCIC
94	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	100%	COCIC
95	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
96	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 340.000,00	20%	COCIC
97	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
98	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
99	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
100	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 220.086,98	85%	COCIC
101	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
102	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 280.000,00	40%	COCIC
103	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
104	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COCIC
105	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 2.086.232,20	87%	COCIC
106	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.447.000,00	72%	COCIC
107	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
108	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 340.000,00	20%	COCIC
109	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
110	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 779.525,47	R\$ 681.404,45	87%	COCIC
111	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambê/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 736.111,49	74%	COCIC
112	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipaçuanga/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
113	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
114	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
115	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
116	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEMBA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
117	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 240.000,00	40%	COCIC
118	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
119	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
120	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
121	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 70.000,00	20%	COCIC
122	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
123	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
124	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
125	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
126	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
127	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
128	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
129	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
130	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
131	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caiçó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC



ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
132	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
133	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
134	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
135	COCIC/2021001		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PICARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
136	COCIC/2021002		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2021003		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
138	COCIC/2021004		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
139	COCIC/2021005		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS - CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
140	COCIC/2021006		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 307.230,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
141	COCIC/2021007		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio V'Arzinha dos Grossos	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 389.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
142	COCIC/2021008		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
143	COCIC/2021009		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 184.338,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
144	COCIC/2021010		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.984.100,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
145	COCIC/2021011		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 398.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
146	COCIC/2021012		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
147	COCIC/2021013		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 368.676,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
148	COCIC/2021014		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 398.158,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
149	COCIC/2021015		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
<b>TOTAL COCIC</b>									<b>92.367.915,14</b>	<b>51.168.891,60</b>	<b>55%</b>	
150	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/acadêmicos.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
151	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
152	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Paralisado	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
153	CGDS/2018005 (ex PO 6.5)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 339.517,00	R\$ 339.517,00	100%	CGDS
154	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carimim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS



ANEXO 9 - RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
155	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 199.412,43	R\$ 0,00		CGDS
156	CGDS/2020002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00		CGDS
<b>TOTAL CGDS</b>									<b>1.748.028,91</b>	<b>339.517,00</b>	<b>19%</b>	
157	CGEP/2018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
<b>TOTAL CGEP</b>									<b>199.399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
158	CGCP/2017001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,11	50%	CGCP
<b>TOTAL CGCP</b>									<b>709.382,21</b>	<b>354.691,11</b>		
<b>TOTAL DPLAN</b>									<b>95.024.726,06</b>	<b>51.863.099,71</b>	<b>55%</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>95.024.726,06</b>	<b>51.863.099,71</b>	<b>54,6%</b>	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 4º Ciclo 2021

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2021
