

Agosto de 2022

POÇO DA CRUZ
SISTEMA HÍDRICO

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2022-2023
ALOCAÇÃOVideo Conferência
LOCAL


PE

UF

22/06/2022
DATA DA REUNIÃO

AÇUDE POÇO DA CRUZ

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

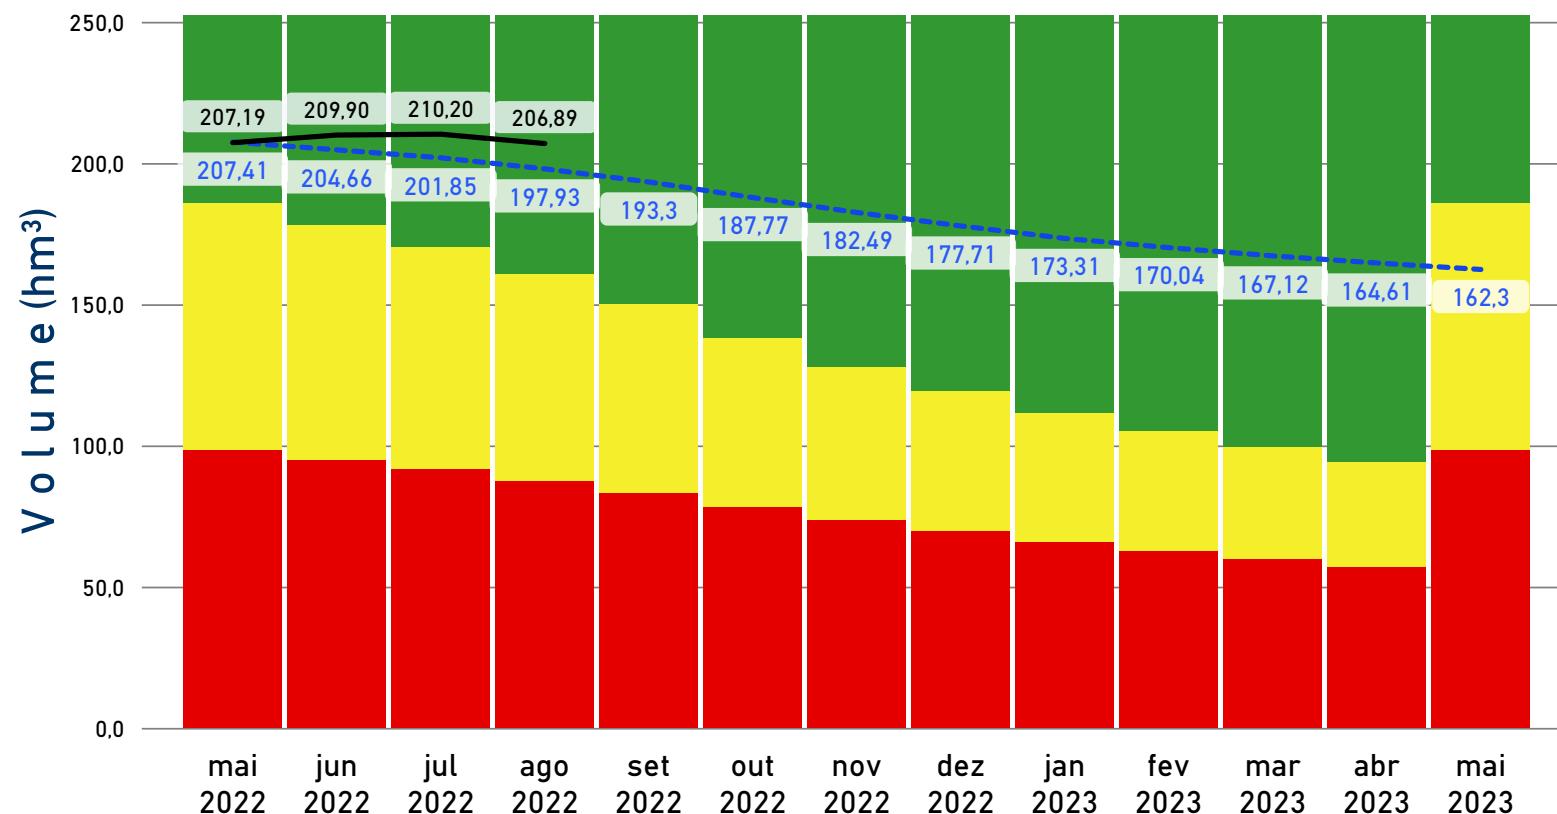

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm^3)	Cota Observada (m)	Média de Volume Observado (hm^3)
mai 2022	428,42	207,41	428,41	207,19
jun 2022	428,32	204,66	428,50	209,90
jul 2022	428,23	201,85	428,51	210,20
ago 2022	428,09	197,93	428,40	206,89
set 2022	427,93	193,30		
out 2022	427,74	187,77		
nov 2022	427,55	182,49		
dez 2022	427,37	177,71		
jan 2023	427,21	173,31		
fev 2023	427,08	170,04		
mar 2023	426,97	167,12		
abr 2023	426,87	164,61		
mai 2023	426,78	162,30		

COMAR

Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

comar@ana.gov.br

(61) 99297-1020

LEGENDAS

VOLUMES ESPERADOS (hm^3)VOLUMES OBSERVADOS (hm^3)

boletim gerado em:

05/09/2022

Agosto de 2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

POÇO DA CRUZ
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

PE
UF

22/06/2022
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsável	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório	ANA	Diária	REALIZADA	
1.2	Medição de descargas defluídas do reservatório	CGH	Horária	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	defluência zero atualmente
1.3	Calibração dos medidores de descarga do reservatório	CGH	Previamente a descarga	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	ANA fará campanha de medições em outubro para fazer a calibração
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Regularização da outorga	PIMOX	Imediato	NÃO REALIZADA	
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Relatório sobre intervenções mínimas necessárias para possibilitar a defluência a jusante da barragem	DNOCS / CEST-PE	Agosto/2022	NÃO REALIZADA	
3.2	Disponibilização de informações sobre orçamento e cronograma para execução do projeto de modernização do PIMOX	DNOCS / Direção Geral	Julho/2022	NÃO REALIZADA	
3.3	Articulação para a execução das ações emergenciais visando possibilitar a defluência a jusante da barragem	DNOCS / CEST-PE	Imediata	NÃO REALIZADA	Prevista reunião em 10 de agosto de 2022 para definição da estratégia
3.4	Reunião com MDR para previsão orçamentária para 2023 visando a execução do projeto de modernização	DNOCS / ANA / APAC / SEINFRAPE	Agosto/2022	NÃO REALIZADA	

Agosto de 2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

POÇO DA CRUZ
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

PE
UF

22/06/2022
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
Demais usos no entorno	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Geração de energia complementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização do rio Moxotó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos no rio Moxotó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	07/2022	08/2022
Geração de energia complementar	0,00	0,00
Perenização do rio Moxotó	0,00	0,00
Usos no rio Moxotó	0,00	0,00

Agosto de 2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

POÇO DA CRUZ
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

PE
UF

22/06/2022
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Alexandre Jorge P. Moura	DNOCS	(81) 98816-9628
Alexson Caetano da Silva	Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco	(81) 99872-5810
Cícero Afonso de Souza	*	(87) 98822-6735
Flávio José de Araújo	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ibimirim	(87) 98841-4313
Francisco Manoel da Silva	Câmara de Dirigentes Lojistas de Ibimirim	(87) 99983-1060
Heron Ouriques Gomes	*	(87) 99144-9095
João Batista Araújo Silva	Associação dos Produtores Rurais Irrigantes do Vale do Moxotó	(87) 98848-8650
Luiz Henrique Leal Calado	*	(81) 99971-9268
Orlando Salvador Xavier Junior	Universidade Federal Rural de Pernambuco	(81) 3320-6897
Paulo Geraldo Lima de Medeiros	Prefeitura Municipal de Ibimirim	(87) 98853-6643
