


DEPARTAMENT NACIONAL DE OB CONTRA AS SEC RESERVATÓRI ESTRATÉGICO



Mapa dos Reservatórios Estratégicos do PISF – DNOCS

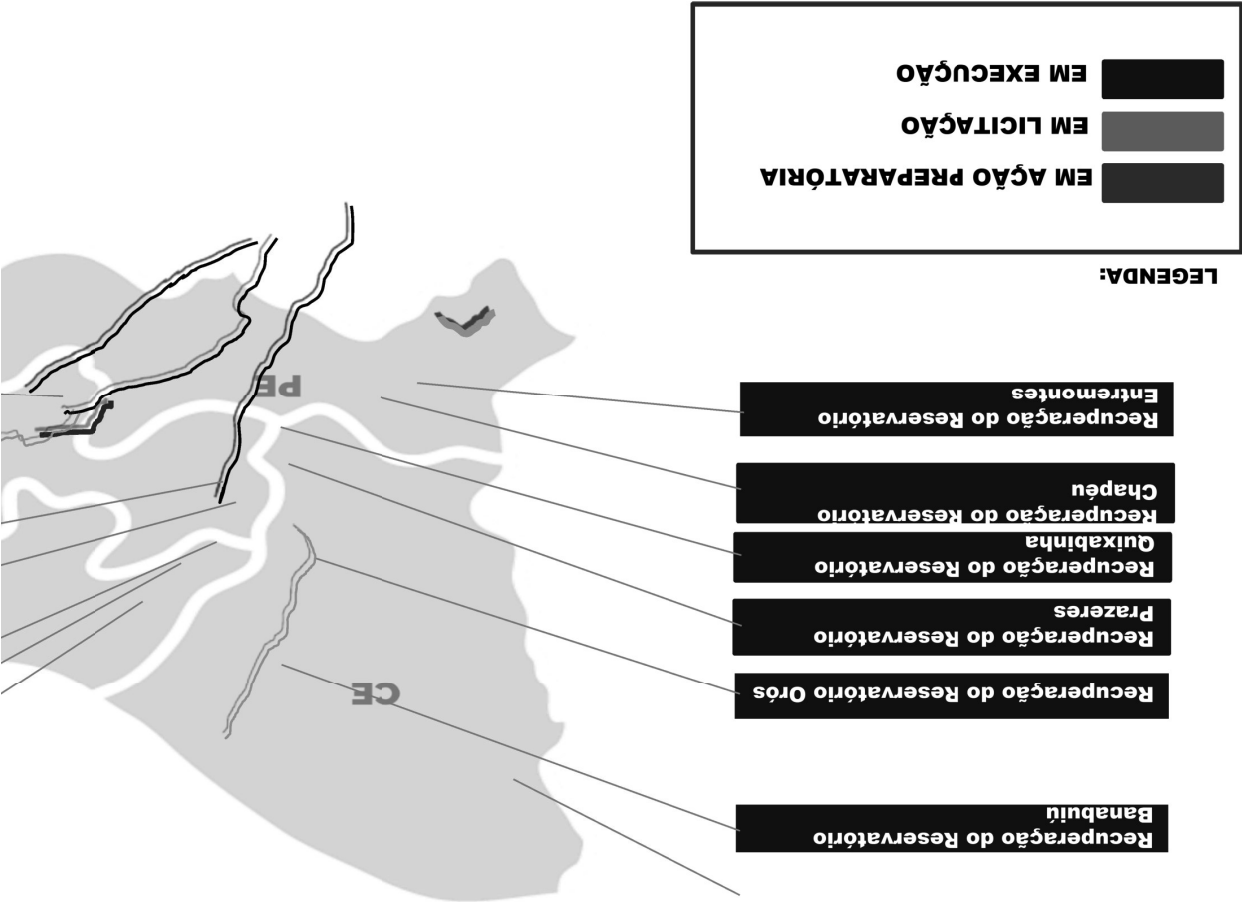

Execução das Obras de Recuperação e Modernização do Centro de Saúde do Município de Cajazeiras, no Estado da Paraíba.

A barragem tem finalidades múltiplas, sendo a pr

A intervenção oferece suporte hídrico ao agude

capacidade de acumular até 255 milhões m³ de água.

CAGEPA.

Informações Contruais:


- Valor Contratual + Aditivos: R\$ 21.489.769,76;

- Execução Física: 99,65 %

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Recuperação do Reservatório Engenheiro Ávidos/ P



9 de set. de 2024 16:57:54
6°59'10.53017"S 38°27'10.23854"W
Barragem Engenheiro Ávidos-PB



•Recuperação do Reservatório Quixabinha/ CE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização de Mauriti, no Estado do Ceará.

Volume de Acumulação= 31 milhões m³.

A barragem tem finalidades múltiplas, sendo a primeira de Mauriti e o Perímetro irrigado Quixabinha, beneficiando abastecimento, perenização do rio Jaguaribe; irrigação culturas agrícolas de áreas de montante; turismo e aprova

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCs: 104/2023(obra) e 85/2023/2**
- TED N.º 944558/2023/MIDR
- Valor empenhado: R\$ 9.081.501,86
- Valor Contratual: R\$ 8.933.852,90 (obra e super
- Valor executado (Pi+R): R\$ 7.354.885,05;
- Execução Física: 81,88 %;
- Ordem de serviço: 08/03/2024;
- Previsão para conclusão: Janeiro/2025

Recuperação do Reservatório Quixabinha/CE



•Recuperação do Reservatório Prazeres/ CE

Execução das Obras de Recuperação e Moderniz
Barro, no Estado do Ceará.

Volume de Acumulação= 32,5 milhões m³.

A barragem tem finalidades múltiplas, sendo a pri
de Barro, beneficiando 22.758 pessoas.

A intervenção visa garantir a automação do siste
abastecimento, perenização do rio Jaguaribe; irrigação
culturas agrícolas de áreas de montante; turismo e aprove

Restrições:

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCs: 05/2024 (obra) e 06/2023 (s**
- TED N.º 945937/2023/MIDR ;
- Valor empenhado R\$ 6.161.796,31;
- Valor Contratual: R\$ 7.520.707,45 (obra e super
- Valor executado (Pi+R): R\$ 4.873.038,72;
- Execução Física: 65,86 %;
- Ordem de serviço: 23/04/2024;
- Previsão para conclusão: Fevereiro/2025.

Recuperação do Reservatório Prazeres/ CE



•Recuperação do Reservatório Chapéu/ PE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização do Reservatório Chapéu, no Estado de Pernambuco.


Volume de Acumulação= 188 milhões m³.

A Barragem Chapéu está localizada na bacia do rio São Francisco, tendo sido concebida com as seguintes restrições:

Ainda resta empenhar o valor de R\$ 4.048.227,95 em informações contratuais:

- **Contratos DNOCs: 62/2024 (obra) e 22/2024 (serviço)**
- TED N.º 945936/2023/MIDR ;
- Valor empenhado: R\$ 3.821.814,47;
- Valor Contratual: R\$ 7.870.042,42 (obra e serviços)
- Valor executado (Pi+R): R\$ 1.401.321,97;
- Execução Física: 29,57 %.
- Ordem de Serviço: 08/08/24
- Previsão para conclusão: Abril/2025.

Recuperação do Reservatório Chapéu/ PE



•Recuperação do Reservatório Entremontes/ PE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização de Parnamirim, no Estado de Pernambuco.

Volume de Acumulação= 339 milhões m³.

A Barragem Entremontes está localizada na baía do Estado de Pernambuco, tendo sido concebida com as seguintes restrições:

-Ainda resta empenhar o valor de R\$ 4.468.647,57; Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCs: 16/2024 (obra) e 12/2024 (serviço)**
- TED N.º 945982/2023/MIDR ;
- Valor Contratual: R\$ 8.569.863,95 (obra e serviços)
- Valor empenhado: R\$ 4.101.216,43;
- Valor executado (PI+R): R\$ 3.510.587,57;
- Execução Física: 47,61 %
- Ordem de serviço: 13/05/2024;
- Previsão para conclusão: Março/2025

Recuperação do Reservatório Entremontes/ PE



•Recuperação do Reservatório São José II/ PB

Execução das Obras de Recuperação e Moderniz

Paraíba.

Volume de Acumulação= 1,3 milhões m³.

A Barragem São José está localizada no Município
concebida com as seguintes finalidades: abastecimento hu

Restrições:

-Ainda resta empenhar o valor de R\$ 944.250,15 l

Informações Contratuais:

• **Contratos DNOCs: 23/2024 (obra) e 21/2024 (s**

• TED N.º 944556/2023/MIDR;

• Valor Contratual: R\$ 4.068.624,36 ;

• Valor empenhado: R\$ 3.124.374,21;

• Valor executado (Pi+R): R\$ 701.346,89;


• Execução Física: 20,59 %

• Ordem de serviço: 17/06/2024;

• Previsão para conclusão: Fevereiro/2025.



Recuperação do Reservatório São José II/ PB



•Recuperação do Reservatório Angicos (Arapuã)/ RN

Execução das Obras de Recuperação e Moderniz
Grande do Norte.

Volume de Acumulação= 4,29 milhões m³.

A Barragem Angicos está localizada na bacia do A
Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seg
dessedentação animal.

Restrições:

-Aplicação de sangão e distrato. Chamada da 2ª co
Informações Contratuais:

• **Contrato DNOCs: 20/2024 (obra)**

• TED N.º 945981/2023/MIDR;

• Valor empenhado: R\$1.000.000,45;

• Valor Contratual: R\$ 7.207.368,42;

• Valor executado (PI+R): R\$ 0,00;

• Execução Física: 0,00 %

• Ordem de Serviço: 08/07/2024;

• Previsão para conclusão: Fevereiro/2025.



•Recuperação do Reservatório Orós/ CE

Execução das Obras de Recuperação e Moderniza
Volume de Acumulação= 2.100 milhões m³.

A Barragem Orós está localizada na bacia do Al
Ceará, tendo sido concebida com as seguintes finalidad
animal e irrigação.


Restrições:

-Baixa execução física. Aplicação de multa ao cons
Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCs: 57/2024 (obra) e 83/2023 (s**
- TED N.º 945983/2023/MIDR
- Valor Contratual: R\$ 16.360.503,30;
- Valor empenhado: R\$ 3.265.851,00;
- Valor executado (Pi+R): R\$ 823.887,74;
- Execução Física: 5,38 %
- Ordem de serviço: 18/07/2024;
- Previsão para conclusão: Julho/2025.



Recuperação do Reservatório Orós/ CE



•Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/ RN

Execução das Obras de Recuperação e Moderniz
do Rio Grande do Norte.

Volume de Acumulação= 54,85 milhões m³.

A Barragem Pau dos Ferros está localizada no rio
do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seg
dessementação animal.

Valor da proposta vencedora: R\$ 39.706.561,36 (/


TED N.º 945935/2023/MIDR

Prazo para execução: 16 meses;

Intervenções previstas:

- Recuperação dos Taludes, coroamento e canais
- Recuperação e fornecimento de equipamentos l
- Novo sistema de Derivação;
- Automação da barragem;
- Instalação de estação meteorológica e medidor
- Instalações Elétricas e SPDA.

Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/ RN



Remanejamento de empenho

Iniciamos as providências para a devolução do crédito, por realizado o remanejamento o mais rápido possível para ev

De		Nº TED		Valor	
		945983/2023 - Orós		R\$	6.969.286,00
		945981/2023 - Angicos		R\$	2.351.767,00
					945937/
					944556/
					945936/
		Total		R\$	9.321.053,00



OBRIGADO!

Luiz Hernani de Carvalho Junior
Diretor de Infraestrutura do DNOCs
hernani.junior@dnocs.gov.br
85 3391-5276



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

UNIÃO E
