




DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RESERVATÓRIOS ESTRATÉGICOS

Mapa dos Reservatórios Estratégicos do PISF– DNOCS

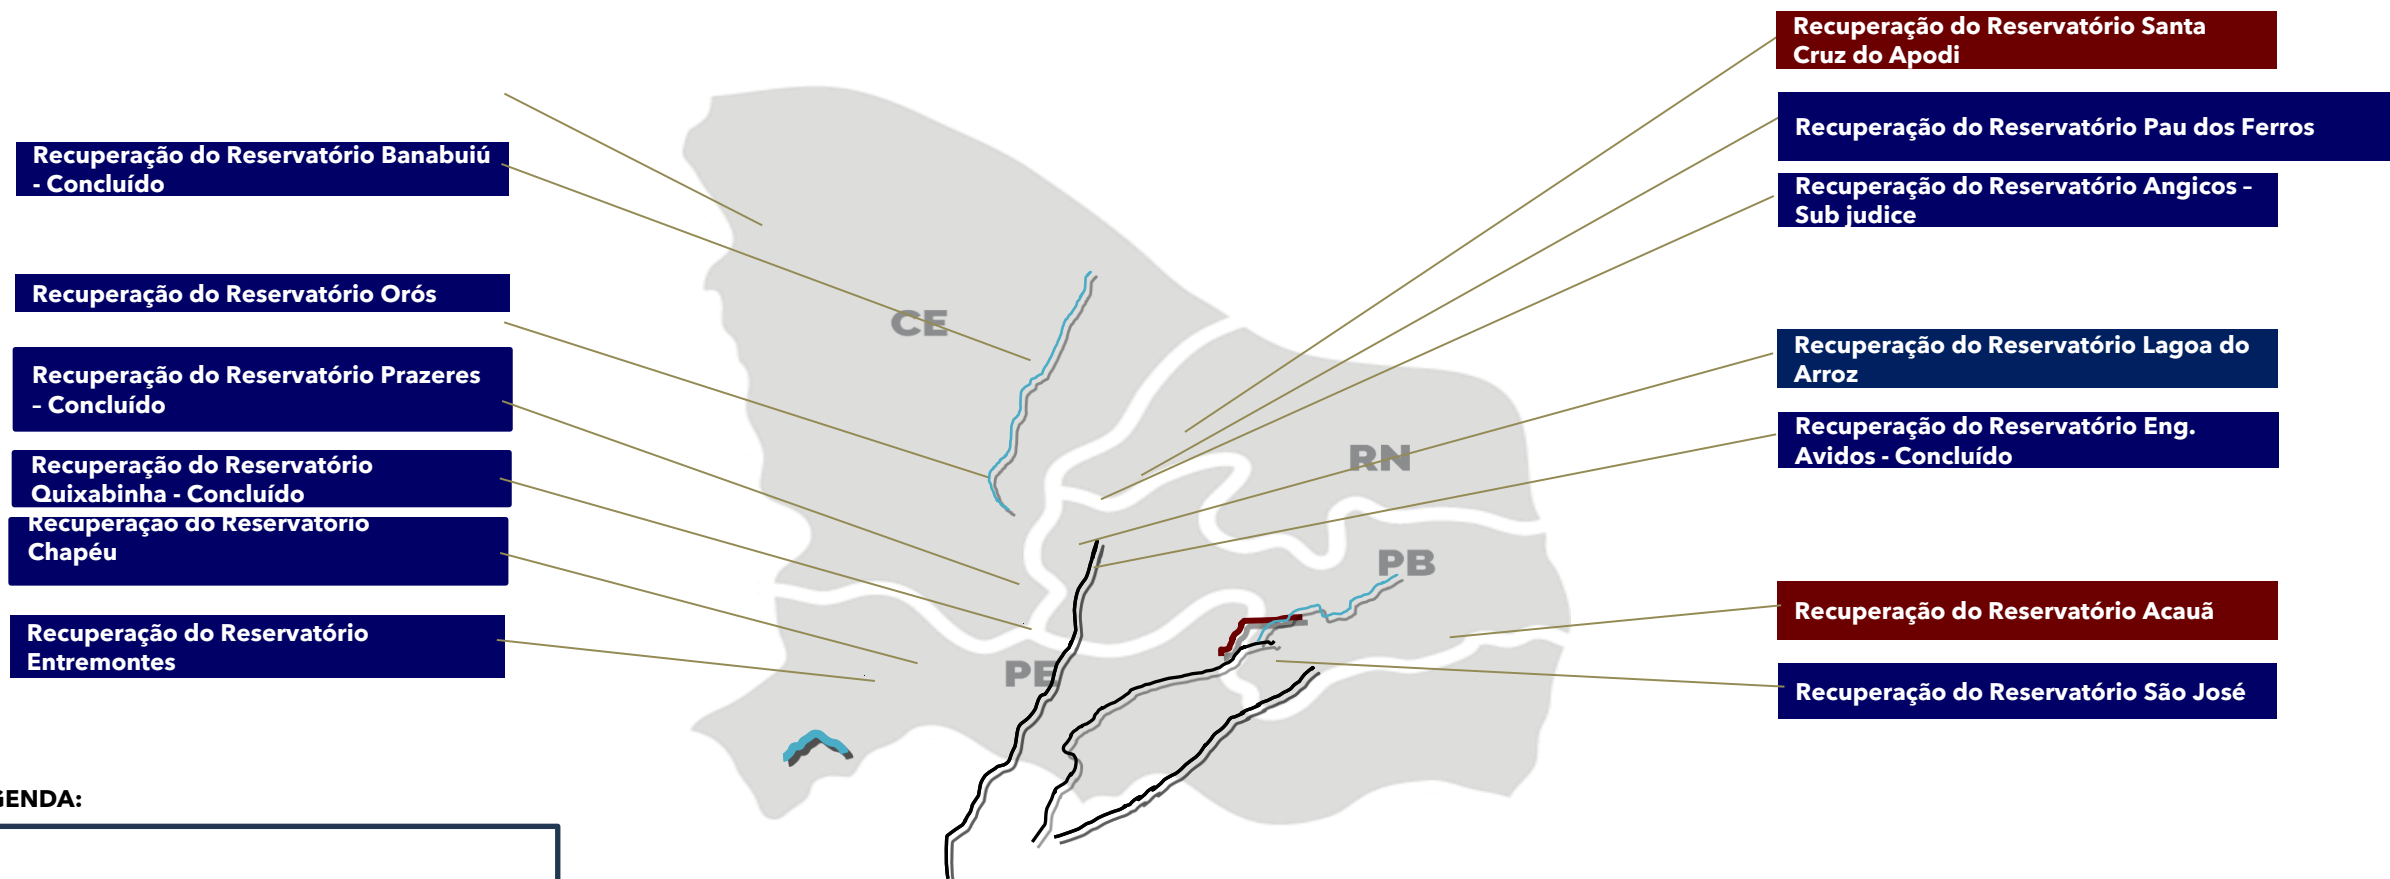

LEGENDA:

 EM AÇÃO PREPARATÓRIA

 EM EXECUÇÃO

• Recuperação do Reservatório Prazeres/ CE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Prazeres, no Município de Barro, no Estado do Ceará.

Volume de Acumulação= 32,5 milhões m³.

A barragem tem finalidades múltiplas, sendo a principal o abastecimento d'água do município de Barro, beneficiando 22.758 pessoas.

A intervenção visa garantir a automação do sistema e gestão integrada do PISF, bem como o abastecimento, perenização do rio Jaguaribe; irrigação do Médio e Baixo Jaguaribe; piscicultura; culturas agrícolas de áreas de montante; turismo e aproveitamento hidrelétrico.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 05/2024 (obra) e 06/2023 (supervisão)**
- TED N.º 945937/2023/MIDR ;
- Valor Contratual: R\$ 8.223.218,53 (obra e supervisão);
- Execução Física: 100 %;
- Ordem de serviço: 23/04/2024;
- Aguardando descentralização de recursos para reforçar o empenho da obra e, posterior, certificação da medição final da obra.



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



Recuperação do Reservatório Prazeres/ CE



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



• Recuperação do Reservatório Quixabinha/ CE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Quixabinha, no Município de Mauriti, no Estado do Ceará.

Volume de Acumulação= 31 milhões m³.

A barragem tem finalidades múltiplas, sendo a principal o abastecimento d'água do município de Mauriti e o Perímetro irrigado Quixabinha, beneficiando 45.500 pessoas.

A intervenção visa garantir a automação do sistema e gestão integrada do PISF, bem como o abastecimento, perenização do rio Jaguaribe; irrigação do Médio e Baixo Jaguaribe; piscicultura; culturas agrícolas de áreas de montante; turismo e aproveitamento hidrelétrico.

Informações Contratuais:


- **Contratos DNOCS: 104/2023(obra) e 85/2023/2023(supervisão)**
- TED N.º 944558/2023/MIDR
- Valor Contratual: R\$ 8.958.668,36 (obra e supervisão);
- Execução Física: 100,00 %;
- Ordem de serviço: 08/03/2024;
- Obra inaugurada.



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



Recuperação do Reservatório Quixabinha/ CE



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



• Recuperação do Reservatório Chapéu/ PE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Chapéu, no Município de Parnamirim, no Estado de Pernambuco.

Volume de Acumulação= 188 milhões m³.

A Barragem Chapéu está localizada na bacia do Brígida-SF, Município de Parnamirim, Estado de Pernambuco, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Restrições:

A Contratada foi notificada devido ao atraso no cronograma de execução da obra e a paralisação total dos serviços sem a devida autorização do DNOCS. Ações de cunho administrativo estão em curso, visando aplicação de sanções.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 62/2024 (obra) e 22/2024 (supervisão)**
- TED N.º 945936/2023/MIDR ;
- Valor empenhado: R\$ 7.695.072,42;
- Valor Contratual: R\$ 7.870.042,42 (obra e supervisão);
- Valor executado (Pi+R): R\$ 2.410.055,36 (obra e supervisão);
- Execução Física: 32,39 %.
- Ordem de Serviço: 08/08/24
- Previsão para conclusão: Novembro/2025(*).



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



Recuperação do Reservatório Chapéu/ PE



• Recuperação do Reservatório Entremontes/ PE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Entremontes, no Município de Parnamirim, no Estado de Pernambuco.

Volume de Acumulação= 339 milhões m³.

A Barragem Entremontes está localizada na bacia do Brígida-SF, Município de Parnamirim, Estado de Pernambuco, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Restrições:

A Contratada foi notificada devido ao atraso no cronograma de execução da obra e a paralisação total dos serviços sem a devida autorização do DNOCS. Atualmente, a Comissão de Fiscalização acompanha e avalia de forma rigorosa a performance da empresa, especialmente após a notificação, a fim de restabelecer e acompanhar fielmente o cronograma físico-financeiro previsto, sob pena de adoção das sanções administrativas cabíveis.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 16/2024 (obra) e 12/2024(supervisão)**
- TED N.º 945982/2023/MIDR ;
- Valor Contratual: R\$ 8.569.863,95 (obra e supervisão);
- Valor empenhado: R\$ 8.816.680,83;
- Valor executado (Pi+R): R\$ 4.451.069,09;
- Execução Física: 53,45 %
- Ordem de serviço: 13/05/2024;
- Previsão para conclusão: Novembro/2025(*)



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



Recuperação do Reservatório Entremontes/ PE



• Recuperação do Reservatório São José II/ PB

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem São José II, no Estado da Paraíba.

Volume de Acumulação= 1,3 milhões m³.

A Barragem São José está localizada no Município de Monteiro, Estado da Paraíba, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal..

Restrições:

- Ainda resta empenhar o valor de R\$ 944.250,15 para garantir a execução contratual.
- Obras paralisadas aguardando definição do cronograma de suspensão do bombeamento do PISF

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 23/2024 (obra) e 21/2024 (supervisão)**
- TED N.º 944556/2023/MIDR;
- Valor Contratual: R\$ 4.068.624,36 ;
- Valor empenhado: R\$ 4.068.018,62;
- Valor executado (Pi+R): R\$ 956.005,26;
- Execução Física: 20,59 %
- Ordem de serviço: 17/06/2024;
- Previsão para conclusão: Novembro/2025(*).



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



Recuperação do Reservatório São José II/ PB



• Recuperação do Reservatório Angicos (Arapuá)/ RN

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte.

Volume de Acumulação= 4,29 milhões m³.

A Barragem Angicos está localizada na bacia do Apodi, Município de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Restrições: Renovação da Licença Ambiental

Informações Contratuais:

- **Contrato DNOCS: 01/2026 (obra)**
- Valor empenhado: R\$ 4.010.062,87;
- Valor Contratual: R\$ 9.784.698,21;
- Valor executado (Pi+R): R\$ 0,00;
- Execução Física: 0,00 %
- Ordem de Serviço - Marcado: 10/02/2026;



• Recuperação do Reservatório Orós/ CE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Orós, no Estado do Ceará.
Volume de Acumulação= 2.100 milhões m³.

A Barragem Orós está localizada na bacia do Alto Jaguaribe, Município de Orós, Estado do Ceará, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano, dessedentação animal e irrigação.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 57/2024 (obra) e 83/2023 (supervisão)**
- TED N.º 945983/2023/MIDR
- Valor Contratual: R\$ 16.360.503,30;
- Valor empenhado: R\$ 16.916.409,06;
- Valor executado (Pi+R): R\$ 8.139.898,38;
- Execução Física: 85,03 %;
- Ordem de serviço: 18/07/2024;
- Previsão para conclusão: março/2026.

Recuperação do Reservatório Orós/ CE



MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



- **Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/ RN**

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Pau dos Ferros, no Estado do Rio Grande do Norte.


Volume de Acumulação= 54,85 milhões m³.

A Barragem Pau dos Ferros está localizada no rio Apodi, Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 66/2024 (obra)**
- TED N.º 945935/2023/MIDR
- Valor Contratual: R\$ 16.360.503,30;
- Valor empenhado: R\$ 8.602.642,98;
- Valor executado (Pi+R): R\$ 7.574.525,10*;
- Execução Física: 67,631 %;
- Ordem de serviço: 18/07/2024;
- Previsão para conclusão: julho/2026;

Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/ RN

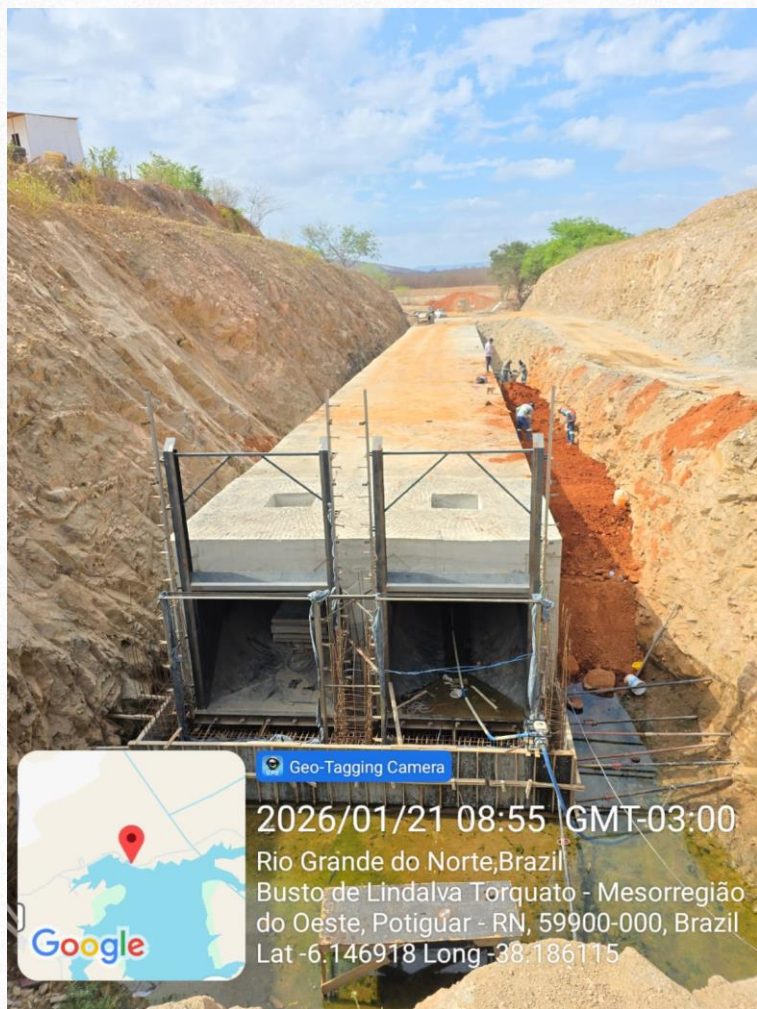

Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz/ PB

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Lagoa do Arroz, no Estado da Paraíba.

Volume de Acumulação= 54,85 milhões m³.

A Barragem Pau dos Ferros está localizada no rio Apodi, Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 22/2025 (obra)**
- TED N.º 945935/2023/MIDR
- Valor Contratual: R\$ 7.611.851,65;
- Execução Física: 29,84 %;
- Ordem de serviço nº 23/2025: 10/11/2025;
- Previsão para conclusão: outubro/2026;

Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz/ RN





OBRIGADO!

Luiz Hernani de Carvalho Junior
Diretor de Infraestrutura do DNOCS
hernani.junior@dnocs.gov.br
85 3391-5276
