




**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS**

**RESERVATÓRIOS
ESTRATÉGICOS**

Mapa dos Reservatórios Estratégicos do PISF– DNOCS

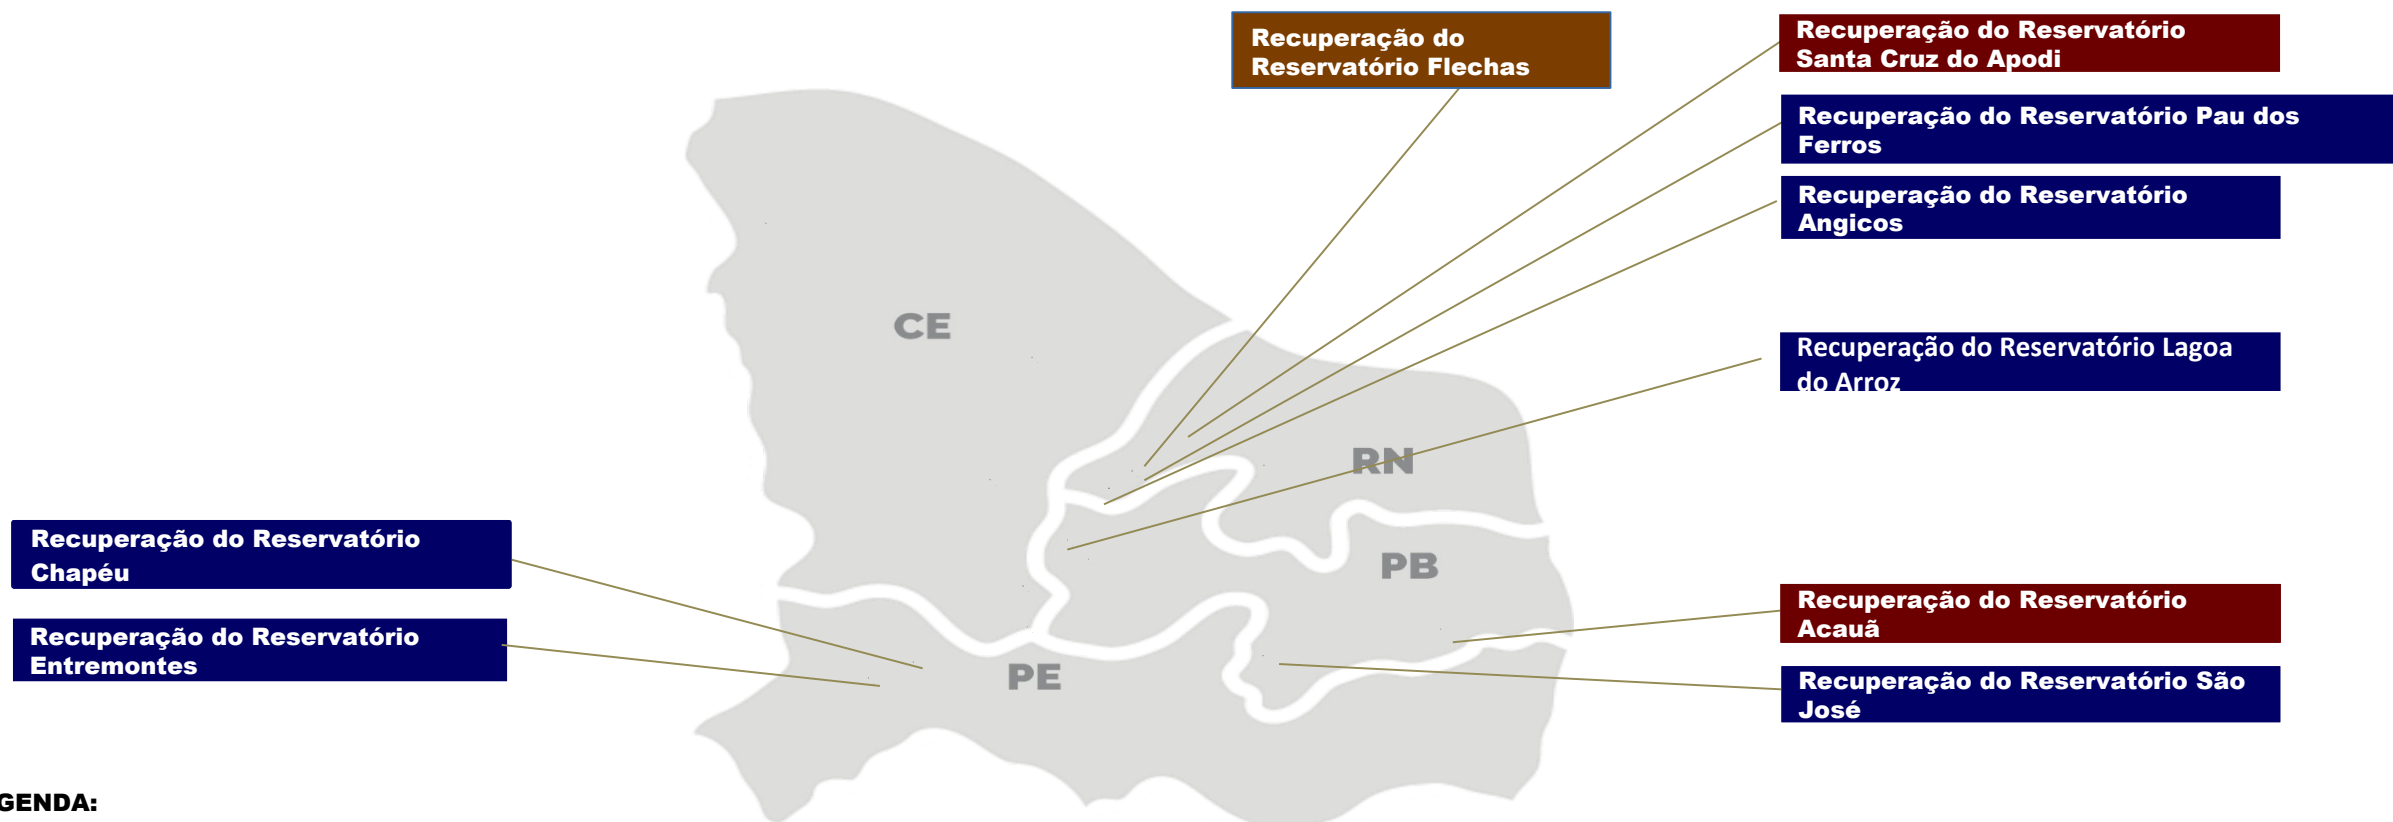

LEGENDA:

EM AÇÃO PREPARATÓRIA

EM EXECUÇÃO

• Recuperação do Reservatório Chapéu/ PE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Chapéu, no Município de Parnamirim, no Estado de Pernambuco.

Volume de Acumulação= 188 milhões m³.

A Barragem Chapéu está localizada na bacia do Brígida, Município de Parnamirim, Estado de Pernambuco, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

A Contratada foi notificada devido ao atraso no cronograma de execução da obra. Está em trâmite um aditivo de readequação contratual.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 62/2024 (obra) e 22/2024 (supervisão)**
- TED N.º 945936/2023/MIDR ;
- Valor Contratual: R\$ 7.870.042,42 (obra e supervisão);
- Execução Física: 34,42 %.
- Ordem de Serviço: 08/08/24
- Previsão para conclusão: **out/2026.**

Recuperação do Reservatório Chapéu/ PE



• Recuperação do Reservatório Entremontes/ PE

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Entremontes, no Município de Parnamirim, no Estado de Pernambuco.

Volume de Acumulação= 339 milhões m³.

A Barragem Entremontes está localizada na bacia do Brígida-SF, Município de Parnamirim, Estado de Pernambuco, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Restrições:

A Contratada foi notificada devido ao atraso no cronograma de execução da obra. Está em trâmite um aditivo de readequação contratual.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 16/2024 (obra) e 12/2024(supervisão)**
- TED N.º 945982/2023/MIDR ;
- Valor Contratual: R\$ 8.569.863,95 (obra e supervisão);
- Execução Física: 55,80 %
- Ordem de serviço: 13/05/2024;
- Previsão para conclusão: **out/2026**

Recuperação do Reservatório Entremontes/ PE



• Recuperação do Reservatório São José II/ PB

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem São José II, no Estado da Paraíba.

Volume de Acumulação= 1,3 milhões m³.

A Barragem São José está localizada no Município de Monteiro, Estado da Paraíba, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Restrições:

- As obras foram retomadas.

Informações Contratuais:

- **Contratos DNOCS: 23/2024 (obra) e 21/2024 (supervisão)**
- TED N.º 944556/2023/MIDR;
- Valor do Contrato: R\$ 3.406.018,62;
- Execução Física: 20,59 %
- Ordem de serviço: 17/06/2024;
- Previsão para conclusão: **out/2026.**

Recuperação do Reservatório São José II/ PB



• Recuperação do Reservatório Angicos (Arapuá)/ RN

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte.

Volume de Acumulação= 4,29 milhões m³.

A Barragem Angicos está localizada na bacia do Apodi, Município de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

O projeto está sendo adequado em função das condicionantes verificadas *In loco*

- Informações Contratuais:
- **Contratos DNOCS: 01/2024;**
- TED N.º 945981/2023/MIDR
- Valor do Contrato: R\$ 9.784.698,21;
- Ordem de serviço: 25/02/2026;
- Avanço físico: 11,98%
- Previsão para conclusão: **dezembro/2026.**

Recuperação do Reservatório Angicos (Arapuá)/ RN



• Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/ RN

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Pau dos Ferros, no Estado do Rio Grande do Norte.

Volume de Acumulação= 54,85 milhões m³.

A Barragem Pau dos Ferros está localizada no rio Apodi, Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Valor do contrato: R\$ 39.706.561,36;

TED N.º 945935/2023/MIDR;

O.S assinada em 11/12/2024

Recuperação dos Taludes, coroamento e canais de restituição do vertedouro;

- Implantação dos equipamentos hidromecânicos na Tomada D'água suplementar;
- Novo sistema de Derivação;
- Automação da barragem;
- Execução Física: 79,07 %;
- Prazo para conclusão: **Outubro/2026.**

Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/ RN



29/07/2026
24M 590110 9320590
Pau Dos Ferros RN
59900-000
Brasil

Recuperação do Reservatório Santa Cruz do Apodi/ RN

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Santa Cruz do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte.

Volume de Acumulação= 599,712 milhões m³.

A Barragem Santa Cruz do Apodi está localizada no rio Apodi-Mossoró, Município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

- Valor do orçamento: R\$ 17.930.629,71;
- TED N.º 945984/2023-SNSH/MIDR
- Prazo para execução: 12 meses;
- Recuperação do paramento de jusante e canal de restituição do vertedouro;
- Implantação dos equipamentos hidromecânicos na Tomada D'água suplementar;
- Novo sistema de Derivação;
- Automação da barragem;
- Processo Licitatório realizado através do Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e concluído com homologação do vencedor do certame, cuja proposta apresentada perfaz o valor de R\$ 14.552.078,5672 .

Recuperação do Reservatório Santa Cruz do Apodi/ RN



Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz/ PB

Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Lagoa do Arroz, no Estado da Paraíba
Volume de Acumulação= 54,85 milhões m³.

A Barragem Lagoa do Arroz está localizada no rio Cacaré, Município de Cajazeiras, Estado da Paraíba, tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

- Valor da obra: R\$ 7.611.851,65;
- TED N.º 945938/2023-SNSH-MIDR.
- Contrato DNOCS n.º 22/2025
- Prazo para execução: 10 meses;
- Recuperação dos Taludes, coroamento e canais de restituição do vertedouro;
- Implantação dos equipamentos hidromecânicos;
- Automação da barragem;
- Avanço físico: 58,56%
- Prazo para conclusão: out/2026.

Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz/ PB



Recuperação do Reservatório Flechas/ RN

Volume de Acumulação= 8,95 milhões m³.

A Barragem Flechas está localizada no rio Flechas, Município de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte tendo sido concebida com as seguintes finalidades: abastecimento humano e dessedentação animal.

Ações em andamento:

- Detalhamento do projeto executivo;
- Quantificação dos quantitativos;
- Preparação do acervo documental, visando início do processo licitatório.
- Valor estimado para execução dos serviços: 7 milhões de reais.



OBRIGADO!

Luiz Hernani de Carvalho Junior

Diretor de Infraestrutura do DNOCS

hernani.junior@dnocs.gov.br

85 3391-5276
