


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

MAIO / 2019

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Alocação de Água -
26/07/2018 - Picos-PI

O MONITORAMENTO
DAS CONDIÇÕES DA
ALOCAÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO GESTORA
DA BARRAGEM DE
BOCAINA

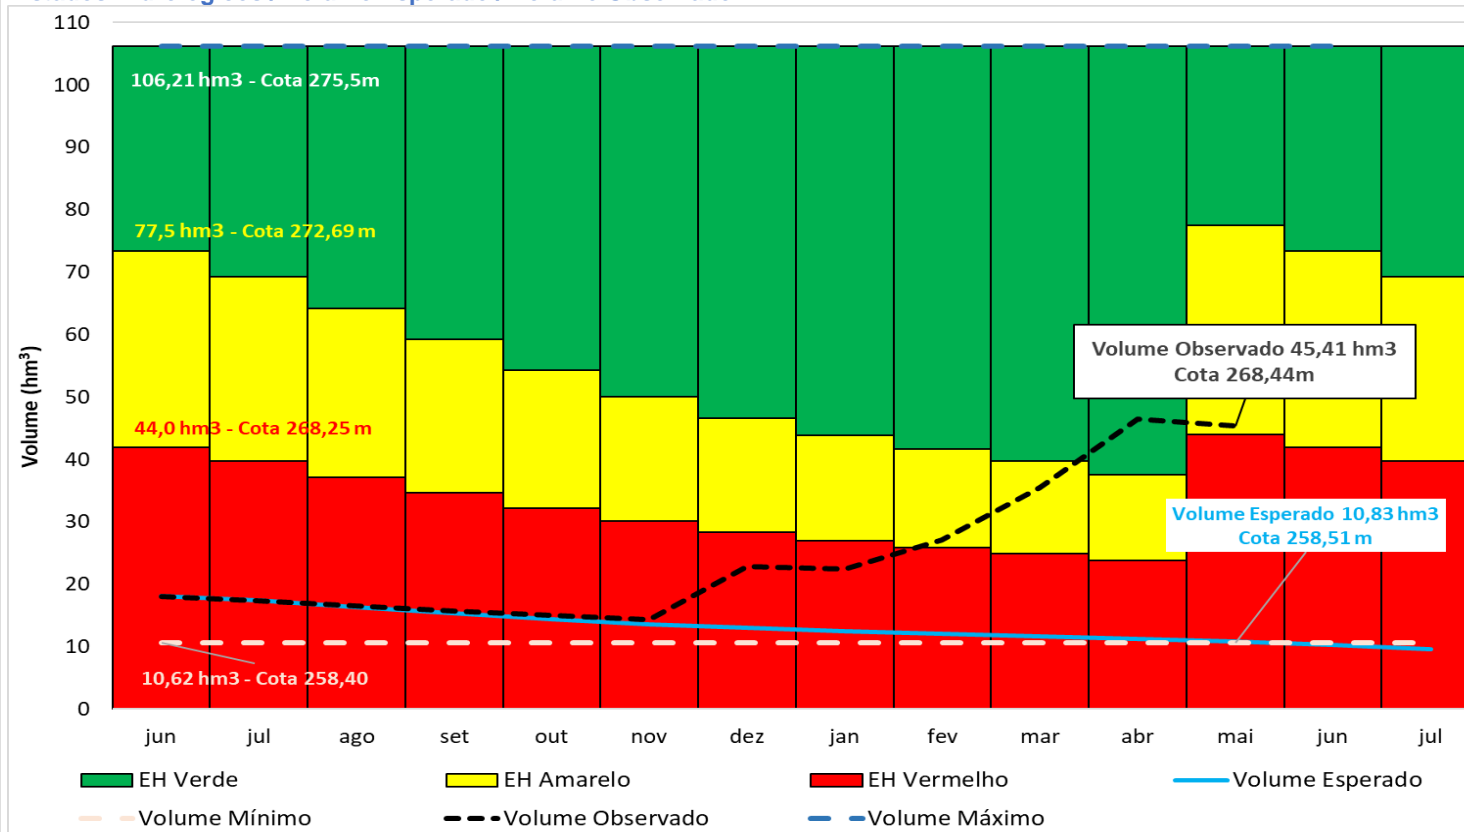

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
jul/18	17,38	17,40	dez/18	12,99	22,84	mai/19	10,83	45,41
ago/18	16,37	16,52	jan/19	12,50	22,48	jun/19	10,25	
set/18	15,39	15,71	fev/19	12,10	27,06	jul/19	9,60	
out/18	14,43	14,98	mar/19	11,71	35,47			
nov/18	13,63	14,37	abr/19	11,31	46,45			

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

MAIO / 2019

Alocação de Água -
26/07/2018 - Picos-PI

O MONITORAMENTO
DAS CONDIÇÕES DA
ALOCÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO
GESTORA DA
BARRAGEM DE
BOCAINA

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras
especiais - Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigação entorno Bocaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos jusante até riacho dos Cabaços	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Perenização até riacho dos Cabaços														
Usos riacho dos Cabaços até rio Itaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização riacho dos Cabaços até rio Itaim														
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Usos Observados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Irrigação entorno Bocaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Usos jusante até riacho dos Cabaços	SI	75	209	150	0	0	0	0	0	0	0			43
Perenização até riacho dos Cabaços														
Usos riacho dos Cabaços até rio Itaim	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
Perenização riacho dos Cabaços até rio Itaim														
Total	0	75	209	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43

SI - Sem Informação

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

MAIO / 2019

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas do açude	ANA	Diária			
1.2	Medição da vazão defluente (cota da estação fluviométrica a jusante do açude)	DNOCS	Semanal			
2	Instrumentação					
2.1	Recuperação emergencial da válvula dispersora a jusante do açude	DNOCS	Imediato	OBS 1		
2.2	Recuperação completa dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS	2018		OBS 1	
3	Regulação dos Usos					
3.1	Publicação do Marco Regulatório MR	ANA / SEMAR-PI	2018		OBS. 4	
3.2	Regularização dos usuários	ANA / SEMAR-PI	180 dias após a publicação do MR			
4	Outras Ações					
4.1	Recuperação da via sobre a barragem visando evitar a continuidade da erosão oriunda de águas pluviais na ombreira direita	DNOCS / Pm de Bocaina	Imediato		OBS 1	
4.2	Ações para proibição do tráfego de motocicletas no talude da barragem, causa de erosão inicial no maciço	DNOCS/SEMAR-PI/Comissão Gestora	Imediato			OBS 2
4.3	Relato sobre a situação da adutora do SIAA Bocaina	SEMAR-PI	Agosto de 2018	OBS 3		

Observações:

- 1) A válvula foi recuperada emergencialmente no início de agosto. Em 10/12/2018 foram iniciados os Serviços de Recuperação da Barragem. A válvula encontra-se fechada desde 07/12/2018. Em 22/04/19 o DNOCS informou que a execução estava em 50,73% e solicitou à ANA aditivo ao TED para serviços adicionais. A ANA informou que não há recursos disponíveis. Não houve avanço significativo em maio.
- 2) Não há informações a respeito da realização desta atividade.
- 3) Segundo informações do DRH/SEMAR/PI, o projeto do Sistema Adutor Bocaina/Piaus está 70% executado e parado desde junho de 2015. Em 04/04/2019 o DRH enviou planilha com valores necessários para a conclusão das obras. Aditivo ao contrato está em análise pela Caixa Econômica Federal.
- 4) Aguardando manifestação da SEMAR-PI
