

julho de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

INGAZEIRA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCÇÃO

VENTUROSA  
LOCAL


PE  
UF

17/12/2019  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE INGAZEIRA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

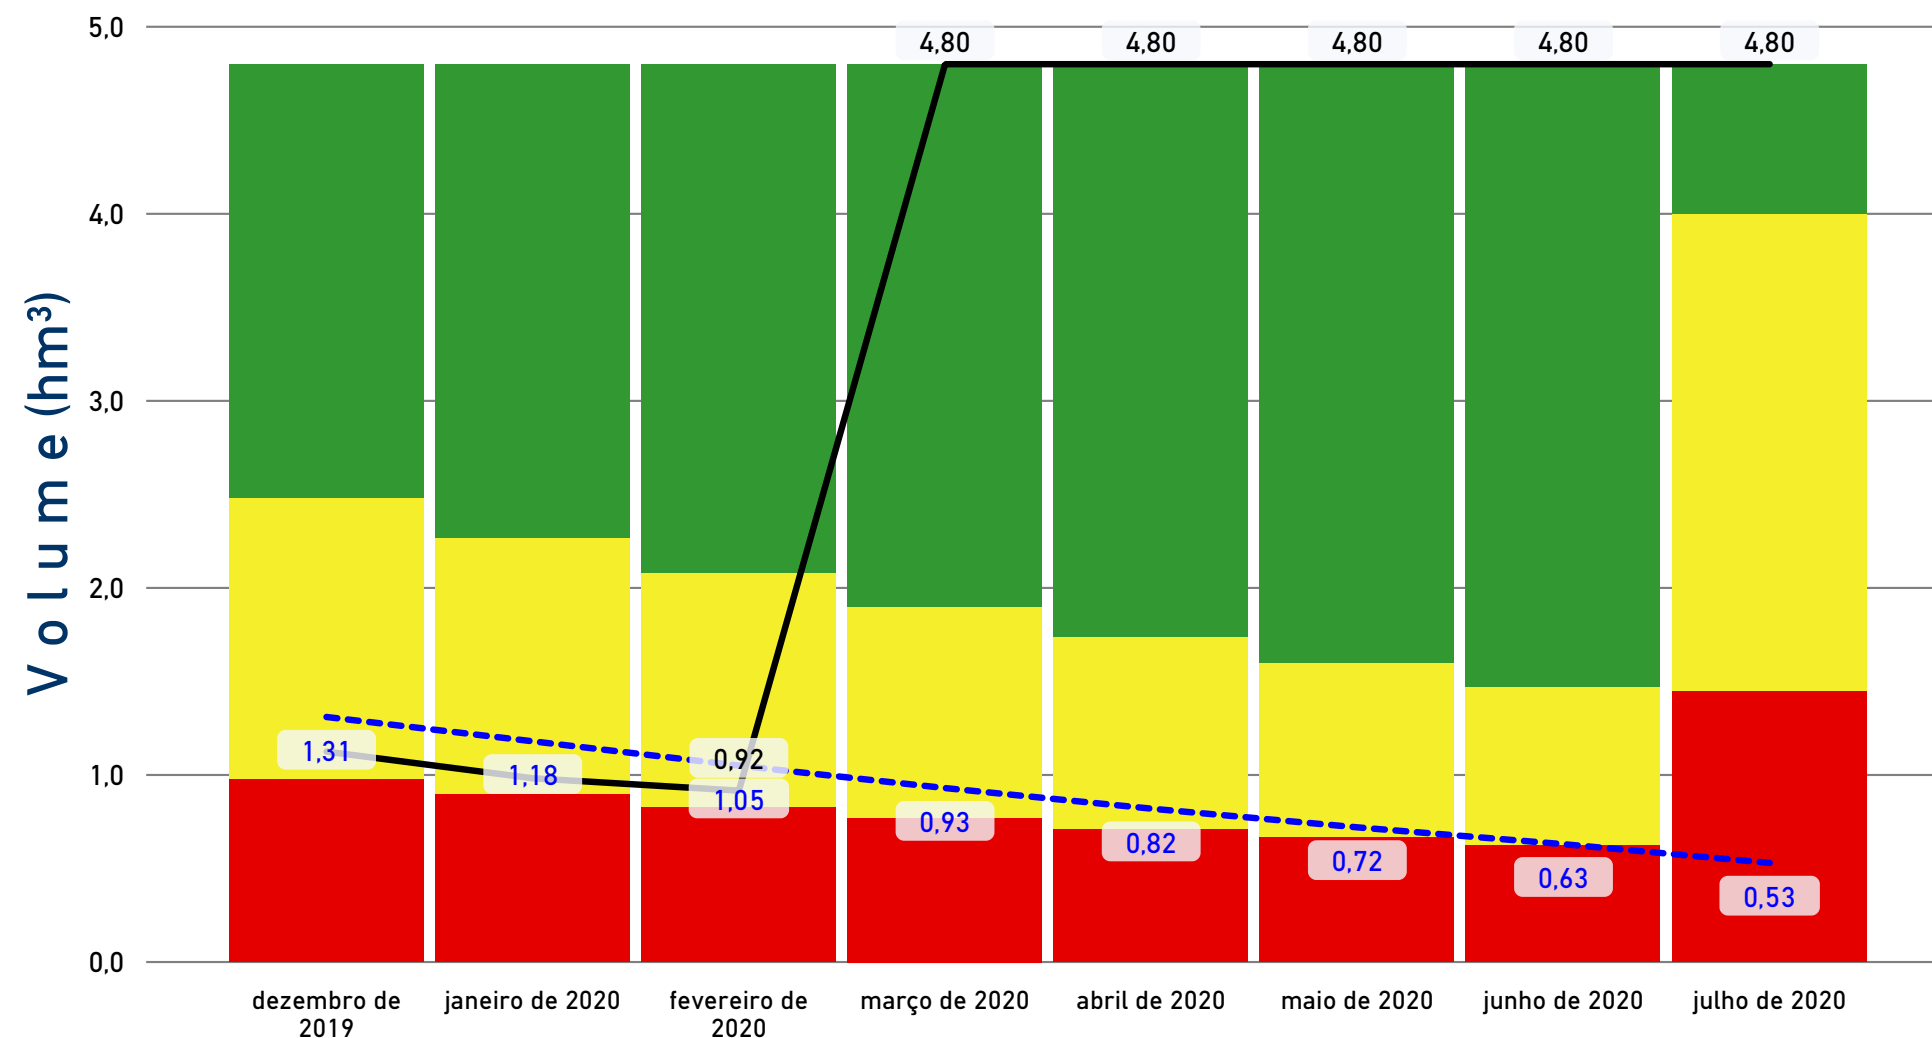

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
dezembro de 2019	475,80	1,31	475,42	1,12
janeiro de 2020	475,54	1,18	475,14	0,98
fevereiro de 2020	475,29	1,05	475,01	0,92
março de 2020	475,05	0,93	480,13	4,80
abril de 2020	474,65	0,82	480,33	4,80
maio de 2020	474,23	0,72	480,25	4,80
junho de 2020	473,85	0,63	480,24	4,80
julho de 2020	473,43	0,53	480,21	4,80

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)

— VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

INGAZEIRA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCÇÃO

VENTUROSA  
LOCAL

PE  
UF

17/12/2019  
DATA DA REUNIÃO



## CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020	julho de 2020
Abastecimento Venturosa (COMPESA)	29,89	29,89	29,89	29,89	29,89	29,89	29,89	29,89
Caminhões pipa	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Irrigação no entorno	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perenização a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39

## CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020	julho de 2020
Abastecimento Venturosa (COMPESA)	39,52	28,11	30,32	31,04	30,33	31,35	30,37	34,03
Caminhões pipa	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Irrigação no entorno								
Perenização a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42,86	31,45	33,66	34,38	33,67	34,69	33,71	37,37

### LEGENDA



SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

18/08/2020

julho de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

INGAZEIRA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

VENTUROSA  
LOCAL

PE  
UF

17/12/2019  
DATA DA REUNIÃO



It...	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do açude	Diária	ANA		
1.2	Reunião com associação de irrigantes para informar a área máxima de irrigação de 1 (um) hectare por parcela	jan-20	CONSU		
1.3	Reunião com caminhões-pipa para cadastrar e informar sobre limite de 48 caminhões de 6m³ por dia	dez-19	CONSU e PM Venturosa		CONSU e Prefeitura não informaram sobre a realização dessa reunião.
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de réguas no açude de forma a garantir o monitoramento	Imediato	APAC		
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Cadastro de usuários no entorno do açude	A depender do reenchimento do açude - 2º semestre de 2020	ANA		Tema a ser discutido na reunião de alocação.
3.2	Minuta de marco regulatório (regras e limites para os usos no reservatório - MR)	2020	ANA/APAC		Tema a ser discutido na reunião de alocação.
3.3	Regularização dos usos	180 dias após a publicação do MR	Usuários do sistema hídrico		Tema a ser discutido na reunião de alocação.
3.4	Fiscalização dos usuários no açude e no rio Pajeú a jusante	Contínua	ANA		
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Registro da reunião de Alocação	30 dias após a publicação do TAA	CONSU e APAC		Ação importante para dar segurança jurídica ao Termo de Alocação.
4.2	Limpeza das margens do açude junto ao paredão da barragem	Imediato	PM Venturosa		Não há registro sobre a realização dessa atividade.
4.3	Relatório sobre funcionamento do sistema de esgotamento sanitário de Venturosa	jan-20	COMPESA		COMPESA encaminhou a Nota Técnica sobre o sistema de esgotamento doméstico de Venturosa em 18 de março de 2020.
4.4	Conclusão de sistema alternativo de abastecimento público para Venturosa	jun-20	COMPESA		COMPESA informa que essa ação ainda não foi concluída, estando em andamento.
4.5	Regularização da captação para as comunidades Ingazeira, Ouro Branco e Amarelo	Imediato	FUNASA - PE		
4.6	Vistoria da adutora para verificação de perdas no trajeto do açude a Venturosa	dez-19	COMPESA		COMPES informa ter incorporado à rotina da unidade na cidade a vistoria constante da adutora
4.7	Batimetria a partir dos estudos do PE - 3D	jun-20	APAC		APAC informa: capacidade igual a 3,24 hm3 à cota de sangria (480 m).

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

## LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

18/08/2020

julho de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

INGAZEIRA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

VENTUROSA  
LOCAL

PE  
UF

17/12/2019  
DATA DA REUNIÃO



## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Adilson Leonildo Bezerra	Igreja Católica - Paróquia São José	(87) 99119-7843 / (87) 3833-1554
Adrielle Castilho Nunes	CPRH	(87) 98102-7518
Antônio Veríssimo da Silva	STR - Venturosa	(87) 99153-5328 / (87) 3833-1169
Charlton Hendrickson	Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos	(81) 3184-3737
Cícera Gomes da Silva	Associação de Moradores e Agricultores de Pedra Fiche	(87) 99129-2486
Eraldo Tenório Bezerra	ADAGRO	(87) 99127-1558 / (87) 3833-4002
Eriberto Monteiro Cavalcanti Sobrinho	Camara Municipal de Venturosa	(87) 3833-1209
Heriberto Américo de Freitas	IPA - Venturosa	(87) 99127-5556 / (87) 3833-4014
Josenildo Ferreira de Araújo	Colônia de Pescadores Z-24 - Venturosa	(87) 99131-3823
Marcus Vinicius de Sousa (Coordenador)	Secretaria de Saúde	(87) 99163-9047 / (87) 3833-1907
Telma de Brito Almeida	STR - Pedra	(87) 99935-0264 / (87) 3833-1169

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

18/08/2020
