





**ACOMPANHAMENTO – 01/04/2025**

Dir. Operações

# Aprender Conectado – Acompanhamento\* 01/04/2025



	NORTE	NORDESTE	CENTRO OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
 REDE EXTERNA	1.142	2.084	92	237	386	<b>3.941</b>
 REDE INTERNA	4.066	510	43	52	75	<b>4.746</b>
 GERADOR SOLAR	503		2	-	-	<b>505</b>
 ESCOLAS CONCLUÍDAS	818	296	36	38	52	<b>1.240</b>

(\*) Inclui Piloto, Fase 2-3 e Fase 4.1

# Rede Externa – Acompanhamento 01/04/2025




3.941 Escolas Conectadas | 91% Fibra | Velocidade Média de 223 Mbps

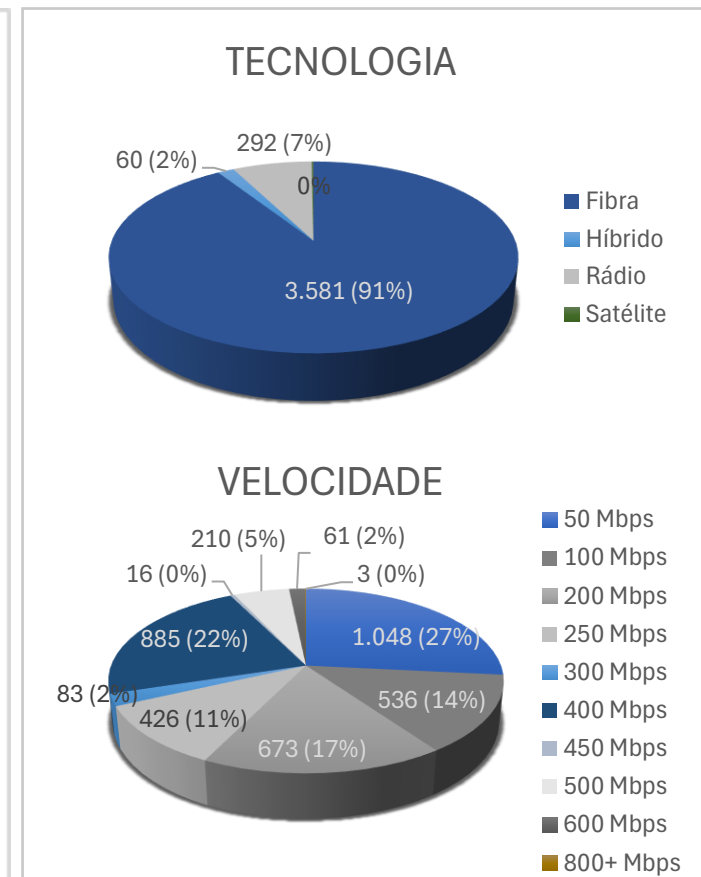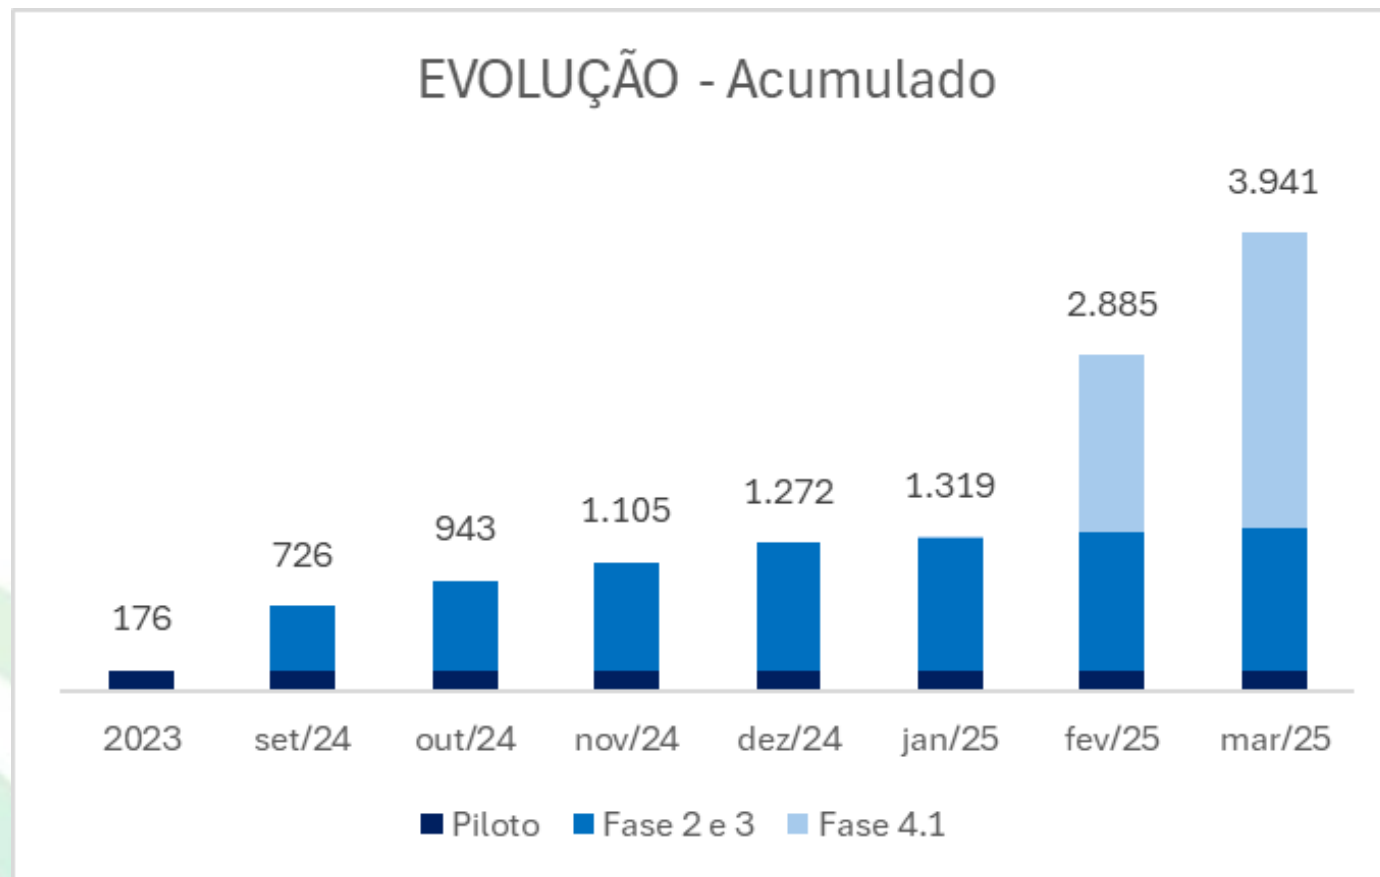

# Rede Interna – Acompanhamento 01/04/2025

 4.746 Wi-Fi Instalados

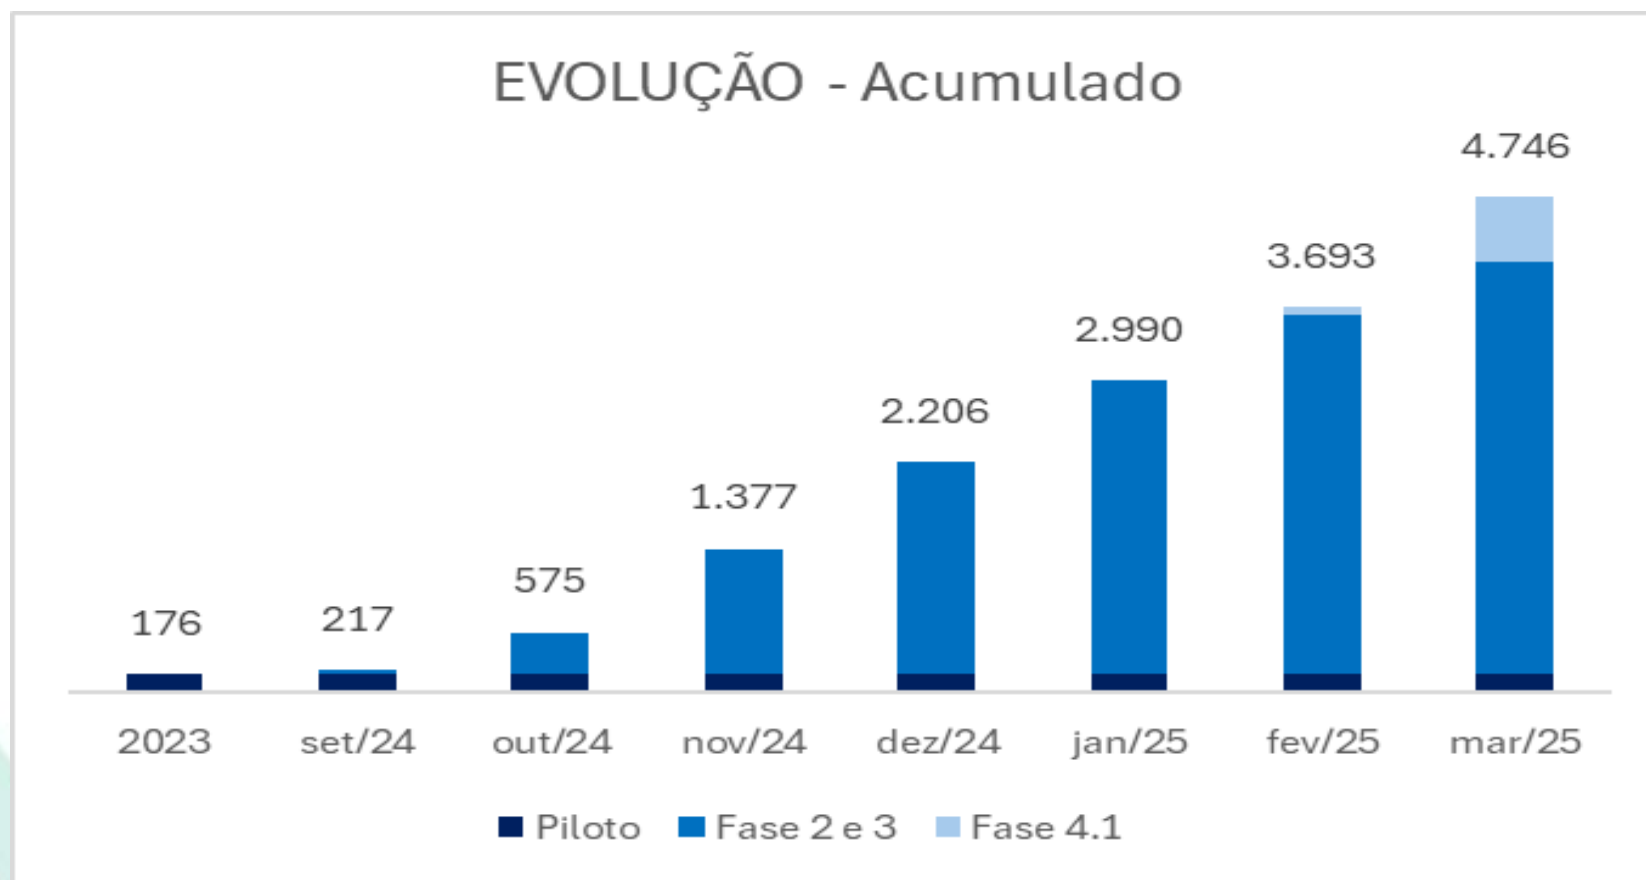



# Fases 2 e 3 – Acompanhamento 01/04/2025

UF	Rede Externa [terrestre] ▢			Rede Interna ▢			Gerador Solar ▢		
	Escolas	Concluídas		Escolas	Infraestrutura Concluída		Escolas	Concluídas	
AC	128	84	68%	585	236	42%	166	94	77%
AM	299	220	75%	1.678	1.208	73%	776	170	23%
AP	9	9	100%	72	70	99%	18	14	100%
BA	164	85	52%	164	159	98%	32		
MA	204	181	98%	217	196	99%	5	-	-
PA	894	549	62%	2.133	1.939	92%	263	217	93%
RR	127	91	72%	227	149	66%	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.825</b>	<b>1.219</b>	<b>68%</b>	<b>5.076</b>	<b>3.957</b>	<b>79%</b>	<b>1.260</b>	<b>503</b>	<b>44%</b>

% exclui desativadas, retiradas do escopo e/ou atendidas por outro programa

Total Escolas Rede Externa atualizado pela viabilidade/inviabilidade de atendimento por meio terrestre

# Fases 4.1 – Acompanhamento 01/04/2025

REGIÃO	Rede Externa [terrestre] 			Rede Interna 			Gerador Solar		
	Escolas	Concluídas		Escolas	Infraestrutura Concluída		Escolas	Concluídas	
CENTRO-OESTE	132	54	42%	245	5	2%	-	-	-
NORDESTE	6.079	1.759	29%	6.093	97	2%	19		
NORTE	502	148	30%	1.442	385	27%	146		
SUDESTE	1.013	339	34%	1.568	29	2%	4	-	-
SUL	744	186	26%	1.158	22	2%	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.470</b>	<b>2.486</b>	<b>30%</b>	<b>10.506</b>	<b>538</b>	<b>5%</b>	<b>169</b>		

% exclui desativadas, retiradas do escopo e/ou atendidas por outro programa

Total Escolas Rede Externa atualizado pela viabilidade/inviabilidade de atendimento por meio terrestre

# Pontos de Atenção

- ❖ Definir governança para atendimento das escolas sem energia (fora do escopo GAPE/EACE)
- ❖ Aguardamos orientação quanto às adequações dos Kits Gerador Solar providos pela EACE aos padrões adotados pelas Concessionárias (programa Luz para Todos), tendo em vista cotação dos custos correspondentes e encaminhamento ao GAPE
- ❖ Destinação das sobras de equipamentos (Rede Interna e Gerador Solar) decorrentes de desativação, unificação de escolas e atendimento por outros projetos
- ❖ Tratamento de mudanças de endereço
- ❖ Definir e contratar os acessos via satélite
- ❖ Aguardando liberação pelo GAPE para seguir com o processo das RFPs 4.2

Obrigado!

