



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190031962

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar à 0720170038038

1. Responsável Técnico

THIAGO SANTOS DA CUNHA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0709300921**

Registro: **18577/D-DF**

Empresa contratada: **DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL** Registro: **10093-DF**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.494/0014-50**

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED SEDE DA PF

E-Mail: renato.rjlf@dpf.gov.br

Fone: (61)20248715

Contrato:

Celebrado em: 02/05/2019

Valor Obra/Serviço R\$:
2.352.884,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED SEDE DA PF

Data de Início: 28/06/2017

Previsão término: 23/07/2017

Coordenadas Geográficas:

-15.805106959180966,-47.88316547870636

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.494/0014-50**

E-Mail: renato.rjlf@dpf.gov.br

Fone: (61) 20248715

4. Atividade Técnica

Realização

Quantidade

Unidade

Orçamento Reforma Edificação de materiais mistos

5.707,7000

metros quadrados

Planejamento Edificação Materiais Mistos

5.707,7000

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA PARCIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA FEDERAL

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


Local _____ de _____ de _____

THIAGO SANTOS DA CUNHA - CPF: 019.879.441-00

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - CPF/CNPJ:
00.394.494/0014-50

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 28/05/2019 Valor Pago: R\$ 226,50 Nosso Número/Baixa: 0119025735



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720170040415

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

JEOVA NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 0709252390
Registro: 11404/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.494/0014-

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: renato.rjlf@dpf.gov.br

Fone: (61)20248715

Contrato:

Celebrado em: 29/06/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 14.264.240,72

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED SEDE DA PF

Data de Inicio: 28/06/2017

Previsão término: 23/07/2017

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Outro

Código/Obra pública:

Proprietário: POLÍCIA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.494/0014-50

E-Mail: rjlf@dpf.gov.br

Fone: (61) 20248715

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto Instalação sanitária

Quantidade

Unidade

Projeto Instalação pluvial

104,1400

metros quadrados

Projeto Impermeabilização

18.000,0000

metros quadrados

Projeto Instalação hidráulica

4.250,0000

metros quadrados

104,1400

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasília, 10 de 07 de 17

Local Data

JEOVA NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 825.292.641-04

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - CPF/CNPJ: 00.394.494/0014-50

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 11/07/2017 Valor Pago: R\$ 81,53 Nosso Número/Baixa: 0117030512



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

Arquivo: MVM POL FEDERAL SONDAGEM

1 ART Nº

05628

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Registro de Contrato sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal nº 6.496/77

RESPONSÁVEL TÉCNICO/CONTRATADO

2. Nome do Profissional: DANILLO GUSTAVO TEIXEIRA OLIVIER		3. Título(s) Profissional(is): (código): 111115	4. Carteira nº: DF-10687/D
5. CPF: 846.501.501-59	6. Endereço do Profissional: QS 07 RUA 800 LOTE 01 BLOCO A APT. 105		7. Atualizar Endereço: ☒
8. Cidade/UF: ÁGUAS CLARAS / DF	9. CEP: 71.971-540	10. Telefone: (61) 3356.0315	11. E-mail: dgtoliver@yahoo.com.br
12. Nome da empresa contratada:		13. Nº Registro/Visto CREA-DF:	14. Telefone:

CONTRATANTE

15. Nome do contratante (pessoa física ou jurídica): MVM ENGENHARIA LTDA.		16. CGC: 06.185.773/0001-76	
17. Endereço para correspondência: SIA/SUL QUADRA 05 C LOTE 07 - EDIFÍCIO KARIM - SALA 205		18. Cidade/UF: BRASÍLIA / DF	19. CEP: 71.200-055
21. Nome do proprietário da obra/serviço: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL		22. CGC: 00.394.494/0014-50	20. Telefone: (61) 3361.1324 23. Telefone: (61) 3311.8100

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO

24. Tipo do registro da ART: ☒ Normal ☐ Complementação ☐ Substituição ☐ Regularização	25. Característica da ART: ☐ Projeto ☐ Obra ☒ Serviço ☐ Cargo/Função	26. Participação: ☒ Individual ☐ Equipe	27. Vínculo do Profissional: ☒ Autônomo ☐ Empregado ☐ Sócio ☐ Obra Própria	28. Situação da obra/serviço: ☐ Não Iniciada(o) ☐ Iniciada(o) ☒ Concluída(o)
29. Endereço da obra ou serviço: SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 06 LOTES 09 E 10 EDIFÍCIO SEDE DO DPF			30. Cidade/UF: BRASÍLIA / DF	
31. CEP: 70.037-900	32. Telefone: (61) 3311.8100	33. Valor da obra/serviço: R\$ 1.000,00	34. Valor dos honorários: Sem Onus	35. Prazo de execução: 3 DIAS ÚTEIS
36. Início das atividades: 16/07/2009	37. Nº Pavimentos:	38. Área Inicial (m2):	39. Área de acréscimo (m2):	40. Área total (m2):
41. Objeto da obra ou serviço, descrito conforme o contrato: EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SIMPLES SPT				

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

42. Nível de Atuação(cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):	42. Nível de Atuação (cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):
1	20	A0808	2	60					
47. Observações Complementares: SONDAGEM À PERCUSSÃO SIMPLES (SPT) E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO									
48. Entidade profissional com direito a repasse do percentual da taxa de ART (código): EC0009 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENGENHEIROS CIVIS - ABENC/DF									

PARA USO DO CREA-DF

49. Vinculação: 1. Projeto 2. Obra/Serviço 3. Co-Autoria 4. Co-Responsabilidade	50. Nº Vínculo: 50. Nº Vínculo: 50. Nº Vínculo:	51. Serviço: 51. Serviço: 51. Serviço:	52. Vinculada à ART Nº/Ano: 52. Vinculada à ART Nº/Ano: 52. Vinculada à ART Nº/Ano:
---	---	--	---

ASSINATURAS

53. Declaro serem verdadeiras as informações acima: 	54. De acordo: 	55. De acordo:
56. Local e data: 15/07/09	57. Recebido por: 	TODA ART DEVERÁ SER BAIXADA JUNTO AO CREA/DF QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROFISSIONAL 1ª VIA - CREA / 2ª VIA - PROFISSIONAL / 3ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 4ª VIA - OBRA / 5ª VIA - PROPRIETÁRIO

ESTE CANHOTO DEVERÁ SER DESTACADO NO CREA-DF

CREA/DF		1 ART Nº:
58. DATA DO PAGAMENTO:	59. VALOR DA TAXA A PAGAR:	60. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




GEOMÉTRICA ENGENHARIA

DANILLO GUSTAVO TEIXEIRA OLIVIER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687 / D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

RELATÓRIO DE SONDAGEM

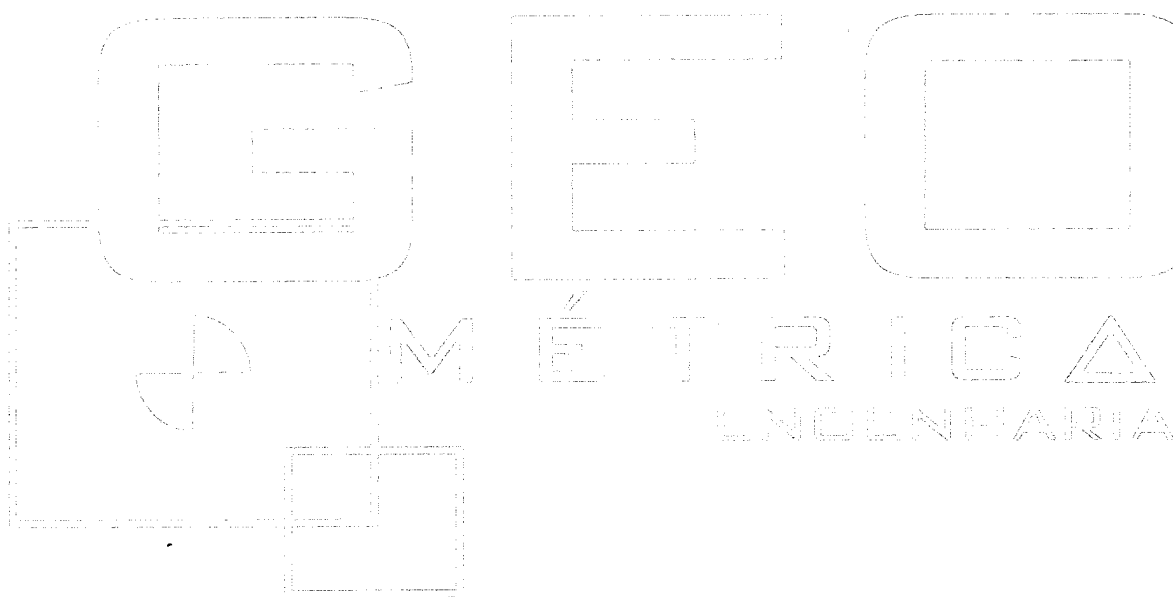

PROPRIETÁRIO: MVM ENGENHARIA LTDA.

**ENDEREÇO: SETOR DE AUTARQUIAS SUL – EDIFÍCIO
SEDE POLÍCIA FEDERAL – BRASÍLIA / DF**

REFERÊNCIA: 1647/09.

BRASÍLIA / DF, 19 DE JUNHO DE 2009.



GEOMÉTRICA ENGENHARIA

DANILLO OLIVIER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

Brasília / DF, 19 de junho de 2009.

À
MVM Engenharia
Setor de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal - Brasília / DF
Ref.: 1647/09

Prezado(a) Senhor(a),

Apresentamos em anexo o resultado da sondagem de reconhecimento de sua obra a ser realizada em local supra citado.

Foram executados 2 (dois) furos de sondagem e perfurados um total de 41,90 metros.

As perfurações foram feitas pelo processo sem circulação de água, protegidas por um revestimento de 63,05 mm de diâmetro.

Durante a sondagem foi executado de metro em metro o Ensaio de Penetração Dinâmica, SPT (Standard Penetration Test), o qual consiste em contar o número de golpes necessários para que um peso de 65 kg caindo de 75 cm de altura faça um barrilete amostrador penetrar 30 cm no terreno.

A extração das amostras é realizada com a cravação de um Amostrador Padrão de 34,9 mm de diâmetro interno e 50,8 mm de diâmetro externo.

O número de golpes obtidos fornece a compactidade de solos de predominância siltosa ou arenosa e, a consistência dos solos de predominância argílosa.

Nas sondagens em que o Nível D'água é encontrado, sua medida é feita 24 horas após o término da sondagem, período necessário para sua estabilização.

O perfil geotécnico obtido representa apenas uma sequência provável das camadas entre os furos executados.

As cotas dos furos estão relacionadas ao RN identificado na Planta de Locação das Sondagens, em anexo.

Todas as demais especificações estão contidas nos esquemas em anexo.

Permanecendo ao seu inteiro dispor, subscrevo-me.

Cordialmente.

Data: 19/06/2009	Folha: 01/06	Ref.: 1647/09	Cliente: MVM Engenharia
Eng. Responsável:  Danillo Gustavo Teixeira Olivier CREA 10.687 - D/DF			Local: Setor de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal



GEOMÉTRICA ENGENHARIA

DANILLO OLIVIER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

Planta de Locação dos Furos de Sondagens

RN=0,73 m ●

Saída Garagem

Guarita

SP1
NA = não encontrado
NT = 1,00 m

SP2
NA = não encontrado
NT = 1,50 m

C.E.B.

Entrada edifício

Legenda

SP = Sondagem à Percussão
RN = Referência de Nível
NA = Nível de Água
NT = Nível do Terreno

Sem escala

Data:
19/06/2009

Folha:
02/06

Ref.:
1647/09

Cliente:

MVM Engenharia

Eng. Responsável:

Danillo Gustavo Teixeira Olivier
CREA 10.687 - D/DF

Local:

Setor de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal



GEOMÉTRICA ENGENHARIA

DANILLO OLIVIER

ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

Cliente: MVM Engenharia		Nº Furo: SP1	Ref.: 1647/09	Folha: 03/06
Local: Sector de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal		Data início: 12/06/2009		Data término: 13/06/2009

Profund.	N (30cm) Inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-	Não Encontrado						ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA MOLE
2	5	4						2,00 m	
3	2	2						3,00 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA MUITO MOLE
4	3	4							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA DE MOLE A MÉDIA
5	4	5							
6	7	7							
7	8	8							
8	4	4							
9	6	7							
10	6	6							
11	7	7							
12	9	10						12,00 m	
13	14	16							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA RUA
14	16	16							
15	14	17						15,00 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA DURA
16	20	22							
17	26	28							
18	20	20						18,00 m	

RN.: 0,73 m	Eng. Responsável: Danilo Gustavo Teixeira Olivier CREA 10.687 - D/DF	Limite da Sondagem: 20,45 m	NA Inicial: não encontrado
Cota: 1,00 m			NA final (24h): não encontrado



GEOMÉTRICA ENGENHARIA

DANILLO OLIVIER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

Cliente:	MVM Engenharia	Nº Furo:	SP1	Ref.:	1647/09	Folha:	04/06
Local:	Sector de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal	Data início:	12/06/2009	Data término:	13/06/2009		

Profund.	N (30cm) Inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
19	18	20	Não Encontrado					20,45 m	ARGILA SILTOARENOSA BEGE DURA
20	26	32							
21	38	38							
22	-	-							
23	-	-							
24	-	-							
25	-	-							
26	-	-							
27	-	-							
28	-	-							
29	-	-							
30	-	-							
31	-	-							
32	-	-							
33	-	-							
34	-	-							
35	-	-							
36	-	-							

RN.: 0,73 m	Eng. Responsável: Danilo Gustavo Teixeira Olivier CREA 10.687 - D/DF	Limite da Sondagem: 20,45 m	NA Inicial: não encontrado
Cota: 1,00 m			NA final (24h): não encontrado



GEOMÉTRICA ENGENHARIA

DANILLO OLIVIER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

Cliente:	MVM Engenharia	Nº Furo:	SP2	Ref.:	1647/09	Folha:	05/06
Local:	Sector de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal	Data início:	12/06/2009	Data término:	13/06/2009		

Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível Diágua	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-	Não Encontrado						ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA MÉDIA
2	6	6							
3	6	6							
4	6	6							
5	6	6							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA MOLE
6	8	9						6,00 m	
7	5	5						7,00 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA MÉDIA
8	6	6							
9	6	7							
10	6	6						10,00 m	
11	11	12							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA RIJA
12	13	12							
13	15	16							
14	16	16							
15	16	17						15,00 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA DURA
16	23	26							
17	24	25							
18	26	27						18,00 m	

RN:	0,73 m	Eng. Responsável:	Danillo Gustavo Teixeira Olivier CREA 10.687 - D/DF	Limite da Sondagem:	20,45 m	NA Inicial:	não encontrado
Cota:	1,50 m					NA final (24h):	não encontrado



GEOMÉTRICA ENGENHARIA


DANILLO OLIVIER

ENGENHEIRO CIVIL CREA 10.687/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

Cliente:	MVM Engenharia	Nº Furo:	SP2	Ref.:	1647/09	Folha:	06/06
Local:	Sector de Autarquias Sul - Edifício Sede Polícia Federal	Data Início:	12/05/2009	Data término:	13/05/2009		

Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo	
				10	20	30	40			
19	33	35	Não Encontrado						ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA DANILLO OLIVIER	
20	37	38								
21	39	40						20,45 m		
22	-	-								
23	-	-								
24	-	-								
25	-	-								
26	-	-								
27	-	-								
28	-	-								
29	-	-								
30	-	-								
31	-	-								
32	-	-								
33	-	-								
34	-	-								
35	-	-								
36	-	-								

RN.: 0,73 m	Eng. Responsável:  Danilo Gustavo Teixeira Olivier CREA 10.687 - D/DF	Limite da Sondagem: 20,45 m	NA Inicial: não encontrado
Cota: 1,50 m			NA final (24h): não encontrado



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720170038061

Complementar à 0720150030358
Equipe à 0720170038038

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1010504045**

Registro: **19819/D-GO**

Empresa contratada: **10093 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.494/0014-50**

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: renato.rjf@dpf.gov.br

Fone: (61)20248715

Contrato:

Celebrado em: 29/06/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 86.000,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED. SEDE DA PF

Data de Início: 28/06/2017

Previsão término: 23/07/2017

Coordenadas Geográficas: -15.805108784085407,-
47.88316547870636

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **POLÍCIA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.494/0014-50**

E-Mail: renato.rjf@dpf.gov.br

Fone: (61) 20248715

4. Atividade Técnica

Realização

Desenho Técnico Tanque ou reservatório em concreto

Quantidade

Unidade

Anteprojeto Saneamento, [Tanque ou reservatório em concreto]

32,0000

metros cúbicos

Projeto Tanque ou reservatório em concreto

32,0000

metros cúbicos

Projeto Instalação pluvial

50,0000

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Carvalho
Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasília, 29 de *julho* de 2017
Local Data

Thiago Augusto de Carvalho
THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO - RNP: 1010504045
Engenheiro - Matr. 14.065

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - CPF/CNPJ: 00.394.494/0014-50
CREA-DF

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 19/07/2017 Valor Pago: R\$ 81,53 Nosso Número/Baixa: 0117029666



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720170038038

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

THIAGO SANTOS DA CUNHA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0709300921**

Registro: **18577/D-DF**

Empresa contratada: **10093 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.494/0014-50**

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED SEDE DA PF

E-Mail: renato.rjlf@dpf.gov.br

Fone: (61) 20248715

Contrato:

Celebrado em: 29/06/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 14.264.240,72

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

SAUS Quadra 6 Bloco A

Número: 09/10

Bairro: Asa Sul

CEP: 70037-900

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED SEDE DA PF

Data de Início: 28/06/2017

Previsão término: 23/07/2017

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.494/0014-50**

E-Mail: renato.rjlf@dpf.gov.br

Fone: (61) 20248715

4. Atividade Técnica

Realização

Quantidade **Unidade**

Orçamento Reforma com ampliação Edificação de materiais mistos

22.080,0000 metros quadrados

Planejamento Edificação Materiais Mistos

22.080,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA FEDERAL

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BSB 12 de *Julho* de 2017

Local

Data

THIAGO SANTOS DA CUNHA - CPF: 019.879.441-00

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - CPF/CNPJ: 00.394.494/0014-50

Renato José Lazari da Fonseca
Engenheiro - Matr. 14.085
Substituto

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 11/07/2017 Valor Pago: R\$ 214,82 Nosso Número/Baixa: 0117028779
