


PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL


Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
Departamento de Projetos Estratégicos
(DPE/SNSH – MIDR)

Novembro / 2026


Avanços Físico e Ambiental das Obras

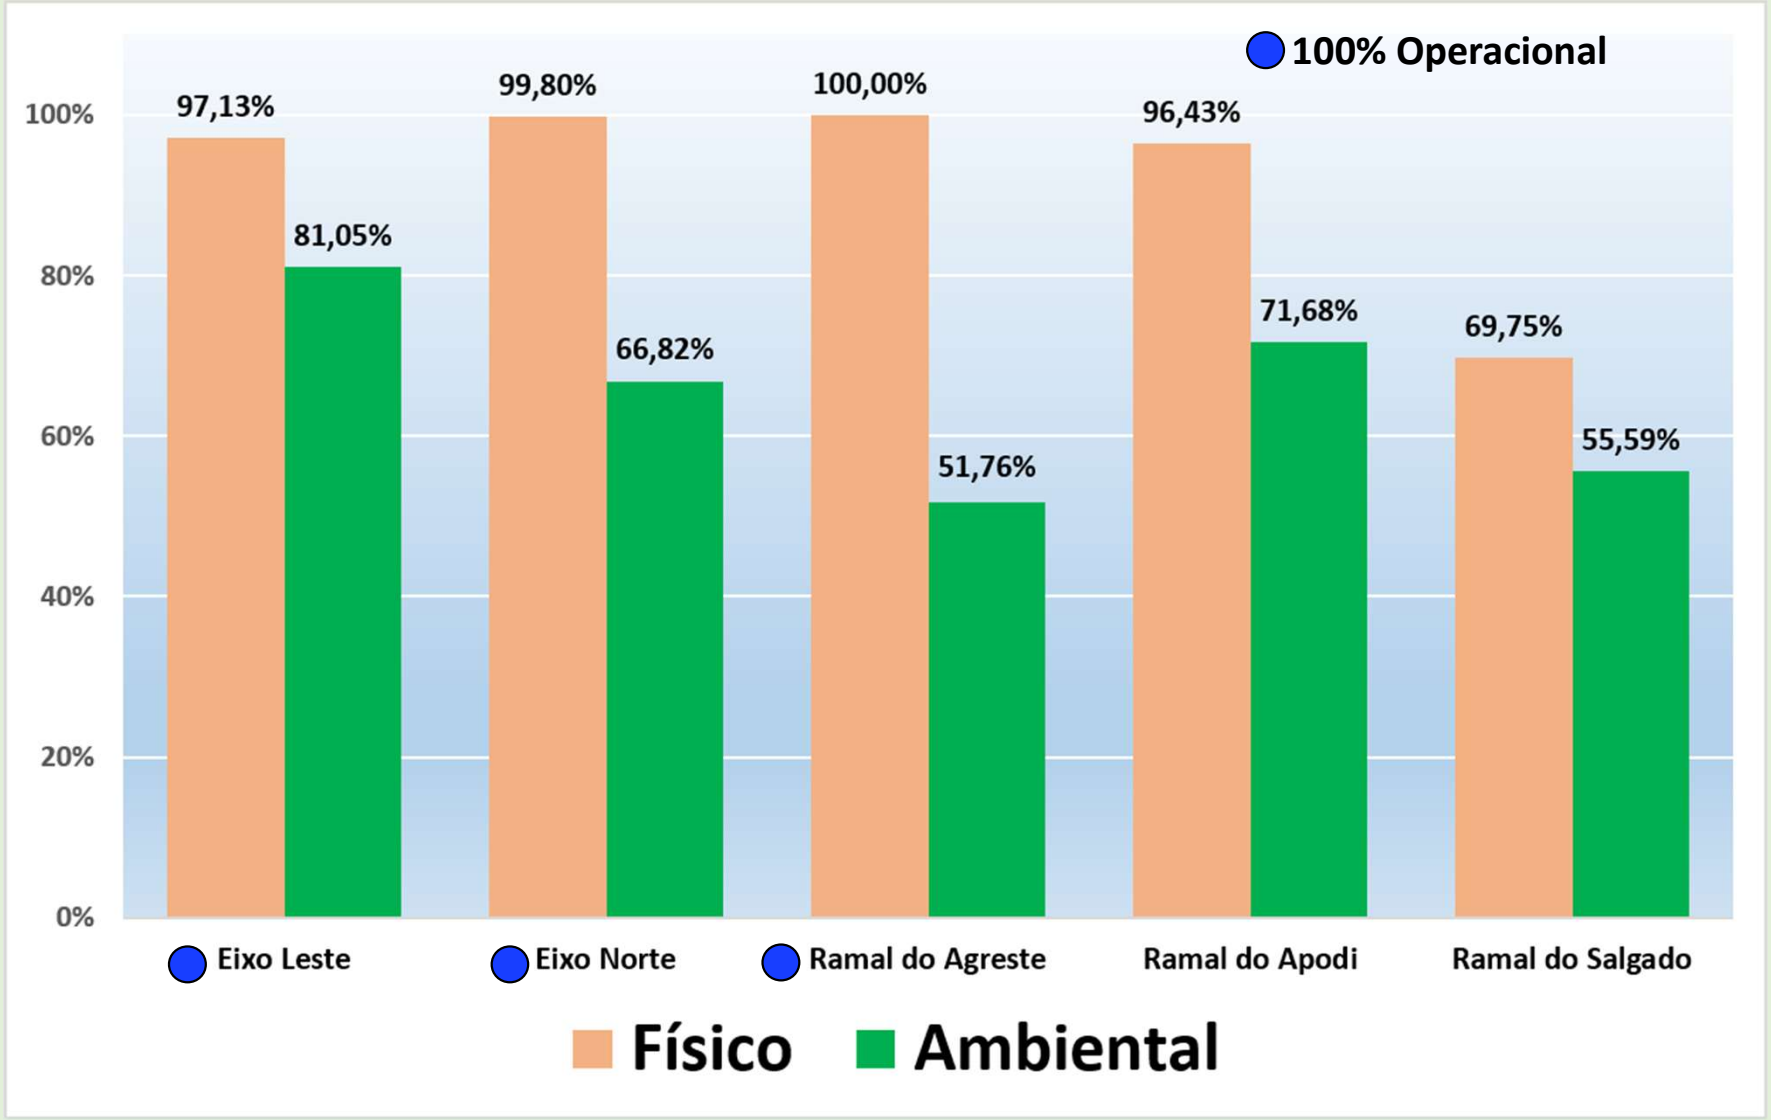

Ramal do Apodi

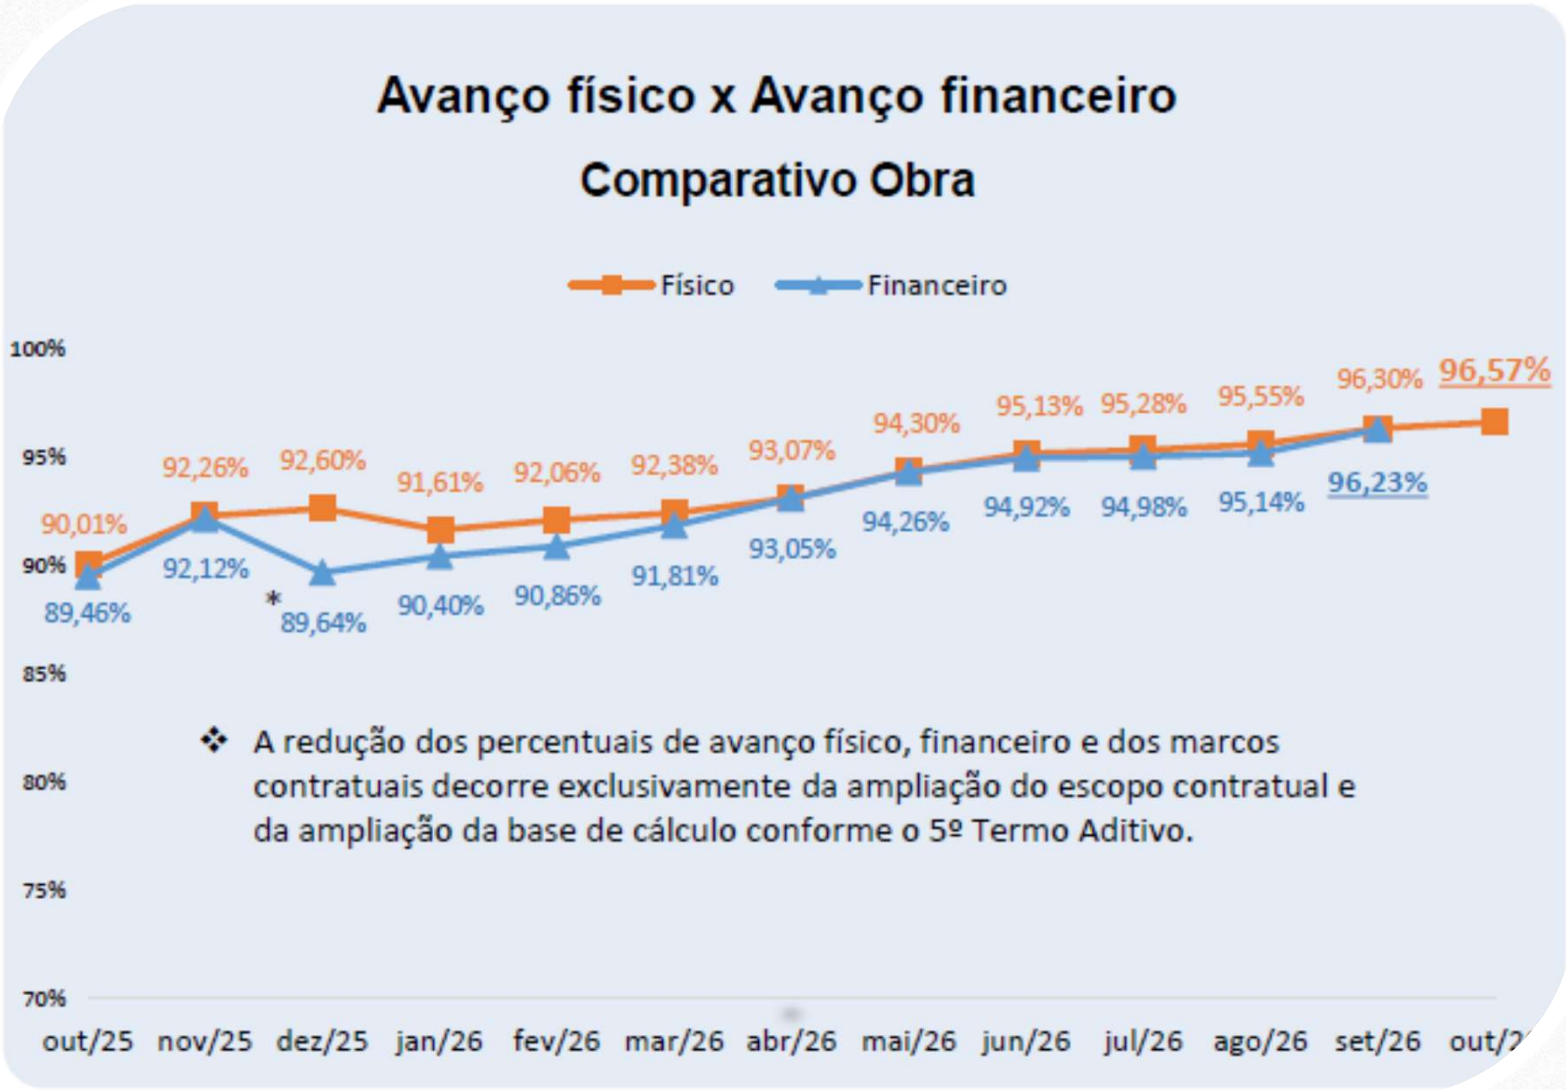

Ramal do Apodi

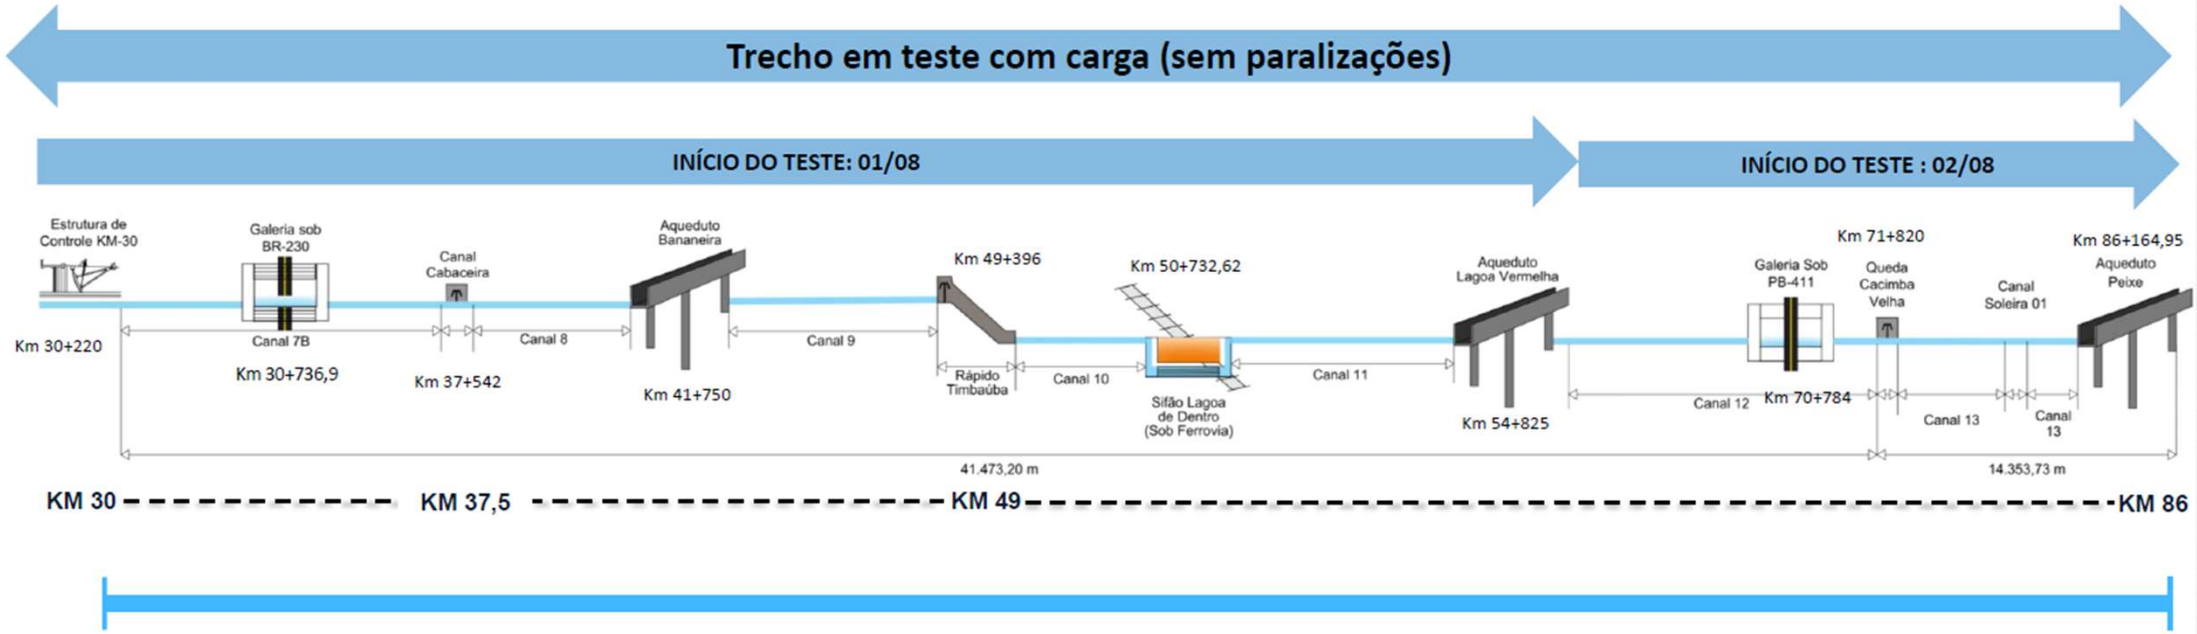


Legenda:

Trecho com água

Obs: A retomada dos testes iniciaram com a abertura da EC de Redondo às 8h30min do dia 01/08/2026;

Ramal do Apodi

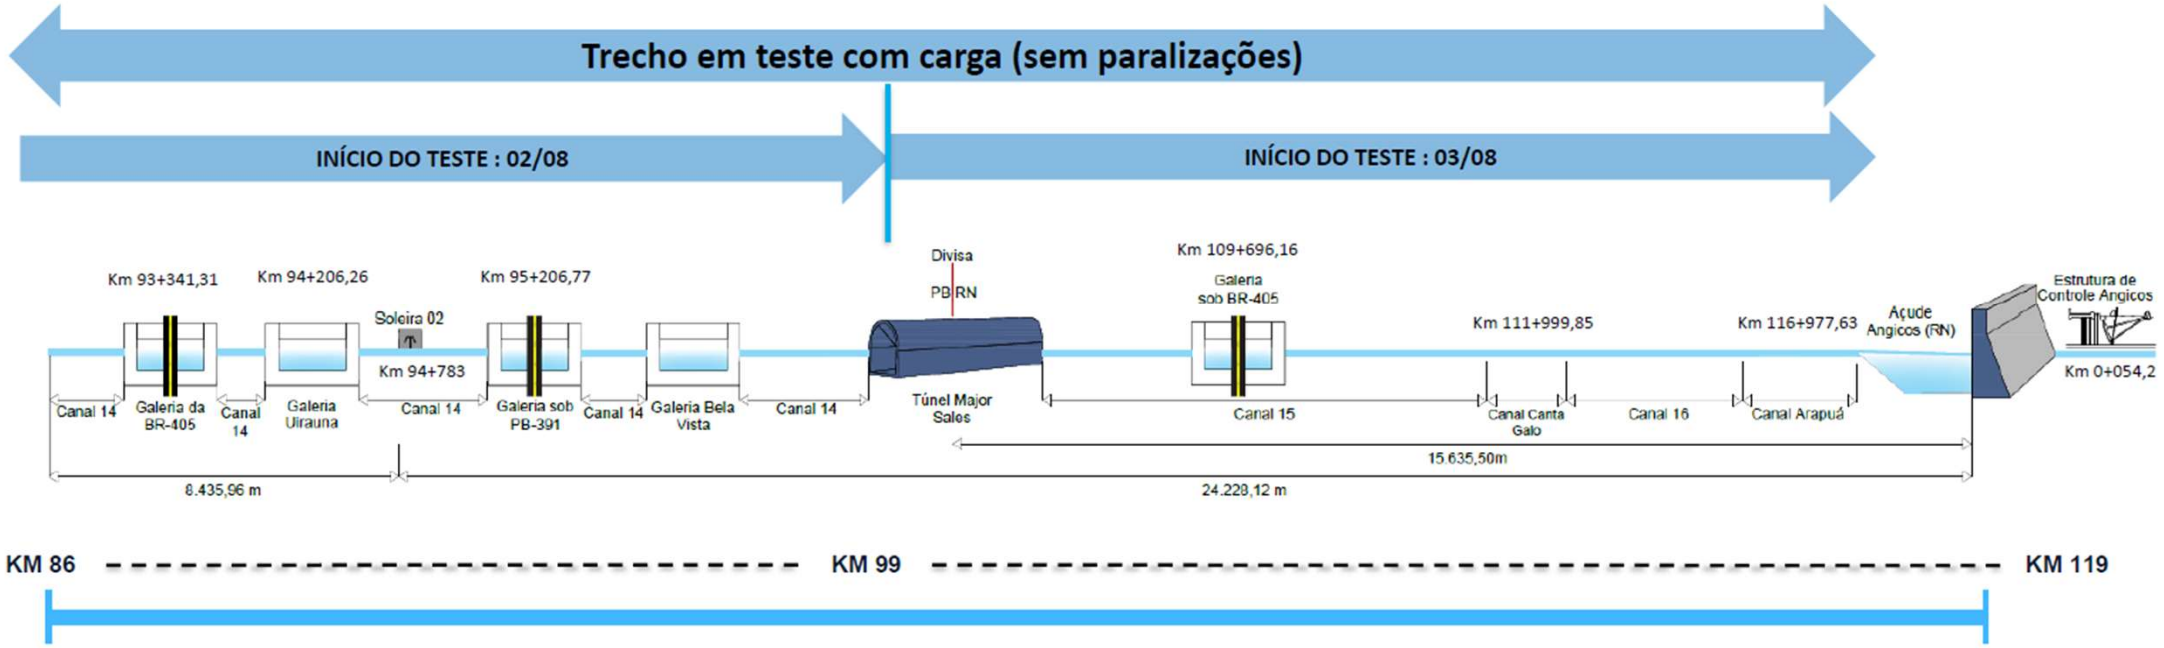

Legenda:

Trecho com água


Obs: A retomada dos testes iniciaram com a abertura da EC de Redondo às 8h30min do dia 01/08/2026;

Ramal do Apodi

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL


GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

PONTES MISTAS Total: 11 unidades

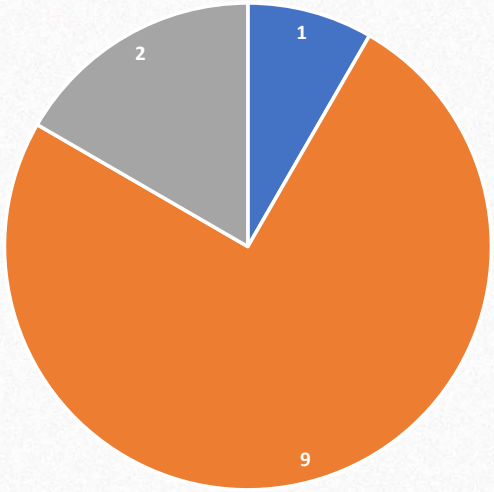


Concluída Em Andamento Não iniciada


PASSARELAS Total: 17 unidades

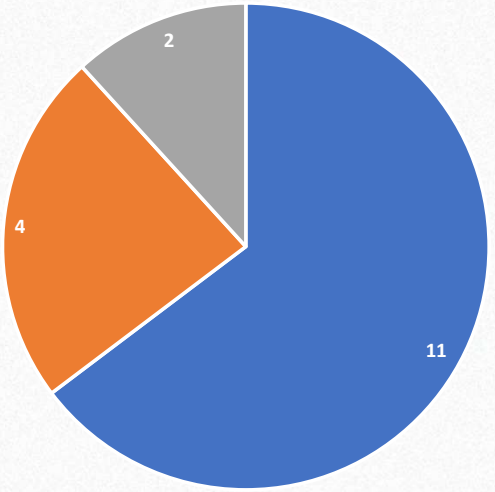


Concluída Em Andamento Não iniciada

Ramal do Apodi

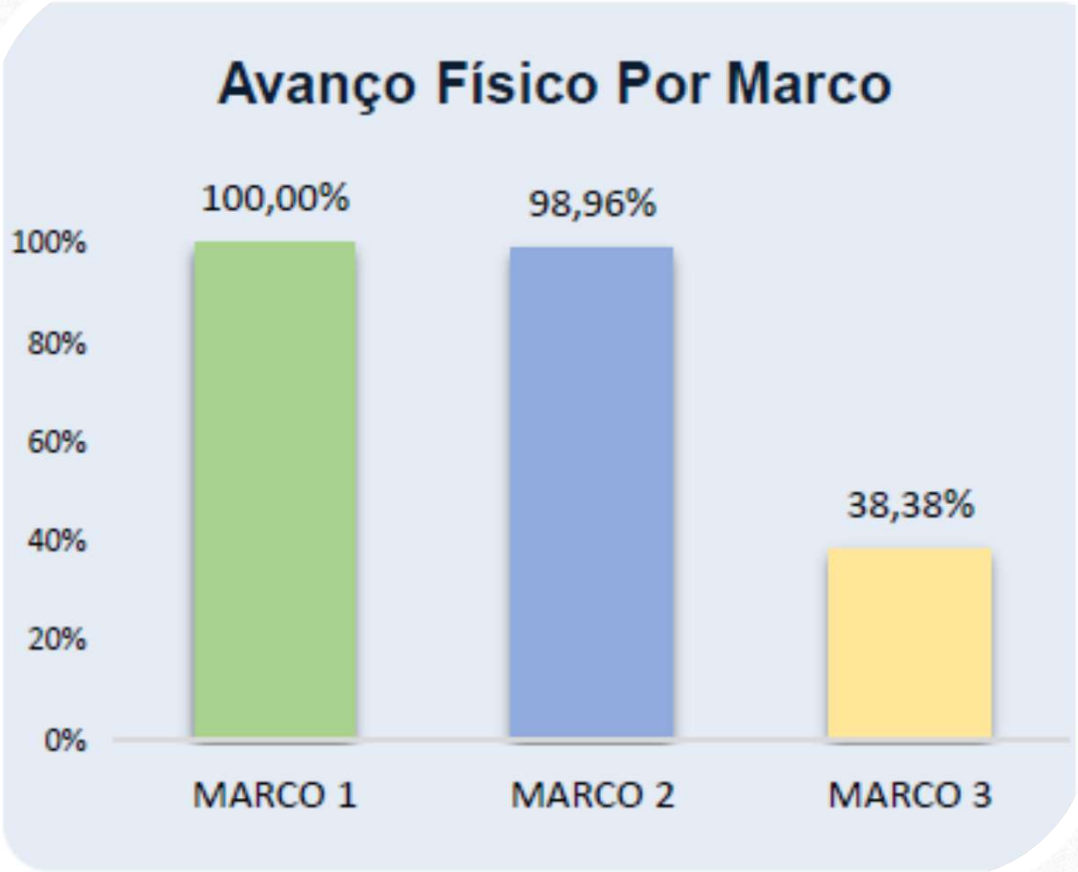

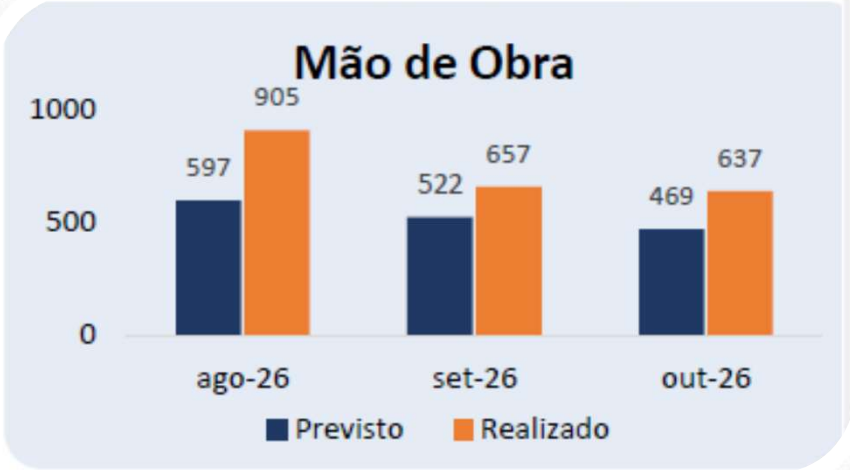

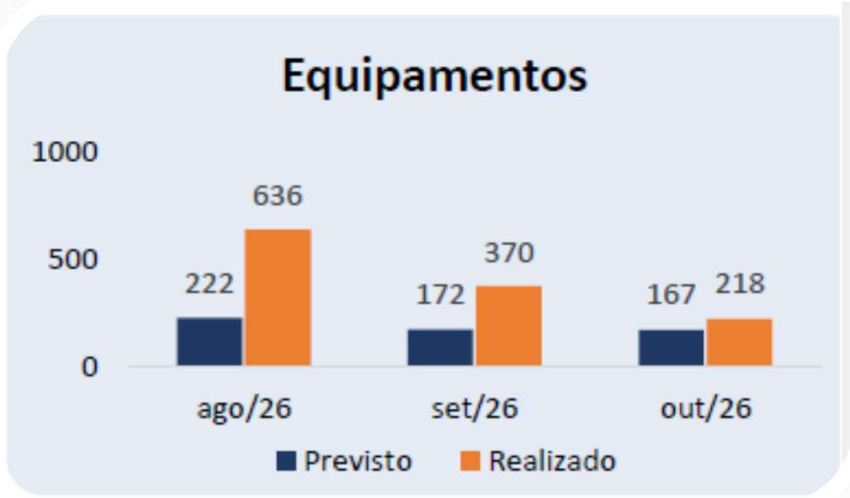

Ramal do Apodi

WBS 4537 – PONTE MISTA 1



Foto 1: Aterro da sapata LDH



Foto 2: Aterro da sapata LDH

WBS 4569 – PASSARELA 10



Foto 3: concretagem da infraestrutura LDH



Foto 4: concretagem da infraestrutura LEH

Ramal do Apodi

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

WBS 4239 – CANAL 13



Foto 5: execução do canal de restituição do bueiro



Foto 6: execução do canal de restituição do medidor de vazão

WBS 4570 – PASSARELA 11



Foto 7: retirada das formas da superestrutura



Foto 8: retirada das formas da superestrutura

Ramal do Apodi

WBS 4548 – PONTE MISTA 12



Foto 27: execução de aterro



Foto 28: execução de terraplenagem (estrada de acesso)



Foto 29: concretagem do guarda-rodas



Foto 30: armação da laje de aproximação LDH

Ramal do Apodi

WBS 4067 – GALERIA SOB A PB-391



Foto 17: Armação da laje da bacia de captação



Foto 18: concretagem de enchimento da bacia de dissipação

WBS 4529 – GALERIA SOB A PB-391



Foto 19: armação das formas da 2º etapa das barreiras new jersey



Foto 20: Concretagem das barreiras new jersey

Ramal do Apodi

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

PBA 7 – Desapropriações de Terras e Benfeitorias do PISF e dos Ramais Associados

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO APODI – TRECHO IV DO PISF							30/10/2026	
Descrição	**Processos**		**Imóveis**		**Área (ha)**		**Valor (R$)**	
Cadastro em análise (Checklist)	13	1,4%	16	1,5%	35,0000	1,0%	509.687,55	1,0%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	21	2,3%	22	2,0%	30,6000	0,8%	433.802,88	0,8%
Processos para ajuizamento com cadastro no SEI	10	1,1%	14	1,3%	51,3100	1,4%	241.938,23	0,5%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	317	34,3%	381	34,6%	1.435,0900	39,0%	18.609.173,09	35,0%
Processos ajuizadas pela AGU com alvará liberados	563	60,9%	669	60,7%	2.130,6800	57,9%	33.435.555,11	62,8%
TOTAIS:	**924**	**100,0%**	**1.102**	**100,0%**	**3.682,6800**	**100,0%**	**53.230.156,86**	**100,0%**

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇAO DO RAMAL DO APODI – TRECHO IV DO PISF							06/05/2024	
Descrição	**Processos**		**Imóveis**		**Área (ha)**		**Valor (R$)**	
Cadastro em análise (Checklist)	442	52,1%	527	52,1%	1.242,31	43,3%	57.609,95	0,1%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	79	9,3%	101	10,0%	463,07	16,1%	284.738,22	0,6%
Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI	131	15,4%	144	14,2%	283,76	9,9%	1.506.424,73	3,3%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	11	1,3%	12	1,2%	102,4	3,6%	24.880,07	0,1%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	141	16,6%	169	16,7%	592,22	20,6%	25.047.703,87	54,6%
Processos ajuizadas pela AGU com alvará liberados	44	5,2%	59	5,8%	187,65	6,5%	18.924.283,79	41,3%
TOTAIS:	**848**	**100,0%**	**1.012**	**100,0%**	**2.871,41**	**100,0%**	**45.845.640,63**	**100,0%**

Principais indicadores da produção de campo atualizada em 30/10/2026

a) **Cadastro em análise==========> São 13 processos de 16 propriedades c/ traçado alterado e complemento de VPR.**

b) **Cadastro com pendências cartorárias=> Restam 21 processos de 22 propriedades c/ pendências cartorárias por traçado alterado + complemento VPR**

c) **Processos pré-instruídos cadastrados no SEI======== São 10 processos de 14 propriedades pré-instruidos no SEI, em tramitação para AGU/PRU5.**

d) **Processos ajuizados========== 880 ajuizados referentes a 1.050 propriedades. 19 processos suspensos por alteração de traçado.**

e) **Há 108 processos com perícias em andamento, por discordância do valor indenizatório.**

Ramal do Salgado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Execução das Obras de Implantação

- Contrato 28/2023 assinado em **19/12/2023**
- Ordem de Serviço emitida em **04/04/2024**.

Engenharia Consultiva


- Contrato 27/2024 assinado em **05/07/2024.**
- Emissão da Ordem de Serviço em **12/07/2024**).

Gestão Ambiental

- Contrato 27/2023 assinado em **19/12/2023**
- Emissão da Ordem de Serviço em **09/02/2024**).

INVESTIMENTO	VALOR ESTIMADO
TOTAL	R$ 618.904.625,13

Ramal do Salgado - Perfil

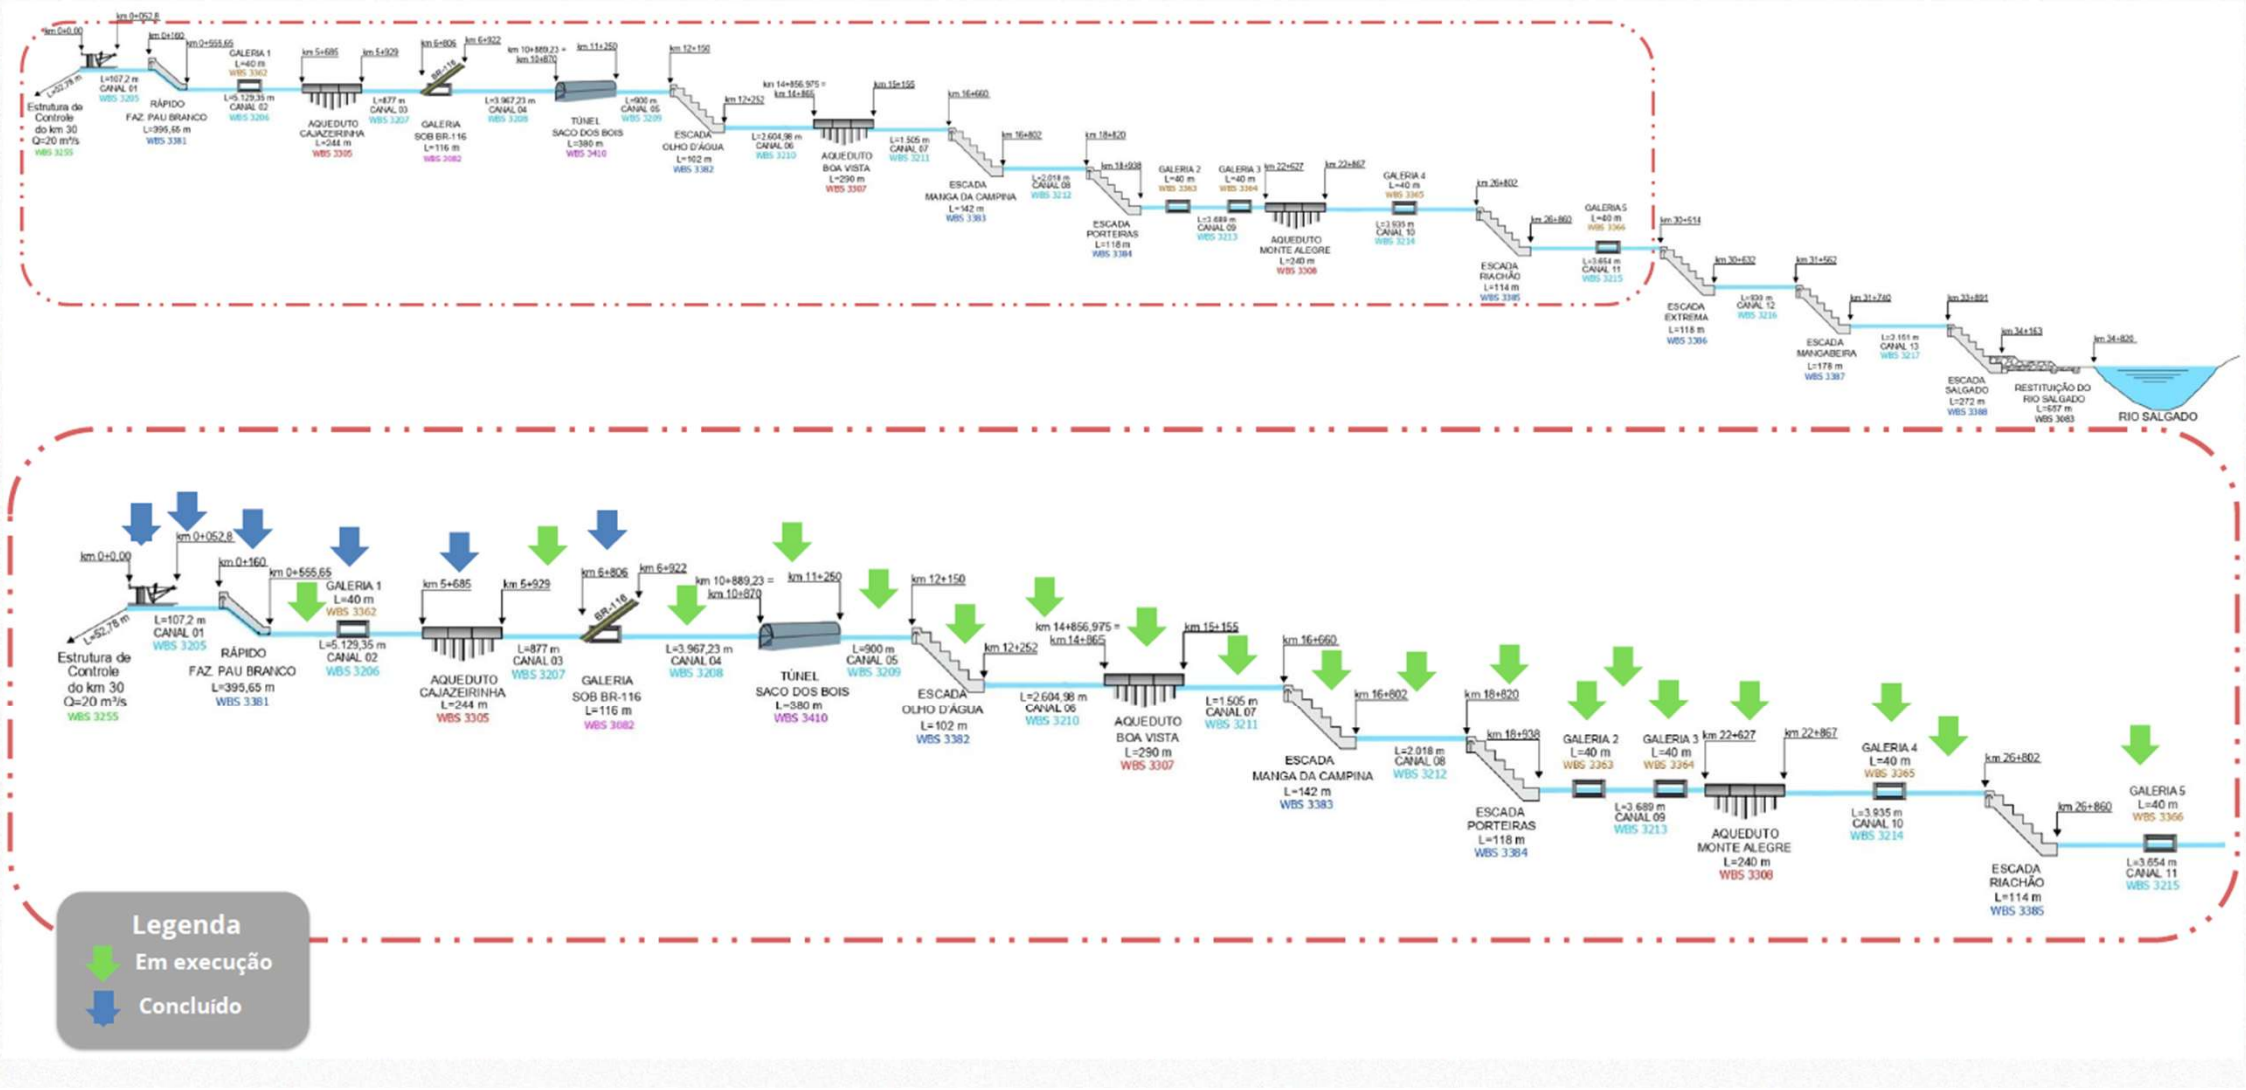



Ramal do Salgado - Obras

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

AVANÇO FÍSICO GERAL



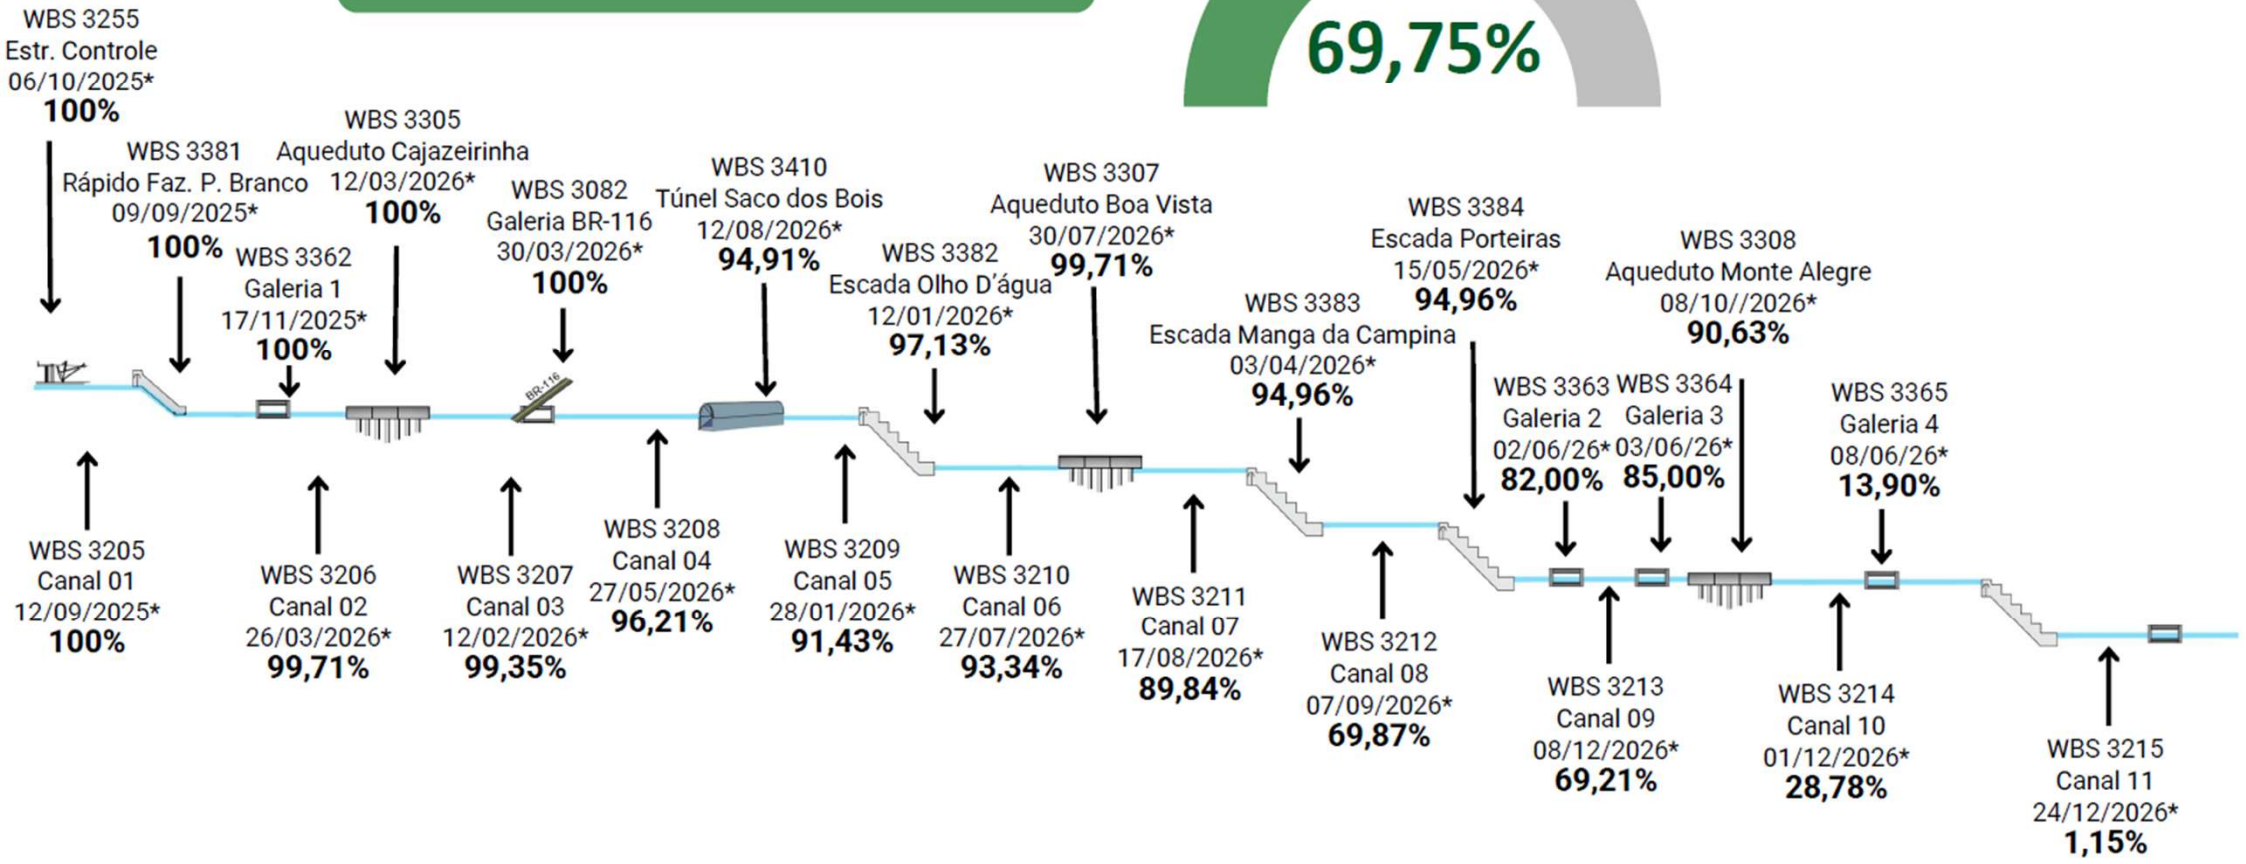

Ramal do Salgado





Estrutura (WBS)	Atividades em execução
3208 Canal 4	Tratamento de talude

Ramal do Salgado





Estrutura (WBS)	Atividades em execução
3209 Canal 5	Drenagem externa

Ramal do Salgado





Estrutura (WBS)	Atividades em execução
3213 Canal 9	Terraplenagem e revestimento de canal

Ramal do Salgado



Estrutura (WBS)	Atividades em execução
3308 Aqueduto Monte Alegre	Superestrutura

Ramal do Salgado









Ramal do Salgado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

PBA 7 – Desapropriações de Terras e Benfeitorias do PISF e dos Ramais Associados

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO SALGADO – TRECHO III DO PISF							30/10/2026	
Descrição	Processos		Imóveis		Área (ha)		Valor (R$)	
Cadastro em análise (Checklist)	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	3	2,9%	3	2,4%	106,6240	13,1%	508.016,89	11,4%
Processos ajuizadas pela AGU com alvará liberados	99	97,1%	121	97,6%	706,5480	86,9%	3.940.865,84	88,6%
TOTAIS:	**102**	**100,0%**	**124**	**100,0%**	**813,1720**	**100,0%**	**4.448.882,73**	**100,0%**

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇAO DO RAMAL DO SALGADO – TRECHO III DO PISF							06/05/2024	
Descrição	Processos		Imóveis		Área (ha)		Valor (R$)	
Cadastro em análise (Checklist)	28	28,0%	31	25,4%	241,16	34,1%	1.151.299,03	29,2%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	16	16,0%	19	15,6%	185,15	26,2%	669.469,83	17,0%
Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI	9	9,0%	11	9,0%	9,13	1,3%	263.006,01	6,7%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	6	6,0%	8	6,6%	5,71	0,8%	191.277,09	4,8%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	41	41,0%	53	43,4%	265,75	37,6%	1.670.932,60	42,3%
Processos ajuizadas pela AGU com alvará liberados	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,00	0,0%
TOTAIS:	**100**	**100,0%**	**122**	**100,0%**	**706,90**	**100,0%**	**3.945.984,56**	**100,0%**

Principais indicadores da produção atualizado em 30/10/2026

a) **Cadastro em análise========== Não há mais processo para ser analisado.**

b) **Cadastro com pendências documental identificadas==== Não restam mais processos com pendências documentais (Cartório)**

c) **Processos pré-instruídos em tramitação no SEI======== Não restam mais processos a instruir no momento, conforme informação da CGOF / Fiscalização**


d) **Processos ajuizados========== Foram ajuizados no período 102 processos, referentes a 124 propriedades**

e) **Resta 1 (um) processo com perícia em andamento, por discordância do valor indenizatório.**

Ampliação do Bombeamento

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL


GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

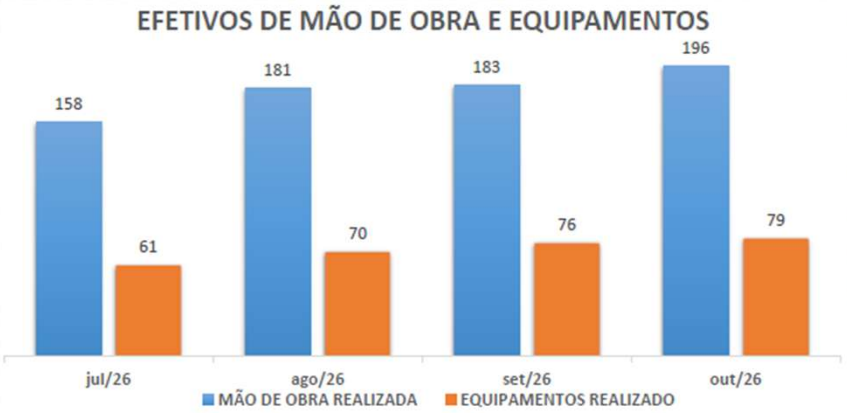

- Contrato nº 03/2025-MIDR
- Data base: Abril/24
- Pacote: 1480
- Valor do Contrato (P0): R$ 491.300.000,00
- Assinatura do Contrato: 08/05/2025
- Prazo de Vigência Contratual: 36 meses - 08/05/2028
- Assinatura da Ordem de Serviço: 27/05/2025
- Prazo de Execução: 32 meses - 27/01/2028

* Efetivos atualizados conforme último RDO recebido do dia 18/10/26


TOTAL MEDIDO	ÚLTIMA MEDIÇÃO BM 16 - SET/26
R$ 183.518.027,21	R$ 2.062.814,65

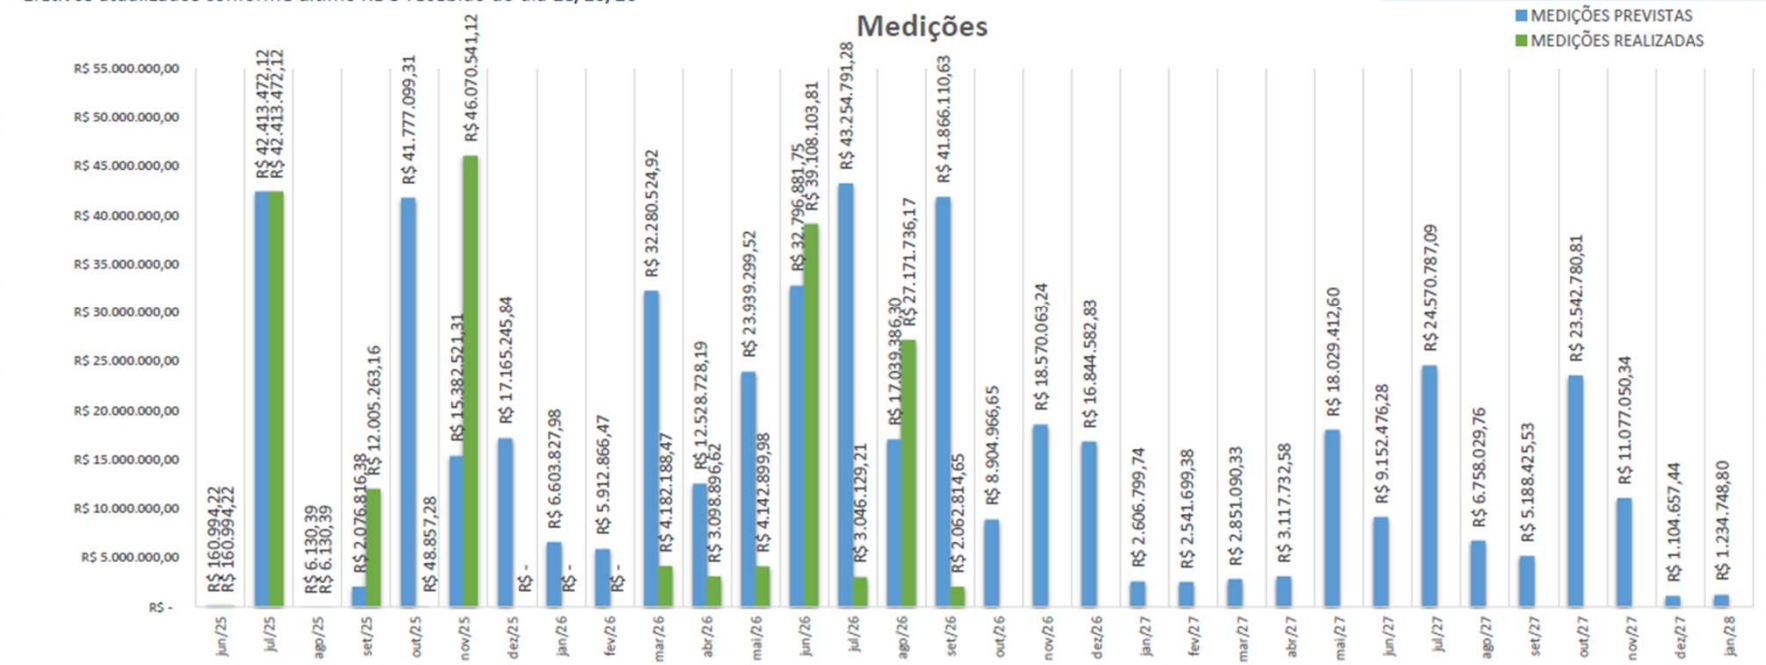


Ampliação do Bombeamento


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO





% AVANÇO FÍSICO

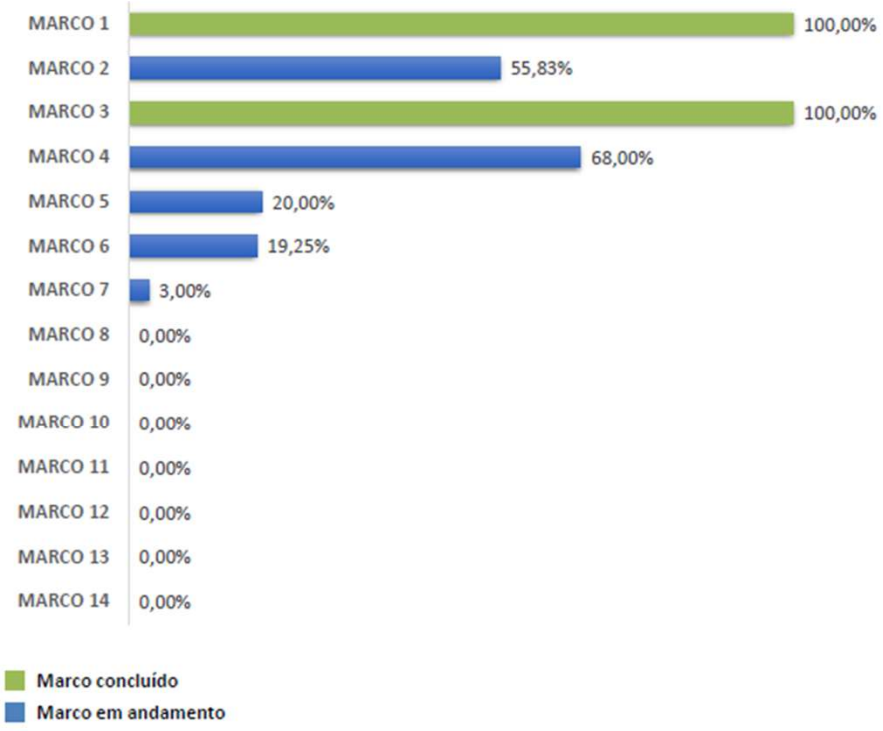




% AVANÇO FINANCEIRO

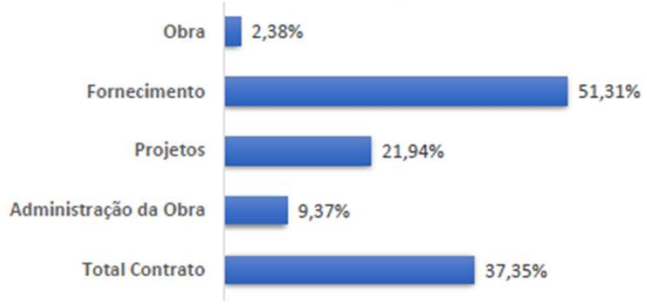

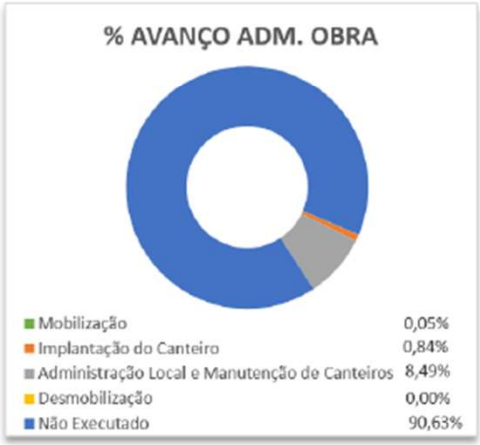

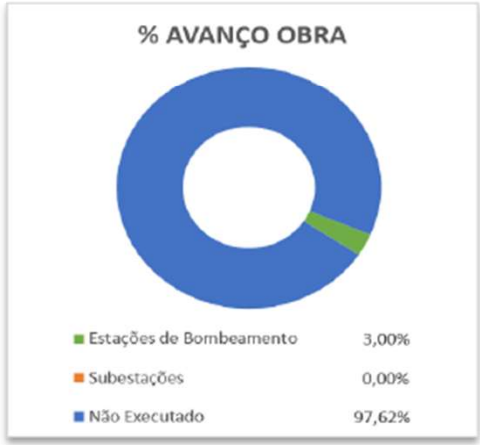

Ampliação do Bombeamento

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Atividades realizadas:

- Montagem de armação de escoramento das fôrmas do bloco de ancoragem da EBI-1;
- Passagem de cabos elétricos no ramal provisório da SE-N1;
- Montagem dos condutos forçados de recalque com execução de acabamentos externos na EBI-1.









- Observações:

Todas as concretagens estão condicionadas a resolução de pendências;

O desligamento do ramal principal e energização do Ramal provisório está condicionada a resolução de pendências.

Ampliação do Bombeamento

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Atividades realizadas:

- Acompanhamento de ensaios de ultrassom e preparação para aplicação da primeira demão de tinta nas juntas 08 e 09 dos condutos da linha B3 na EBI-1;
- Lançamento de cabos elétricos no ramal provisório da EBI-1;
- Execução das manilhas do bueiro simples para drenagem provisória da SE-N3;
- Execução de acabamento interno e pintura externa nos condutos da linha B3, acabamento externo e ensaio de ultrassom nos condutos da linha B4, na EBI-1.

- Observações:

O desligamento do ramal principal e energização do Ramal provisório está condicionada a resolução de pendências.









Ampliação do Bombeamento

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Atividades realizadas:

- Acompanhamento técnico da montagem e posicionamento das armaduras de aço na região superior do bloco de ancoragem BA-01 na EBI-1;
- Montagem de fôrmas do bloco de apoio da EBI-3;
- Execução do bueiro simples para drenagem provisória da SE-N3;
- Serviços de escoramento e posicionamento das fôrmas do bloco de ancoragem BA-01 na EBI-1.









Ramal do Piancó

Inicia-se em Umburanas, Mauriti/CE. Estende-se até o rio Piancó, desaguando no Açude Condado.

Deverá beneficiar cerca de 36 municípios, com aproximadamente 350 mil habitantes.

- O EIA/RIMA aceito pelo IBAMA. ✔
- Publicado o recebimento do EIA/RIMA ✔
- Audiências Públicas realizadas no dia 10/03 em Mauriti/CE e 11/03 em Conceição/PB. (Nota Técnica emitida em Resposta ao parecer emitido pelo IBAMA depois das audiências.) ✔
- Orçamento concluído. ✔
- Concluído atendimento aos apontamentos da Conjur – MIDR, referente ao Edital. ✔
- **CERTOH emitido pela ANA em 13/10/26.** ✔
- **Edital Publicado em 19/10/26.** ✔
- **Abertura das Propostas em 20/01/27.**

Denominação: **EBVIII-1**

Vazões (m^3/s) 1ª etapa/2ª etapa: **2,00/4,00**


Altura manométrica (m.c.a.): **124,95**

Nº de conjuntos elevatórios (por etapa):

1º etapa: **2+1** (reserva); 2º etapa: **2**

Potência instalada (1ª/2ª etapa) (cv): **4800/9600**

Horas de funcionamento (h/dia): **20**

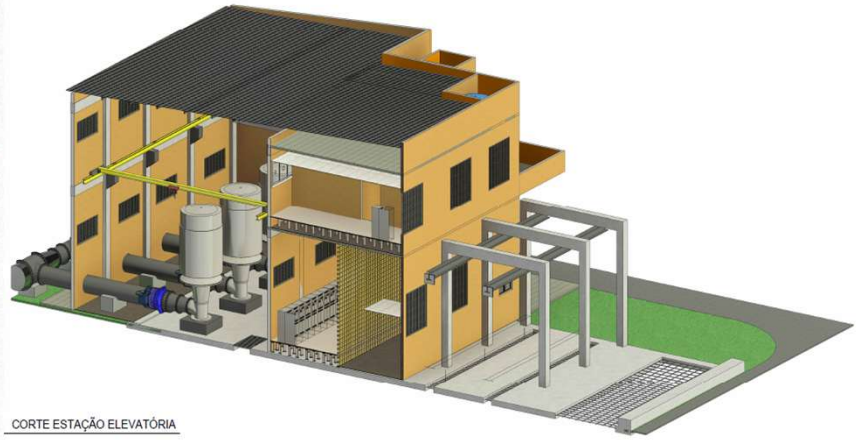

CORTE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Recuperação Dique Negreiros

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL


GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

DADOS DO CONTRATO

Consórcio Negreiros

Contrato	24/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R$ 22.500.000,00
Assinatura do Contrato	07/11/2025
Prazo de Vigência Contratual	21 meses - 07/08/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	14/05/2026
Prazo de Execução	18 meses - 14/11/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA





MARCOS CONTRATUAIS

Prazo	Marco	Descrição
14/07/26	MARCO 1	Conclusão da mobilização
14/11/26	MARCO 2	Conclusão das ensecadeiras de montante laterais
14/02/27	MARCO 3	Conclusão da ensecadeira de montante central
14/06/27	MARCO 4	Conclusão dos aterros
14/08/27	MARCO 5	Conclusão das injeções
14/10/27	MARCO 6	Recomposição da berma do Dique

Atividades realizadas no período:

- Execução da ensecadeira de montante, ombreira direita, no trecho compreendido entre as estacas 2+10 e 10+10;
- Construção da ensecadeira de montante, ombreira esquerda, no trecho compreendido entre as estacas 22+10 e 11+10;
- Coleta de amostras de solo provenientes da jazida Sítio Pau Preto para realização de ensaios de caracterização do material.





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Recuperação Dique Negreiros

















Recuperação e Execução das Lajes EBI-2

DADOS DO CONTRATO

Niemaia Serviços e Equipamentos

Contrato	25/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R$ 2.360.000,00
Assinatura do Contrato	10/11/2025
Prazo de Vigência Contratual	17 meses - 09/04/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	08/05/2026
Prazo de Execução	8 meses - 06/01/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA

3,03%
AVANÇO FÍSICO

18,81%
AVANÇO FINANCEIRO

MARCOS CONTRATUAIS

Prazo	Marco	Descrição
07/06/26	MARCO 1	Conclusão da implantação dos Canteiros de Obra
07/09/26	MARCO 2	Entrega na obra dos itens de fornecimento
07/11/26	MARCO 3	Conclusão das obras de reforço no topo das paredes transversais e tratamento das fissuras
06/01/27	MARCO 4	Conclusão da execução das lajes sobre os poços de sucção 5 a 8

Atividades realizadas no período:

- Demolição da parede a jusante dos poços de sucção dos nichos 7 e 8 da EBI-2;
- Demolição do topo das paredes externas na EBI-2.





Recuperação e Execução das Lajes EBI-3

DADOS DO CONTRATO

Niemaia Serviços e Equipamentos

Contrato	26/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R$ 2.367.646,00
Assinatura do Contrato	10/11/2025
Prazo de Vigência Contratual	17 meses - 09/04/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	08/05/2026
Prazo de Execução	8 meses - 06/01/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA

1,33%
AVANÇO FÍSICO

20,19%
AVANÇO FINANCEIRO

MARCOS CONTRATUAIS

Prazo	Marco	Descrição
07/06/26	MARCO 1	Conclusão da implantação dos Canteiros de Obra
07/09/26	MARCO 2	Entrega na obra dos itens de fornecimento
07/11/26	MARCO 3	Conclusão das obras de reforço no topo das paredes transversais e tratamento das fissuras
06/01/27	MARCO 4	Conclusão da execução das lajes sobre os poços de sucção 5 a 8

Atividades realizadas no período:

- Demolição das paredes a jusante dos poços de sucção dos nichos 6 e 8 na EBI-3.





Recuperação dos PVs da Galeria Monteiro

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

DADOS DO CONTRATO


Construtora W. V.

Contrato	42/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R$ 10.988.000,00
Assinatura do Contrato	15/12/2025
Prazo de Vigência Contratual	15 meses - 15/03/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	19/02/2026
Prazo de Execução	12 meses - 19/02/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA



AVANÇO FÍSICO

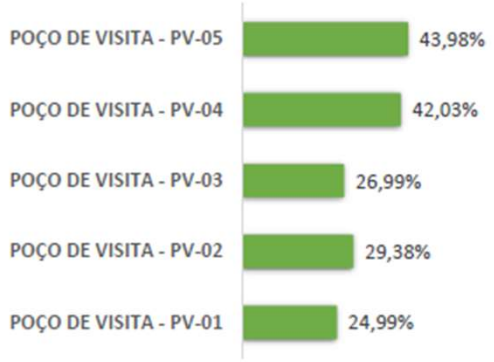

Atividades realizadas no período:

- Escavação manual para montagem do Tunnel Liner no PV-01;
- Escavação manual e mecanizada para montagem do Tunnel Liner nos PV-02.





Recuperação dos PVs da Galeria Monteiro

Atividades realizadas no período:

- Escavação manual para montagem do Tunnel Liner no PV-01;
- Escavação manual e mecanizada para montagem do Tunnel Liner nos PV-02.











MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Agradecimentos do Time do DPE
