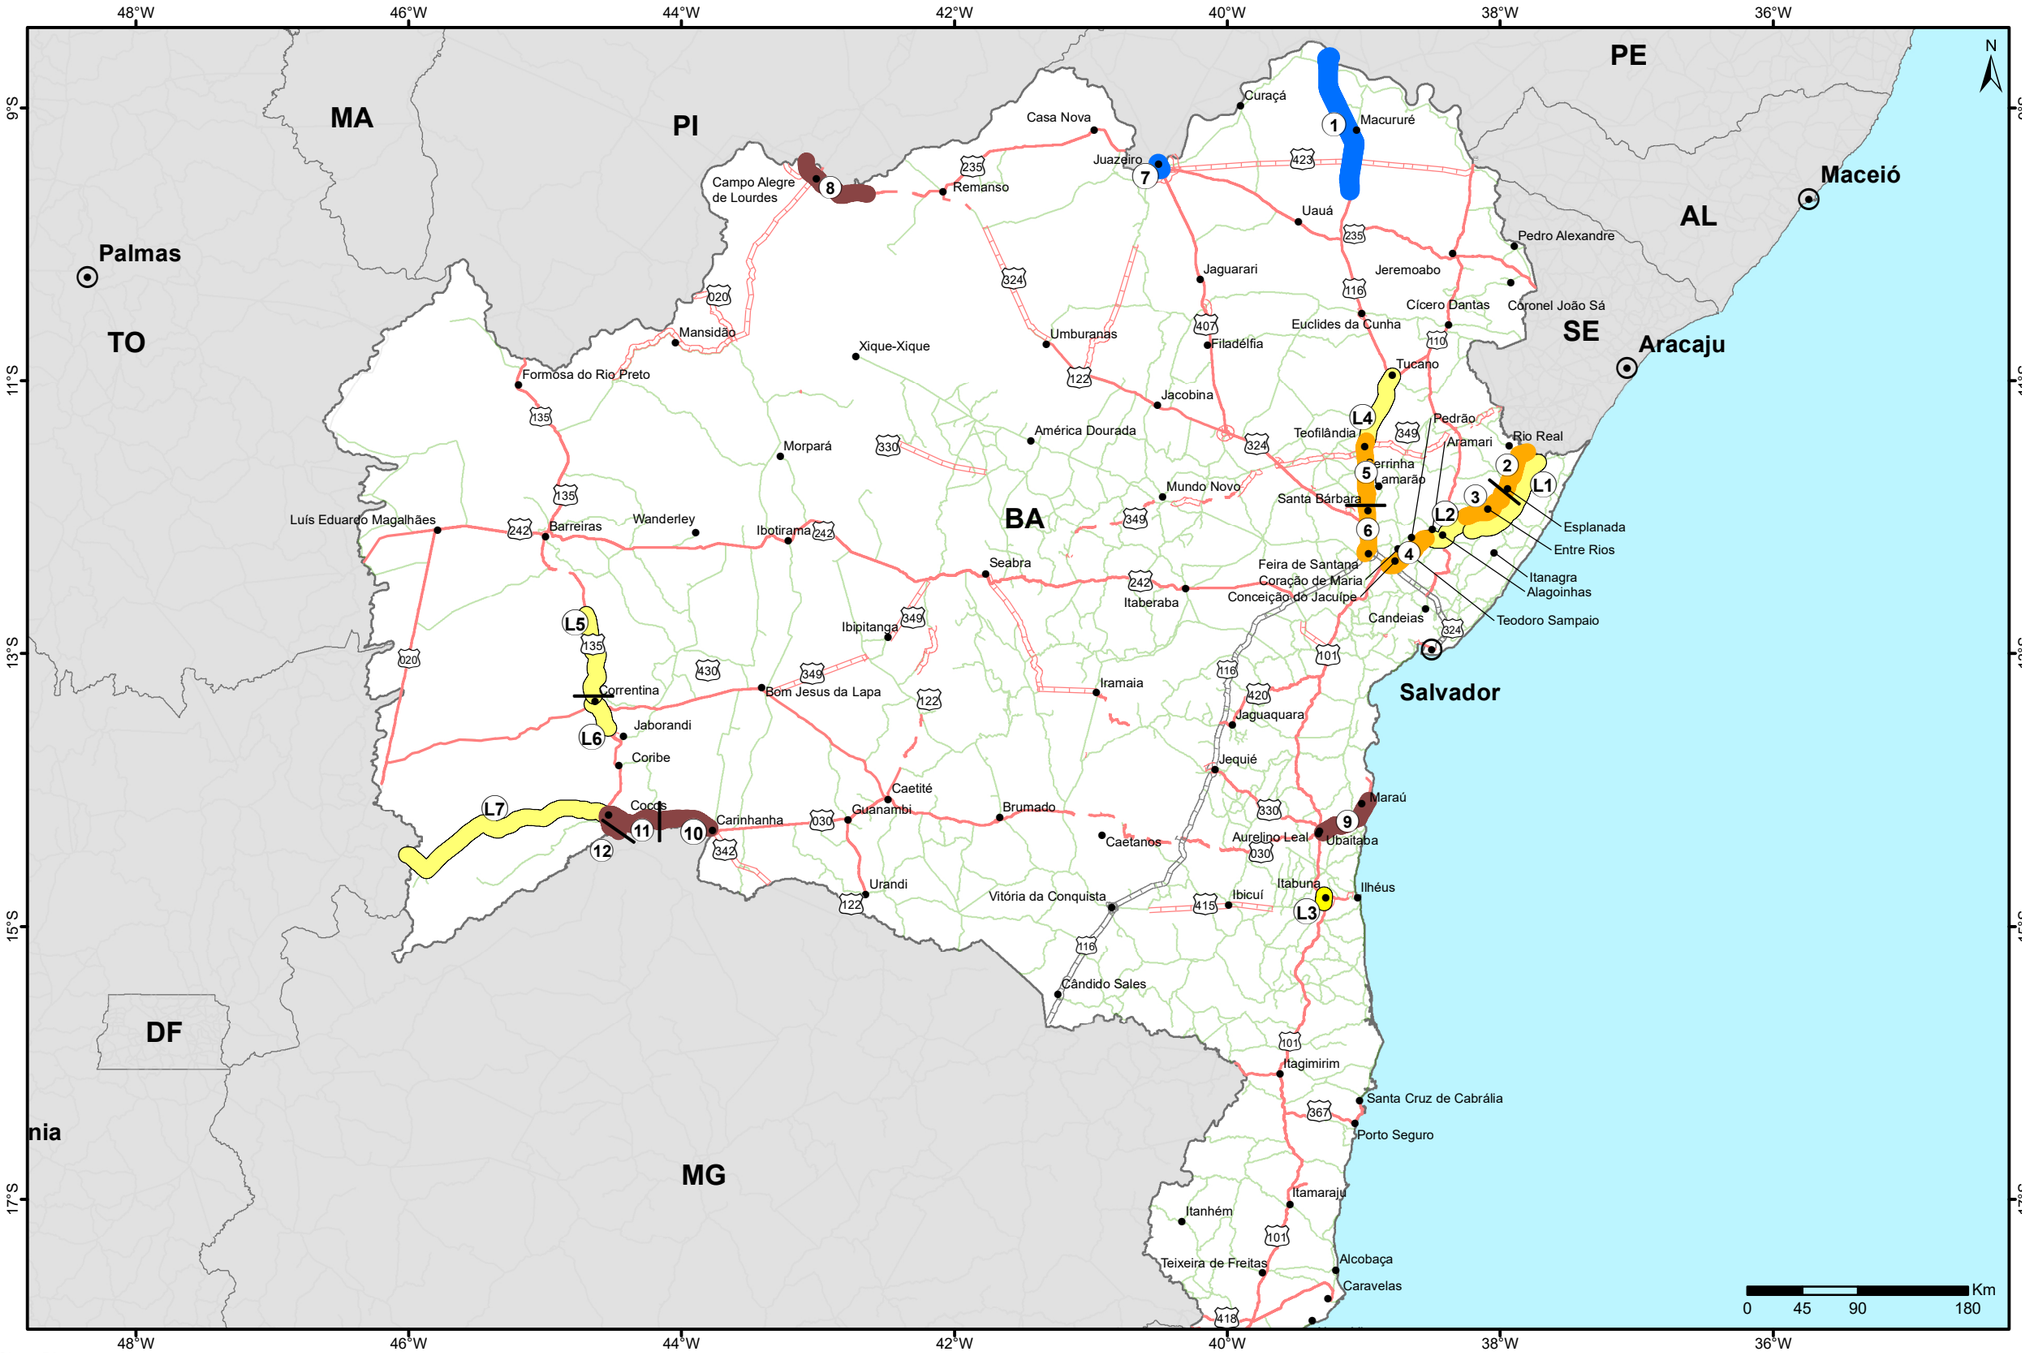

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL
BAHIA

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - Planejada
  - Concedida

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	217,90 Km
IMPLANTAÇÃO	226,70 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	118,66 Km
A LICITAR	
Total	**563,26 Km**

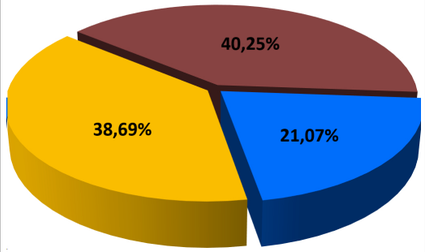

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras Diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO		EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	1	05 00875/2014	CONSÓRCIO CCL / LCM / PSO / PRODEC	BR-116	0,00	113,36	113,36	Adequação BR-116/BA	21/11/2014	31/01/2025	R$ 310.420.073,76	19,76%	05 00028/2015	CONSÓRCIO HOLLUS/ASTEP/BA	Em execução entre os Kms 88,20 e 108, com serviços de limpeza vegetal, terraplenagem, início da pavimentação (sub-base e base) e OAE.
2	1	05 00748/2014	CONSÓRCIO MOTA - EMPA - CONCRESOLO	BR-101	0,00	41,60	41,6	Duplicação BR-101/BA	08/10/2014	28/05/2023	R$ 241.259.166,11	71,53%	05 00888/2016	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Levantamentos, para o remanescente, sendo executados.
3	2	05 00749/2014	CONSÓRCIO MOTA - EMPA - CONCRESOLO	BR-101	41,60	83,58	41,98	Duplicação BR-101/BA	08/10/2014	28/05/2023	R$ 290.378.301,32	65,35%	05 00888/2016	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Levantamentos, para o remanescente, sendo executados.
4	4	05 00751/2014	CONSÓRCIO TORC - ENECON	BR-101	124,60	165,40	40,8	Duplicação BR-101/BA	23/10/2014	31/12/2023	R$ 275.839.363,95	65,07%	05 00137/2017	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Obras paralisadas desde 12/2022 por insuficiência de recursos orçamentários. Levantamentos, para o remanescente, sendo executados.
5	5	05 00878/2014	CONSÓRCIO HAP - PLANEX - CONVAP L5 BR 116/BA	BR-116	334,23	387,41	53,18	Duplicação BR-116/BA	18/10/2014	07/01/2024	R$ 350.252.406,21	15,00%	05 00911/2016	ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS	Obras paralisadas desde 02/2019 por deliberação cautelar do TCU. Desde então, não houve retomada dos serviços.
6	6	05 00879/2014	CONSÓRCIO AMORIM BARRETO/EMPA/BASITEC	BR-116	387,41	427,75	40,34	Duplicação BR-116/BA	14/10/2014	31/03/2024	R$ 529.656.541,38	79,01%	05 00911/2016	ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS	Obra em ritmo lento devido a desapropriações e interferências. Frentes de serviços liberadas, em todas as disciplinas, do km 419,09 ao km 427,75.
7	Único	05 00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-407	0,00	5,30	5,3	Adequação de capacidade na Travessia de Juazeiro	15/05/2023	08/07/2024	R$ 185.911.466,36	13,66%	05 00523/2023	CONSÓRCIO JBR/ASTEP	Executando serviços de terraplenagem e complementares, além de revestimento asfáltico na totalidade de extensão da obra.
8	10	05 00114/2017	CONSÓRCIO BR-235 (S.A. PAULISTA / ASTEC)	BR-235	601,30	663,60	62,3	Implantação e pavimentação	20/04/2017	31/12/2023	R$ 178.255.592,56	64,12%	05 00189/2017	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA.	Trecho até a cidade de Campo Alegre de Lourdes sendo concluído
9	3	05 00700/2022	COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S/A	BR-030	845,50	898,40	52,9	Implantação entre Ubaitaba e Maraú	31/12/2022	15/10/2025	R$ 231.409.291,04	0,00%	05 00179/2023	TRAFECON ENGENHARIA LTDA	Mobilização em análise devida a recuperação judicial da executora.
10	2	05 00312/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	237,50	280,10	42,6	Implantação entre Cocos e Carinhanha (Lote 2)	20/06/2023	04/04/2025	R$ 109.836.032,60	37,32%	05 00604/2022	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.	Obra em execução, com serviços de terraplenagem e pavimentação, com frentes liberadas em todo o trecho.
11	1	05 00059/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	191,50	237,50	46	Implantação entre Cocos e Carinhanha (Lote 1)	12/12/2022	03/06/2024	R$ 126.860.637,08	53,76%	05 00604/2022	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.	Obra em execução, em fase de terraplenagem e pavimentação, com frentes liberadas em todo o trecho.
12	5	05 00629/2014	CONSÓRCIO TOP/GEOSISTEMAS	BR-135	443,90	466,80	22,9	Implantação BR-135/BA	21/08/2014	04/05/2024	R$ 106.689.309,78	89,94%	05 00030/2015	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Obra em execução, com frentes de pavimentação e acabamentos de OAE.

Obras a licitar

A LICITAR	BR	SEGMENTO		OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO
L1	BR-101	0,00	83,58	Ação 105S - Lotes 1 e 2				Levantamento de remanescentes concluído pea supervisora.
L2	BR-101	83,50	124,60	Ação 105S - Lote 3				Após rescisão do contrato 05 00750/2014, em tramitação consulta às demais classificadas, do edital 233/2014-05, quanto ao interesse em assumir o remanescente (processo 50600.039170/2023-98)
L3	BR-101	503,00	509,00	Ação 7XW2 - Itabuna				Em andamento projeto do Contorno Oeste em Itabuna. Prorrogado contrato 05 00377/2018 (EVTEA/Projeto) que avaliará viabilidade da implantaçã em pista dupla (50600.031777/2017-81)
L4	BR-116	274,23	334,23	Ação 13X7 - Lote 4 - Travessias				Projetos executivos de restauração concluídos. Projetos de OAEs e duplicação em nível Básico. A SR avalia a segmentação em 2 licitações, separando as travessias
L5	BR-135	267,00	340,00	Ação 1C09 - Lote 2				Há anteprojeto aprovado. Necessária atualização de orçamento, a ser realizada pela SR.
L6	BR-135	340,00	378,00	Ação 1C09 - Lote 3				Em tramitação, na SR, atos preparatórios para licitação (50605.003696/2023-90)
L7	BR-030	0,00	194,96	Implantação e pavimentação	50600.033922/2023-15		0557/23-00	Edital publicado. Data de abertura 09/01/2024

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
