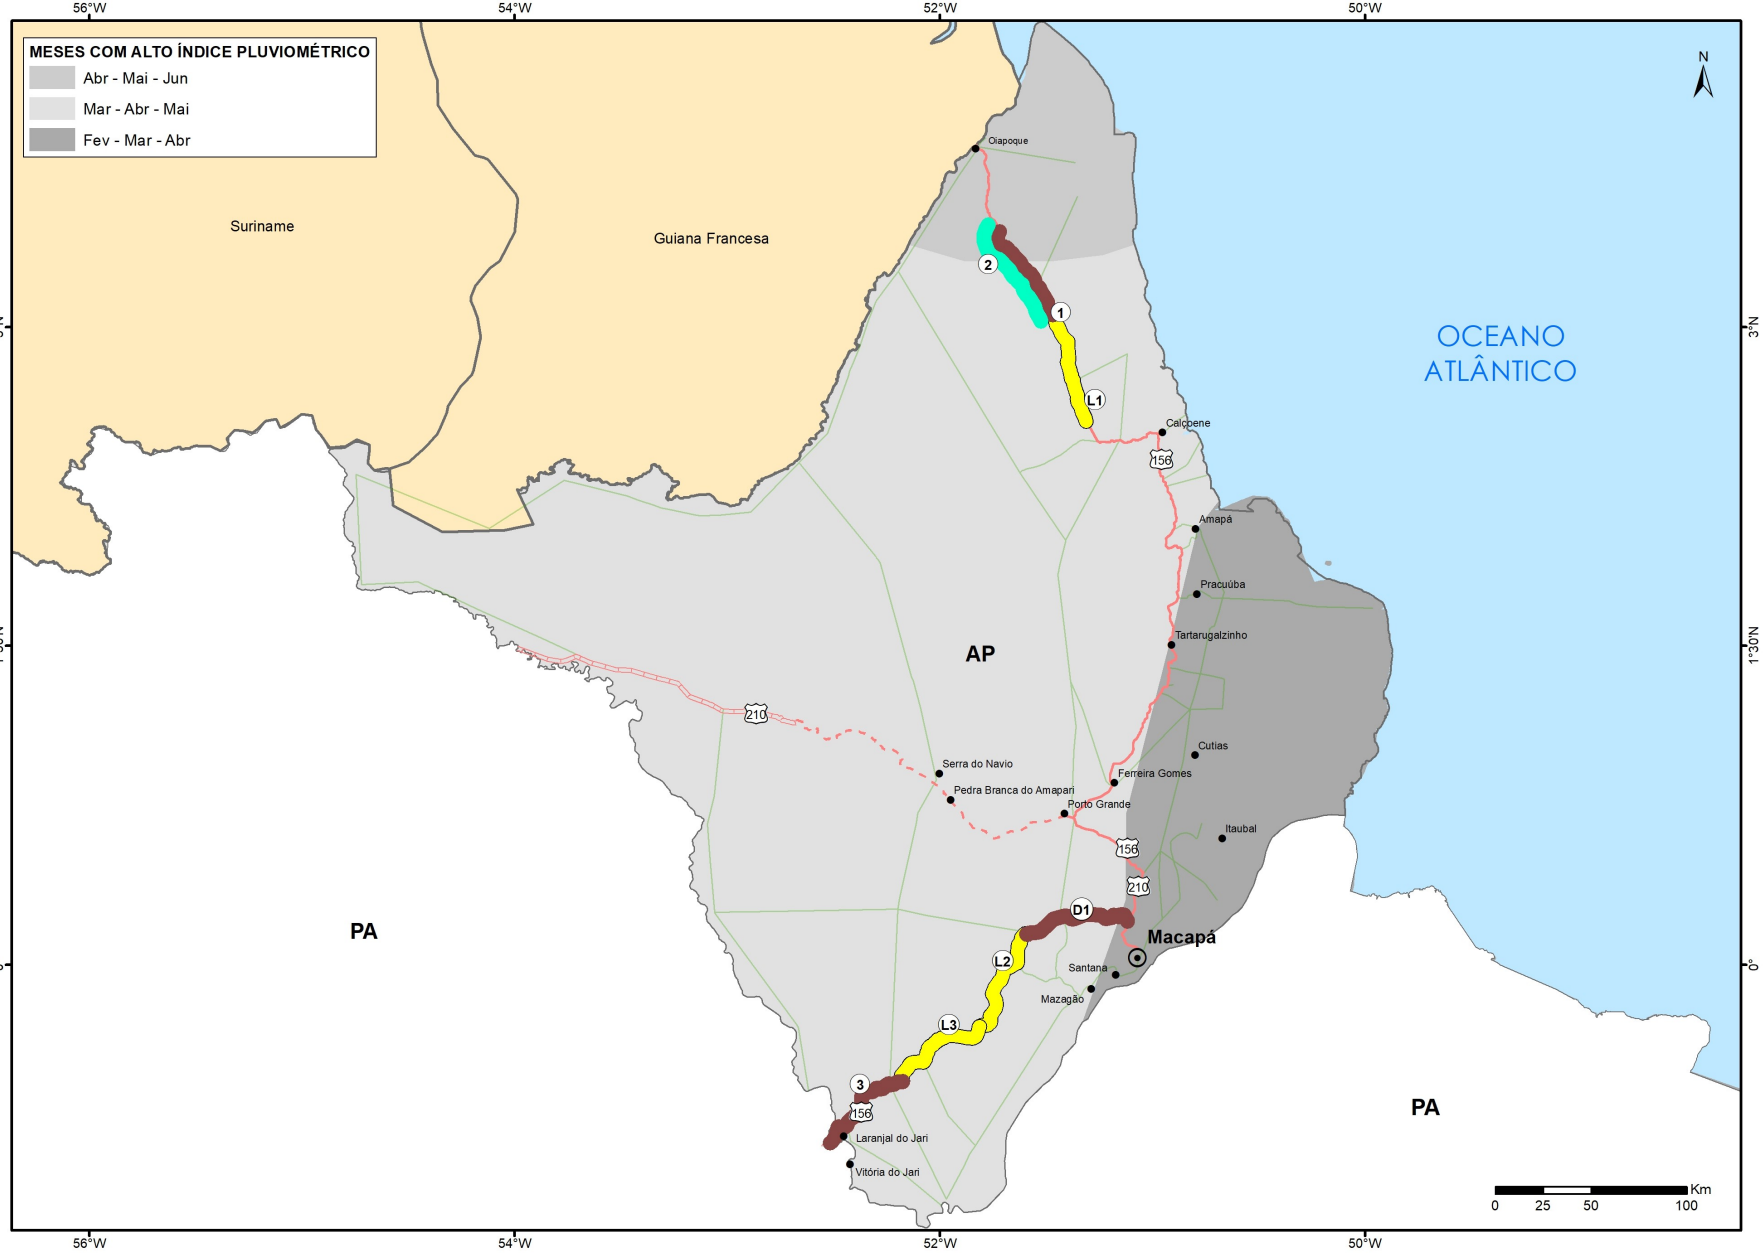

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL
AMAPÁ

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - Planejada
  - Concedida

Tipos de Intervenção

- IMPLANTAÇÃO — 177,20 Km
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- A LICITAR

Total 177,20 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	1989	1418	2-3-7	3 - Norte	00 00719/2023	CONSÓRCIO LB / METROPOLITANA	BR-156	687,73 743,73	56	Remanescente de pavimentação do Lote 3 - Tronco Norte	21/12/2023	01/12/2026	R$ 278.387.212,62	7,67%	Em andamento correção de erosões por fortes chuvas, desobstrução da drenagem e ensaios nas estruturas remanescentes das pontes de concreto.	00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
2		1418	2-3-7	Único	00 00246/2024	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	BR-156	714,73 770,73	0	Realocação de aldeias indígenas	23/04/2024	15/11/2027	R$ 72.355.436,47	3,55%	Chuvas intensas na região impactam a execução dos serviços. Os serviços se encontram concentrados na Aldeia Anaw erá e Samaúma.	00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
3	2493	13YK	3-7	1 - Sul	00 00402/2024	L B CONSTRUÇÕES LTDA	BR-156	27,00 87,10	60,1	Implantação e pavimentação do Lote 1 - Tronco Sul	19/09/2024	19/03/2028	R$ 302.111.990,39	1,92%	Executando supr. vegetal e limpeza da faixa de domínio,drenagem e levantamentos topográficos. Execução impactada por período de chuvas.	25 00315/2025	STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	2491	13YK	3-7	TED-884/2020	EXÉRCITO - DEC	BR-156	210,10 271,20	61,1	Implantação do Lote 4	13/01/2021	19/03/2028	R$ 158.229.045,24	R$ 0,00	R$ 158.229.045,	39,31%	Drenagem, movimentação de terra e manutenção dos caminhos de serviço em execução. Remanescentes serão levantados pela supervisora para novo contrato.	00 00512/2022	TRAFEGON ENGENHARIA LTDA

Obras a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	1989	1418	2-3-7	2 - Norte	BR-156	633,68 687,73	Remanescente de pavimentação do Lote 2 - Tronco Norte			Em processo de análise e aprovação dos projetos do remanescente para viabilizar a licitação da obra que está prevista para o 1º Sem/26.	00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
L2	2493	13YK	3-7	3 - Sul	BR-156	149,12 210,18	Implantação e pavimentação do Lote 3 - Tronco Sul	50600.036566/2025-45	0104/26-00	Processo licitatório em andamento. Em fase de habilitação.	Edital 0100/26-00	EM LICITAÇÃO
L3	2493	13YK	3-7	2 - Sul	BR-156	87,10 149,12	Implantação e pavimentação do Lote 2 - Tronco Sul	50600.004862/2025-87	0459/25-00	Edital de licitação homologado e adjudicado. Aguardado assinatura de contrato	Edital 0100/26-00	EM LICITAÇÃO

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
