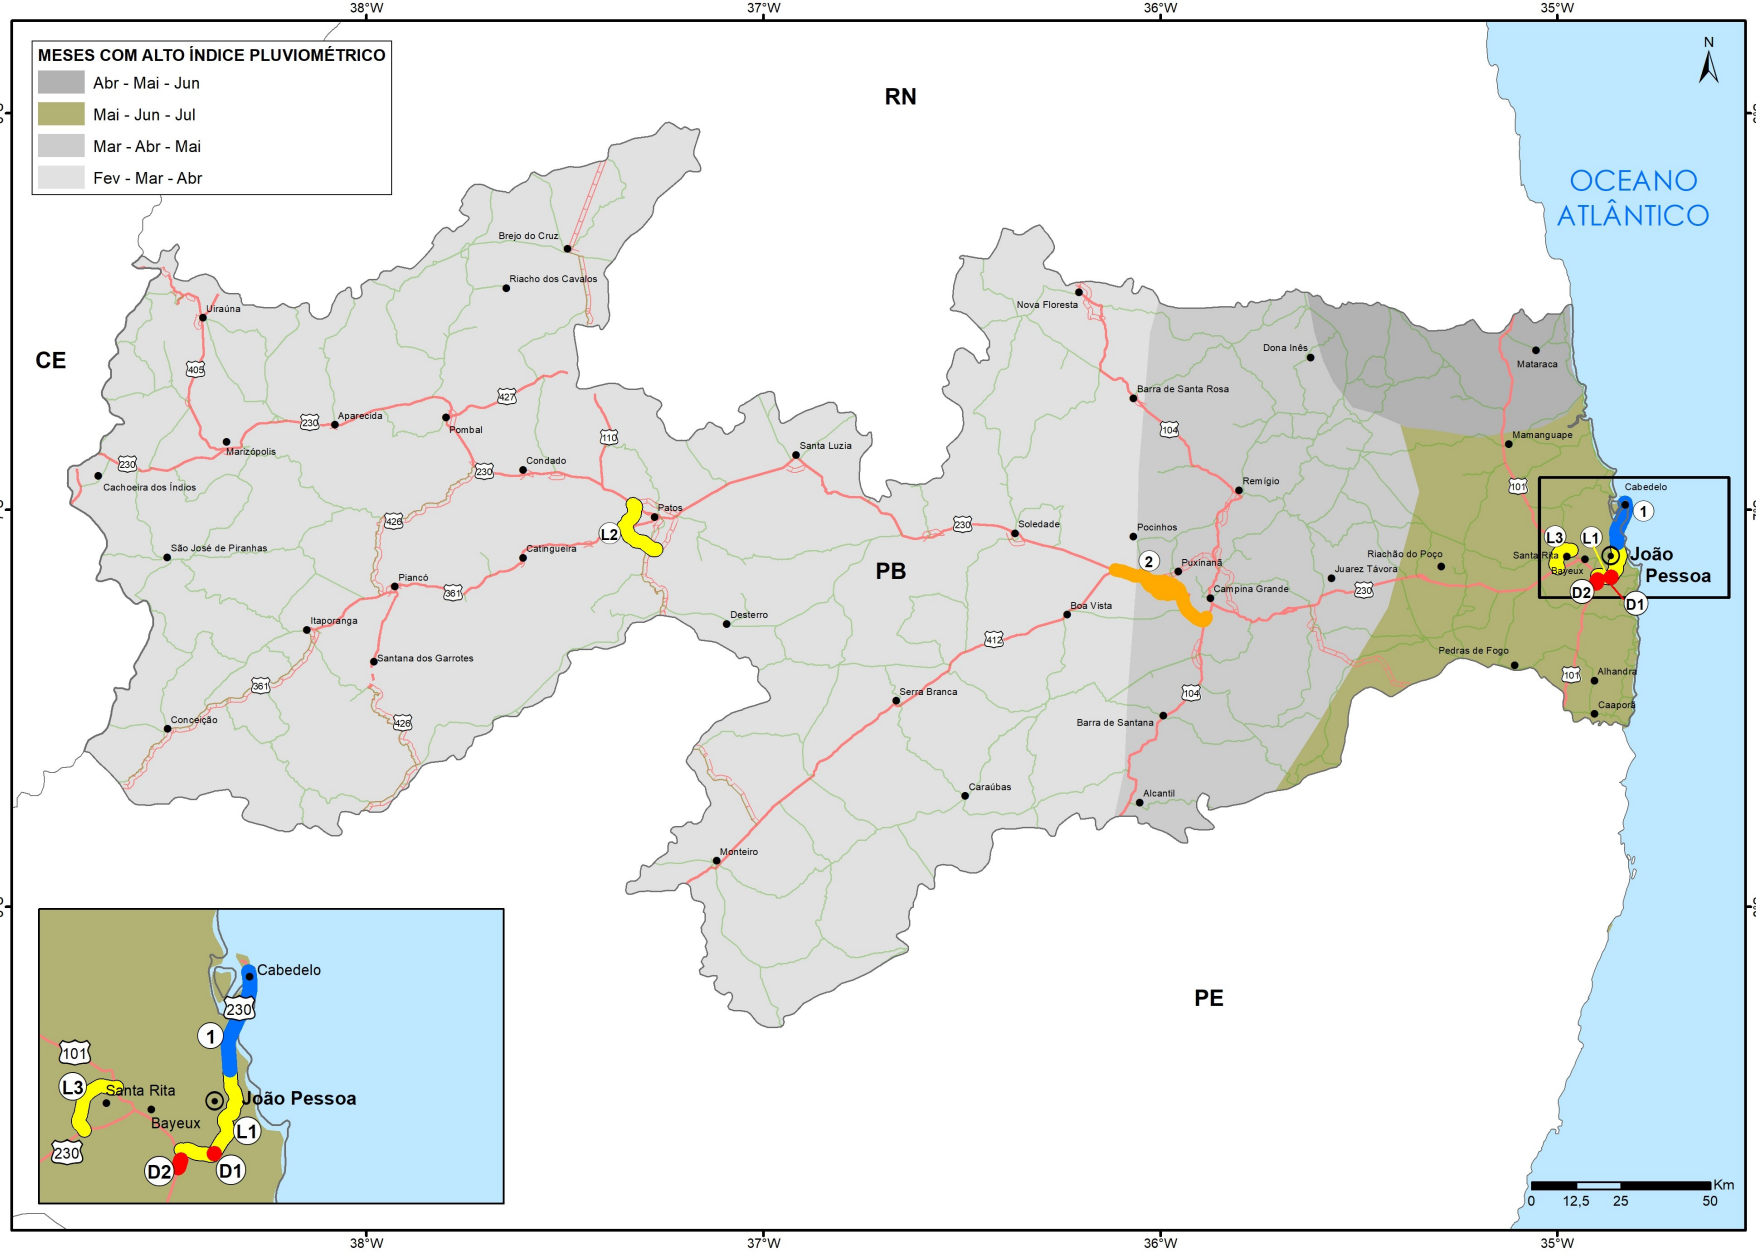

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL
PARAÍBA

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - Planejada
  - Concedida

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	31,60 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	11,78 Km
A LICITAR	
OAE*	
Total	**45,38 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2049	7T98	2-3-7	Único	13 00434/2023	CONSÓRCIO CLC / CONSERVA	BR-230	2,00 13,38	11,38	Adequação de Cabedelo - João Pessoa	29/08/2023	10/11/2026	R$ 186.419.172,15	72,79%	Drenagem, restauração e OAEs em execução. Novo cronograma, motivado por chuvas e interferências, aguarda análise e aprovação.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
2	2048	13YE	2-3	Único	13 00938/2017	CONSÓRCIO LCM/CCL/PRODEC BR-230/PB	BR-230	152,30 183,90	31,6	Duplicação Campina Grande - Farinha	02/01/2018	31/08/2026	R$ 567.121.479,67	45,19%	Executando terraplenagem, pavimentação e OAEs. LI do Seg 3 pendente. Interferências com Energisa e CAGEPA. Novo cronograma em análise.	13 00651/2025	JBR ENGENHARIA LTDA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1				ACT-109/2022	ESTADO DA PARAÍBA	BR-230	24,32 24,32	0	Construção do Viaduto de Água Fria (estaca 1216, Km 24,32)	31/03/2022	01/08/2025	R$ 0,00	R$ 28.711.428,32	R$ 28.711.428,32	0%	Viaduto concluído. As-built pendente.		
D2				ACT-181/2024	ESTADO DA PARAÍBA	BR-101	89,70 90,10	0,4	Construção do Viaduto do Bairro das Indústrias e vias marginais	05/08/2024	22/01/2027	R$ 0,00	R$ 19.843.717,19	R$ 19.843.717,19	0%	Obra delegada em andamento. Previsão de conclusão até Jul/26.		

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2049	7T98	2-3-7		BR-230	13,38 28,10	Adequação de Oitizeiro - João Pessoa	50613.000790/2025-50		Anteprojeto aprovado na SEPLAN/PB. Em fase de atos preparatórios do processo licitatório. Será contratação integrada.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
L2	3871	161Q			BR-230		Contorno de Patos			Projetos em análise na SR com previsão de aprovação até o fim de 2026.		
L3	4641				BR-230		Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa			Edital 359/2025 de elaboração de projetos adjudicado e homologado pela SR/PB. Aguarda-se assinatura de contrato.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
