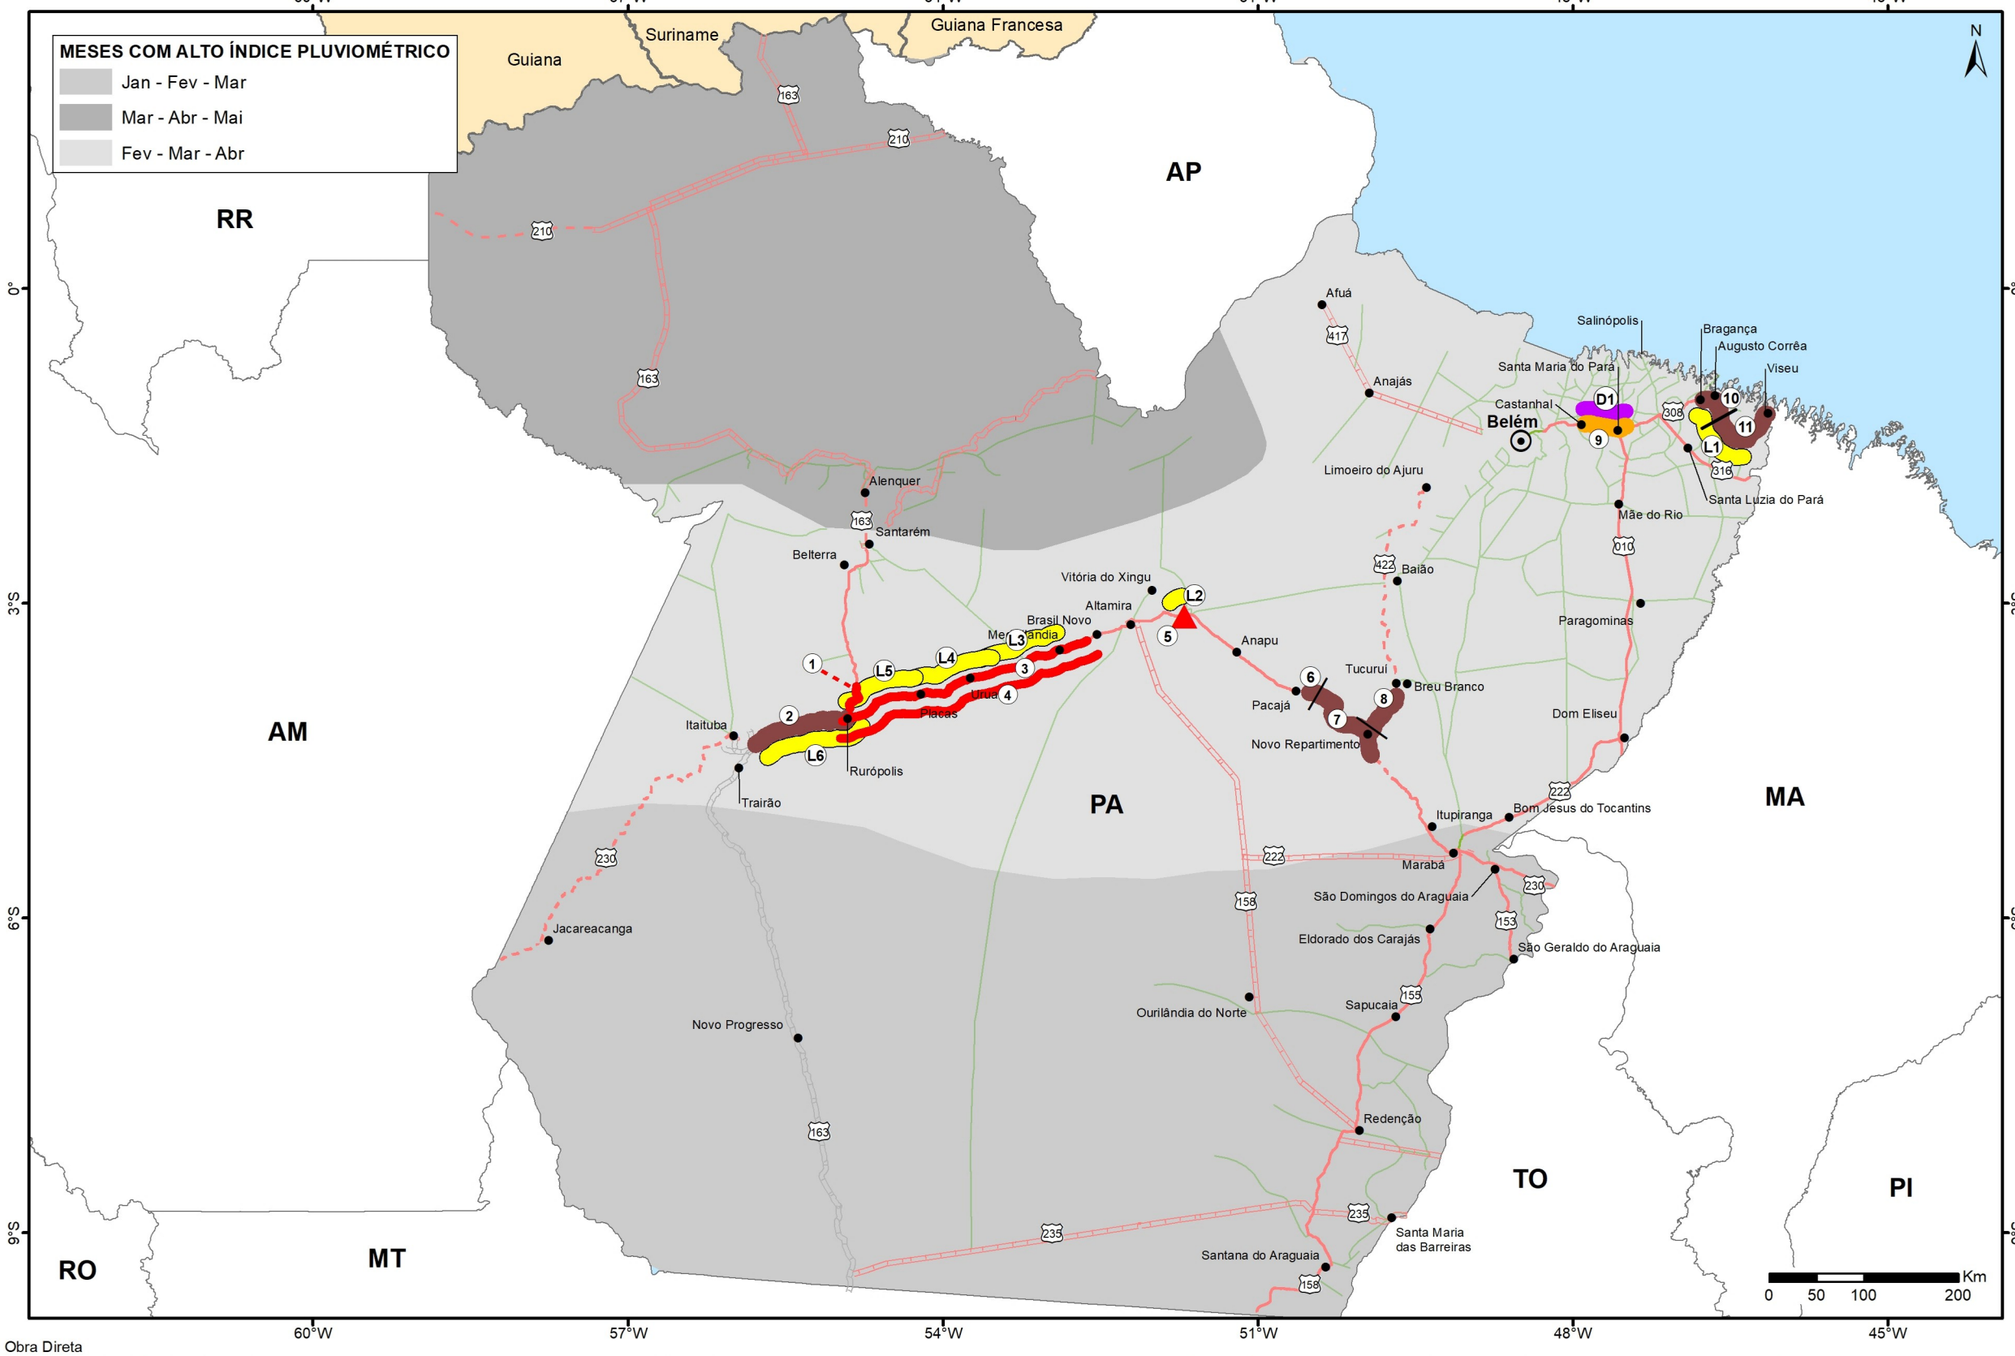

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇAO GERAL DE CONSTRUÇAO RODOVIARIA
MAPA GERENCIAL
PARÁ

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - Planejada

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	400,72 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	45,00 Km
OBRAS COMPLEMENTARES**	
OAE*	
OAE	
A LICITAR	
Total	**445,72 Km**

* Contrato para construção de OAEs ao longo do trecho da rodovia.
** Intervenção para remoção de rede elétrica

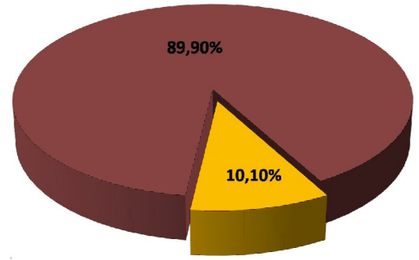

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.
Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1		1490	2-3	Único	02 00263/2023	CONSÓRCIO AGR/LCM BR-163	BR-163	814,00 844,00	1,68	Acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto.	09/05/2023	26/07/2025	R$ 19.165.463,19	99,04%	Obras concluídas. Em fase de recebimento provisório.		
2	2042	1490	2-3	Único	00 00035/2013	CONSÓRCIO SANCHES TRIPOLONI - BENITO ROGGIO - CONSOL	BR-163	676,31 788,98	112,67	Implantação da BR-163/PA.	01/07/2013	26/10/2024	R$ 329.102.703,65	78,7%	Contrato em conclusão. Previsão de contratação de remanescente de serviços em 2026.	Edital 0075/25-02	Em licitação
3	2043	110I	2-3-8	4	00 00851/2016	CONSÓRCIO VEREDA - ENECON	BR-230	727,80 894,22	0	Execução de OAE na BR-230 (12 Pontes).	22/01/2017	09/04/2024	R$ 50.110.128,69	99,32%	Obra concluída em Abr/24.	00 00352/2013	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
4	2043	110I	2-3-8		02 00261/2024	PLANEJE LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	BR-230	709,40 1006,80	297,5	Desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo. Entrega	13/06/2024	10/09/2027	R$ 50.415.979,49	0%	Obra em fase de projeto.	02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
5	2044	161U-10KR	3-2	Único	00 00011/2021	CONSÓRCIO CONSTRUBASE / CIDADE	BR-230	571,00 571,70	0,7	Construção de ponte sobre o rio Xingú.	25/05/2021	07/04/2026	R$ 385.779.571,07	37,35%	A obra se encontra em execução de infraestrutura e mesoestrutura.	02 00519/2023	CONSÓRCIO STE - ENECON
6		10KR	2-3	Único	02 00398/2024	CONSTRUTORA JUMBO LTDA	BR-230	390,87 398,95	8,08	Remanescente do Complexo Ladeira da Velha Rodovia	04/07/2024	01/10/2025	R$ 53.584.238,17	0%	Obra em fase de projeto.	02 00519/2023	CONSÓRCIO STE - ENECON
7	2045	10KR	2-3	2	02 00582/2010	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	BR-230	283,60 388,60	105	Implantação da BR-230.	05/07/2010	14/07/2024	R$ 290.919.955,45	97,82%	Obra concluída.	02 00936/2018	ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
8	2046	7S61	3	Único	02 00731/2021	CONSÓRCIO BR-422 (LCM - ÁPIA)	BR-422	0,00 59,34	59,34	Construção e pavimentação da BR-422/PA.	10/12/2021	22/09/2026	R$ 228.555.409,36	67,74%	Obra em andamento com 40,78 km implantados. Prevista a conclusão da pavimentação até Dez/25.	02 00490/2022	CONSÓRCIO STE / PROGAIA
9	2040	7W07	3	Único	02 00471/2021	TAMASA ENGENHARIA S/A	BR-316	67,60 112,60	45	Duplicação da BR-316.	06/09/2021	04/09/2025	R$ 192.897.658,29	45,34%	Obra em andamento com 20,28 km concluídos. Previsto remanescente de serviços.	02 00010/2018	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
10	2047	7S62	3	1	02 00341/2024	GONÇALVES DIAS ENGENHARIA LTDA	BR-308	203,27 239,27	36	Remanescente de Implantação e Pevimentação do Lote 1	01/07/2024	28/09/2026	R$ 63.839.480,45	21,96%	Obra em andamento com 13,16 km concluídos.	Edital 0060/25-02	Em licitação
11	2047	7S62	3	2	02 00342/2024	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	BR-308	239,27 318,90	79,63	Remanescente de Implantação e Pevimentação do Lote 2	04/07/2024	01/10/2026	R$ 199.071.346,44	9,14%	Obra em andamento com 7,92 km concluídos.	Edital 0060/25-02	Em licitação

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	2040	7W07	3	ACT-433/2023	Estado do Pará	BR-316	67,60 112,60	45	Delegar Supervisão e Execução de remoção de rede elétrica	27/07/2023	12/01/2026	R$ 0,00	R$ 23.168.341,45	R$ 23.168.341,45	0%	A previsão de remanejamento de rede elétrica é Ago/25, mas ainda sem nenhuma movimentação por parte da Concessionária.		

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1		7S62	3	BR-308	204,30 276,40	Construção de 11 OAEs			Previsão de licitação no 2º semestre/2025.	Edital 0060/25-02	Em licitação
L2		161U	3	BR-230	569,61 572,28	Acesso à ponte do rio Xingu			Previsão de licitação 2º semestre/2025.	02 00519/2023	
L3	2041	110I	2-3-8	BR-230	728,00 811,10	Prev 4 - Lote 1			Previsão de contratação de obra no 2º semestre/2025.	02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
L4	2041	110I	2-3-8	BR-230	811,10 894,22	Prev 5 - Lote 2			Previsão de contratação de obra no 2º semestre/2025.	02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
L5	2041	110I	2-3-8	BR-230	894,22 976,99	Prev 6 - Lote 3			Previsão de contratação de obra no 2º semestre/2025.	02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
L6	2042	1490	2-3	BR-163	676,31 788,98	Remanescente do contrato 00 00035/2013			Remanescente do contrato 00 00035/2013. Previsão de contratação da obra em 2026.	Prev 08 CONTR	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
