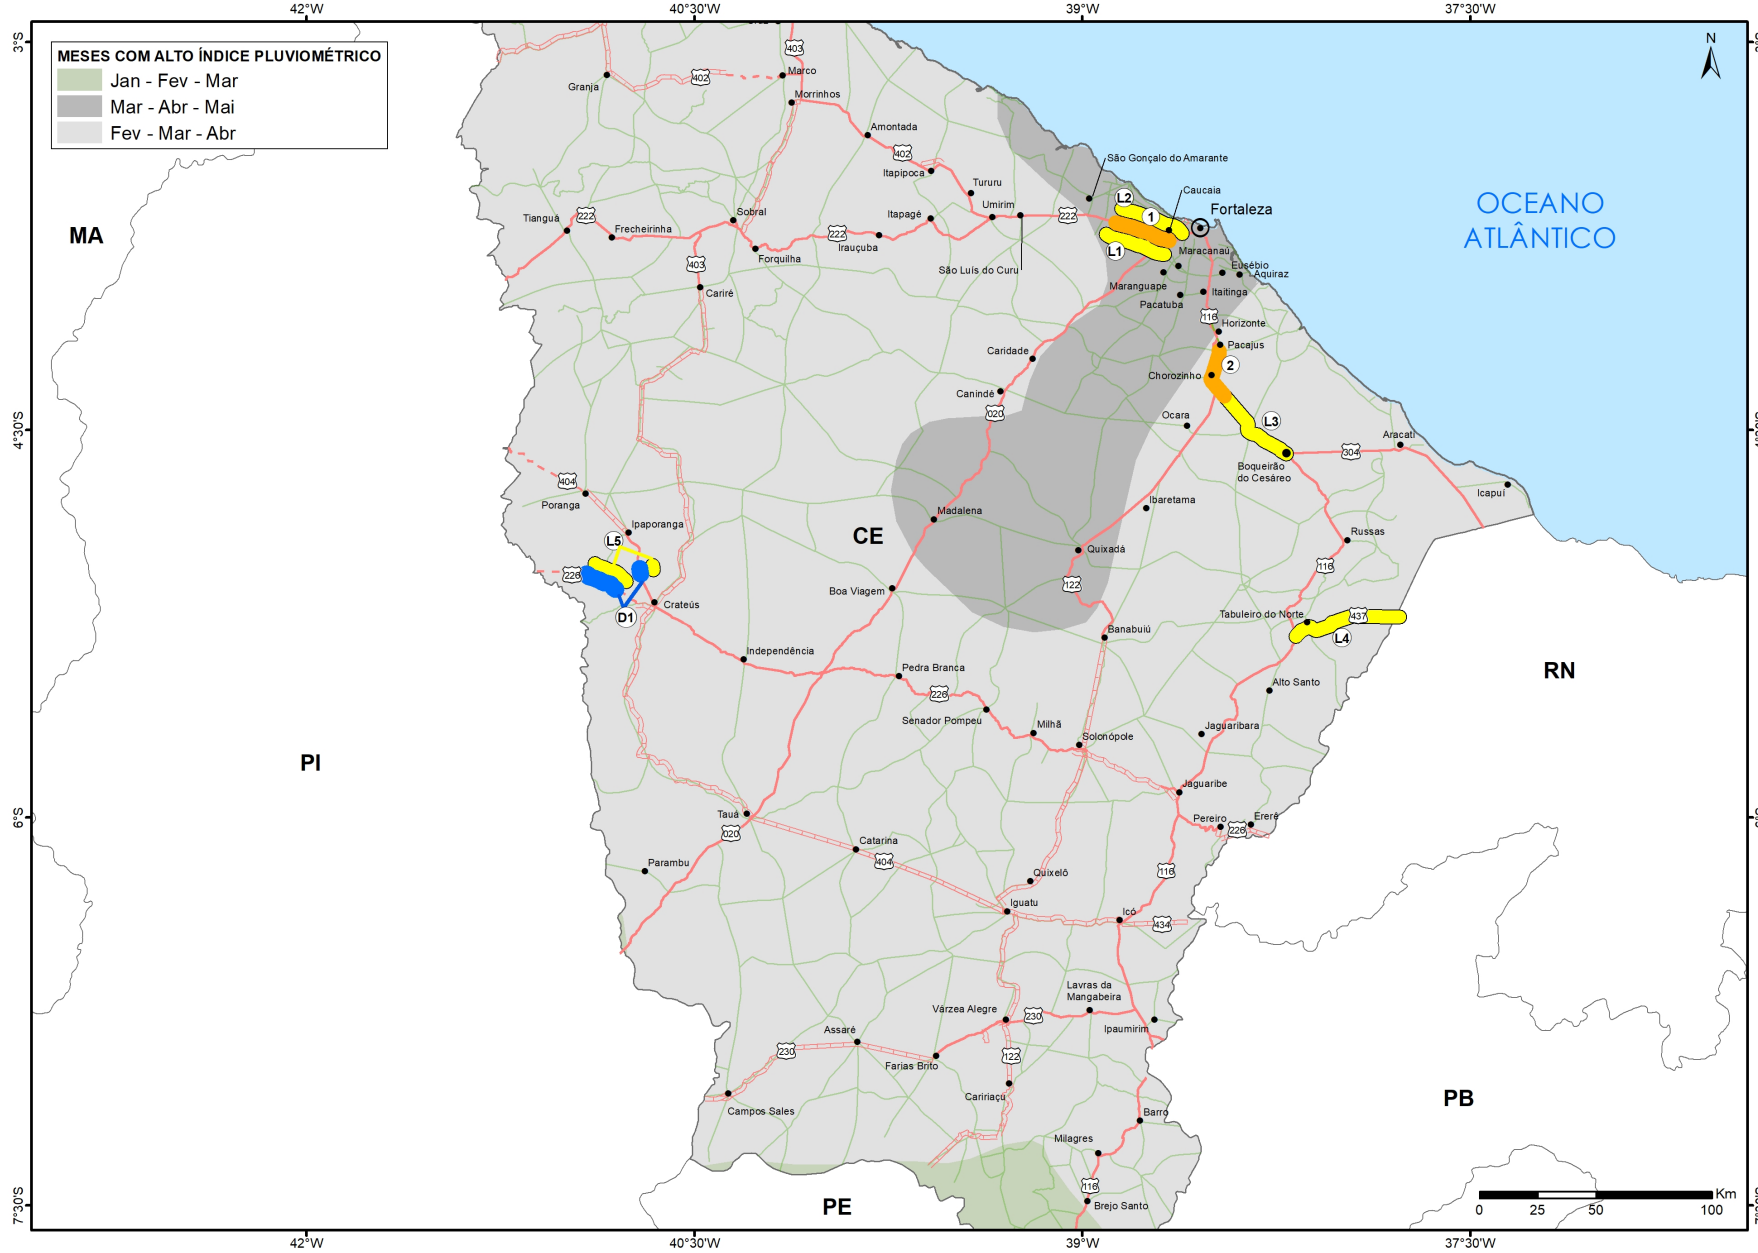

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2008	10L3	2-3	Único	03 00537/2015	CONSÓRCIO TORC - MAIA MELO	BR-222	11,40 35,70	24,3	Duplicação do Acesso ao Porto de Pecém	27/08/2015	30/06/2026	R$ 282.317.180,17	95,77%	Pavimentação concluída. Prevista a entrega total da obra no 2º Sem/26.	03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
2	2009	13X6	3	1	03 00077/2024	CONSÓRCIO CLC-CONSERVA-ESTRATÉGICA	BR-116	53,40 75,50	22,1	Duplicação Pacajus - Boqueirão do Cesário	25/03/2024	03/01/2028	R$ 289.066.893,85	13,21%	Em andamento serviços de drenagem e OAC, pavimentação, tal como a execução das pontes sobre o Riacho Sangradouro e o Riacho Campestre.	03 00935/2024	CONSÓRCIO PROSUL-GEOSSISTEMAS-HIDROCONSULT

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1				ACT-266/2023	DNOCS	BR-404	73,00 74,90	1,9	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	09/02/202	R$ 0,00	R$ 84.006.006,04	R$ 84.006.006,04	0%	Em andamento o ACT com a execução dos projetos básicos e às ações de desapropriação e licenciamento ambiental.		
D1				ACT-266/2023	DNOCS	BR-226	356,00 370,80	14,8	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	09/02/202	R$ 0,00	R$ 84.006.006,04	R$ 84.006.006,04	0%	Em andamento o ACT com a execução dos projetos básicos e às ações de desapropriação e licenciamento ambiental.		

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1		10L3	2-3	Único	BR-222	11,40 35,70	Construção de benfeitorias previsto no PBA I			Em tratativas para contratação da construção das benfeitorias, que serão realizadas em três processos licitatórios distintos (I, II, III), dos quais um já se encontra em andamento.	03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
L2					BR-222	11,40 35,70	ACT Projeto Executivo/Execução do Cruzamento Rodoferroviário e remanescentes das obras do contrato 537/2025			Em tratativas para celebração de ACT, referente à elaboração de Projeto Executivo/Execução das Obras do Cruzamento Rodoferroviário TLSA MVP 11 x BR-222/CE.	A LICITAR	A LICITAR
L3	123662	13X6	3	2/3	BR-116		Adequação de Pacajus - Boqueirão do Cesário - Lotes 2 e 3			A nteprojetos doados pelo estado por meio da SOP. Os lotes 2 e 3, conforme inicialmente segmentado o empreendimento, serão unificados.Obra com previsão de licitação na modalidade integrada no 1º Sem/26.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
L4	2494	165N		2	BR-437	0,00 48,50	Adequação Div. RN/CE - Entr. BR-116			Em andamento processo para obtenção de licença ambiental, a fim de viabilizar a licitação da obra na modalidade integrada. Projetos já aprovados.	A LICITAR	A LICITAR
L5		167R	3	Único	BR-226	356,00 370,80	Adequação nas BRs 404 e 226/CE			Estão em tratativas os procedimentos para licitação do empreendimento na modalidade semi-integrada.	A LICITAR	A LICITAR
L5		167R	3	Único	BR-404	73,00 74,90	Adequação nas BRs 404 e 226/CE			Estão em tratativas os procedimentos para licitação do empreendimento na modalidade semi-integrada.	A LICITAR	A LICITAR

*Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. **Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
