Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Custo
1		**1**	**CONTRATO - IMPERMEABILIZAÇÃO FNS**	**1340 dias**	**Seg 01/06/26**	**Qui 31/01/30**			**-R$ 2.856,51**
2		1.1	Ordem de Serviço	0 dias	Seg 01/06/26	Seg 01/06/26		3	R$ 0,00
3		1.2	Mobilização	15 dias	Seg 01/06/26	Ter 16/06/26	2	6;5	R$ 0,00
4		**1.3**	**EAP - PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - DRF - FNS**	**365 dias**	**Ter 16/06/26**	**Qua 16/06/27**			**-R$ 2.856,51**
5		1.3.1	ART	0 dias	Ter 16/06/26	Ter 16/06/26	3	9TI+5 dias;7TI+5 dias	-R$ 2.856,51
6		1.3.2	PEB - Plano de Execução BIM	30 dias	Ter 16/06/26	Qui 16/07/26	3	9TI+5 dias;7TI+5 dias	R$ 0,00
7		1.3.3	Recebimento do PEB	5 dias	Ter 21/07/26	Dom 26/07/26	6TI+5 dias;5TI	12	R$ 0,00
8		**1.3.4**	**Relatório de Análise Inicial e Diagnóstico**	**40 dias**	**Ter 21/07/26**	**Dom 30/08/26**			**R$ 0,00**
9		1.3.4.1	Programa de Necessidades	30 dias	Ter 21/07/26	Qui 20/08/26	6TI+5 dias;5TI	12TI+5 dias;10	R$ 0,00
10		1.3.4.2	Recebimento do Programa de Necessidades	10 dias	Qui 20/08/26	Dom 30/08/26	9	12	R$ 0,00
11		**1.3.5**	**Projeto Básico**	**140 dias**	**Dom 30/08/26**	**Dom 17/01/27**			**R$ 0,00**
12		1.3.5.1	Ordem de Serviço	0 dias	Dom 30/08/26	Dom 30/08/26	9TI+5 dias;7;1	13;14;15;16;17;18	R$ 0,00
13		1.3.5.2	Projeto Arquitetônico da Cobertura e Fachadas	75 dias	Dom 30/08/26	Sex 13/11/26	12	14TT+5 dias;15TT+5 d	R$ 0,00
14		1.3.5.3	Projeto de Paisagismo	60 dias	Sáb 19/09/26	Qua 18/11/26	13TT+5 dias;11	20;19	R$ 0,00
15		1.3.5.4	Projeto Luminotécnico	60 dias	Sáb 19/09/26	Qua 18/11/26	13TT+5 dias;11	20;19	R$ 0,00
16		1.3.5.5	Projeto de Impermeabilização da Cobertura	60 dias	Dom 30/08/26	Qui 29/10/26	12	21TI+5 dias;19	R$ 0,00
17		1.3.5.6	Projeto de Impermeabilização das Fachadas	60 dias	Dom 30/08/26	Qui 29/10/26	12	21TI+5 dias;19	R$ 0,00
18		1.3.5.7	Projeto de Adaptações Estruturais	60 dias	Dom 30/08/26	Qui 29/10/26	12	21TI+5 dias	R$ 0,00
19		1.3.5.8	Projeto Elétrico e SPDA	60 dias	Qua 18/11/26	Dom 17/01/27	13;14;15;16;17	21TI+5 dias	R$ 0,00
20		1.3.6	Aprovação do Projeto nos Órgãos Públicos	60 dias	Qua 18/11/26	Dom 17/01/27	13;14;15	24	R$ 0,00
21		1.3.7	Recebimento PB	15 dias	Sex 22/01/27	Sáb 06/02/27	19TI+5 dias;16	23TI+5 dias	R$ 0,00
22		**1.3.8**	**Projeto Executivo**	**125 dias**	**Qui 11/02/27**	**Qua 16/06/27**			**R$ 0,00**
23		1.3.8.1	Ordem de Serviço	0 dias	Qui 11/02/27	Qui 11/02/27	21TI+5 dias	24;25;26;27;28;29;30;	R$ 0,00
24		1.3.8.2	Projeto Arquitetônico da Cobertura e Fachadas	60 dias	Qui 11/02/27	Seg 12/04/27	23;20	25TT;32TI+5 dias;26TI	R$ 0,00
25		1.3.8.3	Projeto de Paisagismo	60 dias	Qui 11/02/27	Seg 12/04/27	23;24TT	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
26		1.3.8.4	Projeto Luminotécnico	60 dias	Qui 11/02/27	Seg 12/04/27	23;24TT	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
27		1.3.8.5	Projeto de Impermeabilização da Cobertura	60 dias	Qui 11/02/27	Seg 12/04/27	23	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
28		1.3.8.6	Projeto de Impermeabilização das Fachadas	60 dias	Qui 11/02/27	Seg 12/04/27	23	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
29		1.3.8.7	Projeto Elétrico e SPDA	60 dias	Qui 11/02/27	Seg 12/04/27	23	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
30		1.3.8.8	Projeto de Adaptações Estruturais	30 dias	Qui 11/02/27	Sáb 13/03/27	23	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
31		1.3.8.9	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	30 dias	Qui 11/02/27	Sáb 13/03/27	23	32TI+5 dias;33TI+5 dia	R$ 0,00
32		1.3.8.10	Orçamento Definitivo e Detalhado	60 dias	Sáb 17/04/27	Qua 16/06/27	29TI+5 dias;28	34	R$ 0,00
33		1.3.8.11	Cronograma de Obra Definitivo e Detalhado	60 dias	Sáb 17/04/27	Qua 16/06/27	29TI+5 dias;28	34	R$ 0,00
34		1.4	Recebimento do PE	30 dias	Qua 16/06/27	Sex 16/07/27	33;32	36	R$ 0,00
35		**1.5**	**EAP - OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - DRF - FNS**	**720 dias**	**Sex 16/07/27**	**Qui 05/07/29**			**R$ 0,00**
36		1.5.1	Ordem de Serviço	0 dias	Sex 16/07/27	Sex 16/07/27	34	40;38;41;37	R$ 0,00
37		1.5.2	ART	0 dias	Sex 16/07/27	Sex 16/07/27	36	38II	R$ 0,00
38		1.5.3	Serviços Administrativos	720 dias	Sex 16/07/27	Qui 05/07/29	36;37II	113TT	R$ 0,00
39		**1.5.4**	**Serviços Operacionais**	**720 dias**	**Sex 16/07/27**	**Qui 05/07/29**			**R$ 0,00**
40		1.5.4.1	Serviços Preliminares	8 dias	Sex 16/07/27	Sáb 24/07/27	36	44	R$ 0,00
41		1.5.4.2	Locação e aquisição de materiais e equipamentos para proteção e apoio para execução dos serviços	720 dias	Sex 16/07/27	Qui 05/07/29	36	113TT	R$ 0,00
42		**1.5.4.3**	**Recuperação dos Sistemas de Impermeabilização**	**662 dias**	**Sáb 24/07/27**	**Qua 16/05/29**		**111;109;110;112**	**R$ 0,00**
43		1.5.4.3	Bloco 1	107 dias	Sáb 24/07/27	Seg 08/11/27			R$ 0,00
44		1.5.4.3.1	Ordem de Serviço Etapa	0 dias	Sáb 24/07/27	Sáb 24/07/27	40	46;50	R$ 0,00
45		1.5.4.3.1	Impermeabilização da Cobertura	57 dias	Sáb 24/07/27	Dom 19/09/27			R$ 0,00
46		1.5.4.3.1	Demolições e Retiradas	11 dias	Sáb 24/07/27	Qua 04/08/27	44	47TI-5 dias	R$ 0,00
47		1.5.4.3.1	Serviços preparatórios	11 dias	Sex 30/07/27	Ter 10/08/27	46TI-5 dias	48	R$ 0,00
48		1.5.4.3.1	Aplicação de Sistema de Impermeabilização	40 dias	Ter 10/08/27	Dom 19/09/27	47	52	R$ 0,00
49		1.5.4.3.1	Impermeabilização das Fachadas	52 dias	Sáb 24/07/27	Ter 14/09/27			R$ 0,00
50		1.5.4.3.1	Demolições e Lavagem	12 dias	Sáb 24/07/27	Qui 05/08/27	44	51	R$ 0,00
51		1.5.4.3.1	Aplicação de Novo Revestimento Externo	40 dias	Qui 05/08/27	Ter 14/09/27	50	52	R$ 0,00
52		1.5.4.3.1	Recuperação das pinturas internas	45 dias	Dom 19/09/27	Qua 03/11/27	51;48	53TI+5 dias	R$ 0,00
53		1.5.4.3.1	Recebimento Etapa	0 dias	Seg 08/11/27	Seg 08/11/27	52TI+5 dias	55	R$ 0,00
54		1.5.4.3.2	Bloco 2	107 dias	Seg 08/11/27	Qua 23/02/28			R$ 0,00
55		1.5.4.3.2	Ordem de Serviço Etapa	0 dias	Seg 08/11/27	Seg 08/11/27	53	57;61	R$ 0,00
56		1.5.4.3.2	Impermeabilização da Cobertura	57 dias	Seg 08/11/27	Ter 04/01/28			R$ 0,00
57		1.5.4.3.2	Demolições e Retiradas	11 dias	Seg 08/11/27	Sex 19/11/27	55	58TI-5 dias	R$ 0,00
58		1.5.4.3.2	Serviços preparatórios	11 dias	Dom 14/11/27	Qui 25/11/27	57TI-5 dias	59	R$ 0,00
59		1.5.4.3.2	Aplicação de Sistema de Impermeabilização	40 dias	Qui 25/11/27	Ter 04/01/28	58	63;64	R$ 0,00
60		1.5.4.3.2	Impermeabilização das Fachadas	52 dias	Seg 08/11/27	Qui 30/12/27			R$ 0,00
61		1.5.4.3.2	Demolições e Lavagem	12 dias	Seg 08/11/27	Sáb 20/11/27	55	62	R$ 0,00
62		1.5.4.3.2	Aplicação de Novo Revestimento Externo	40 dias	Sáb 20/11/27	Qui 30/12/27	61	63	R$ 0,00
63		1.5.4.3.2	Recuperação das pinturas internas	45 dias	Ter 04/01/28	Sex 18/02/28	62;59	64TI+5 dias	R$ 0,00
64		1.5.4.3.2	Recebimento Etapa	0 dias	Qua 23/02/28	Qua 23/02/28	63TI+5 dias;59	66	R$ 0,00
65		1.5.4.3.3	Bloco 3	107 dias	Qua 23/02/28	Sex 09/06/28			R$ 0,00
66		1.5.4.3.3	Ordem de Serviço Etapa	0 dias	Qua 23/02/28	Qua 23/02/28	64	68;72	R$ 0,00
67		1.5.4.3.3	Impermeabilização da Cobertura	57 dias	Qua 23/02/28	Qui 20/04/28			R$ 0,00
68		1.5.4.3.3	Demolições e Retiradas	11 dias	Qua 23/02/28	Dom 05/03/28	66	69TI-5 dias	R$ 0,00
69		1.5.4.3.3	Serviços preparatórios	11 dias	Ter 29/02/28	Sáb 11/03/28	68TI-5 dias	70	R$ 0,00
70		1.5.4.3.3	Aplicação de Sistema de Impermeabilização	40 dias	Sáb 11/03/28	Qui 20/04/28	69	74;75	R$ 0,00
71		1.5.4.3.3	Impermeabilização das Fachadas	52 dias	Qua 23/02/28	Sáb 15/04/28			R$ 0,00
72		1.5.4.3.3	Demolições e Lavagem	12 dias	Qua 23/02/28	Seg 06/03/28	66	73	R$ 0,00
73		1.5.4.3.3	Aplicação de Novo Revestimento Externo	40 dias	Seg 06/03/28	Sáb 15/04/28	72	74	R$ 0,00
74		1.5.4.3.3	Recuperação das pinturas internas	45 dias	Qui 20/04/28	Dom 04/06/28	73;70	75TI+5 dias	R$ 0,00
75		1.5.4.3.3	Recebimento Etapa	0 dias	Sex 09/06/28	Sex 09/06/28	74TI+5 dias;70	77	R$ 0,00
76		**1.5.4.3.4**	**Bloco 4**	**107 dias**	**Sex 09/06/28**	**Dom 24/09/28**			**R$ 0,00**
77		1.5.4.3.4	Ordem de Serviço Etapa	0 dias	Sex 09/06/28	Sex 09/06/28	75	79;83	R$ 0,00
78		1.5.4.3.4	Impermeabilização da Cobertura	57 dias	Sex 09/06/28	Sáb 05/08/28			R$ 0,00
79		1.5.4.3.4	Demolições e Retiradas	11 dias	Sex 09/06/28	Ter 20/06/28	77	80TI-5 dias	R$ 0,00
80		1.5.4.3.4	Serviços preparatórios	11 dias	Qui 15/06/28	Seg 26/06/28	79TI-5 dias	81	R$ 0,00
81		1.5.4.3.4	Aplicação de Sistema de Impermeabilização	40 dias	Seg 26/06/28	Sáb 05/08/28	80	85;86	R$ 0,00
82		1.5.4.3.4	Impermeabilização das Fachadas	52 dias	Sex 09/06/28	Seg 31/07/28			R$ 0,00
83		1.5.4.3.4	Demolições e Lavagem	12 dias	Sex 09/06/28	Qua 21/06/28	77	84	R$ 0,00
84		1.5.4.3.4	Aplicação de Novo Revestimento Externo	40 dias	Qua 21/06/28	Seg 31/07/28	83	85	R$ 0,00
85		1.5.4.3.4	Recuperação das pinturas internas	45 dias	Sáb 05/08/28	Ter 19/09/28	81;84	86TI+5 dias	R$ 0,00
86		1.5.4.3.4	Recebimento Etapa	0 dias	Dom 24/09/28	Dom 24/09/28	85TI+5 dias;81	88	R$ 0,00
87		**1.5.4.3.5**	**Bloco 5**	**107 dias**	**Dom 24/09/28**	**Ter 09/01/29**			**R$ 0,00**
88		1.5.4.3.5	Ordem de Serviço Etapa	0 dias	Dom 24/09/28	Dom 24/09/28	86	90;94	R$ 0,00
89		1.5.4.3.5	Impermeabilização da Cobertura	57 dias	Dom 24/09/28	Seg 20/11/28			R$ 0,00
90		1.5.4.3.5	Demolições e Retiradas	11 dias	Dom 24/09/28	Qui 05/10/28	88	91TI-5 dias	R$ 0,00
91		1.5.4.3.5	Serviços preparatórios	11 dias	Sáb 30/09/28	Qua 11/10/28	90TI-5 dias	92	R$ 0,00
92		1.5.4.3.5	Aplicação de Sistema de Impermeabilização	40 dias	Qua 11/10/28	Seg 20/11/28	91	96;97	R$ 0,00
93		1.5.4.3.5	Impermeabilização das Fachadas	52 dias	Dom 24/09/28	Qua 15/11/28			R$ 0,00
94		1.5.4.3.5	Demolições e Lavagem	12 dias	Dom 24/09/28	Sex 06/10/28	88	95	R$ 0,00
95		1.5.4.3.5	Aplicação de Novo Revestimento Externo	40 dias	Sex 06/10/28	Qua 15/11/28	94	96	R$ 0,00
96		1.5.4.3.5	Recuperação das pinturas internas	45 dias	Seg 20/11/28	Qui 04/01/29	95;92	97TI+5 dias	R$ 0,00
97		1.5.4.3.5	Recebimento Etapa	0 dias	Ter 09/01/29	Ter 09/01/29	96TI+5 dias;92	99	R$ 0,00
98		**1.5.4.3.6**	**Bloco 6**	**127 dias**	**Ter 09/01/29**	**Qua 16/05/29**			**R$ 0,00**
99		1.5.4.3.6	Ordem de Serviço Etapa	0 dias	Ter 09/01/29	Ter 09/01/29	97	101;105	R$ 0,00
100		1.5.4.3.6	Impermeabilização da Cobertura	47 dias	Ter 09/01/29	Dom 25/02/29			R$ 0,00
101		1.5.4.3.6	Demolições e Retiradas	11 dias	Ter 09/01/29	Sáb 20/01/29	99	102TI-5 dias	R$ 0,00
102		1.5.4.3.6	Serviços preparatórios	11 dias	Seg 15/01/29	Sex 26/01/29	101TI-5 dias	103	R$ 0,00
103		1.5.4.3.6	Aplicação de Sistema de Impermeabilização	30 dias	Sex 26/01/29	Dom 25/02/29	102	107;108	R$ 0,00
104		1.5.4.3.6	Impermeabilização das Fachadas	67 dias	Ter 09/01/29	Sáb 17/03/29			R$ 0,00
105		1.5.4.3.6	Demolições e Lavagem	12 dias	Ter 09/01/29	Dom 21/01/29	99	106	R$ 0,00
106		1.5.4.3.6	Aplicação de Novo Revestimento Externo	55 dias	Dom 21/01/29	Sáb 17/03/29	105	107	R$ 0,00
107		1.5.4.3.6	Recuperação das pinturas internas	55 dias	Sáb 17/03/29	Sex 11/05/29	103;106	108TI+5 dias	R$ 0,00
108		1.5.4.3.6	Recebimento Etapa	0 dias	Qua 16/05/29	Qua 16/05/29	107TI+5 dias;11	111;109;110;112	R$ 0,00
109		1.5.4.4	Instalações Elétricas	30 dias	Qua 16/05/29	Sex 15/06/29	108;42	113	R$ 0,00
110		1.5.4.5	Instalações Mecânicas	30 dias	Qua 16/05/29	Sex 15/06/29	108;42	113	R$ 0,00
111		1.5.4.6	Aplicação de Revestimentos e Serviços Finais de Paisagismo na Cobertura	40 dias	Qua 16/05/29	Seg 25/06/29	108;42	113	R$ 0,00
112		1.5.4.7	Revestimentos da Cobertura	40 dias	Qua 16/05/29	Seg 25/06/29	108;42	113	R$ 0,00
113		1.5.4.8	Desmobilização e Limpeza Final	10 dias	Seg 25/06/29	Qui 05/07/29	111;38TT;109;11	114	R$ 0,00
114		1.6	Final dos Serviços Operacionais	0 dias	Qui 05/07/29	Qui 05/07/29	113	115TI+15 dias	R$ 0,00
115		1.7	Recebimento Provisório da Obra	15 dias	Sex 20/07/29	Sáb 04/08/29	114TI+15 dias	116TI+90 dias	R$ 0,00
116		1.8	Recebimento Definitivo da Obra	0 dias	Sex 02/11/29	Sex 02/11/29	115TI+90 dias	117TI+90 dias	R$ 0,00
117		1.9	Encerramento do Contrato	0 dias	Qui 31/01/30	Qui 31/01/30	116TI+90 dias		R$ 0,00

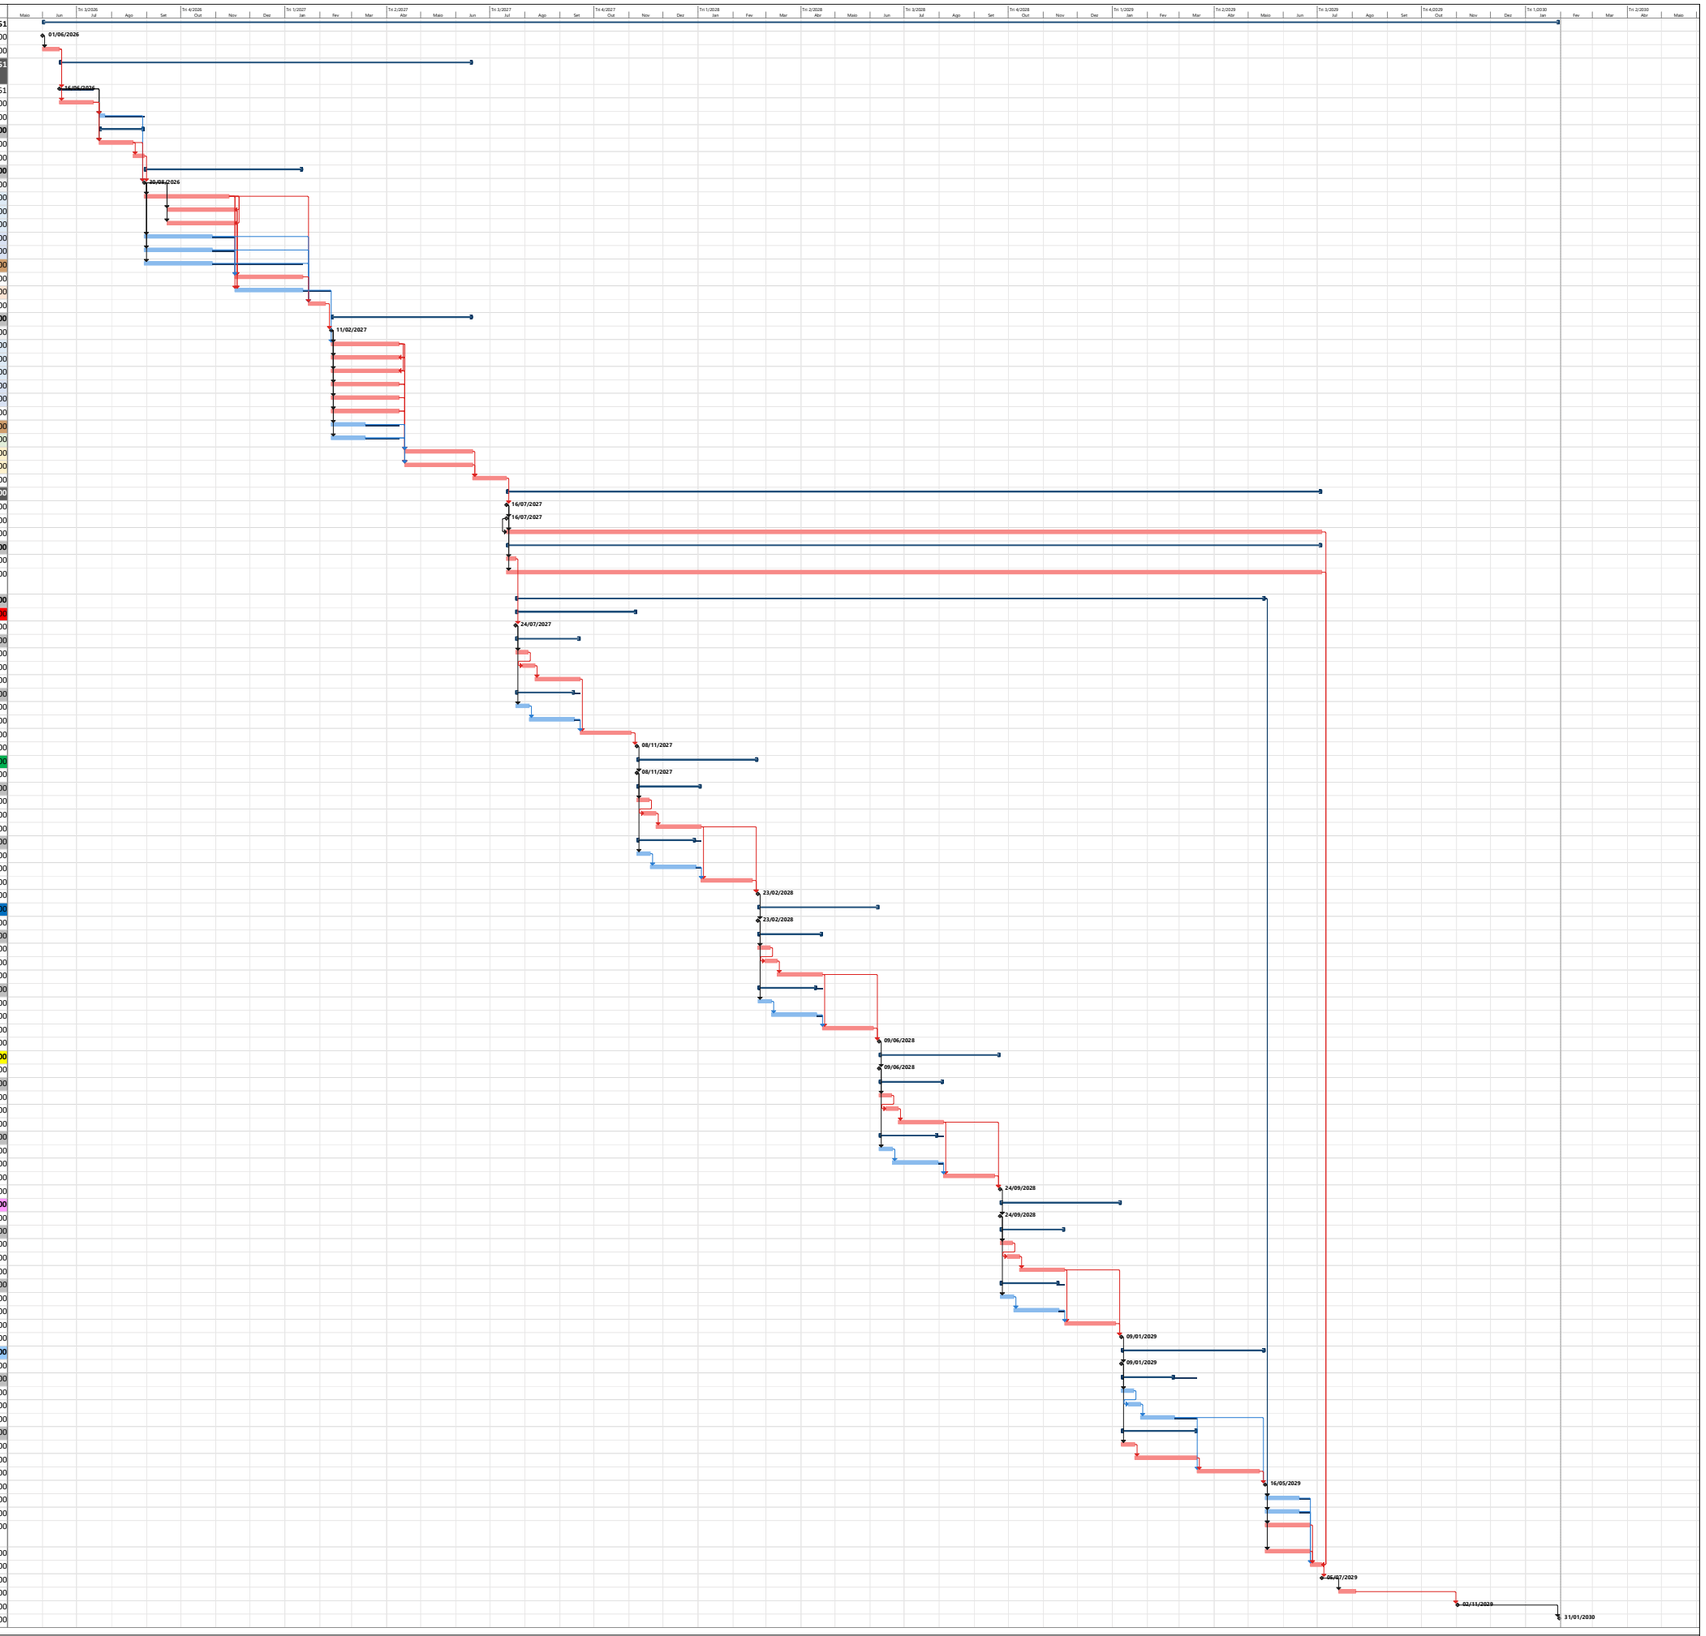

Projeto: EAP - IMPERMEABILIZA
Data: Qui 02/04/26

Tarefa · Marco · Resumo do projeto · Marco Inativo · Tarefa Manual · Acúmulo de Resumo Manual · Somente início · Tarefas externas · Data limite · Divisão crítica · Marco de Linha de Base · Andamento · Margem de Atraso
Divisão · Resumo · Tarefa Inativa · Resumo Inativo · Somente duração · Resumo Manual · Somente término · Marco externo · Crítica · Linha de Base · Resumo da Linha de Base · Progresso manual
