



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL

PLANO DE TRABALHO

3º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada - TED nº 899/2015.

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA:		
a) Unidade Descentralizadora e Responsável: Ministério da Infraestrutura	Nome da autoridade competente: HIRATAN PINHEIRO DA SILVA	CPF: 976. [REDACTED] 87
Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - no Estado do Rio Grande do Sul		
b) UG SIAFI		
Número e Nome da Unidade Gestora que descentralizará o crédito: UG Emitente: 393003 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) UG Gestão Emitente: 39252 - do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul (DNIT/RS)		
Número e Nome da Unidade Gestora - Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 39252 - do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul (DNIT/RS)		
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA:		
a) Unidade Descentralizada e Responsável: Polícia Rodoviária Federal (PRF)	Nome da autoridade competente: LUIS CARLOS REISCHAK JUNIOR	CPF: 005. [REDACTED] 27
Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS)		
b) UG SIAFI		
Número e Nome da Unidade Gestora que receberá o crédito: <i>200109/DEPTO.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL.</i>		
Número e Nome da Unidade Gestora - Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 200119/ Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul		
3. OBJETO:		
A) OBJETO DO TED: Elaboração de projetos executivos e construção de edificações referentes às novas Unidades Operacionais de Pelotas/RS e Rio Grande/RS e a Sede Administrativa da Delegacia em Pelotas (DEL07-RS), para uso da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal do estado do Rio Grande do Sul, em substituição às unidades atingidas por obras viárias da BR 392 e da BR 116.		
B) OBJETO DO PRESENTE PLANO DE TRABALHO E DO 3º TERMO ADITIVO: 1) Prorrogação do prazo da vigência do Termo de Execução Descentralizada TED/899/2015 em 12 meses, assim o prazo de vigência passa de 05/04/2022 para 05/04/2023. 2) Replanejamento e redistribuição do cronograma físico-financeiro de desembolso, visando a continuidade da execução das obras da Sede da Delegacia e das UOPS Pelotas e Rio Grande. 3) Atualização financeira no valor de R\$		

2.346.109,48 (dois milhões trezentos e quarenta e seis mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos) decorrente da nova contratação, além do reequilíbrio e repactuação das contratações das obras em execução, em alinhamento com as disposições do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TED nº 899/2015^[1].

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

A meta geral a ser alcançada é a finalização da construção da Sede Administrativa da Delegacia em Pelotas - DEL Pelotas e das Unidades Operacionais (UOPs) de Pelotas e Rio Grande, delimitadas conforme Cronograma Físico-Financeiro, constante no anexo I do Plano de Trabalho, SEI 39744369.

As etapas e prazos **previstos para execução** estão descritos no **Quadro 9.C** deste instrumento e respeitam as definições de Metas a seguir:

Meta 1 - Unidade Operacional de Pelotas - UOP Pelotas - Etapas 09 à 11.

Meta 2 - Sede Administrativa da Delegacia em Pelotas - DEL Pelotas - Etapas 10 à 16.

Meta 3 - Unidade Operacional de Rio Grande - UOP Rio Grande - Etapas 02 à 10.

As metas referidas estão em consonância com o Cronograma Físico-Financeiro e Cronograma de Desembolso, previstos respectivamente nos itens 9 e 10 do presente instrumento. As etapas das obras estão especificadas conforme Anexo I.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

A) PARA CELEBRAÇÃO DO TED: Considerando que as obras viárias na BR-116 e 392 impuseram a realocação das Unidades da Polícia Rodoviária Federal nas cidades de Pelotas/RS e Rio Grande/RS, faz-se necessária a celebração do presente termo para que sejam construídas as edificações da Sede Administrativa da Delegacia Regional e das Unidades Operacionais nas referidas cidades, com o intuito de que a Polícia Rodoviária Federal possa desempenhar sua missão de garantir a segurança viária cidadã nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União.

B) DO PRESENTE PLANO DE TRABALHO E 3º TERMO ADITIVO: 1) Viabilizar a conclusão das etapas remanescentes da construção da Sede Administrativa da Delegacia Regional e das Unidades Operacionais nas cidades de Pelotas/RS e Rio Grande/RS. 2) Garantir a alocação dos recursos necessários ao custeio da contratação da obra de Rio Grande e das repactuações e reajustes aplicados aos contratos vigentes das obras em execução.

Esse reajuste está previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TED nº 899/2015^[1]. Contudo, ao invés de reajustar o objeto do TED conforme o INCC, serão acrescidos os valores necessários aos reajustes reais para execução das obras, em alinhamento com os cronogramas físico-financeiros atualizados, tanto para o contrato recentemente formalizado (Rio Grande) quanto para as obras já em execução, Anexo I deste Plano de Trabalho, SEI 39744369. A referida atualização irá resultar em um acréscimo na execução de todo o objeto na ordem de R\$ 2.346.109,48 (dois milhões trezentos e quarenta e seis mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos), passando dos atuais R\$ 11.298.052,37 (onze milhões, duzentos e noventa e oito mil e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) para R\$ 13.644.161,85 (treze milhões seiscientos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Ver memória de cálculo Anexo II deste Plano de Trabalho, SEI 38944023.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO:

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

SIM NÃO

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

9.A									
ETAPAS JÁ EXECUTADAS - FASE DE PROJETOS									
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Valor		Duração		
			Unid.	Qtidade	Unitário	Total	Início	Término	
Projetos	01	Elaboração de Projeto Executivo da Unidade Operacional de Pelotas na BR-116/RS	m ²	780,08	R\$ 64.698,75	R\$ 64.698,75	Ago/16	Dez/17	
	02	Elaboração de Projeto Executivo da Sede da Delegacia em Pelotas (DEL07-RS) da SPRF-RS na BR-116/RS	m ²	1.390,78	R\$ 76.331,51	R\$ 76.331,51	Ago/16	Dez/17	
	03	Elaboração de Projeto Executivo da Unidade Operacional de Rio Grande na BR-392/RS	m ²	1.389,82	R\$ 76.058,09	R\$ 76.058,09	Ago/16	Dez/17	
VALOR TOTAL UTILIZADO						R\$ 217.088,35	Ago/16	Dez/17	
9.B									
ETAPAS JÁ PAGAS - FASE DE OBRAS									
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Valor		Duração		
			Unid.	Qtidade	Unitário	Total	Início	Término	
UOP Pelotas	01 à 08	Execução das obras da Unidade Operacional de Pelotas na BR-116/RS	m ²	337,00	R\$ 1.869.404,40	R\$ 1.869.404,40	Fev/21	Jan/22	
Delegacia Pelotas	01 à 09	Execução das obras da Sede da Delegacia em Pelotas (DEL07-RS) da SPRF-RS na BR-116/RS	m ²	408,00	R\$ 1.275.594,83	R\$ 1.275.594,83	Fev/21	Dez/21	
03 - UOP Rio Grande	01	Execução das obras da Unidade Operacional de Rio Grande na BR-392/RS	m ²	27,80	R\$ 72.250,17	R\$ 72.250,17	Nov/21	Dez/21	
VALOR TOTAL UTILIZADO						R\$ 3.217.249,40	Fev/21	Dez/21	
9.C									
ETAPAS COM EXECUÇÃO PREVISTAS - FASE DE OBRAS									
Meta	Etapa/Fase	Total Etapas Previstas	Especificação	Indicador Físico		Valor		Duração	
01 - UOP Pelotas	9ª	11	Execução das obras da Unidade Operacional	m ²	443,08	R\$ 2.457.428,53	R\$ 2.457.428,53	Fev/22	Abr/22

			de Pelotas na BR-116/RS						
02 - Delegacia Pelotas	10ª	16	Execução das obras da Sede da Delegacia em Pelotas (DEL07-RS) da SPRF-RS na BR-116/RS	m ²	982,78	R\$ 3.071.753,22	R\$ 3.071.753,22	Jan/22	Jul/22
03 - UOP Rio Grande	2ª	10	Execução das obras da Unidade Operacional de Rio Grande na BR-392/RS	m ²	1.362,02	R\$ 3.686.642,38	R\$ 3.686.642,38	Jan/22	Set/22
VALOR TOTAL PREVISTO							R\$ 9.215.824,13	Jan/22	Set/22

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

META	Fase	Mês/Ano	Valor	TOTAL PARA O EXERCÍCIO
Construção de duas Unidades Operacionais e da Sede Administrativa da Delegacia em Pelotas (DEL07-RS) da SPRF-RS	Executadas	JUN/2016	R\$ 211.088,35	R\$ 211.088,35
		MAI/2018	R\$ 1.000.000,00*	R\$ 1.000.000,00
		DEZ/2020	R\$ 3.627.790,19	R\$ 3.627.790,19
		MAR/2021	R\$ 3.273.021,00	R\$ 4.500.000,00
		JUL/2021	R\$ 1.226.979,00	
	A Executar	MAR/2022	R\$ 4.305.283,31	R\$ 4.305.283,31

Observações:

- Os indicadores em metros quadrados, são apresentados na proporção percentual de execução do cronograma físico-financeiro, os quais acompanham em anexo este instrumento.
- No quadro "9", constam os valores totais executados e com execução prevista neste instrumento. Os valores das parcelas estão atualizados em razão do reequilíbrio e repactuação dos contratos.
- * A diferença apurada entre o valor do desembolso e o utilizado corresponde ao crédito empenhado em favor da Construtora Engenharia e Incorporadora São Tomas, cujo contrato foi rescindido. Os empenhos emitidos em 2018 para aquela empresa *tiveram seus saldos automaticamente anulados pelo sistema no dia 31/12/2020*, uma vez que não houve liquidação e pagamento. Estas informações encontram-se descritas no Relatório Parcial de Cumprimento de Objeto, SEI 29989865, enviado por intermédio do Ofício nº 83/2021/SPRF-RS, SEI 30119902. As demais informações de acompanhamento foram consolidadas nos relatórios seguintes, SEI 34036794 e 38372644, encaminhadas, respectivamente, por intermédio dos ofícios 708/2021/SPRF-RS e 95/2022/SPRF-RS.
- O crédito total descentralizado até o presente momento é de R\$ 9.338.878,54. Destes, foram utilizados R\$ 4.910.540,79. A diferença apurada entre o valor atualizado dos contratos e o saldo de crédito remanescente é de R\$ 4.305.283,31. A memória de cálculo encontra-se encartada no SEI 38944023, Anexo II.
- A discriminação das etapas de execução da obra encontram-se no cronograma físico-financeiro, Anexo I deste instrumento.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO:

NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
449051 - OBRAS E INSTALACOES	<u>Construção de duas Unidades Operacionais e da Delegacia em Pelotas (DEL07-RS) da SRPRF-RS: APLICAÇÕES DIRETAS: Pagamento das empresas responsáveis pela elaboração de projetos básicos e executivos e execução das obras previstas no objeto, bem como das demais despesas necessárias à sua conclusão.</u>	Não	R\$ 13.644.161,85

12. PROPOSIÇÃO:

LUIS CARLOS REISCHAK JUNIOR
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RS

13. APROVAÇÃO:

HIRATAN PINHEIRO DA SILVA
Superintendente Regional do DNIT

[1] "Havendo necessidade de reajustar valores de serviços contratados estes terão como data-base o mês de Maio/2015, data da elaboração do orçamento, e como indexador o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC)"

PRF

Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS REISCHAK JUNIOR, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul**, em 09/03/2022, às 12:19, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

PRF

Documento assinado eletronicamente por **HIRATAN PINHEIRO DA SILVA, Usuário Externo**, em 11/03/2022, às 15:19, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.prf.gov.br/verificar>, informando o código verificador **39742269** e o código CRC **65D0B0C1**.




Referência: Processo nº 50610.001226/2015-11




SEI nº 39742269


SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DELEGACIA DE PELOTAS - RS	
LOCAL:	BR 116 - KM 54	
CONTRATO:	110208 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
		PREÇO (R\$) / PERCENTUAL (%)																		
		TOTALS	PRAZO - MÊS																	
		1	2	3	4	5 (15 DIAS)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.873,01	46.289,51	1.927,28	1.927,28	1.927,28	1.927,28	2.254,53	2.254,53	1.721,58	1.721,58	1.287,34	1.287,34	1.287,34	1.287,34	1.287,34	1.287,34	1.287,34	1.287,34	1.287,34
2	TRANSPORTE E ESCAVAÇÕES	54.696,87					3.953,50			21,69		5.469,69	13.575,60	18.100,80	6.735,35	6.840,25				
3	INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA IN LOCO	765.688,05	16.177,24	34.765,41	73.952,56		100.527,54	247.236,62	146.723,16	58.245,16	26.246,16	61.913,19								
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	27.230,88		1.081,57	608,48	147,89	5.021,46						6.850,00	6.750,00	4.272,50	2.498,98				
5	PAREDES E PAINÉIS	214.355,44		3.105,23	14.005,20		756,64	26.503,32	55.951,16	33.475,61	59.080,30			25%	25%	16%	9%		9.435,56	12.042,42
6	COBERTURA	598.237,17								54.839,85	96.970,00	32.684,30	123.336,37	133.547,13	58.657,50	54.945,45	43.256,57			
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	121.088,95								2.316,58	12.741,21	17.374,37	34.748,72	23.165,83	11.582,95	11.582,95			7.576,35	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	388.336,28								2.806,46	20.467,80	36.538,89	36.538,89	76.559,45	53.520,31	35.512,37	89.717,11		27.675,00	
9	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	115.631,58								15.780,60	7.405,07	12.380,75	14.301,53	14.301,53					25.286,06	26.176,04
10	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	180.981,84								9.049,09	18.098,18	6.734,34							50.592,52	96.507,71
11	INSTALAÇÃO PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	38.317,67								3.209,32	10%								28%	53%
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	24.244,14												7.273,24	9.697,65	5.737,49				1.535,75
13	REVESTIMENTO	573.674,89								17.365,17		30.257,60	56.487,35	56.487,35	84.561,25	112.129,74	123.578,91		92.807,52	
14	ACABAMENTOS E APARELHOS	66.194,20																	27.206,20	12.821,97
15	ESQUADRIAS	189.927,24													19.004,36	57.013,08	76.017,43		37.892,37	13.342,07
16	PINTURAS	147.108,79											16.634,28	10.540,71	22.946,41	36.464,36	36.464,36		24.058,66	
17	PAVIMENTAÇÕES	185.470,87																	13.684,43	84.394,74
18	COMUNICAÇÃO VISUAL / ACESSIBILIDADE	51.600,57																	35.694,62	15.905,94
19	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	4.425,45																		4.426,46
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.419,30																		3.854,82
21	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	363.874,75	21.156,66	18.289,02	18.289,02	18.289,02	15.842,14	19.111,99	19.111,92	18.768,43	18.462,13	18.462,13	22.261,54	22.261,54	22.261,54	22.261,54	22.261,54	22.261,54	22.261,54	22.261,54
22	SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE SAPATAS - ADITIVO	143.208,88					58.033,74	76.043,71				9.130,72		0,71						
23	ACOMPANHAMENTO DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SAPATAS	3.760,02																		
24	ACRÉSCIMO ELEVAÇÃO DA OBRA	0,00																		0,00
TOTAL GERAL COM BDI:		4.347.348,05	83.623,41	56.063,28	97.882,56	34.369,39	77.907,93	208.550,94	295.106,39	223.697,28	198.393,66	272.728,18	233.326,80	330.835,18	375.088,88	327.327,09	393.572,69	425.650,51	441.863,75	271.361,14
% PARCIAL			1,92%	1,29%	2,25%	0,79%	1,79%	4,80%	6,79%	5,15%	4,56%	6,27%	5,37%	7,61%	8,63%	7,53%	9,05%	9,79%	10,16%	6,24%
VALOR ACUMULADO R\$			83.623,41	139.686,70	237.569,25	271.938,64	349.846,57	558.397,50	853.503,89	1.077.201,17	1.275.594,83	1.548.323,01	1.781.648,80	2.112.483,98	2.487.572,86	2.814.899,95	3.208.472,64	3.634.123,15	4.075.986,90	4.347.348,05
% ACUMULADO			1,92%	3,21%	5,46%	6,26%	8,05%	12,84%	19,63%	24,78%	29,34%	36,62%	40,88%	48,58%	57,22%	64,75%	73,80%	83,58%	93,76%	100,00%

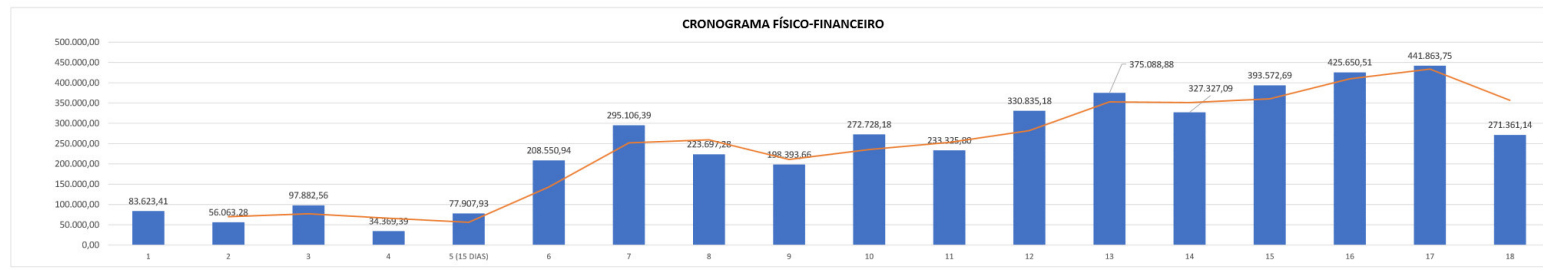

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA UOP PELOTAS - RS			
LOCAL:	BR 116, KM 508 + 500			
CONTRATO:	12/2020 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RS			

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTALS PREÇO (R\$) / PERCENTUAL (%)	PRAZO - MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.738,91 0,76%	2.565,31 8%	6.182,01 19%	1.923,45 6%	1.923,45 6%	2.257,31 7%	2.257,31 7%	2.257,31 7%	3.311,19 10%	2.012,32 6%	2.012,32 6%	2.012,32 6%	2.012,32 6%	
2	TRANSPORTE E ESCAVAÇÕES	374.964,03 8,67%			46.572,31 12%	85.605,37 23%	29.106,32 8%					196.656,54 52%	9.374,10 3%	7.649,38 2%	
3	INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA IN LOCO	259.292,23 5,99%		40.572,87 16%	82.315,21 32%	127.774,04 49%	40.339,98 16%		59,69 0%			-31.769,56 -12%			
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	8.920,58 0,21%			3.450,03 39%					5.691,12 64%		-220,56 -2%			
5	PAREDES E PAINÉIS	102.870,09 2,38%				14.091,49 14%	21.097,62 21%	2.508,43 2%	5.642,02 5%			14.730,66 14%	34.369,51 33%	10.430,36 10%	
6	COBERTURA	402.646,30 9,31%					70.193,56 17%	167.159,68 42%	32.572,52 8%	29.848,50 7%	54.918,90 14%	35.593,47 9%	12.359,66 3%		
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	107.112,10 2,48%	15.607,37 15%				14.369,33 13%	16.995,47 16%	5.741,10 5%	7.280,47 7%	34.307,44 32%		3.500,84 3%	9.310,09 9%	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.089.151,13 25,17%					110.212,57 10%	181.756,29 17%	27.836,56 3%	121.988,58 11%		15.080,50 1%	338.948,65 31%	218.794,45 20%	74.533,52 7%
9	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	114.408,30 2,64%					22.089,15 19%	26.317,43 23%	1.151,96 1%	9.318,67 8%			20.798,22 18%	20.798,22 18%	13.934,64 12%
10	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	44.540,78 1,03%							7.204,15 16%				13.362,24 30%	23.974,39 54%	
11	INSTALAÇÃO PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	16.202,59 0,37%								1.620,26 10%			4.860,78 30%	4.860,78 30%	4.860,78 30%
12	INSTALAÇÃO DE GÁS	5.755,41 0,13%								1.420,55 25%		4.334,86 75%			
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	20.126,56 0,47%							20.126,56 100%						
14	REVESTIMENTO	240.852,35 5,57%					1.143,45 0%	68.959,89 29%	74.402,86 31%	54.925,47 23%		22.580,90 9%	13.602,90 6%	5.236,87 2%	
15	ACABAMENTOS E APARELHOS	35.985,98 0,83%										14.974,89 42%	9.471,21 26%	6.923,92 19%	4.615,95 13%
16	ESQUADRIAS	191.379,49 4,42%							18.803,21 10%			82.315,84 43%	42.636,00 22%	17.556,44 9%	30.068,00 16%
17	PINTURAS	57.700,25 1,33%						12.927,45 22%	11.487,30 20%	25.987,99 45%	-11.505,66 -20%		13.162,21 23%	5.640,96 10%	
18	PAVIMENTAÇÕES	910.432,09 21,04%							14.194,34 2%				37.579,88 4%	154.358,25 17%	704.299,61 77%
19	COMUNICAÇÃO VISUAL / ACESSIBILIDADE	48.974,47 1,13%												24.487,23 50%	24.487,24 50%
20	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	3.381,71 0,08%												3.381,71 100%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.343,56 0,70%										4.551,70 15%	15.133,53 50%	10.658,33 35%	
22	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	229.054,06 5,29%	21.411,23 9%	18.251,10 8%	18.251,10 8%	18.251,11 8%	21.419,03 9%	21.419,04 9%	23.102,51 10%	26.152,78 11%	12.159,23 5%	12.159,24 5%	12.159,24 5%	12.159,24 5%	
TOTAL GERAL COM BDI		4.326.832,96	23.976,54	80.613,35	152.512,10	247.645,46	332.228,32	520.427,55	224.455,51	287.545,57	256.558,65	208.334,37	583.331,29	538.232,96	870.971,29
% PARCIAL			0,56%	1,86%	3,52%	5,72%	7,68%	12,03%	5,19%	6,65%	5,93%	4,81%	13,48%	12,44%	20,13%
VALOR ACUMULADO R\$			23.976,54	104.589,89	257.101,99	504.747,45	836.975,77	1.357.403,32	1.581.858,83	1.869.404,40	2.125.963,06	2.334.297,43	2.917.628,72	3.455.861,68	4.326.832,96
% ACUMULADO			0,56%	2,42%	5,94%	11,67%	19,34%	31,37%	36,56%	43,20%	49,13%	53,95%	67,43%	79,87%	100,00%

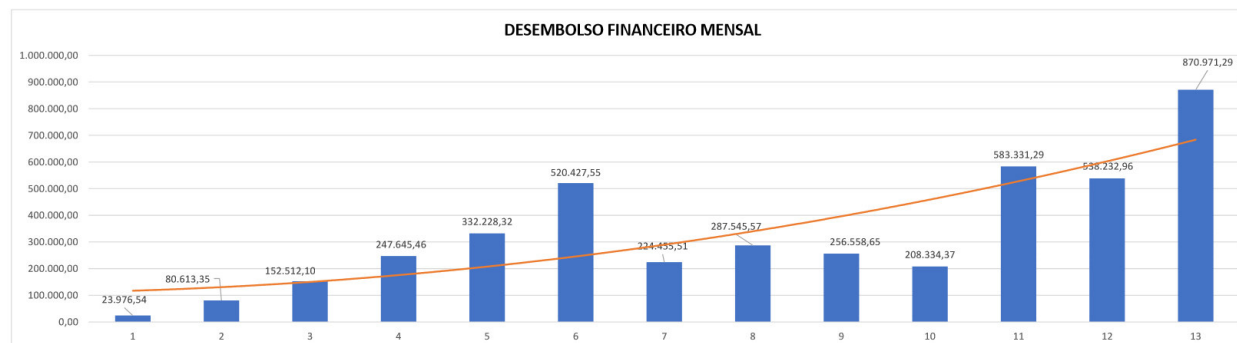

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - R01



OBRA: UOP RIO GRANDE - RS
 PROPRIETÁRIO: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 9ª SRPRF/RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
			51.244,32	2.075,55	2.075,55	2.075,55	2.075,55	2.075,55	2.075,55	2.075,55	2.075,55	2.075,55
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.924,29	1,9%	73,29%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
2	TRANSPORTE E ESCAVAÇÕES	R\$ 4.288,33	0,1%	-	-	2,082,01	2,206,31	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA IN LOCO	R\$ 312.241,27	8,3%	-	58,313,90	138,984,09	99,472,26	15,471,02	-	-	-	-
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 8.516,56	0,2%	-	1,679,98	-	-	-	-	6,836,58	-	-
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 243.432,04	6,5%	-	-	48,264,04	63,216,09	70,710,62	61,241,30	-	-	-
6	COBERTURA	R\$ 473.467,68	12,6%	-	-	19,83%	25,97%	29,05%	25%	116,698,63	132,014,13	-
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 153.962,13	4,1%	-	-	1,640,05	1,608,56	37,092,47	22,628,67	58,220,39	18,568,36	14,203,62
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 936.718,22	24,9%	-	-	1,07%	1,04%	24,09%	14,70%	37,81%	12,06%	9,23%
9	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 115.840,31	3,1%	-	-	-	-	1,172,40	18,160,84	24,402,19	5,149,23	8,962,60
10	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 54.823,62	1,5%	-	-	-	-	9,002,07	-	-	-	45,821,55
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.957,26	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,957,26
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 19.822,10	0,5%	-	-	-	-	-	-	4,989,75	14,832,35	-
13	REVESTIMENTO	R\$ 292.884,60	7,8%	-	-	8,397,89	46,935,52	38,391,93	34,439,75	7,015,85	83,873,59	73,830,07
14	ACABAMENTOS E APARELHOS	R\$ 28.439,17	0,8%	-	-	-	-	-	-	1,325,74	18,079,21	9,034,22
15	ESQUADRIAS	R\$ 152.275,79	4,1%	-	-	-	-	8,160,84	8,160,84	116,452,49	19,501,62	-
16	PINTURAS	R\$ 62.704,61	1,7%	-	-	-	-	10,184,70	18,800,14	18,418,58	9,290,64	6,010,54
17	PAVIMENTAÇÕES NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO	R\$ 22.739,35	0,6%	-	-	-	-	22,739,35	-	-	-	-
18	COMUNICAÇÃO VISUAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 21.458,67	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	21,458,67
19	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	R\$ 2.677,16	0,1%	-	-	-	-	-	-	2,677,16	-	-
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.382,44	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,382,44
21	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 190.512,35	5,1%	21,005,85	18,802,12	18,802,12	18,802,12	18,802,12	18,802,12	18,802,12	18,802,12	19,089,57
22	URBANIZAÇÃO	R\$ 585.824,61	15,6%	-	-	0,18%	-	-	-	15,47%	10,76%	25,07%
	TOTAL	R\$ 3.758.892,55	100%	72.250,17	119.038,75	223.176,88	235.582,31	311.251,11	412.694,20	633.100,02	636.481,10	709.962,82
	TOTAL ACUMULADO			1,92%	5,09%	11,03%	17,29%	25,57%	36,55%	53,40%	70,33%	89,22%
												100,00%

CRÉDITOS DESCENTRALIZADOS		STATUS DA APLICAÇÃO		NECESSIDADE ATUAL	
ANO	VALOR	211.088,35	Utilizado - Projetos	9.215.824,13	Etapas Previstas
2016	211.088,35	1.000.000,00	Empenho anulado	4.910.540,79	Saldo em empenho
2018	1.000.000,00	3.217.249,40	Fase de obras pagas	4.305.283,34	Complemento necessário
2020	3.627.790,19	4.910.540,79	Saldo atual dos empenhos		
2021	3.273.021,00	9.338.878,54	Total descentralizado		
2021	1.226.979,00				
TOTAL	9.338.878,54				

QUADRO RESUMO	
11.298.052,37	VALOR TED ATUAL
9.338.878,54	TOTAL DESCENTRALIZADO
1.959.173,83	SALDO PENDENTE DE REPASSE
4.305.283,34	NECESSIDADE ATUAL
2.346.109,51	DIFERENÇA NECESSIDADE ATUAL E SALDO PENDENTE DE REPASSE
4.305.283,34	VALOR DA PARCELA PREVISTA PARA O 3º ADITIVO
