

PLANO DE CONTROLE DO JAVALI NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA (GO)

RELATÓRIO DE MONITORIA

SETEMBRO/2023



ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS
ICMBio veta



IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de Silvânia

REALIZAÇÃO:

FLONA DE SILVÂNIA/ ICMBio

DIMEEI/ICMBio

IBAMA (GO)

FACILITAÇÃO E RELATORIA:

Renato Cézar de Miranda – Flona de Silvânia/ICMBio

SETEMBRO/2023

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS DA OFICINA	4
3. METODOLOGIA	4
3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA III OFICINA DE MONITORIA.....	7
4. RESULTADOS	8
5. CONCLUSÃO.....	11



1. APRESENTAÇÃO

A IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de Silvânia (GO) foi realizada no mês de setembro/2023, sob a coordenação e facilitação do Analista Ambiental Renato César de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio). O Plano de Controle, elaborado em 2018 com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, foi publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019, por meio da Portaria nº 174. Seu objetivo geral é reduzir e monitorar a população de javali e seus impactos no município, envolvendo a comunidade local e instituições; e conta com 29 ações, distribuídas em 4 objetivos específicos.

Foram convidados para participar desta oficina todos os integrantes do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsável pelo acompanhamento e coordenação do plano, constituído com a publicação da portaria mencionada. Toda organização, o planejamento das atividades e as discussões ocorreram de forma virtual, por e-mails e pela plataforma Microsoft Teams.

A oficina resultou no preenchimento da matriz de monitoria referente ao quarto ano de execução do plano de controle, culminando na geração do painel de gestão e na atualização da matriz de planejamento pós-monitoria. Esses resultados serão apresentados e discutidos neste relatório.

2. OBJETIVOS DA OFICINA

A IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de Silvânia teve como objetivo analisar o andamento das ações propostas, avaliar a implementação, identificar as dificuldades encontradas ao longo do processo e promover o necessário realinhamento das ações, bem como aferir os indicadores e metas estabelecidos.

3. METODOLOGIA

A fase preparatória para a realização da oficina de monitoria envolveu diversas atividades, incluindo o nivelamento conceitual e teórico, identificação do público-alvo, elaboração do plano de trabalho, definição do cronograma, revisão e preparação do material, além da mobilização de articuladores e do GT (Grupo de Trabalho). Durante essa etapa, a comunicação entre as partes ocorreu principalmente por e-mail, o que possibilitou o registro das atividades realizadas.

Após a oficina de monitoria, foram realizadas a revisão e consolidação das matrizes e a elaboração deste relatório. O diagrama representado na Figura 1, ilustra as principais etapas do processo de monitoria.

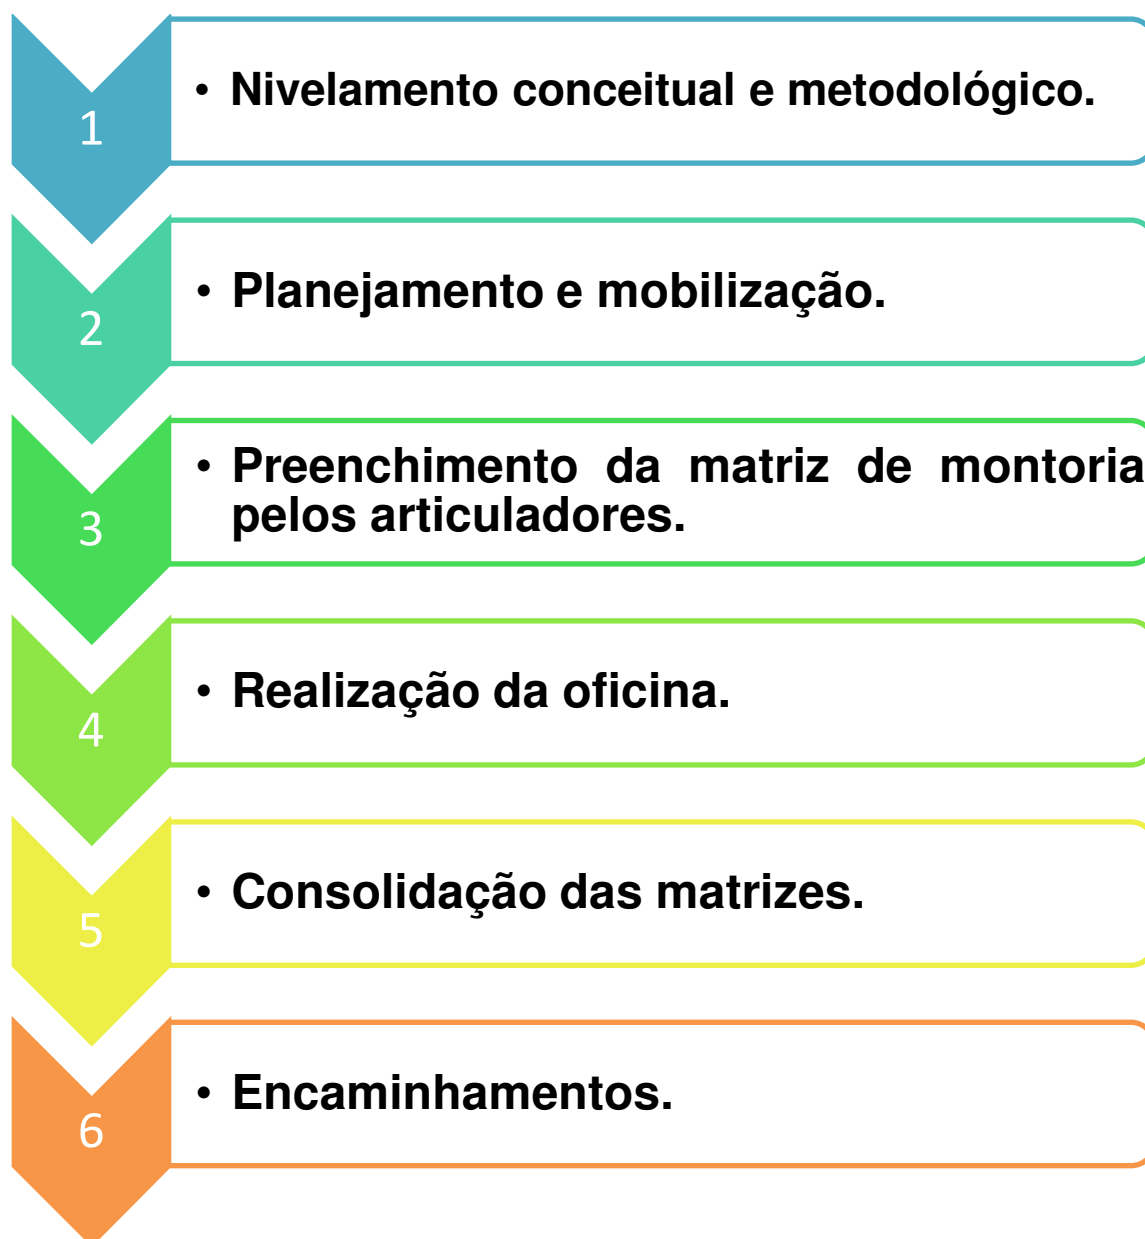


Figura 1. Etapas de realização da III Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de Silvânia (GO).

Conforme programado, a matriz de avaliação foi disponibilizada no google drive, e o link de acesso foi encaminhado por e-mail aos articuladores das ações, acompanhado das orientações e da data-limite para preenchimento (25 de setembro de 2023). Nesse período, ocorreu a substituição dos articuladores que não estavam mais vinculados às instituições de origem.

No dia 27 de setembro de 2023, os integrantes do GAT reuniram-se

virtualmente, por meio da plataforma Teams, para analisar e discutir a matriz de monitoria (avaliação). Sob coordenação e mediação do Analista Ambiental Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), a plenária virtual foi conduzida conforme as seguintes etapas:

1. nivelamento da metodologia utilizada no processo avaliativo;
2. análise e discussão da situação atual das ações (andamento, produto e problemas enfrentados);
3. proposição de revisão dos itens das ações (texto da ação, articuladores e colaboradores);
4. análise do painel de gestão;
5. consolidação das matrizes e encaminhamentos (figura 2).

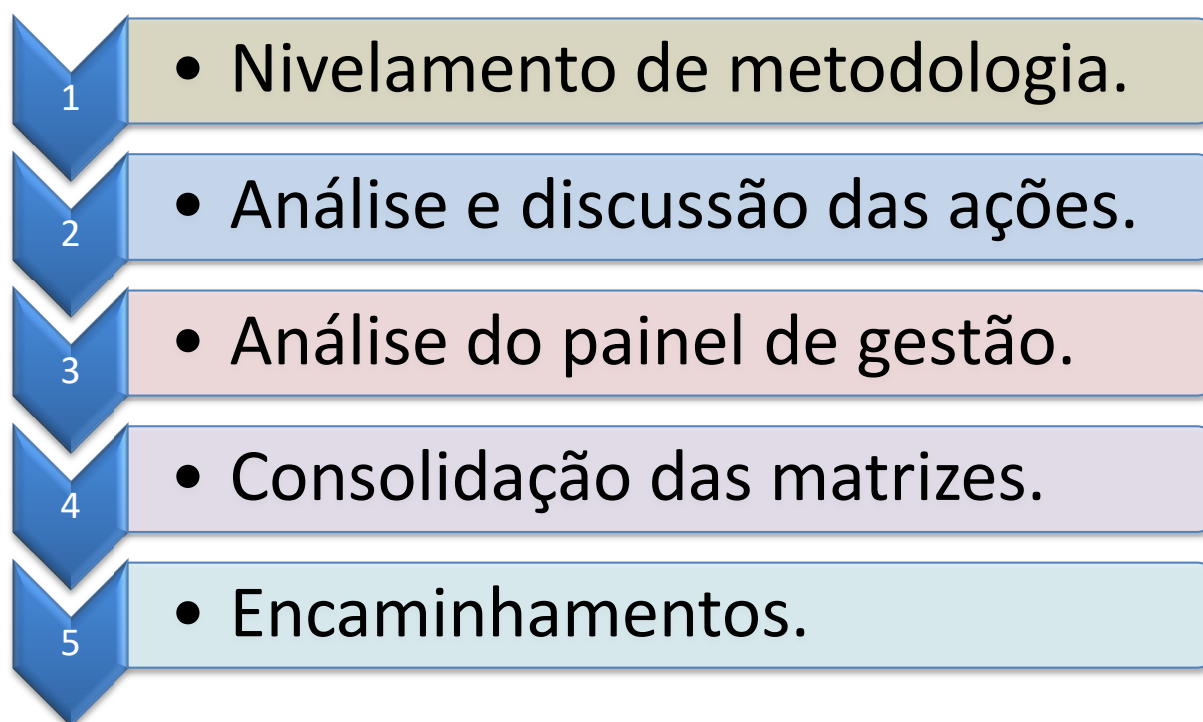


Figura 2. Etapas de realização da IV Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvânia (GO).

Após a análise e discussão das ações relacionadas a cada objetivo específico, o GAT avliou se elas eram adequadas ao cenário atual e suficientes para a consecução dos objetivos propostos. Durante a análise do painel de gestão, discutiu-se o nível de implementação do plano de controle

e os ajustes necessários para garantir sua efetividade.

As ações avaliadas durante a monitoria foram classificadas em categorias conforme o nível de implementação, seguindo o padrão de cores apresentado na figura 3.

Excluída ou Agrupada - Pós monitoria
Início planejado é posterior ao período monitorado
Não iniciada ou não concluída
Em andamento com problemas de realização
Em andamento no período previsto
Concluída

Figura 3. Classificação por cores utilizada na avaliação das ações do Plano de Controle.

3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA III OFICINA DE MONITORIA

INSTITUIÇÃO	NOME COMPLETO	E-MAIL
DIMEEI/ICMBio	Luciana Carvalho Crema	luciana.crema@icmbio.gov.br
DIMEEI/ICMBio	Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima	luiza.lima.bolsista@icmbio.gov.br
Flona de Silvânia/ICMBio	Renato César de Miranda	renato.miranda@icmbio.gov.br
Flona de Silvânia/ICMBio	Paula Gabriela Silva Cotrim	paula.cotrim@icmbio.gov.br
FUNDEP	Lara Uana Evaristo Valério Eduardo Barbosa	laraevabio@outlook.pt
IBAMA/SUPES/GO	Maria Mirtes Machado Lopes	maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br
SEMMA – Silvânia (GO)	Leandro Gomes de Sousa	meioambiente@silvania.go.gov.br meioambientesilvania@gmail.com

4. RESULTADOS

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 29 ações, relacionadas a 4 objetivos específicos, descritos a seguir:

- Reduzir a população de javalis no município de Silvânia (Objetivo 1 – 5 ações);
- Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores de javali (Objetivo 2 - 4 ações);
- Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle do javali (Objetivo 3 - 11 ações);
- Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia Objetivo 4 - 9 ações).

Nesta monitoria, o GAT deliberou pela alteração do texto da ação 4.5, por considerá-la de difícil execução devido a limitação de recursos humanos e financeiros, conforme indicado abaixo:

Texto da ação 4.5 (redação original)

“Estimar a densidade de javalis na Flona de Silvânia e entorno (no mínimo bienalmente.)”


Texto da ação 4.5 (nova redação)

“Realizar o monitoramento da população de javalis no interior da Flona de Silvânia.”

Da análise do painel de gestão, após a consolidação da matriz de monitoria (Tabela 1), verifica-se que 20 ações estão com o andamento no período previsto (**situação verde**) e outras 2 já foram concluídas (**situação azul**), totalizado 22 ações, o que corresponde a 76% do plano. Três ações

não foram iniciadas ou não foram concluídas dentro do prazo planejado (**situação vermelha**), e outras 4 estão classificadas como em andamento ou com problemas de realização (**situação amarela**), totalizando 24% das ações propostas no plano. Nesta monitoria, nenhuma das ações foi excluída ou agrupada.

Tabela 1: Situação atual das ações do Plano de Controle após a consolidação da matriz de monitoria, conforme o Painel de Gestão.

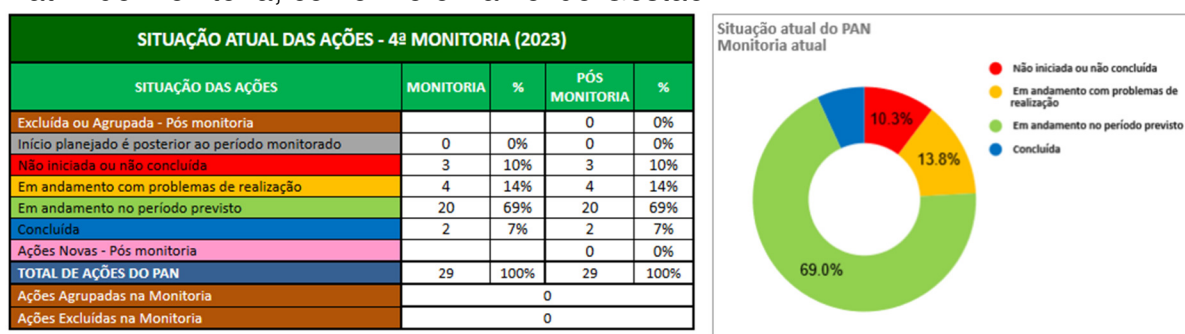

Estes números evidenciam o melhor resultado para o plano de controle desde o início de sua implementação (2020), com 76% das ações implementadas ou concluídas no período previsto, superando os índices alcançados em 2022 (67%), que até então representavam o melhor resultado. Essa mudança de cenário está relacionada ao melhor desempenho nas ações estabelecidas para os objetivos específicos 2 e 3, conforme descrito a seguir:

1. Objetivo 2 – as ações não iniciadas ou não concluídas foram zeradas, impactando positivamente a quantidade de ações em andamento no período previsto;
2. Objetivo 3 – redução de 75% no número de ações não iniciadas ou não concluídas, refletindo no aumento das ações em andamento no período previsto.

Vide tabelas 2 e 3; e o gráfico 1 para mais informações.

Tabela 2. Comparativo entre os ciclos avaliativos do Plano de Controle (2020 a 2023).


QUADRO COMPARATIVO DAS AÇÕES (2020-2023)								
SITUAÇÃO DAS AÇÕES	MONITORIA 2020	%	MONITORIA 2021	%	MONITORIA 2022	%	MONITORIA 2023	%
Início planejado é posterior ao período monitorado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Não iniciada ou não concluída	4	13%	12	40%	8	26%	3	10%
Em andamento com problemas de realização	9	30%	5	17%	2	6%	4	14%
Em andamento no período previsto	13	43%	8	27%	19	61%	20	69%
Concluída	4	13%	5	17%	2	6%	2	7%
Ações Novas - Pós monitoria							0	7%
TOTAL DE AÇÕES DO PLANO	30		30		31		29	

Tabela 3. Situação atual das ações relacionadas aos Objetivos Específicos do Plano de Controle, conforme o Painel de Gestão.

Número de Objetivos Específicos		4
---------------------------------	--	---

Objetivos Específicos	Ações						
OBJETIVO 1	5				1	3	1
OBJETIVO 2	4	0			1	3	0
OBJETIVO 3	11	0		1	2	8	0
OBJETIVO 4	9	0		2		6	1

Gráfico 1. Situação atual das ações relacionadas aos Objetivos Específicos do Plano de Controle, conforme o Painel de Gestão.

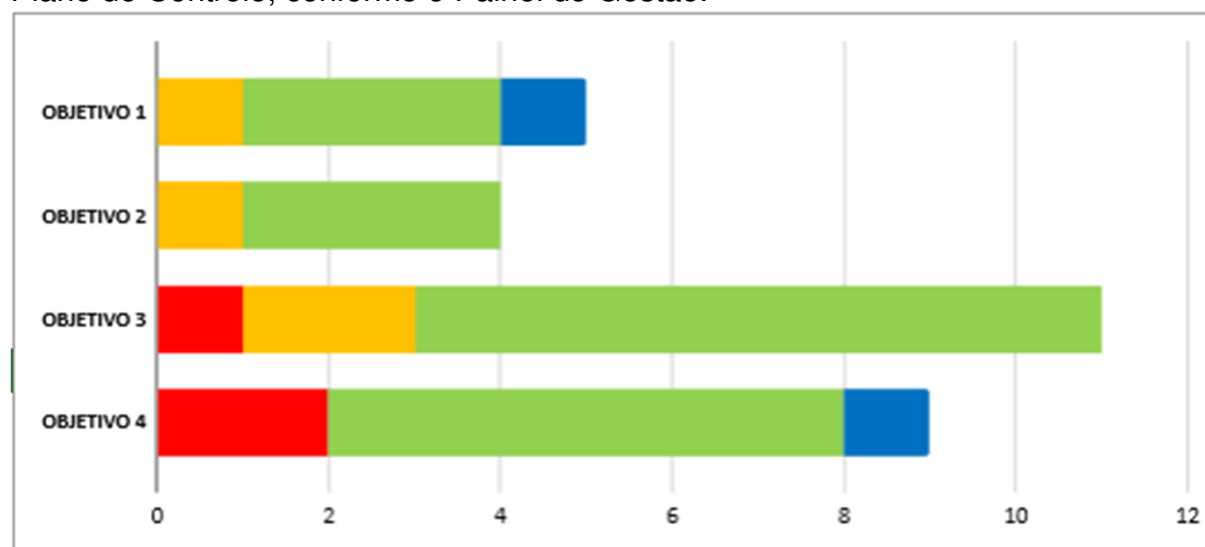

Em comparação ao ciclo de monitoria anterior, percebe-se uma significativa melhoria na implementação das ações relacionadas ao Objetivo 3 e uma leve piora em relação ao Objetivo 4.

5. CONCLUSÃO

Ao final da IV Monitoria, o Plano de Controle do Javali em Silvânia apresenta um conjunto de 29 ações distribuídas em 4 objetivos específicos, o mesmo número de ações registrado ao final da III Monitoria. A consolidação dos dados mostra que o nível de implementação do plano em 2023, com 76% das ações concluídas ou em andamento no período previsto, representa o melhor resultado no intervalo analisado (2019 a 2023), confirmando a tendência de crescimento iniciada em 2022.

Em 2023, os números indicam uma redução expressiva no quantitativo de ações não iniciadas ou não concluídas, que passaram de 8 para 3 ações. Por outro lado, as ações com problemas de realização aumentaram de 2 para 4, o que representa um crescimento percentual de 100%. Apesar desse saldo positivo entre os dois grupos de ações ter contribuído para a melhoria do índice final da monitoria, ele não impactou de forma significativa o número de ações em andamento no período previsto, que aumentou de 19 (2022) para 20 ações (2023). Esses dados refletem o aprimoramento do planejamento do Grupo de Trabalho, com a adoção de estratégias mais efetivas para a consecução dos objetivos específicos do Plano de Controle.

Comparado-se com os dados anteriores, observou-se uma melhora nas “ações em andamento no período previsto” relacionadas aos Objetivos 2 e 3, enquanto o Objetivo 1 manteve-se constante. Esses mesmos objetivos (1, 2 e 3) registraram a maior redução no número de ações “não iniciadas ou não concluídas”. No entanto, os indicadores dos Objetivos 2 e 3 apontam um aumento nas ações “em andamento com problemas de realização”. O status das ações “concluídas” permaneceu inalterado.

Por fim, os dados consolidados nesta análise apontam para uma efetividade crescente do Plano de Controle, especialmente no interior e entorno imediato da Flona de Silvânia. Os dados do SIMAF que também embasam esta monitoria corroboram essa percepção, apesar das inconsistências identificadas e registradas em outros documentos. Ainda

assim, permanece a necessidade de sensibilizar os gestores de Silvânia para que a implementação das ações previstas no Plano de Controle extrapole a área de influência do ICMBio e alcance todo o território do município. Caso contrário, o javali continuará a infestar outras áreas e municípios limítrofes, acarretando impactos ambientais, econômicos e sanitários.

Os instrumentos necessários estão disponíveis, e a mobilização social é um fator decisivo para impulsionar os agentes públicos – especialmente os agentes políticos – na implementação dessa agenda de manejo e controle do javali. Esse contexto justifica a atenção especial dispensada pelo ICMBio às ações relacionadas ao Objetivo 3, cujos resultados positivos deverão estar refletidos na matriz de avaliação de indicadores e metas.
