

ACOMPANHAMENTO

Junho/2026



Aprender
CONECTADO

ESCOLAS
CONECTADAS

Juntos,
ampliamos
futuros

EACE em números

5.397 km

Fibra óptica implantada

87 mil

Access points instalados

6.631 kWh/dia

Energia Solar
(capacidade instalada)

60% Escolas
concluídas

(Piloto, Fases 2&3, 4.1, 4.2 e 5)

95

Escolas/dia útil
(jun/2026)

133 Mbps

Velocidade média

2.661 mil


Estudantes conectados

2.818

Municípios contemplados

2,0 Mbps

Velocidade média/matricula

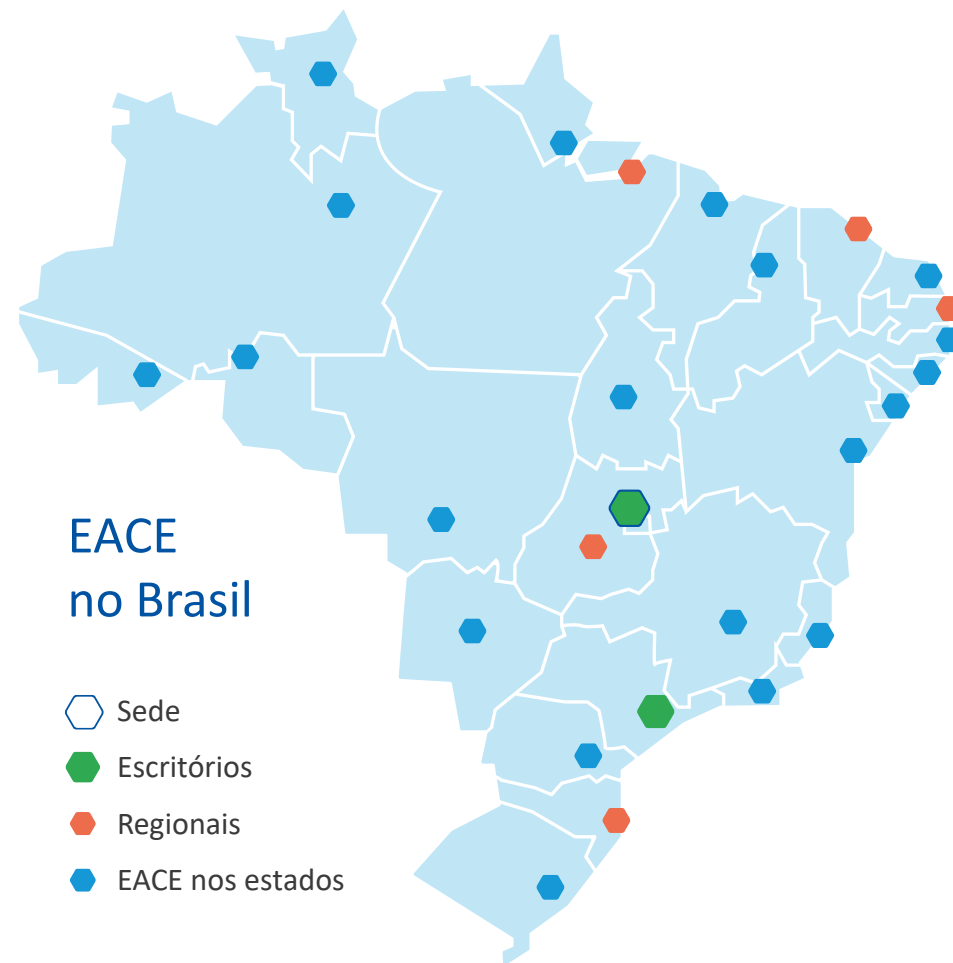



18.547
escolas rurais

1.274
em terra indígena

1.240
em área quilombola

1.677
escolas urbanas




	NORTE	NORDESTE	CENTRO-OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
 REDE EXTERNA	6.671	10.967	458	1.641	3.204	22.941
 REDE INTERNA	7.689	11.178	463	1.630	3.198	24.158
 GERADOR SOLAR	1.496	49	5	3	-	1.553
 ESCOLAS CONCLUÍDAS	6.711	10.806	456	1.608	3.157	22.738


(*) Inclui Piloto, Fase 2&3, 4.1, 4.2 e 5

22.738 escolas concluídas


EVOLUÇÃO [Acumulado]

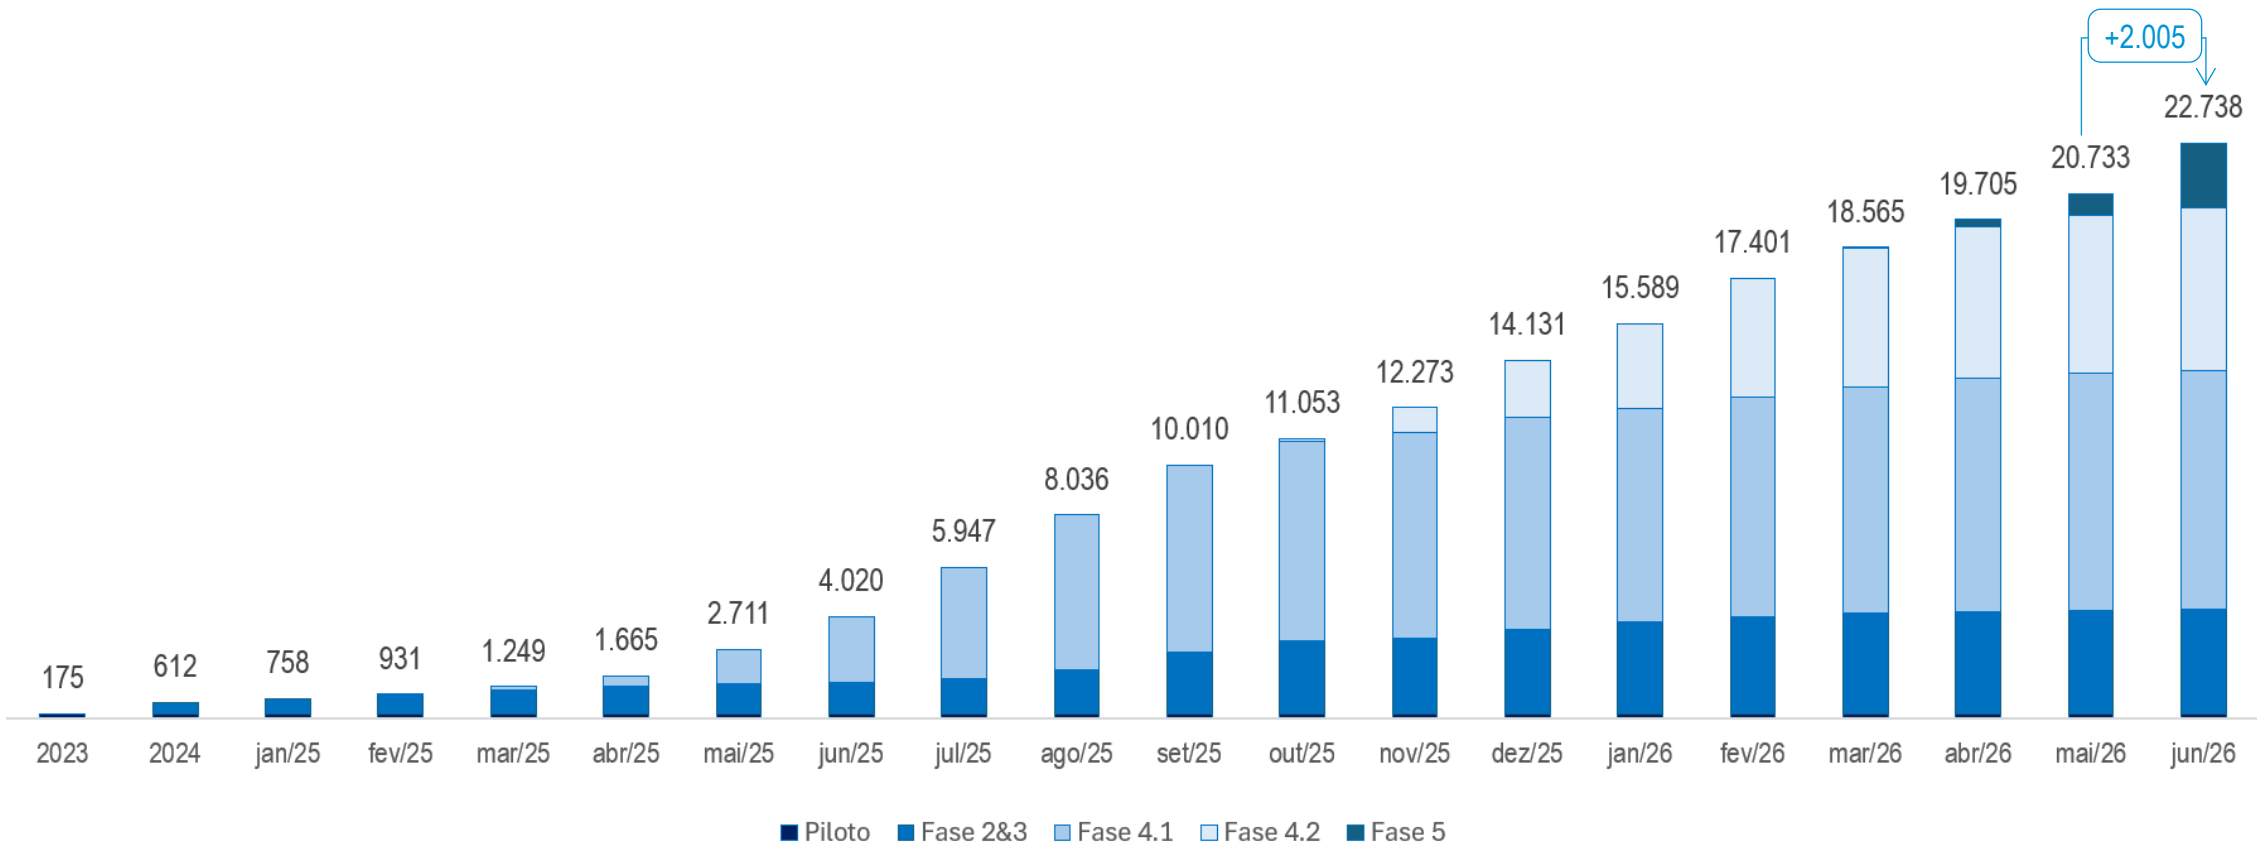


PLANEJADO x REALIZADO

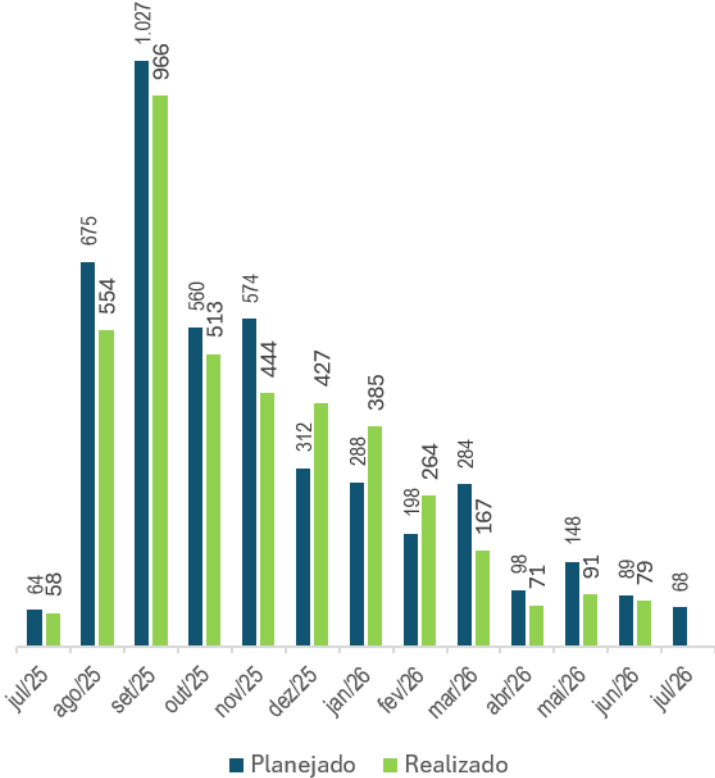


EVOLUÇÃO - Acumulado

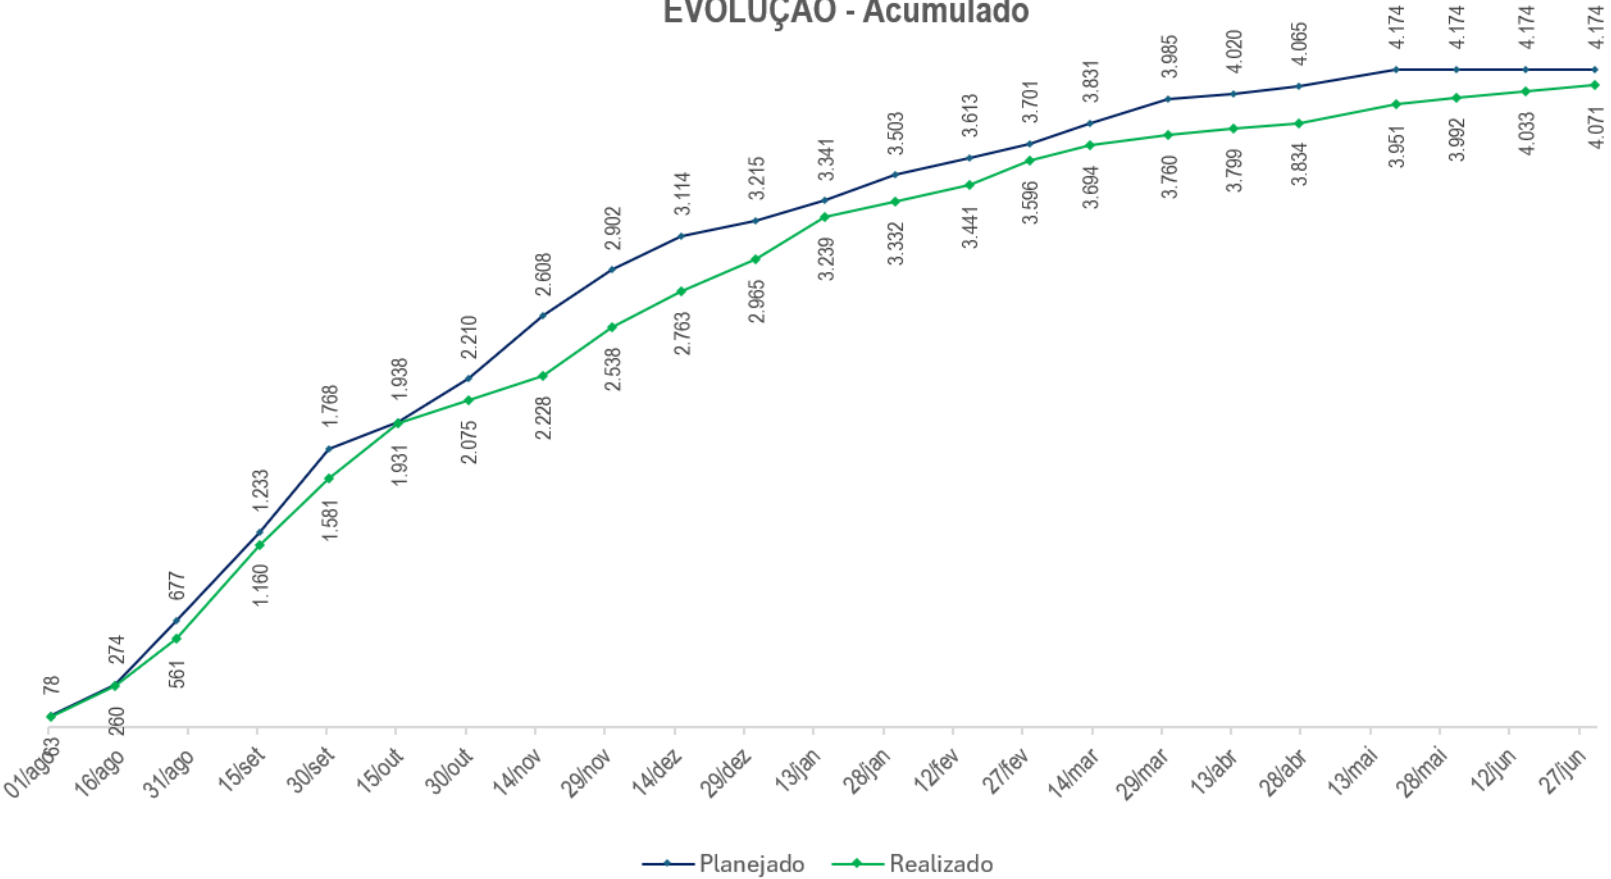


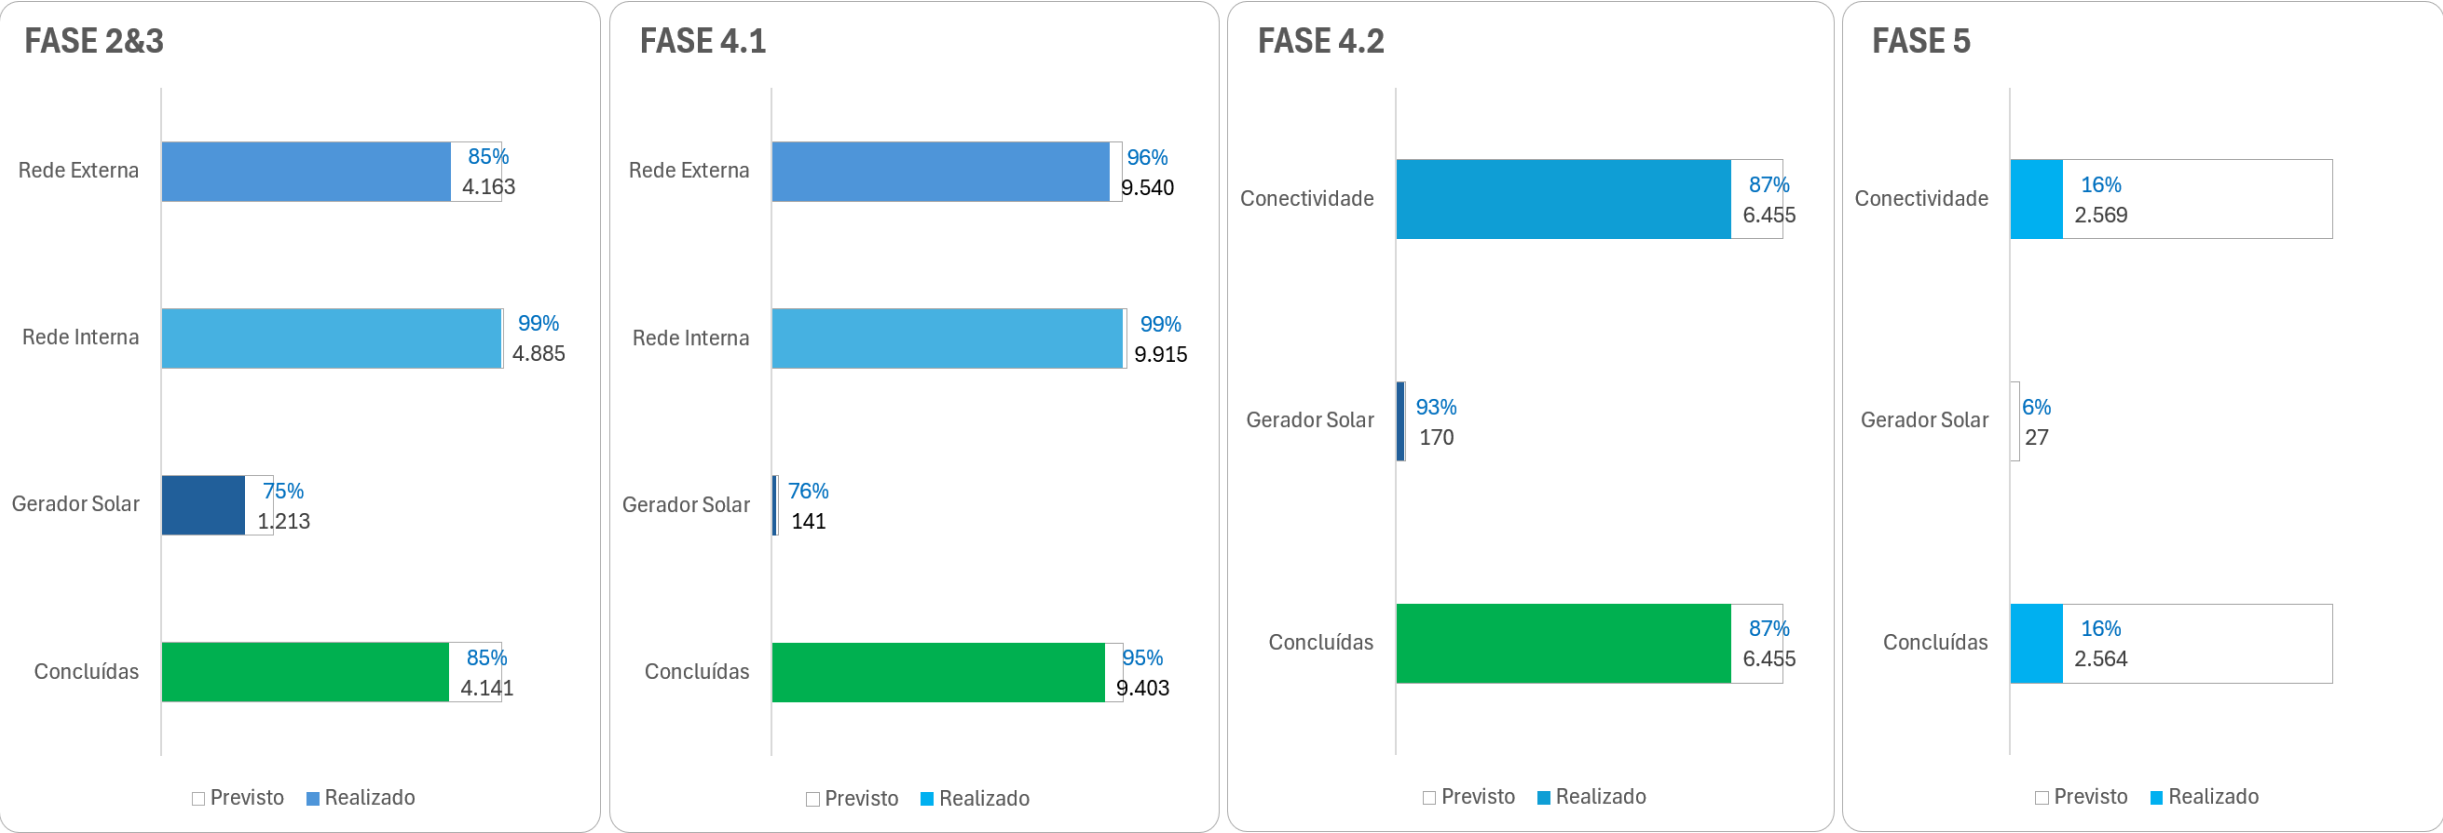

REFORECAST

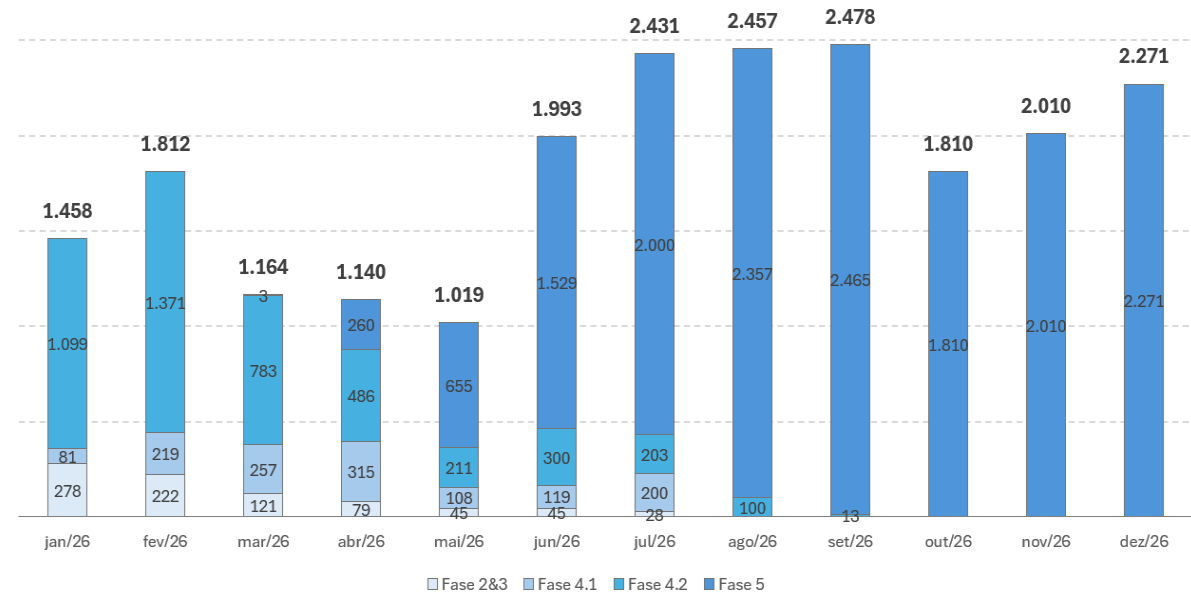

REALIZADO

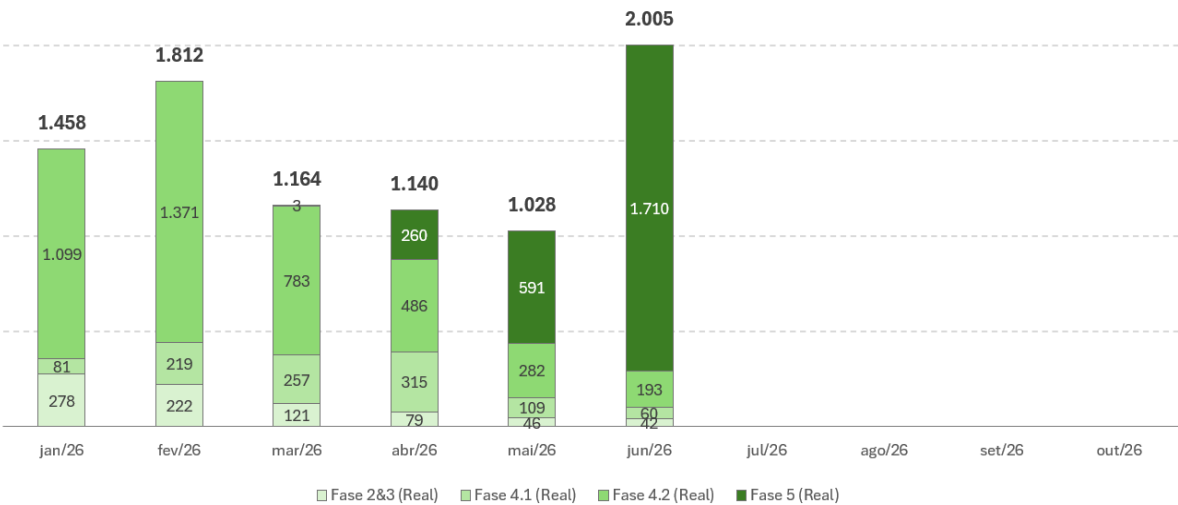

IMPEDIMENTOS		Fase 2&3	Fase 4.1	Fase 4.2	Fase 5
Canceladas	1.247	11	28	130	1078
Sem energia	304	225	28	21	30
Obras	273	50	69	103	51
Validação MEC	70	2	17	27	24
RE outras políticas	31	4	27	0	0
Mud Endereço	17	9	8	0	0
Sem acesso	22	20	2	0	0
Total	1.964	321	179	281	1.183




8.939
escolas




Fase 2&3	44
Fase 4.1	375
Fase 4.2	1.435
Fase 5	4.555
Não previsto	2.530

Migração Gesac 9k → Aprender Conectado (Planejado x Realizado)

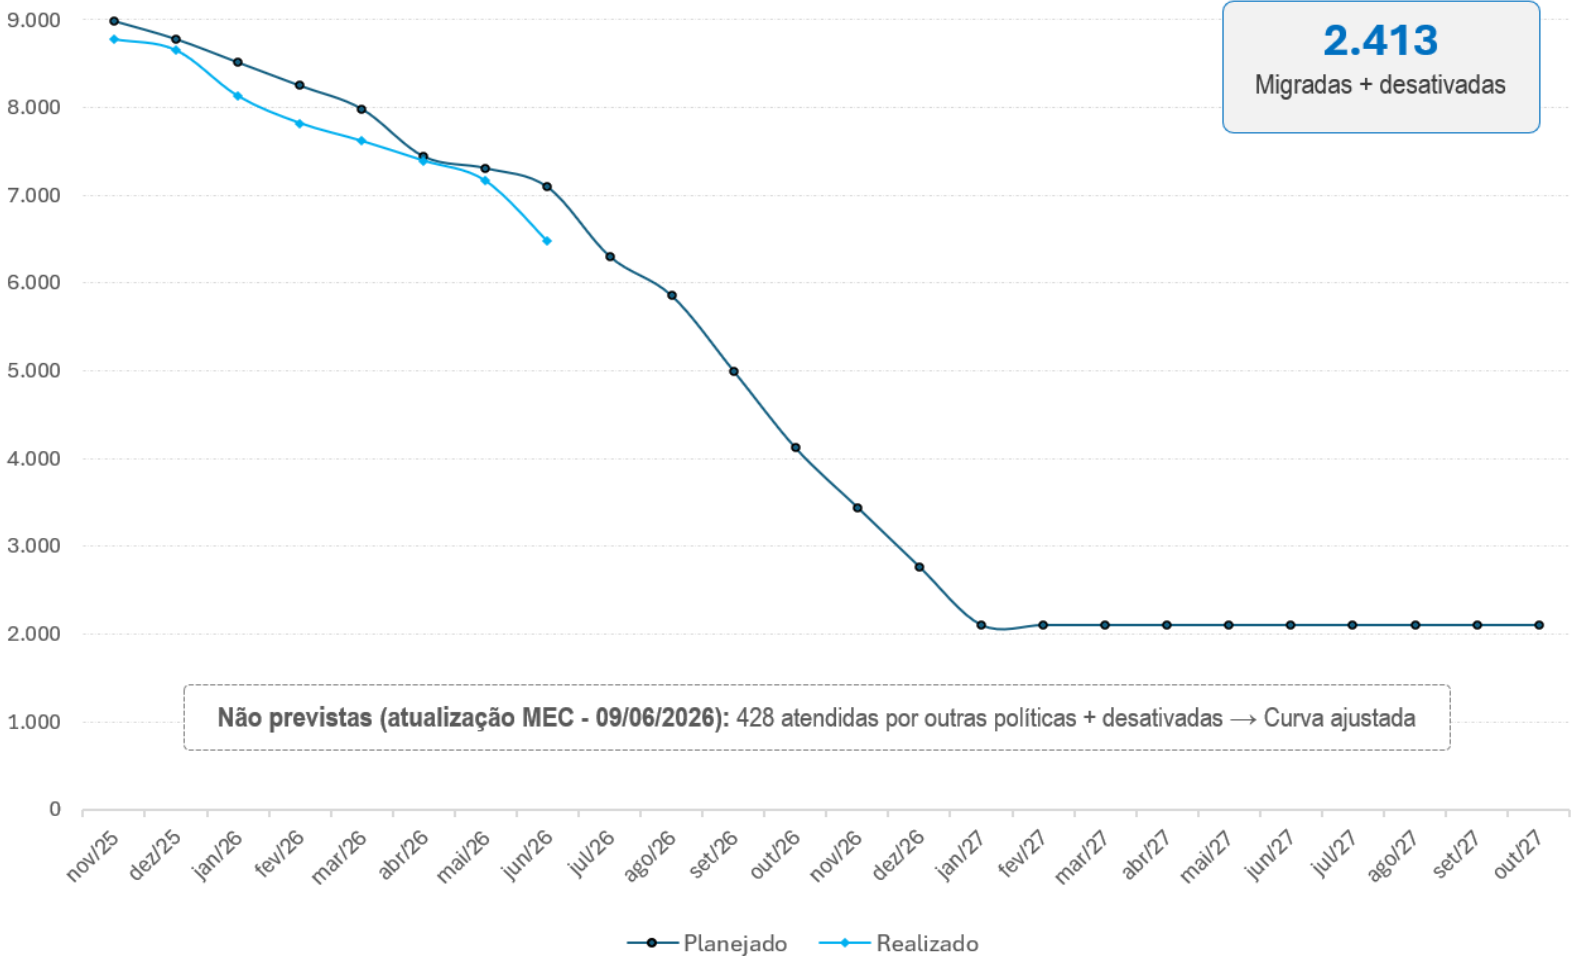

SUSTENTAÇÃO








Relação de dispositivos monitorados pelo Suporte Eace

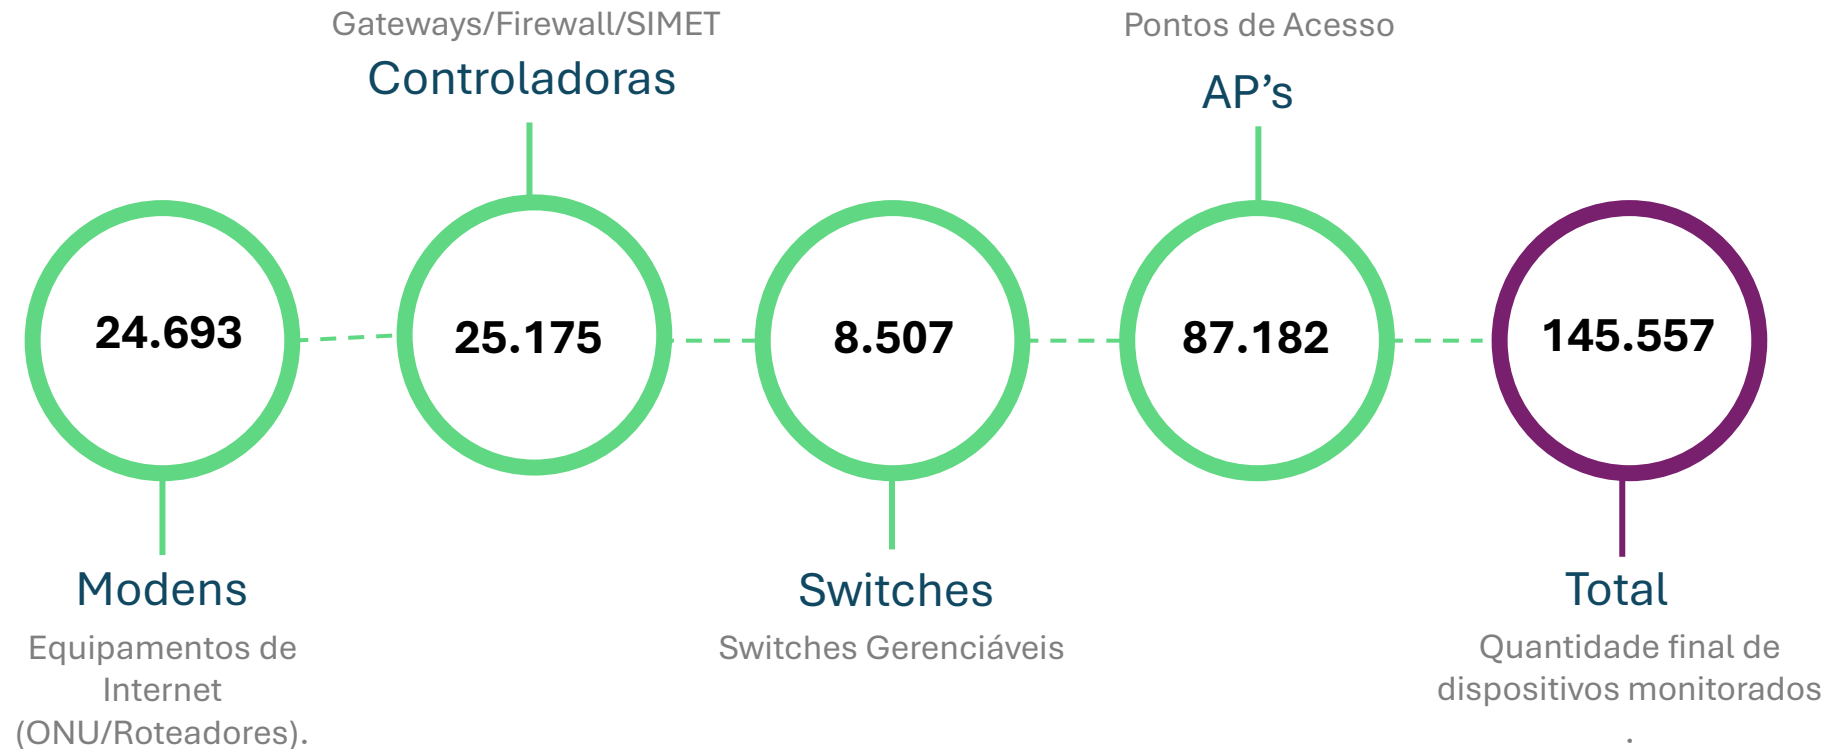



- Dados reportados incluem todas as fases do projeto contabilizando o piloto. Como também foi adicionado os modens do Gsac.

REPAROS







Backlog
2087
Chamados em acompanhamento

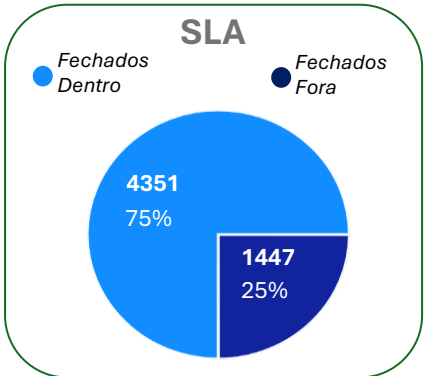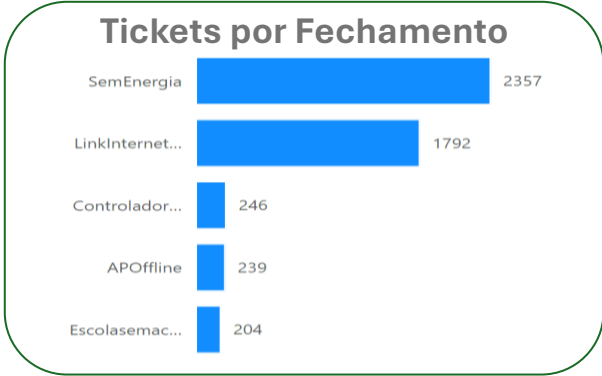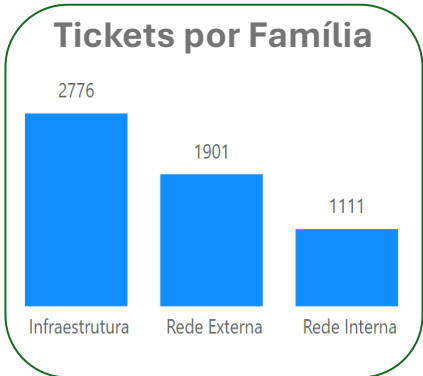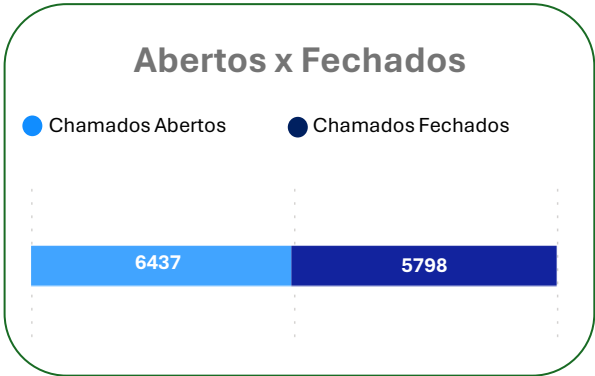

SIMET

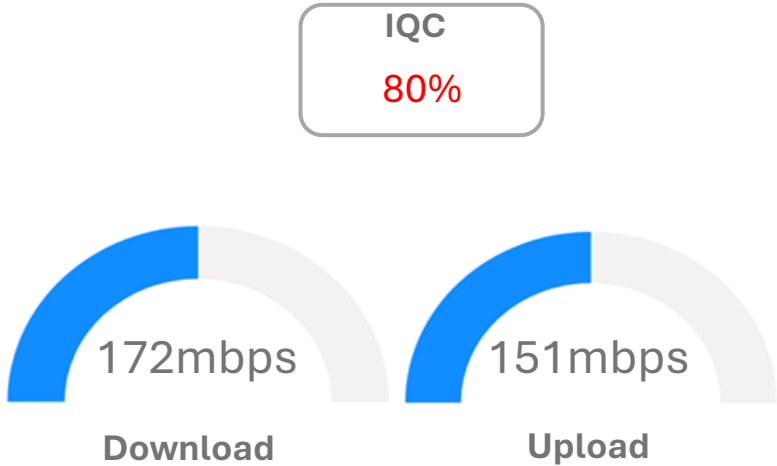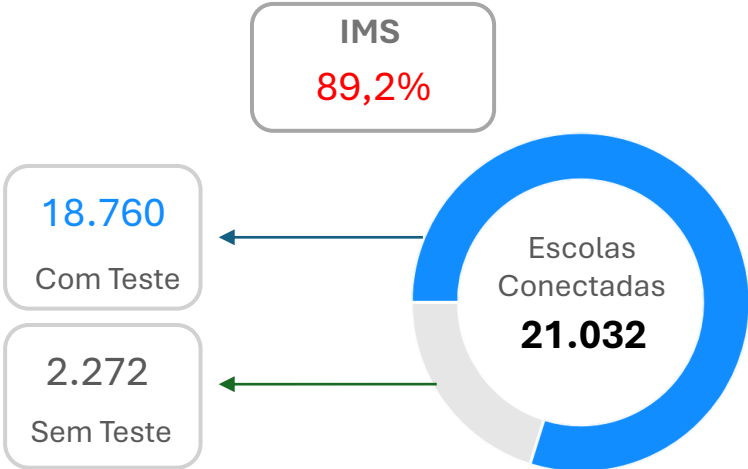

KPIs - Suporte

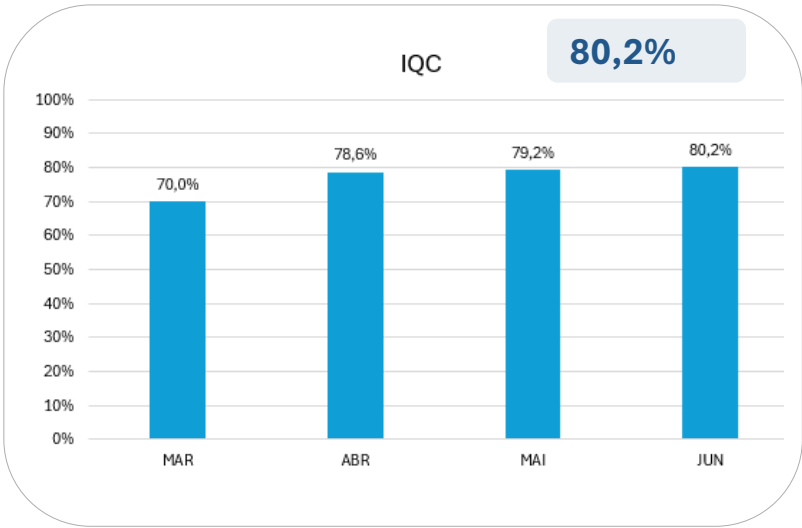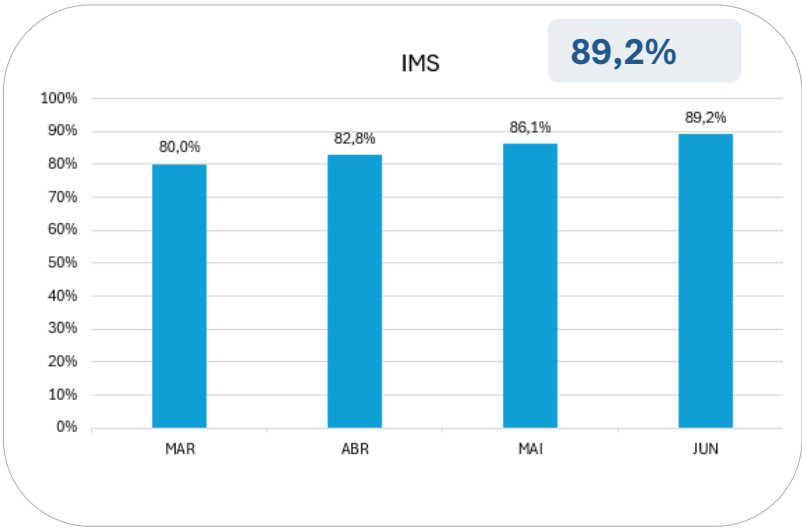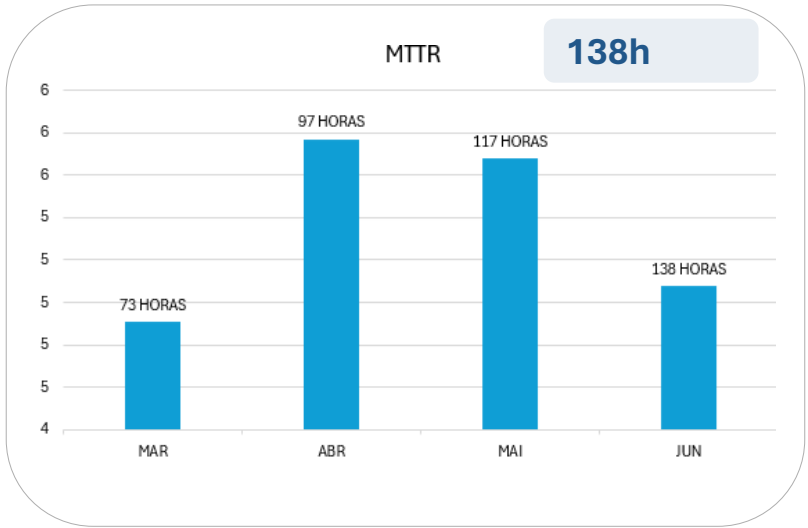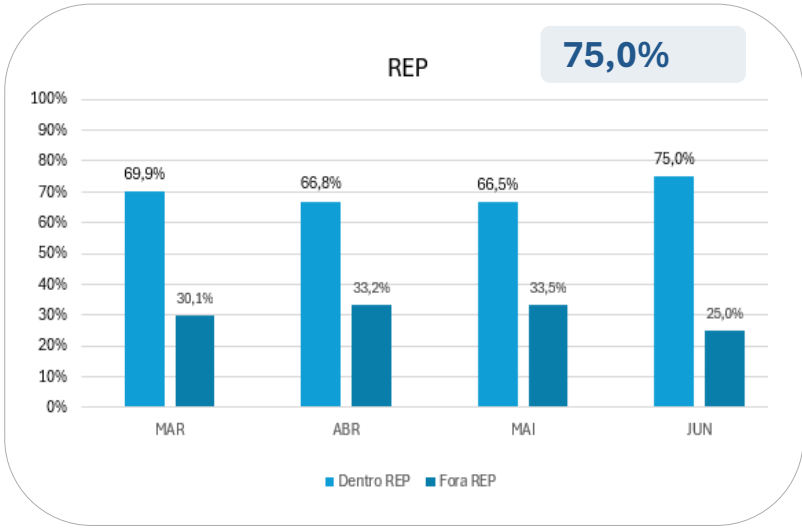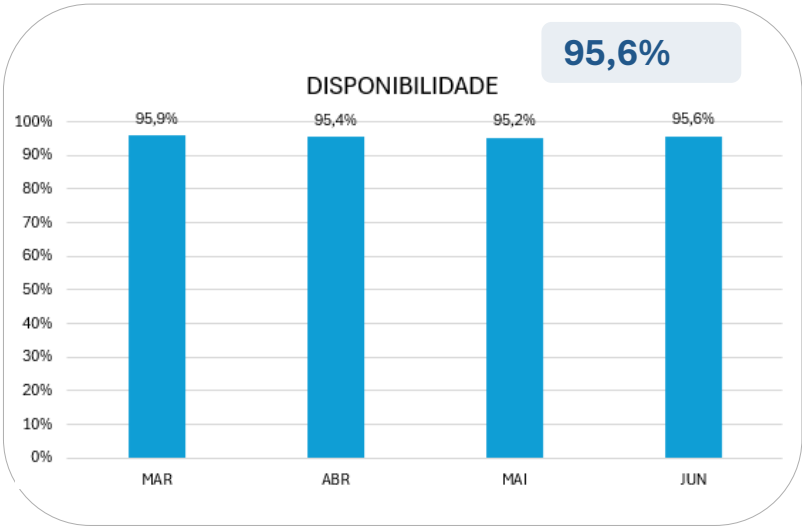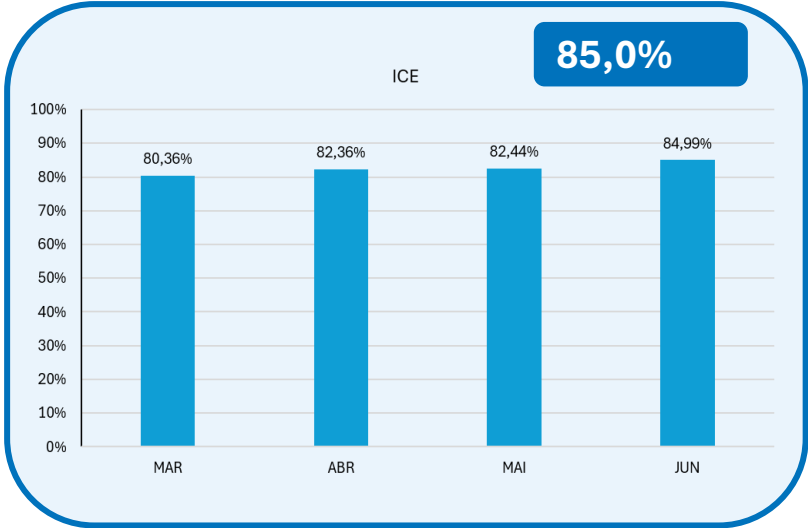

ICE (40% Disponibilidade · 35% IQC · 25% REP) encerra junho em 85,0% — melhor resultado do quadrimestre (+4,6 p.p. vs mar), impulsionado

Obrigado!



Juntos,
ampliamos
futuros
