

# Projeto Aprender Conectado

## Fase 5

Processo de Contratação  
Relatório de Status

Reunião GAPE  
29 de Janeiro 2026






# Projeto Aprender Conectado – Fase 5

---

## OBJETIVO:

1. Apresentação do andamento do processo de Contratação de Serviços de Conectividade – Projeto Aprender Conectado – Fase 5, nos segmentos:

**ESCOPO** - Fornecimento, Implantação e Serviços de Instalação de Rede Externa (Terrestre) e Assinatura mensal de provedor de internet (24 meses), Rede Interna (Wi-fi) e Serviço de Manutenção mensal (24 meses) e Geradores Fotovoltaicos.

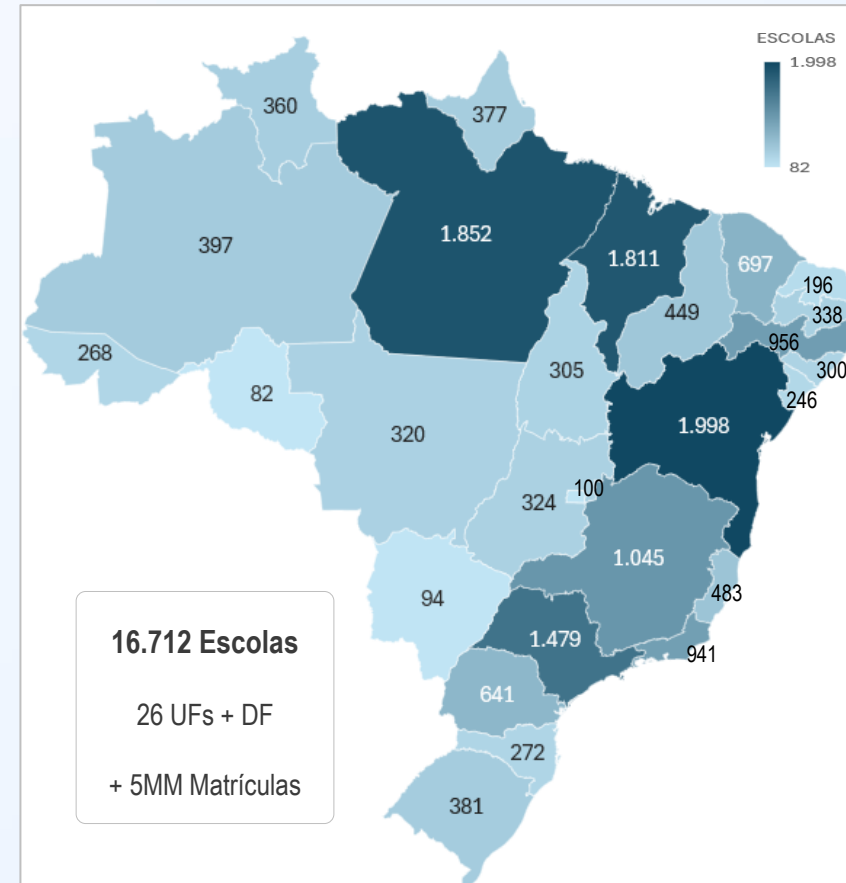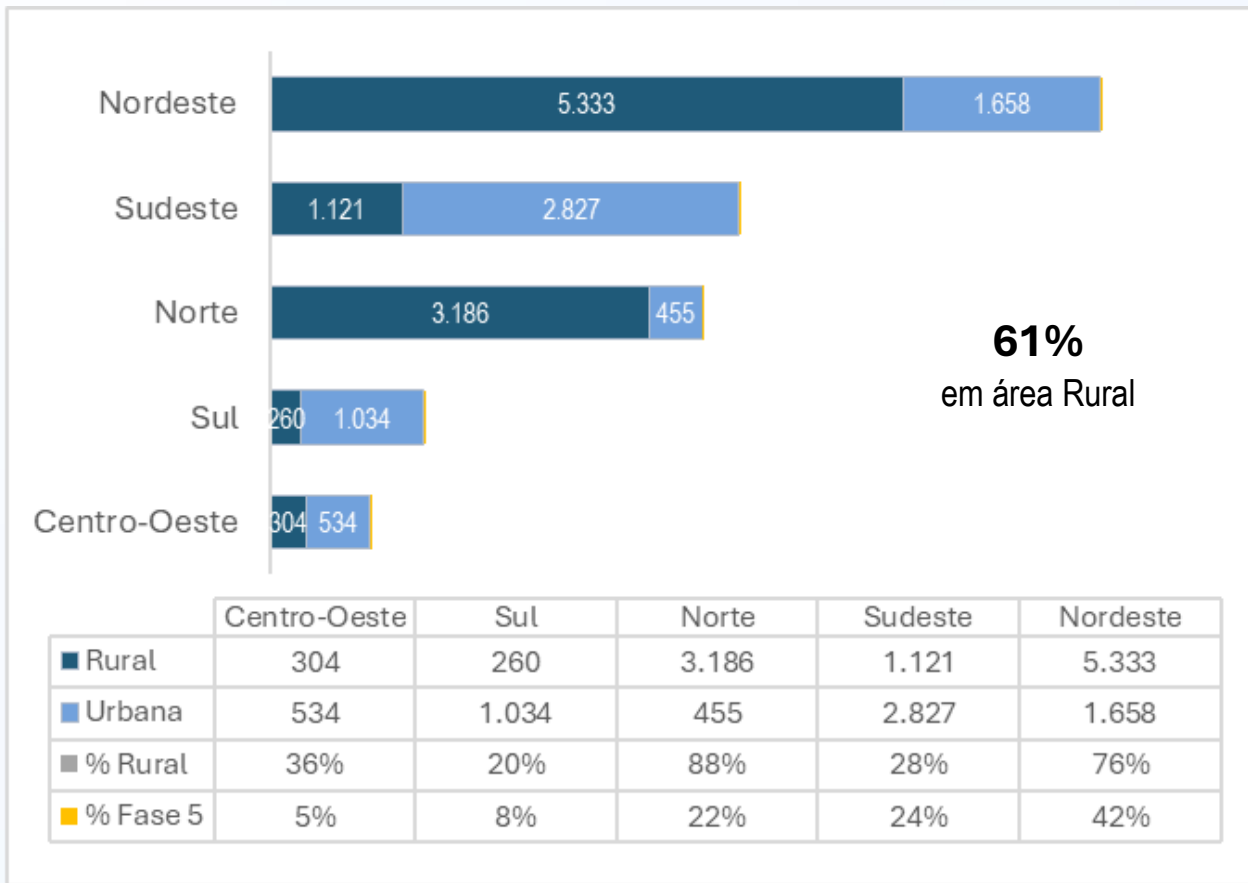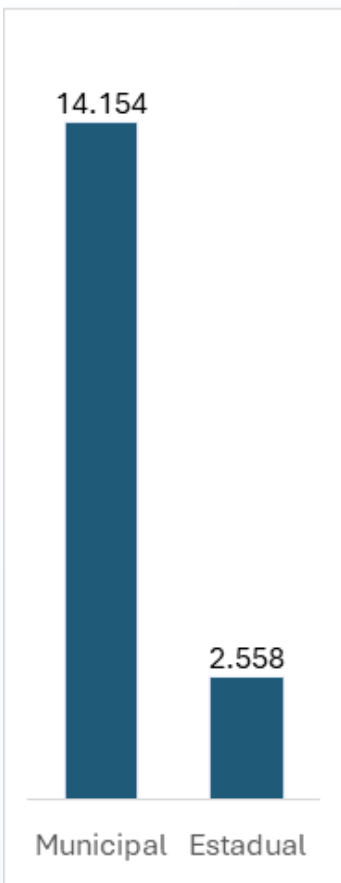

# Projeto Aprender Conectado – Fase 5

## Segmentação em 12 Lotes – 16.712 Escolas

LOTE	REGIÃO	QUANT ESCOLAS
LOTE 1	AC, AM, AP, RO e RR	1.484
LOTE 2	PA	1.852
LOTE 3	MA	1.811
LOTE 4	CE, PI, RN	1.342
LOTE 5	AL, PB, PE, SE	1.840
LOTE 6	BA-1	1.026
LOTE 7	BA-2	972
LOTE 8	MG	1.045
LOTE 9	SP	1.479
LOTE 10	ES, RJ	1.424
LOTE 11	DF, GO, MS, MT, TO	1.143
LOTE 12	PR, RS, SC	1.294

# Contratação de Serviços de Conectividade

## Projeto Aprender Conectado – Fase 5

### CRONOGRAMA DA RFP x ACOMPANHAMENTO:

Ação	Data Proposta	Acompanhamento:
Publicação da RFP	06/11/2025	Realizado no prazo.
Envio de dados para cadastramento dos proponentes na plataforma N	06/11/2025 - 30/11/2025	Realizado no prazo.
Recebimento de Perguntas sobre a RFP (Fornecedores p/ EACE)	06/11/2025 - 13/11/2025	Realizado no prazo.
Respostas às Perguntas sobre a RFP (EACE p/ Fornecedores)	14/11/2025 - 21/11/2025	Realizado no prazo.
Recebimento de Propostas	06/11/2025 - 22/12/2025	Realizado no prazo.
Análise e qualificação das Propostas	23/12/2025 - 02/02/2026	Em andamento, dentro do prazo.
Negociação	02/02/2026 - 06/02/2026	
Contratação/Adjudicação	25/02/2026 - 24/03/2026	


# Projeto Aprender Conectado – Fase 5 - Quantitativos

**27**  
**Estados**

**3.113**  
**Municípios**

**16.712**  
**Escolas**

**LISTA DE FORNECEDORES CONVIDADOS – ETAPAS SUPERADAS**



# Projeto Aprender Conectado – Fase 5

---

## **ROTEIRO DE RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

- 1) Recebimento de Propostas Técnicas e Comerciais e a Lista de Escolas via Plataforma Nimbi;
- 2) Avaliação do material recebido - Critérios:
  - a) Avaliação e Qualificação das Propostas Técnicas – Área Técnica;
  - b) Avaliação de Background Check – Compliance Jurídico;
  - c) Avaliação Econômico-financeira - Controladoria;
  - d) Avaliação e Qualificação das Propostas Comerciais – Compras.

# Projeto Aprender Conectado – Fase 5

## DINÂMICA DO PROCESSO COM OS FORNECEDORES POSICIONADOS:

### Próximos passos:

Fase	Atividade	Início	Fim
	Reavaliação das Propostas Técnicas e Comerciais (Revisadas)	26/01/26	02/02/26
	Negociação com Fornecedores	02/02/26	06/02/26
	Apresentação Diretoria Financeira após Negociação	09/02/26	11/02/26
	Preparação Overview	11/02/26	13/02/26
<b>FASE 5</b>	Reunião GAPE	19/02/26	25/02/26
	Comunicação de Adjudicação	25/02/26	27/02/26
	Resposta da Adjudicação	27/02/26	03/03/26
	Envio da Minuta Contratual após Aprovação da Adjudicação	03/03/26	06/03/26
	Validação da Minuta Contratual	06/03/26	10/03/26
	Assinatura do Contrato	09/03/26	24/03/26



*Aprender*   
CONECTADO
