



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

**Indicadores do Monitoramento e Controle
da Programação
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

**3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação
2014**

Recife
25 de setembro de 2014

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do monitoramento	5
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	9
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	22
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	29
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	47
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos	50
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 107/2013, alterado pela Portaria SUDENE nº 134/2014	53
8 – Observações e Deliberações em plenária de 25/09/2014	56
9 – Conclusão	58
Anexo I – Quadros do monitoramento	60
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2014	153
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	155
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015	160

Introdução

Em continuidade ao processo cíclico de monitoramento das ações da Sudene, que realiza-se trimestralmente, foi encerrado o 3º ciclo que corresponde ao período compreendido de janeiro a agosto do ano de 2014. A Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI), órgão responsável pela realização do processo de monitoramento, em conformidade com a sistemática de tal processo, realizou no dia 25 de setembro deste ano na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar, às 8h30, reunião para exposição dos resultados obtidos no referido ciclo.



Foto 1 – Superintendente José Márcio abrindo a reunião Geral para discussão dos resultados do 3º Ciclo de Monitoramento da SUDENE

Contando com a participação do Superintendente, e dos diretores, coordenadores gerais e coordenadores, além de responsáveis por projetos e outros participantes, a reunião foi iniciada com a exposição do quadro resumo com situação dos 63 projetos da instituição que foram considerados no presente ciclo. Posteriormente, foi exposta a situação dos projetos segmentados por programas do Plano Plurianual (PPA), diretrizes e objetivos estratégicos seguidos pelos órgãos internos.



Foto 2 – Técnicos e Diretoria Colegiada debatendo os resultados do 3º Ciclo de Monitoramento da SUDENE

Na reunião foram enfatizados os projetos em atraso ou com etapas nessa situação, bem como, aqueles na condição de paralisados e cancelados, com as devidas explicações apresentadas pelos responsáveis. Destaque para os projetos do FDNE que, por força de legislação, não possuem prazos definidos para que os agentes financeiros se pronunciem sobre a conclusão da implantação (alguns projetos estão até em operação), é o caso de muitos de geração de energia eólica. Isso tem levado a um desencontro entre o prazo previsto para conclusão e o estipulado para emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI), de responsabilidade do agente financeiro. Enfim, termina o projeto numa situação irreal, efetivamente concluído, mas a espera do CEI. A Diretoria de Gestão de Fundos estudará a substituição da etapa de “emissão do CEI” por documento, também emitido pelo Agente Financeiro, atestando a conclusão do empreendimento.

Situação parecida foi apresentada pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS), tratando da possibilidade de transferir para a unidade de Gestão de Convênios, para acompanhamento por meio de Plano Operativo a ser criado naquela instância, a etapa de emissão do Parecer Financeiro Final de cada convênio celebrado pela nova SUDENE, tendo em vista que tal providência se trata de atribuição daquela unidade, ficando suprimido do PO da unidade finalística tal etapa, conferindo assim, mais fidedignidade às responsabilidades de cada instância.

Em ambos os casos, essas alterações somente poderão ser implementadas após aprovação da Diretoria Colegiada.

Por outro lado, uma mudança pedida em reuniões anteriores passou a ser incorporada a partir deste ciclo: o status de “em andamento” passou a ser conferido a projetos que apresentem alguma etapa em atraso, desde que o período de vigência do convênio possibilite a superação dessa condição nesse prazo. Essa uma situação diferente daqueles projetos (neste caso, projeto aqui não se refere a projeto de convênio) com vigência vencida, mas ainda em andamento, cuja situação não poderia ser outra, senão a de “atraso”.


Outro aspecto a considerar foram os problemas detectados na execução do programa “Água para Todos” em razão de fragilidades verificadas nos atos legais estabelecidos pelo Ministério da Integração Nacional, que estão repercutindo na sua execução e recomendando revisão. Nesse sentido, a Diretoria de Planejamento da SUDENE, em conjunto com a Auditoria interna, promoveu reunião para discutir detalhes operacionais, que resultou em um conjunto de medidas a serem estudadas para melhorar a sua execução de forma a ser absorvido pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável. Por força dessa orientação o programa deverá ser temporariamente suspenso. Além disso, poderá vir a ser retirado do portfólio de metas de desempenho institucional que foi fixado para o período out/2013 a set/2014, o que não significa ser retirado do monitoramento.

Problema também vem acometendo o projeto do PO 03, que trata do Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco. Esse projeto vinha enfrentando problemas com a elaboração da licitação pela Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco, em razão de mudanças nas regras do estado para esse tipo de procedimento, gerando grandes atrasos na execução, e tendo em vista o que preconiza o § 2º, art. 5º do Decreto nº 7.133/2010, que estabelece possibilidade de ajustes em metas, desde que o fato gerador não seja ocasionado pelo órgão concedente, poderá também, vir a ser retirado do mesmo portfólio após apreciação do assunto pela Diretoria Colegiada da Autarquia.

Por fim, cabe o registro de que, afora pequenos ajustes na adoção do conceito de “Atrasado” e “Em Andamento”, não houve alteração nos demais procedimentos do monitoramento, e as deliberações e encaminhamentos da alta administração constam de capítulo específico deste relatório.

1- Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Comparativos dos Monitoramentos nos Ciclos de 2014

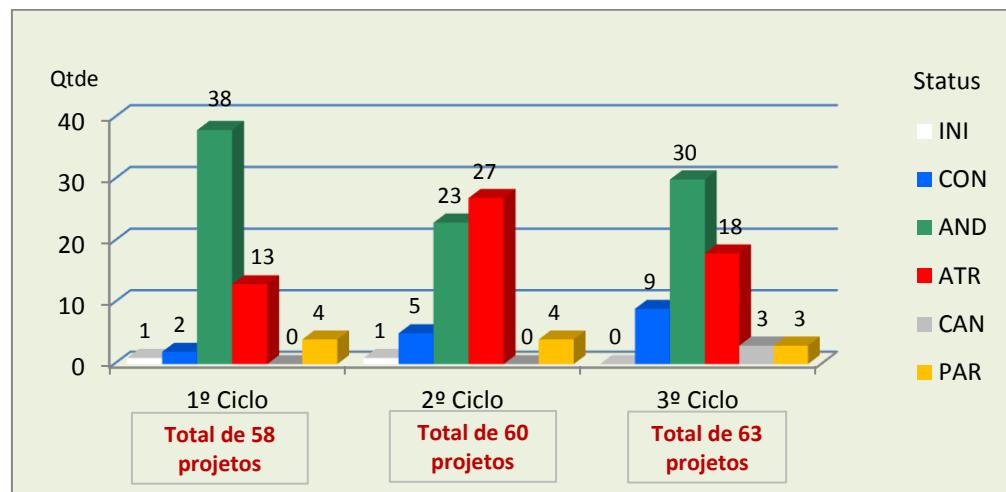

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo os ciclos de 2014

A melhoria dos resultados neste 3º ciclo, é revelada pela soma da quantidade de projetos em andamento e concluídos (39) contra 24 atrasados, cancelados ou paralisados, em comparação, de forma particular, com os resultados do ciclo anterior, influenciados, principalmente, pelas medidas junto aos convenientes, no sentido de adequar os cronogramas de execução à realidade.

1.2 – Resultados Gerenciais – 3º Ciclo 2014

A tabela 1, adiante, nos mostra como os projetos estão distribuídos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, explicitando as respectivas situações de recursos e status até o dia 29 de agosto de 2014. Nesse ciclo houve aumento de 3 projetos em relação ao 2º, totalizando 63 projetos que somam, aproximadamente, R\$ 8,8 bilhões de recursos previstos, dos quais um pouco mais de 4,8 bilhões foram liberados até o momento, puxados pelos projetos do FDNE.

A mesma tabela revela também, um maior volume de recursos na diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, com ênfase no objetivo 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, onde estão enquadados os projetos do Fundo de desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Neste objetivo estão concentrados 99,6% dos recursos previstos e 99,8% do montante liberado para 39 projetos.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2014

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	39	8.773.188,58	4.791.283,75	-	3	17	16	2	1	39
	1.5	3	234,11	139,87	-	2	1	-	-	-	3
Sub-Total		42	8.773.422,69	4.791.423,61	-	5	18	16	2	1	42
2	2.1	1	4.972,00	0,00	-	-	-	-	1	-	1
	2.3	1	530,48	265,24	-	-	1	-	-	-	1
	2.4	2	579,78	354,70	-	-	1	1	-	-	2
Sub-Total		4	6.082,26	619,94	-	0	2	1	1	0	4
3	3.1	5	0,00	0,00	-	2	3	-	-	-	5
	3.2	8	1.215,02	736,02	-	2	4	1	-	1	8
	3.3	4	21.303,82	7.783,66	-	-	3	-	-	1	4
Sub-Total		17	22.518,85	8.519,68	0	4	10	1	0	2	17
TOTAL		63	8.802.023,79	4.800.563,23	0	9	30	18	3	3	63

Fonte: CGGI/SUDENE

(1) - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1.1** Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.1**-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**- Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 29/08/2014 (3º Ciclo de monitoramento-2014)

A Tabela 2, mostra, por sua vez, a dotação e a liberação dos recursos segundo programas e ações do PPA, com destaque para os investimentos do FDNE, que termina influenciando na execução da ação 0355 do PPA. Porém uma outra informação deve ser considerada, sob risco de uma falsa interpretação dos dados. É que tem sido cada vez maior a restrição imposta ao orçamento finalístico, aquele cujas ações estão vinculadas aos objetivos da SUDENE contidos na Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, que a criou. E o que isso significa? Significa que passa-se, involuntariamente, à sociedade a impressão de uma baixa materialidade na execução da programação estratégica da SUDENE, como aliás, tem repetido a CGU/PE, quando na realidade, as restrições e os sistemáticos cortes aplicados pela SOF e pelo MI sobre o orçamento da SUDENE anulam a capacidade de execução do órgão. Foram vítimas deste processo, projetos estratégicos como o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Competitividade para o Semiárido, Melhoramento genético do algodão para exploração no Semiárido, Trem Turístico de Passageiros, ligando as principais capitais do Nordeste, entre outros.

Um outro aspecto da fragilidade orçamentária, que também compromete o desempenho tem sido a fonte de recursos posta a disposição do orçamento: fonte 250 – recursos próprios. As dotações dessa fonte (receita) decorrem do desempenho das liberações do FDNE, e essas liberações não obedecem nem a uma regularidade nem a um montante representativo, pois se constituem de 1,5 % do retorno das amortizações do citado fundo para o custeio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, e 2,0%, decorrente das liberações. Além disso, trata-se de fonte passível de contingenciamento ao contrário da fonte 100, do Tesouro Nacional. Cabe ressaltar que, dentre as Superintendências vinculadas ao MI, a SUDENE é a única que apresenta a maior parte do orçamento enquadrado nessa fonte. Aliás, proposta para 2015, já sinalizada pelo MI, aponta toda a proposta orçamentária enquadrada na fonte 250.

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2014**

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrad os (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	20N9	1	115,80	115,80		1					1
	0355	26	8.735.700,39	4.784.785,28			9	16		1	26
	4640	2	2.201,62	1.648,32		1	1				2
	8340	4	26.529,01	974,41		1	1		2		4
	8689	1	530,48	265,24			1				1
	8902	6	12.945,86	3.343,02			5		1		6
	8917	1	207,54	0,00			1				1
	8918	1	694,46	556,78			1				1
Sub-Total		42	8.778.925,17	4.791.688,85	0	3	19	16	3	1	42
2040	8172	2	579,78	354,70	-	-	1	1	-	-	2
Sub-Total		2	579,78	354,70	0	0	1	1	0	0	2
2111	2000	18	22.518,85	8.519,68	-	6	9	1	-	2	18
Sub-Total		18	22.518,85	8.519,68	0	6	9	1	0	2	18
Interno	Interno	1	0,00	0,00	-	-	1	-	-	-	1
Sub-Total		1	0,00	0,00	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		62	8.802.023,79	4.800.563,23	0	9	30	18	3	3	63

Fonte: CGGI/SUDENE

(1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 20N9 – Apoio ao Associativismo e Cooperativismo; 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20WQ-Plano Orçamentário 05 – Divulgação das políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;). Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade).

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os de financiamento do FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento financiado pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais.


Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Nota: Os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 3º Ciclo de monitoramento 2014

O Gráfico 2, adiante, mostra a distribuição dos 63 projetos segundo status (iniciado, concluído, em andamento, atrasado, cancelados ou paralisado), com destaque para os 39 projetos enquadrados no objetivo estratégico 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, mais uma vez, influenciados pelos 26 projetos do FDNE, dos quais 16 na condição de atraso pelo fato de que o agente financeiro ainda não viabilizou a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado, e não há prazo legal para essa definição.


O Gráfico 3, por sua vez, trata dos recursos liberados para os 63 projetos, até o 3º ciclo 2014, sendo o Obj. 1.1, já mencionado, aquele de maior repercussão entre os demais, em razão das liberações para os projetos do FDNE.

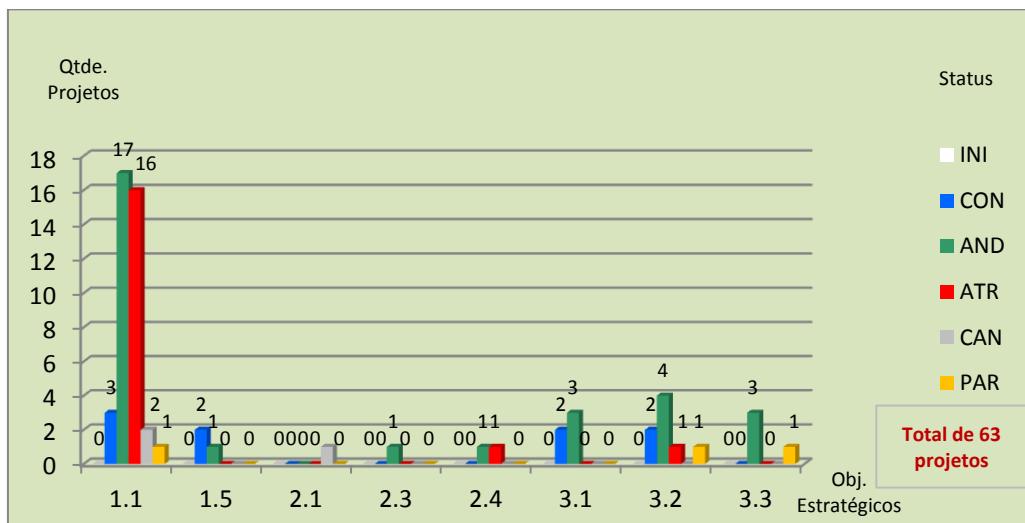

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Convenções dos Obj. Estratégicos: **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.1**-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2014)

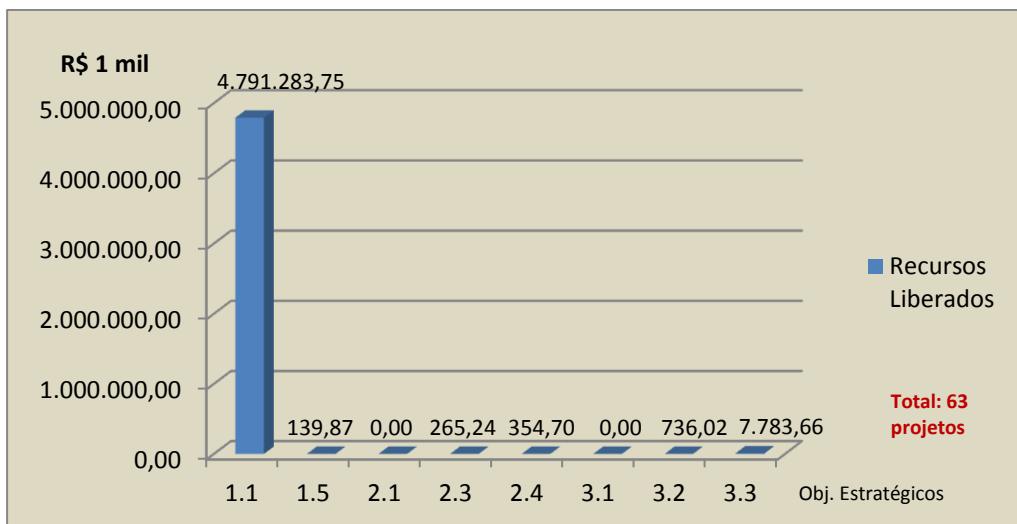

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional


Convenções dos Obj. Estratégicos: **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.1**-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Gráfico 3 – Recursos liberados segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2014)

2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC))

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias protocoladas}} = \frac{14 \times 100}{14} = 100,00\%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários:
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = 98,6 %.
 Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012).
 Abr/2013 = 57,14% (1º Ciclo 2013).
 Jun/2013 = 100% (2º Ciclo 2013).
 Ago/2013 = 100 % (3º Ciclo 2013).
 Nov/2013= 100% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 100% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 100% (2º Ciclo 2014)
- h) Representação gráfica

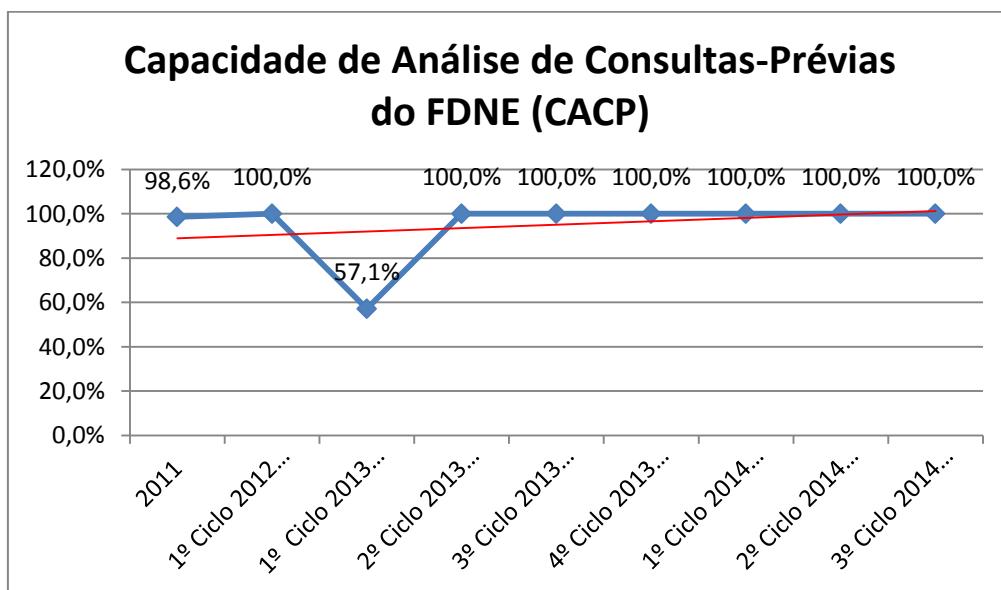

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)


- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{14}{2} = 7,0$ análises/técnico
- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários:
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = 2,05 análises/técnico (2011)
 Nov/2012 = 0,67 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012).
 Abr/2013 = 2,67 análises/técnico (1º Ciclo 2013).
 Jun/2013 = 6,00 análises/técnico (2º Ciclo 2013).
 Ago/2013 = 6,50 análises/técnico (3º Ciclo 2013).
 Nov/2013 = 11,67 análises/técnico (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 11,67 análises/técnico (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 3,50 análises/técnico (2º ciclo 2014)
- h) Representação gráfica:

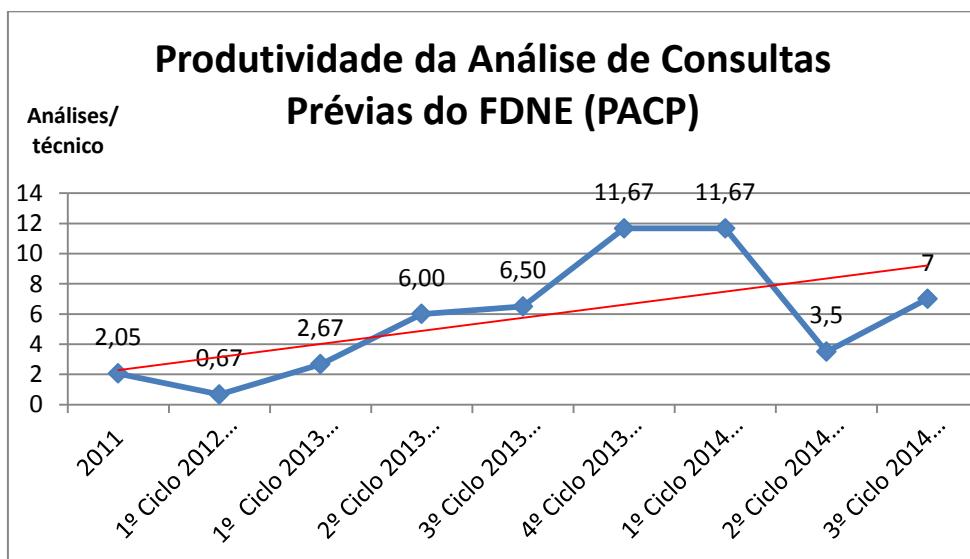

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.3 - Consistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{10 \times 100}{14} = 71,43\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2014
- f) Comentários: A devolução de Consultas Prévias foi decorrente de ausência de documentos necessários à conclusão da análise e/ou preenchimento inadequado do formulário padrão estabelecido.
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = 40,80 %.
 Nov/2012 = 100,00 % (1º e único Ciclo 2012).
 Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013).
 Jun/2013 = 50,00 % (2º Ciclo 2013).
 Ago/2013 = 46,15 % (3º Ciclo 2013).
 Nov/2013 = 40% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 40% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 71,43% (2º ciclo 2014)
- h) Representação gráfica:

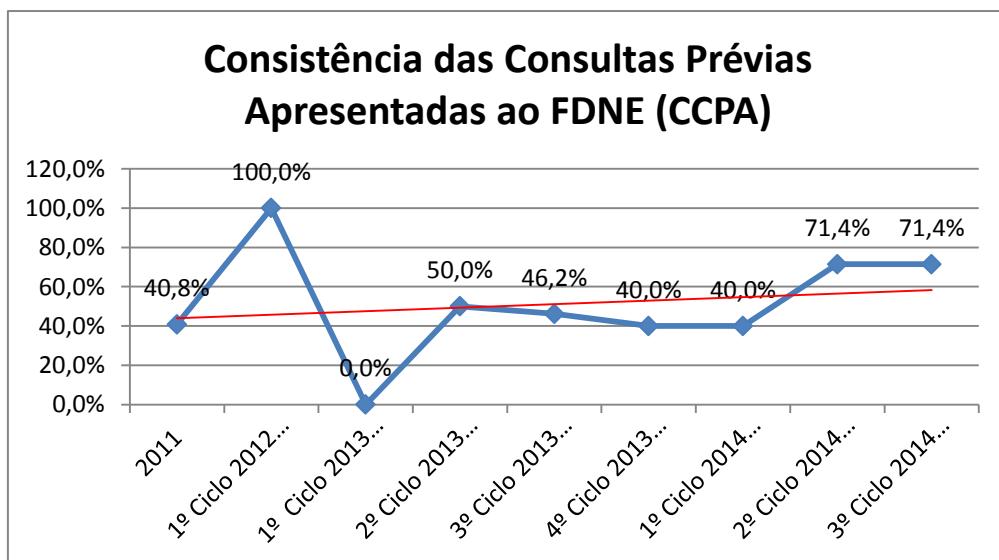

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do

prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = 0,0$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{149 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,66$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{150 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,67$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))

e) Periodicidade: Jan-ago/2014

f) Comentários: não houve demanda de análise projeto para o BNB.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º Ciclo 2013). Incluía até então, apenas o BNB.

Jun/2013 = BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63 (2º Ciclo 2013).


Ago/2013 = BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63 (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (1º ciclo 2014)


Mai/2014 = BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67 (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

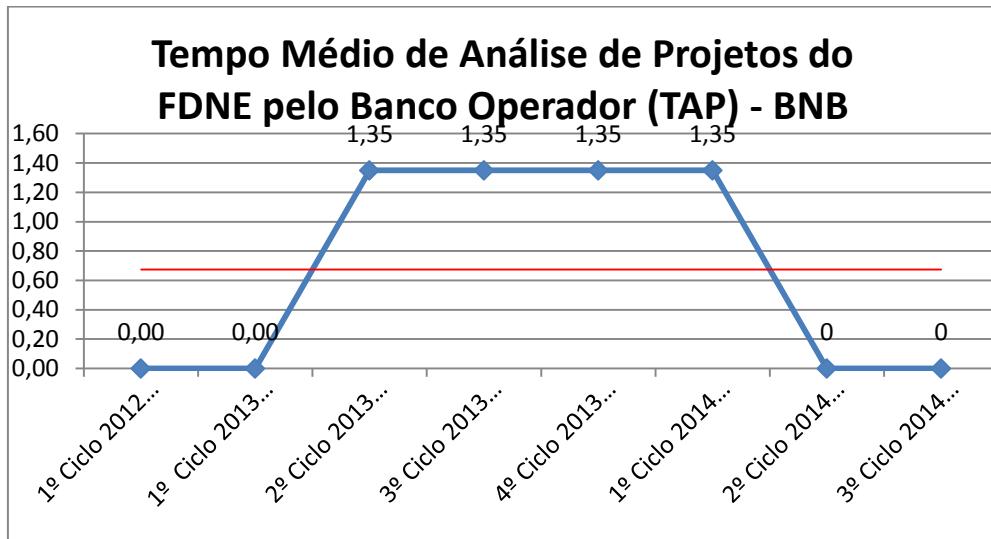


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

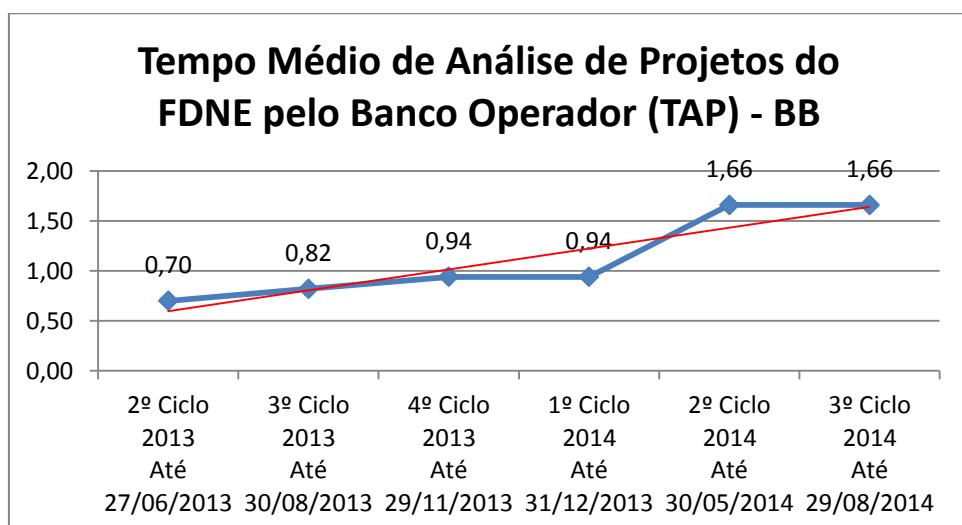

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

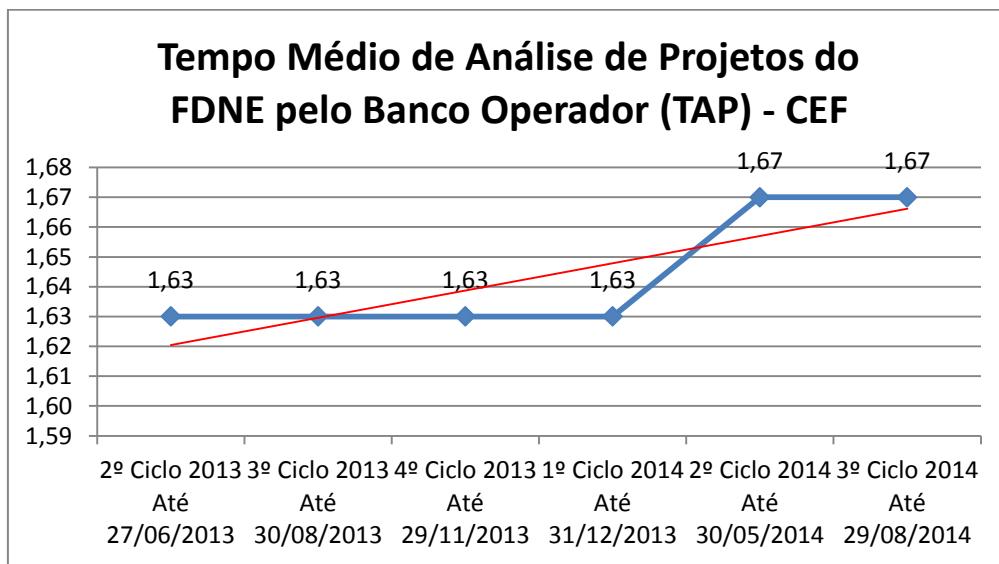

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = 0,00\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{1} = 100,00 \%$$


a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{2} = 0,00 \%$$


- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

- e) Periodicidade: Jan-ago2014
- f) Comentários: não houve demanda de análise projeto para o BNB.
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013) (incluía até então, apenas o BNB).
 Jun/2013 = BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 % (2º Ciclo 2013).
 Ago/2013 = BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 % (3º Ciclo 2013).
 Nov/2013 = BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00% (2º Ciclo 2014),

- h) Representação gráfica:

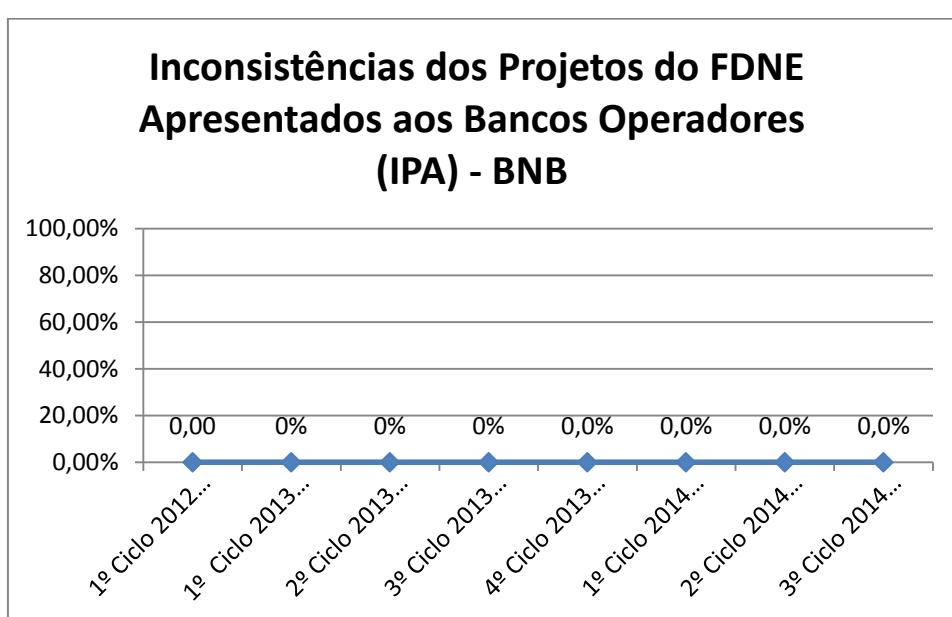


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

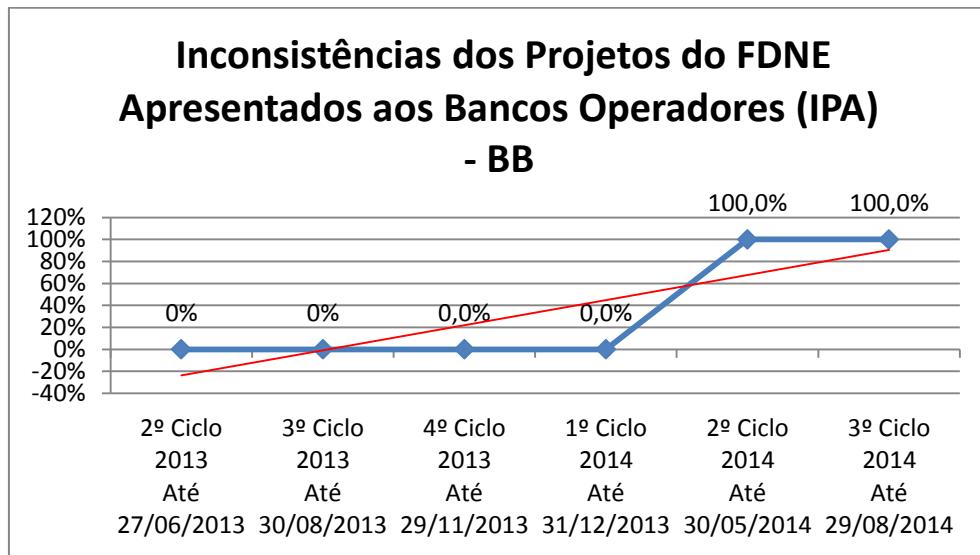

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

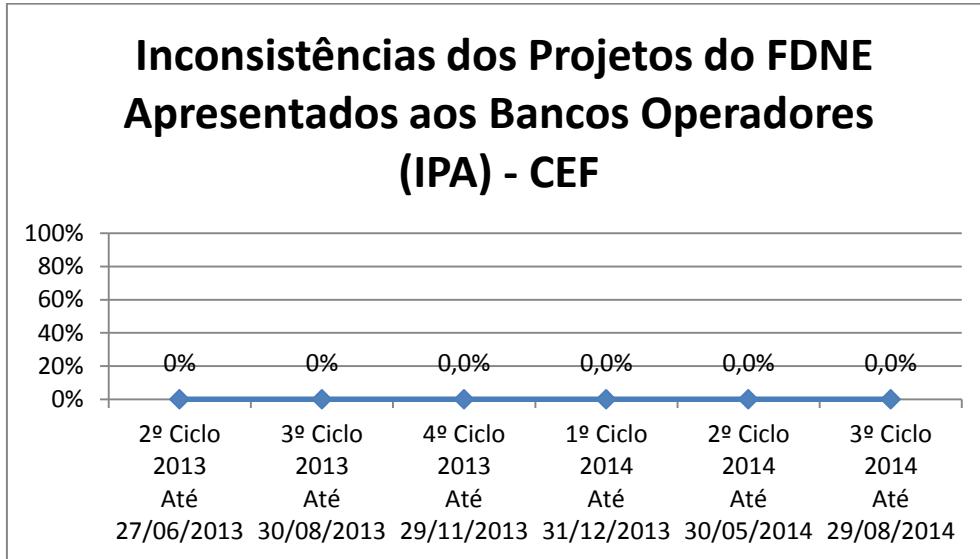

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado} \times 100}{\text{Dotação LOA}} = \frac{1.888.949.528,00 \times 100}{2.022.481.635,00} = 93,3\%$
- Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- Periodicidade: Jan-ago/2014

f) Comentários: Da dotação do FDNE na LOA o montante de R\$ 133.532.107,00 não poderá ser utilizado por terem sido anulados para bloqueio de crédito para alteração de fonte de recursos, sendo que tal alteração não foi ainda aprovada. E sendo tal valor orçamentário oriundo de fonte de recursos próprios (fontes 250 e 280) previstas mas que não serão realizados, não poderão ser empenhados.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 100,0 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 99,14 % (referência LOA 2012 e RAPs) (1º Ciclo 2013)

Jun/2014 = 61,24 % (2º Ciclo 2013)


Ago/2013 = 61,24 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 56,26% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 100% (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 2,52% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

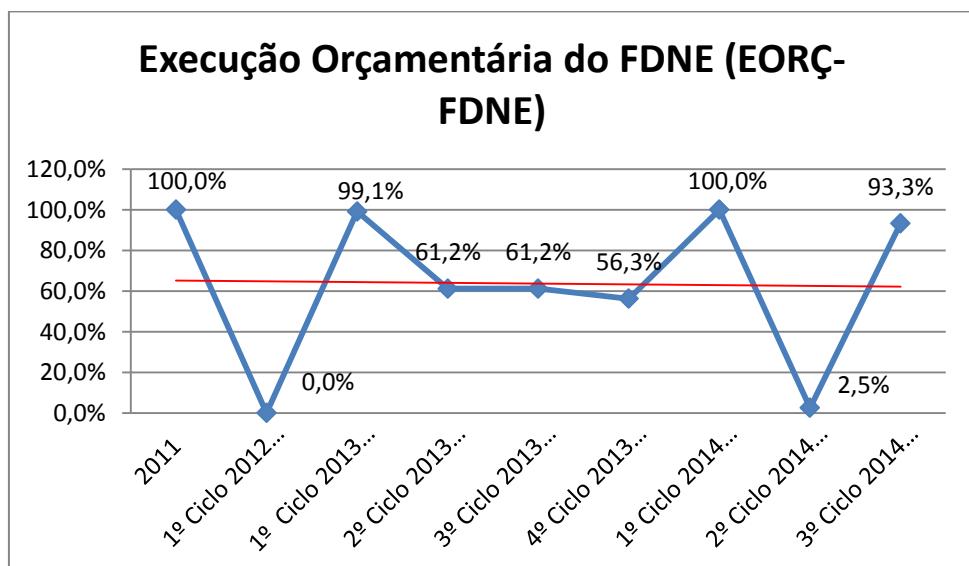

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Recursos Empenhados}} = \frac{2.127.658.850,80 \times 100}{8.619.399.986,56} = 24,68\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-agosto 2014

f) Comentários:

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 14,2 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 3,25 % (1º Ciclo 2013).

Jun/2013 = 11,70 % (2º Ciclo 2013).


Ago/2013 = 11,70 % (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = 18,43% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 18,43% (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 8,46% (2º ciclos 2014)

h) Representação gráfica:

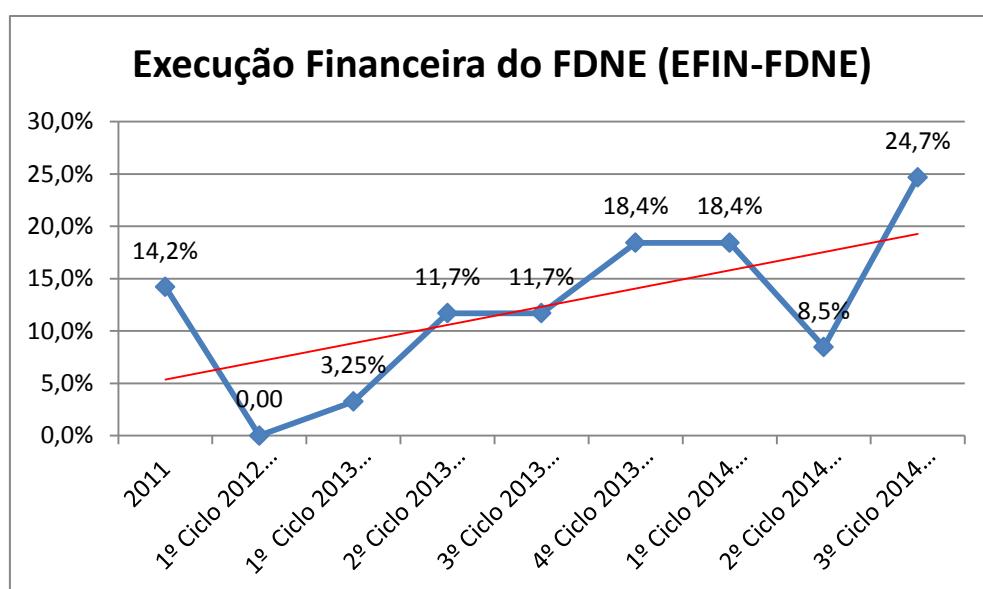

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1 \times 100}{30 \text{ dias}} = \frac{8 \times 100}{30} = 26,67\%$

b) Objetivo: Aferir o percentual que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00 (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-agosto/2014

f) Comentários: O percentual reflete a eficiência da equipe técnica, que utilizou apenas uma fração do tempo máximo legal para tanto.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 36,50% (2º Ciclo 2013)


Ago/2013 = 36,50 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 34,53% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 34,53% (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 10,00% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

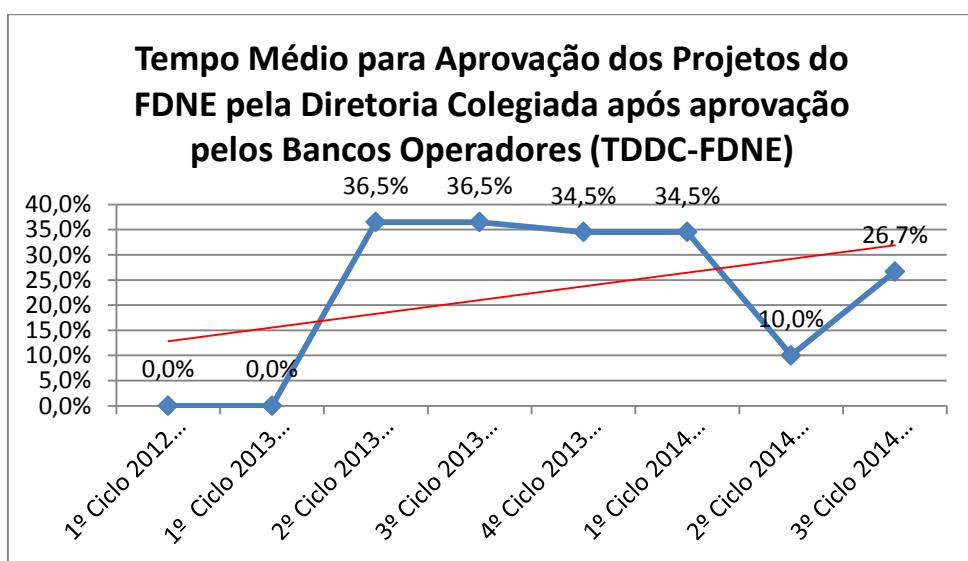

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: Tm = $\frac{T}{N}$ = $\frac{794}{3}$ = 264,67 dias


b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários:

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013= cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)
 Jun/2013 = 138,4 dias (2º Ciclo 2013)
 Ago/2013 = 138,4 dias (3º Ciclo 2013)
 Nov/2013 = 501 dias (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 501 dias (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 260,5 dias (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

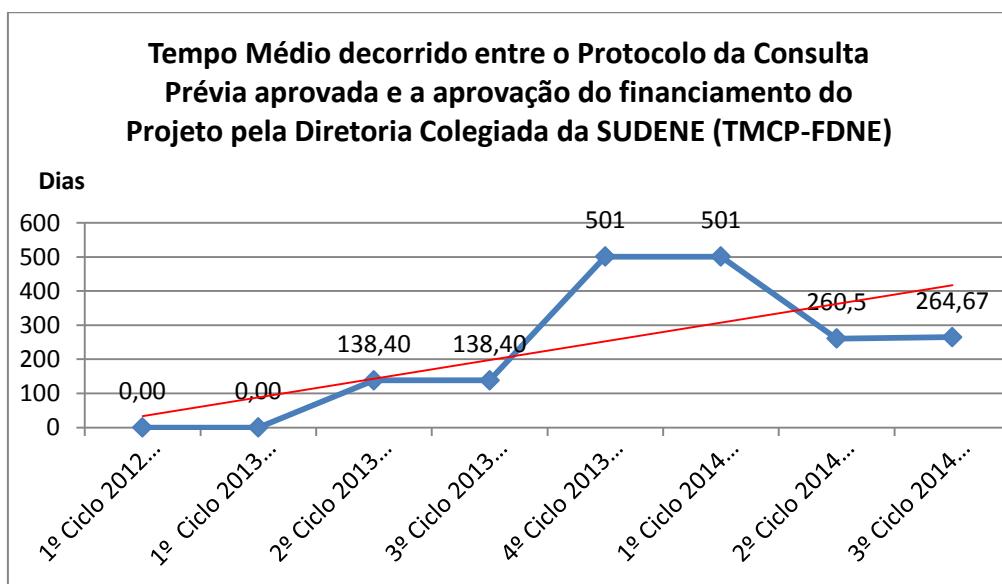

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


Notas:

- **T_m** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{3}{3} = 1,00$

- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários: todos os projetos aprovados pelos Agentes Operadores (BB, BNB e CEF) tiveram o financiamento aprovado pela SUDENE.
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)
 Jun/2013 = 1,0 (2º Ciclo 2013)
 Ago/2013 = 1,0 (3º Ciclo 2013)
 Nov/2012 = 1,0 (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 1,0 (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 1,0 (2º ciclo 2014)
- h) Representação gráfica:

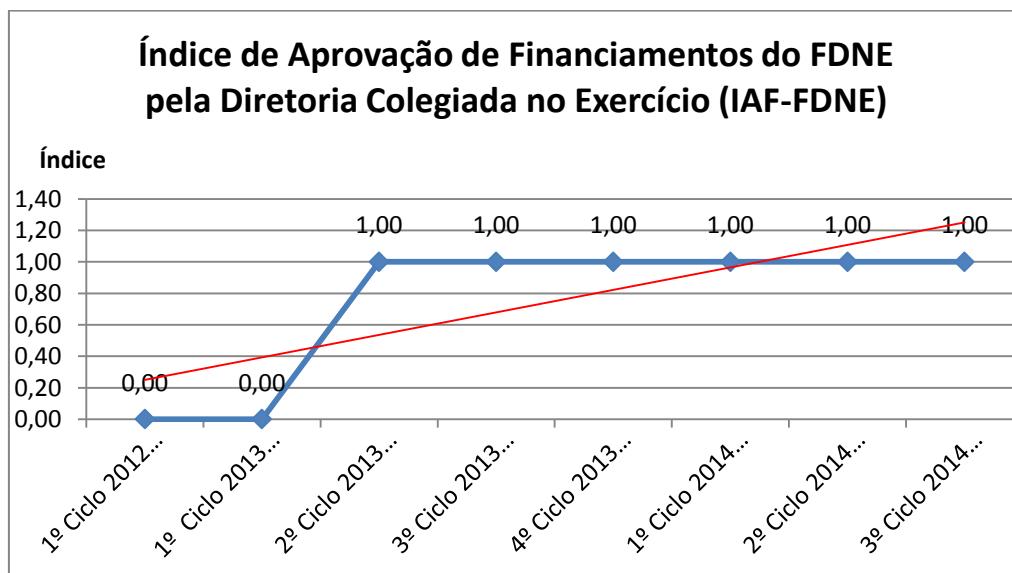

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV–IF)

- a) Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{6.421 \text{ dias}}{73 \text{ pleitos}} = 89,7 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal: quanto menor melhor
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2014 e encerrado em 31 de agosto de 2014, foram vistoriados 73 estabelecimentos dos 155 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período. O número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias (Tempo Médio de Espera) atingiu 89,7 dias/pleito. O resultado foi basicamente afetado pelo período de férias uma vez que em janeiro não foram realizadas vistorias e em fevereiro as vistorias somente tiveram início a partir do dia 17, e por 5 processos cujo prazo médio entre a formalização e a vistoria variou de 167 a 205 dias.

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 205 dias (Pepsico Amacoco Bebidas do Brasil Ltda.). O prazo mínimo, de 8 dias, foi observado no processo de interesse da empresa Autopel Automação Comercial e Informática Ltda. O maior número de observações (19) situou-se entre 31 e 60 dias de espera. Também foi significativo o número de observações entre 61 e 90 dias (15 vistorias).

Prazo em dias	Número de vistorias
Até 30 dias	7
De 31 a 60 dias	19
De 61 a 90 dias	15
De 91 a 120 dias	10
De 121 a 150 dias	9
De 151 dias a 180 dias	10
De 181 a 210 dias	3
Acima de 210 dias	0


O quadro abaixo distribui, nos meses indicados, as vistorias realizadas.

Meses	Vistorias realizadas
Anteriores	1
Novembro de 2013	10
Dezembro de 2013	11
Janeiro de 2014	-
Fevereiro de 2014	14
Março de 2014	6
Abril de 2014	10
Maio de 2014	17
Junho de 2014	4
TOTAL	73

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = 64,60 dias/pleito. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 = 30,10 dias/pleito. (1º Ciclo 2013)
 Jun/2013 = 76,00 dias/pleito. (2º Ciclo 2013)
 Ago/2013 = 64,40 dias/pleito. (3º Ciclo 2013)
 Nov/2012 = 68,50 dias/pleito. (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 69,20 dias/pleito. (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 83,00 dias/pleito. (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

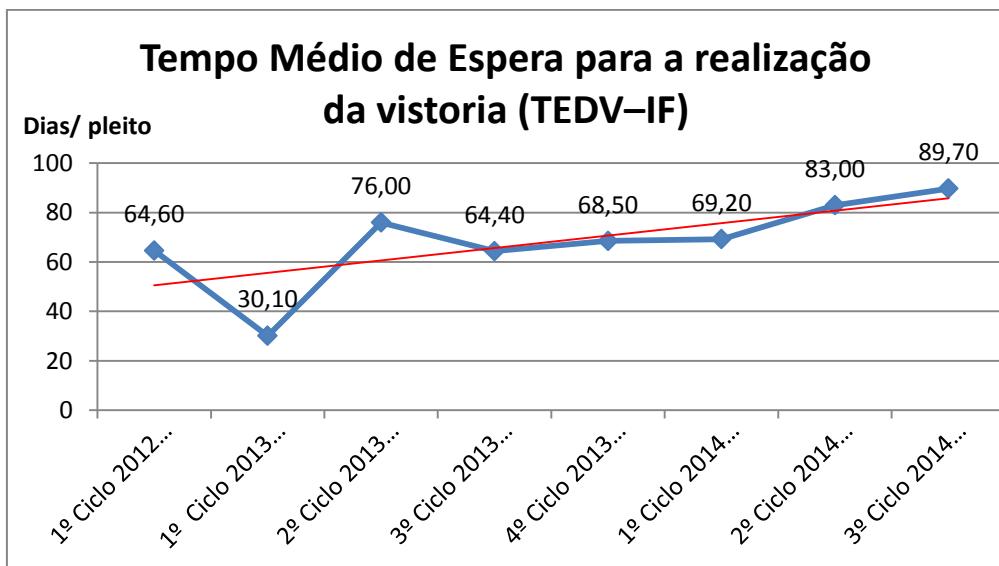

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


Convenções:

$T_1 = \Sigma$ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{237} = 0\%$
- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto menor melhor
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários: Não preenchido
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 2,36 % (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 0,00 % (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 0,00% (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 0,00% (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 0,00% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 0,00% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 0,00% (2º ciclo 2014)
- h) Representação gráfica:

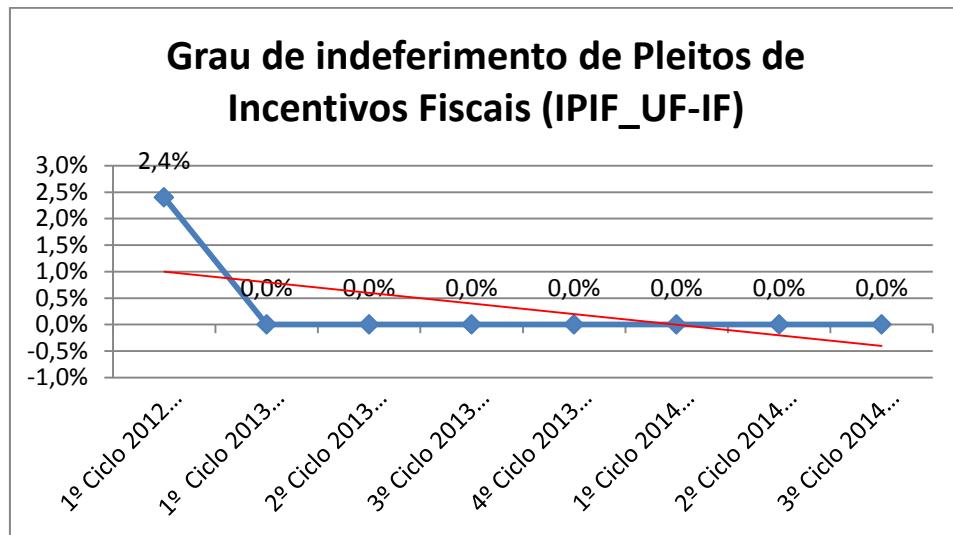

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período considerado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.


(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} = \frac{151 \times 100}{237} = 63,70\%$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014
- f) Comentários: no período, dos 237 pleitos protocolados, foram concluídas 151 análises, sendo 91 de redução do imposto de renda, 45 pleitos de isenção do AFRMM e 15 de reinvestimento do IRPJ, o que significou percentual de análise de 63,7% dos pleitos ingressados.
- g) Resultados anteriores:
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Dez/2011 a mai/2012 = 77,16 %. (1º e único Ciclo 2012)
Jul a dez/2012 = 90,00% (1º Ciclo 2013)
Jan a mai/2013 = 100,00% (2º Ciclo 2013)
Jan-ago/2013 = 75,4% (3º ciclo 2013)
Jan-nov/2013 = 62,9% (4º ciclo 2013)
Mar/2014 = 67,3% (1º ciclo 2014)
Mai/2014 = 66,4 % (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

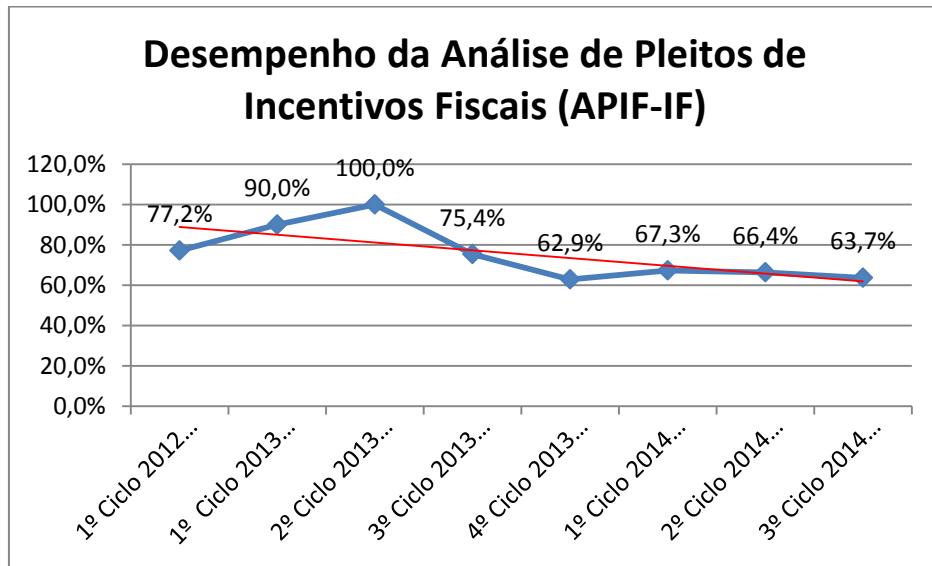

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)


- Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{15.943 \text{ dias entre o ingresso e a conclusão da análise}}{151 \text{ pleitos protocolados}} = 105,6 \text{ dias/pleito}$
- Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (média): Quanto menor melhor
- Periodicidade: Jan-ago/2014
- Comentários: o prazo médio observado, de **105,6 dias** decorreu do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros oito meses de 2014 (151 processos ou pleitos). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 160,7 dias, sendo de 50,5 dias para os processos de isenção do AFRMM e de 129 dias para os processos de reinvestimento.

O acréscimo no prazo médio dispendido nos exames foi provocado, em grande parte, pela finalização da análise de 8 processos cujo prazo médio entre a formalização e a aprovação alcançou 255,4 dias, basicamente por problemas de documentação e de logística, com destaque para o pleito de interesse de Master Glasses Indústria e Comércio Ltda., com 488 dias entre a formalização e a aprovação, e o de interesse da Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. com 308 dias para sua aprovação.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 53,86 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 52,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 67,7 dias/pleito (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 62,2 dias/pleito (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 70,2 dias/pleito (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 76,7 dias/pleito (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 113,3 dias/pleito (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

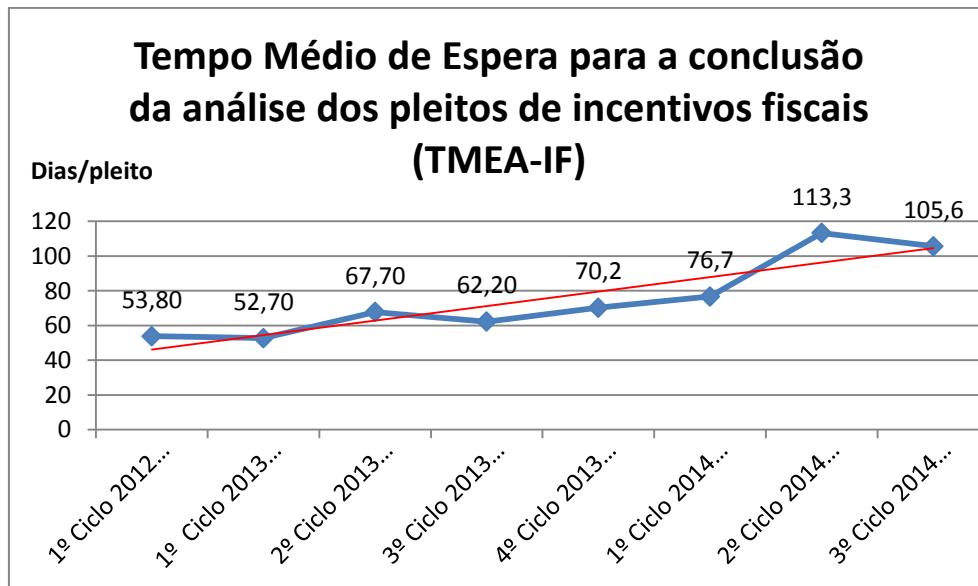

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

$T_1 = \Sigma$ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{151}{10} = 15,1$ análises/técnico

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal: (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2014

- f) Comentários: o número observado, de 15,1 análises por técnico, é a nosso ver mais que satisfatório se levarmos em conta, além do período de férias de janeiro e julho, o número de dias gastos com a realização das vistorias uma vez que é o mesmo servidor que formaliza o processo, realiza a vistoria e complementa o exame do processo. Deixamos de efetuar o cálculo em termos percentuais por entender que o resultado fica distorcido.
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = Não existia o indicador.
- Dez/2011 a mai/2012 = 12,7 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012)
- Jul a dez/2012 = 14,4 análises/técnico (1º Ciclo 2013)
- Jan a mai/2013 = 9,6 análises/técnico (2º Ciclo/2013)
- Jan a ago/2013 = 15 análises/técnico (3º ciclo 2013)
- Jan a nov/2013= 21,6 análises/técnico (4º ciclo 2013)
- Mar/2014 = 29,8 análise/técnico (1º ciclo 2014)
- Mai/2014 = 8,5 análise/técnico (2º ciclo 2014)

- h) Representação gráfica:

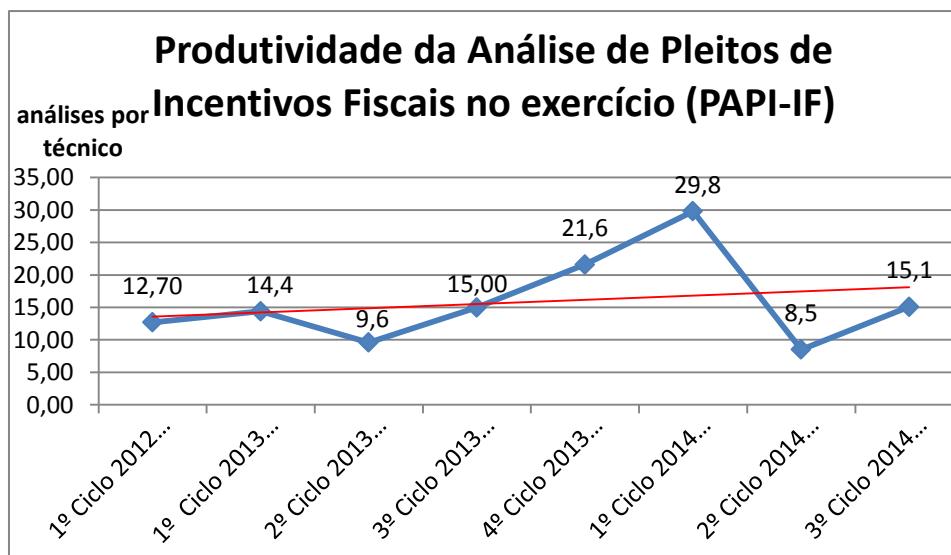

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)


- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{73 \text{ vistorias}}{5 \text{ equipes}} = 14,6 \text{ vist/equipe}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal: (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2014

f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 73 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 12,4 vistorias/equipe. (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 18,2 vistorias/equipe (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 8 vistorias/equipe (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 12,4 vistorias/equipe (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 18,6 vistorias/equipe (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 32,4 vistorias/equipe (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 8 vistorias/equipe dias (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

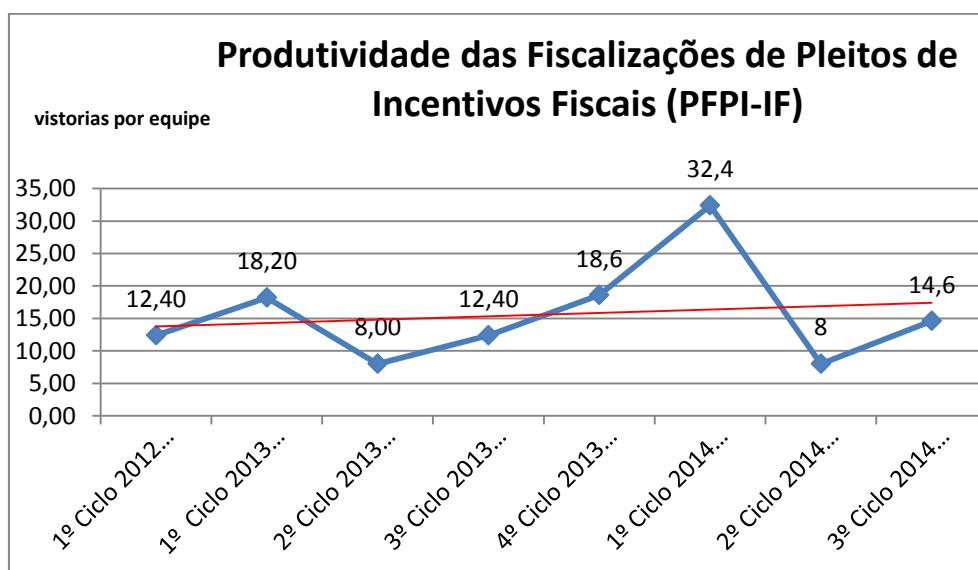

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{39 \times 100}{72} = 54,17\%$


b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período de aferição: janeiro-agosto/2014.

f) Comentários: No período do 2º ciclo para o 3º ciclo, foi constatado um acréscimo significativo de propostas protocoladas, ou seja, de 15 passou para 72 propostas, constando no SICONV 39 analisadas. Das 33 restantes, 27 já possuem análise preliminar, porém não inseridas no SICONV, devido à pendência de mudança de modalidade financeira. Portanto considerando as propostas com análise preliminar, resultando em 66 propostas analisadas, o CAPC seria de 91,67%.

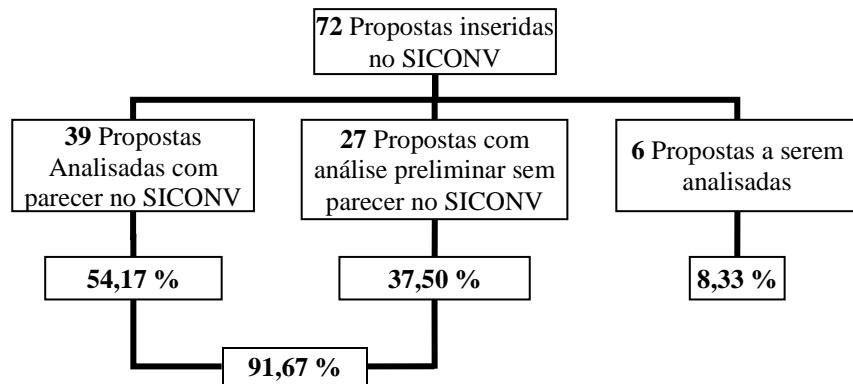

g) Resultados Anteriores (CAPC):

Dez/2011 = 100,0 %

Jan a nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0% (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 86,79 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013= 92,45% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 73,33% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

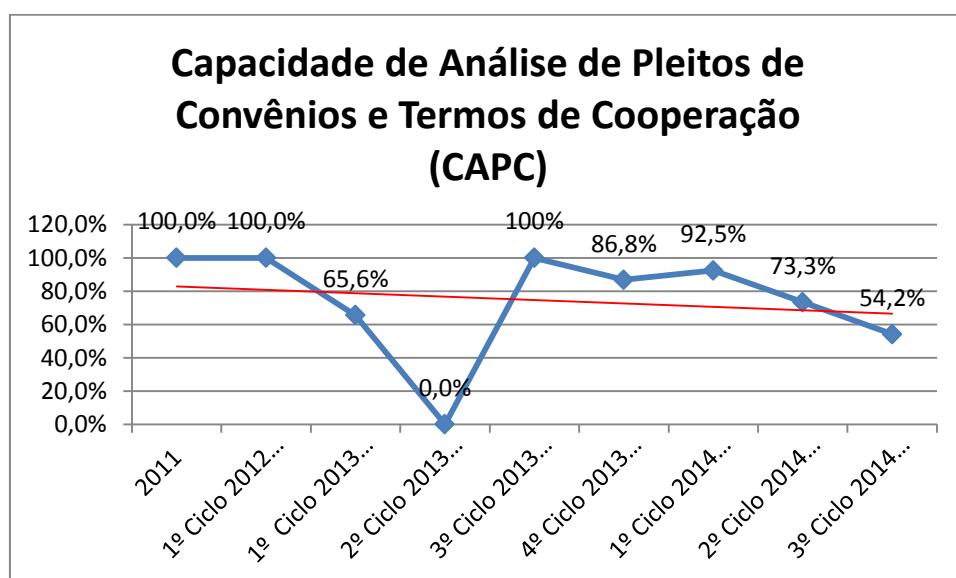

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{3 \times 100}{39} = 7,69\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período da aferição: janeiro-agosto/2014

f) Comentários: Até o encerramento deste período, foram aprovados três propostas, das 39 analisadas. Entretanto, cabe ressaltar que 4 propostas foram analisadas e estão em complementação pelo proponente, e 20, após serem complementadas, aguardam nova análise técnica desta SUDENE.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = 14,6 %

Jan a nov/2012 = 21,74 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 38,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 25,0% (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 23,91 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 22,45% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 18,18% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

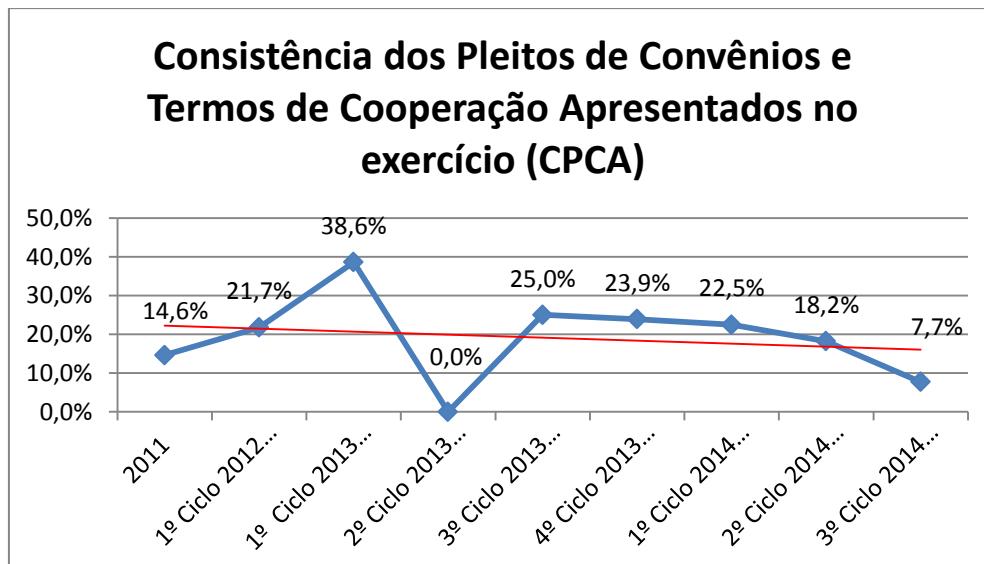

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.}}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} \times 100 =$

$$= \frac{12 \times 100}{72} = 16,67 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Período da aferição: janeiro-agosto/2014

f) Comentários: Dentro das 12 propostas rejeitadas, 7 foram por impedimento técnico, que poderão ser reapresentadas para uma nova análise.

g) Resultados Anteriores (IIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 13,04 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 74,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 75,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 56,6 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 62,26% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 60,0% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

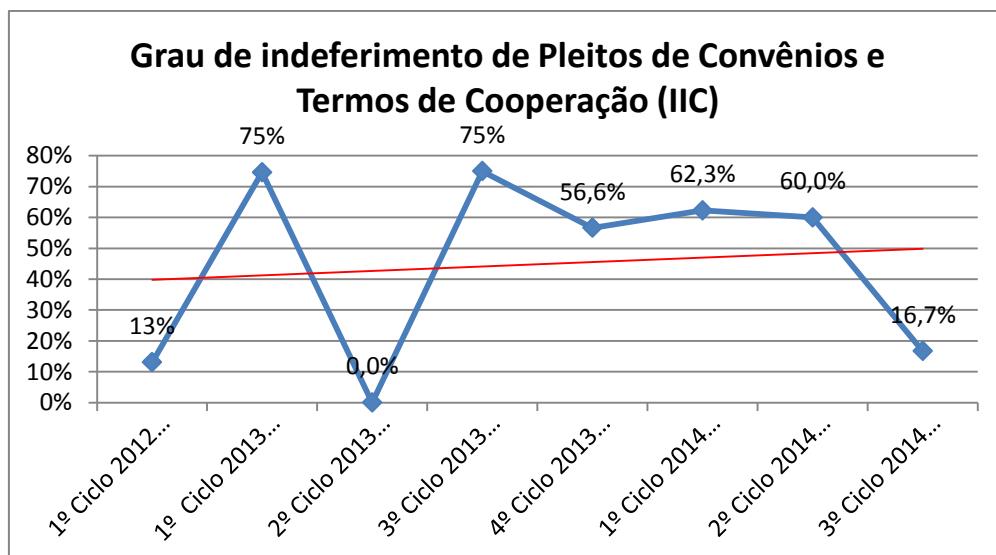

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \frac{11}{11} \times 100 = 100\%$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)
- e) Período da aferição: janeiro-agosto/2014
- f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 11 viagens de acompanhamento da parte física dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral.
- g) Resultados Anteriores (DFCON):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Jan a nov/2012 = não informado pela unidade. (1º e único Ciclo 2012)
Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)
Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)
Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)
Jan a nov/2013 = 100,0 % (4º ciclo 2013)
Jan a dez/2013 = 100,0% (1º ciclo 2014)
Jan a mai/2014 = 100,0% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

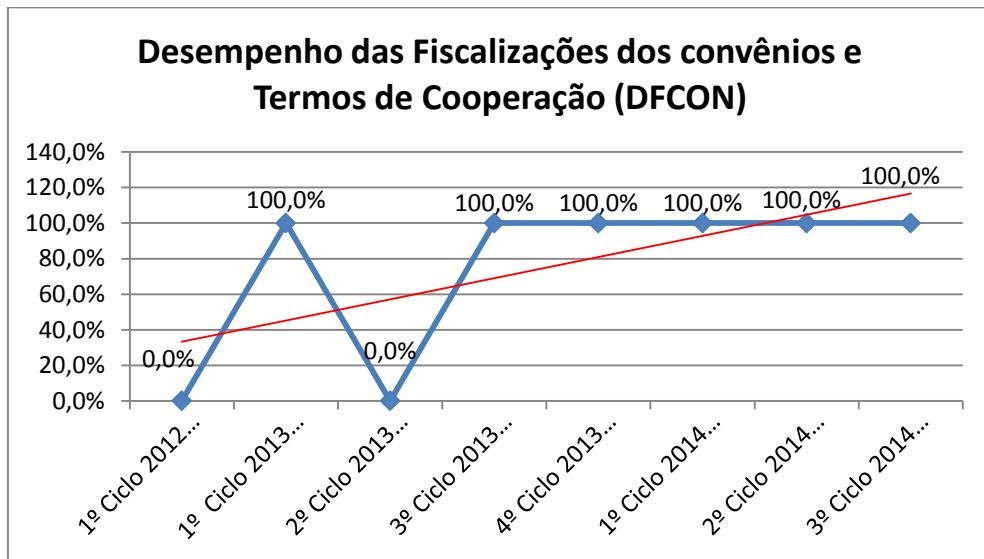

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ANO 2014

1. Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura.
Período: 28 à 31.01.2014
Técnico: Marcelo Viana
Local: Araripina, Serra Talhada, Moreilândia – PE.
2. Realizar visita técnica de acompanhamento do convênio nº 770741/2012 que trata do Projeto de Capacitação dos Integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Estado da Paraíba
Período: 30.01.2014
Técnicos: Juliana Borges e Macira Sotero
Local João Pessoa – PB.
3. Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura no Estado de PE
Período: 04 a 06.02.2014
Técnico: Marcelo Viana
Local: Floresta e São José do Egito – PE.
4. Realizar visita de acompanhamento final do Projeto Aprisco Seridó, convênio SICONV 710365/2009 – Região do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte – RN
Período 1102 a 13.02.2014-03-31 Técnico: Victor Uchoa
Local: Natal e Jardim do Seridó – RN.

5. Visita Técnica para emissão de Laudo Técnico do convênio SICONV 744654/2010 – ao município de Timbau do Sul, no Estado do Rio Grande do Norte.
Período: 20 a 21.02.2014.
Técnica: Maria Helena Castro
Local: Timbau do Sul – RN.
6. Realizar supervisão final do convênio nº 767485/2011, celebrado com o Município de Riacho de Santana, no Estado do Rio Grande do Norte, com vistas a emissão de Laudo Técnico
Período: 19 a 21.03.2014.
Técnico Agrimon Marcos
Local Riacho de Santana – RN.
7. Realização dos trabalhos de vistoria de campo nos convênios da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedra/RN – SICONV nº 737691/2010 (conclusão de obras de urbanização), Prefeitura Municipal de Assu/RN – SICONV 768007/2011 (obras de pavimentação em asfalto CBUQ em ruas) e Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa-RN, SICONV 770860/2012 (construção de uma ponte de concreto armado) para emissão de Laudo técnico.
Período: 09.04 a 11.04.2014
Técnico: Edson Laranjeiras
Local: Lagoa de Pedra, Assu e Ruy Barbosa – RN.
8. Verificar no local onde vai se realizar as reformas dos mercados públicos de Messias Targino/RN e Jardim de Piranhas/RN, a viabilidade de realização de convênios.
Período: 06.05 a 08.05.2014.
Técnico: Edson Laranjeiras
Local: Messias Targino-RN e Jardim de Piranhas – RN.
9. Viagem de acompanhamento ao termo de Cooperação entre SUDENE e IFPB “Qualificação Profissional de Mulheres para a Construção Civil, nº 59.335.000213/2013-25”.
Período 31.07.2014.
Técnicos: Macira Sotero e Edson Laranjeiras.
Local: João Pessoa – PB.
10. Supervisionar as ações do Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura Processo nº 59.335.000124/2012-6 – SICONV 769783/2012
Período 07 a 08.08.2014.
Técnico: Marcelo Viana.
Local: Serra Talhada e Sertânia – PE.
11. Supervisionar as ações do Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das estruturas Produtivas da caprinocultura e Apicultura convênio 59.335.000124/2012-6 - SICONV 769783/2012
Período: 20 a 22.08.2014.
Técnicos: Marcelo Viana e Marcelo Saiki.
Local: Parnamirim e Custódia – PE.

PROPOSTAS INSERIDAS NO SICONV - JANEIRO À AGOSTO / 2014

NÚMERO DA PROPOSTA	NOME DO PROPONENTE	UF DO PROPONENTE	PROGRAMA	POSSUI PARECER?	SITUAÇÃO
1 047621/2014	MUNICIPIO DE TANGARA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável E Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
2 047615/2014	CAMPO REDONDO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável E Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
3 047161/2014	PORTO DO MANGUE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável E Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
4 047104/2014	PEDRO AVELINO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável E Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
5 044157/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	MG	2029-Desenvolvimento Regional / 8917 - Fortalecimento Das Administrações Locais - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
6 043883/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	RN	2040 - Gestão De Riscos E Resposta A Desastres / 8172 - Coordenação E Fortalecimento Do Sistema Nacional De Proteção E Defesa Civil	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
7 043574/2014	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
8 043406/2014	PENDENCIAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
9 043352/2014	GROSSOS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
10 043346/2014	CEARA MIRIM PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

11	043339/2014	SAO JOSE DE MIPIBU PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
12	043338/2014	MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
13	043325/2014	VARZEA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
14	043317/2014	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
15	043316/2014	EXTREMOZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
16	043302/2014	SAO GONCALO DO AMARANTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
17	043286/2014	MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
18	043270/2014	TIBAU DO SUL PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
19	043235/2014	GOIANINHA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
20	042663/2014	BOM JESUS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
21	042552/2014	ESPIRITO SANTO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
22	042522/2014	CAICARA DO RIO DO VENTO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

23	042505/2014	RIO DO FOGO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
24	042247/2014	MONTE DAS GAMILEIRAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
25	042067/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
26	041924/2014	CARNAUBAIS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
27	041922/2014	JAPI PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
28	041915/2014	LAGOA DANTA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
29	041907/2014	MUNICIPIO DE JARDIM DE ANGICOS	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
30	041899/2014	SAO JOSE DO SERIDO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
31	041894/2014	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
32	041885/2014	ALMINO AFONSO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
33	041858/2014	RUY BARBOSA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
34	041853/2014	MUNICIPIO DE ACARI	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação

35	041821/2014	NOVA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
36	041736/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - Gestão De Riscos E Resposta A Desastres / 8172 - Coordenação E Fortalecimento Do Sistema Nacional De Proteção E Defesa Civil	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
37	041668/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
38	041665/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
39	041664/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
40	041663/2014	MUNICIPIO DE FLORANIA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
41	041654/2014	SERRA DO MEL PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
42	041652/2014	LAGOA DE VELHOS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
43	041648/2014	BREJINHO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
44	041647/2014	MUNICIPIO DE JUCURUTU	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
45	041645/2014	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
46	041644/2014	AREIA BRANCA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise

47	041545/2014	CRUZETA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
48	041482/2014	MAJOR SALES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
49	040009/2014	VERA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
50	040008/2014	SANTA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
51	040007/2014	LAJES PINTADAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
52	040005/2014	PARAZINHO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
53	040003/2014	JANDAIRA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
54	040001/2014	JACANA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
55	039978/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
56	039973/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
57	039971/2014	BREJINHO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
58	039733/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

59	039665/2014	MUNICIPIO DE CERRO CORA - PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
60	039638/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
61	039633/2014	MUNICIPIO DE FLORANIA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
62	036529/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029 - Programa De Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentavel E Economia Solidaria - Ação 82029 - Programa De Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentavel E Economia Solidaria - Ação 8902 - Promoção De Investimentos Em Infraestrutura Económica	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
63	036442/2014	ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA	SE	2029 - Programa De Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentavel E Economia Solidaria - Ação 82029 - Programa De Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentavel E Economia Solidaria - Ação 8902 - Promoção De Investimentos Em Infraestrutura Económica	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
64	036438/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	MG	2029-Desenvolvimento Regional / 8917 - Fortalecimento Das Administrações Locais - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
65	036339/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - Gestão De Riscos E Resposta A Desastres / 8172 - Coordenação E Fortalecimento Do Sistema Nacional De Proteção E Defesa Civil	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
66	036275/2014	EMPRESA EST DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S/A	PB	2029-Desenvolvimento Regional / 20n7 - Provimento De Infraestrutura Produtiva Para APLs - Plano Brasil sem Miséria	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
67	036138/2014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável E Economia Solidária / Ação 8689 - Elaboração E Implementação Do Zoneamento Ecológico-Econômico - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
68	034868/2014	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	PE	Programa 2029 – Desenvolvimento, Territorial Sustentável E Economia Solidária.Ação 8340 – Desenvolvimento Da Rede Regional De Inovação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

69	024010/2014	MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO	RN	2029 - Programa De Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentavel E Economia Solidaria - Ação 8902 - Promoção De Investimentos Em Infraestrutura Economica	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
70	023207/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-Desenvolvimento Regional / 20N7 - Provimento De Infraestrutura Produtiva Para APLs - Plano Brasil sem Miséria	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
71	023169/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-Desenvolvimento Regional / 20N7 - Provimento De Infraestrutura Produtiva Para APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
72	020551/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	2029 - Programa De Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentavel E Economia Solidaria - Ação 8902 - Promoção De Investimentos Em Infraestrutura Economica	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

LEGENDA	
	PROPOSTAS ANALISADAS E APROVADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS POR IMPEDIMENTO TÉCNICO
	PROPOSTAS EM ANÁLISE
	PROPOSTAS A SEREM ANALISADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS PRELIMINARMENTE COM PENDÊNCIA DE MUDANÇA DE MODALIDADE FINANCEIRA

4.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{242 \text{ dias}}{91 \text{ pleitos}} = 2,66 \text{ dias/pleito}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado ideal (dias/pleito): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2014

f) Comentários: das 91 propostas protocoladas, 42 ainda não foram iniciadas, 47 estão em fase de formalização e 2 estão aprovadas.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.


Jan a out/2012 = 13,8 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 13,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 0 dias/pleito (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 0 dias/pleito (4º ciclo 2013)
 Jan a dez/2013 = 16,27 dias/pleito (1º ciclo 2014)
 Jan a Mai/2014 = 59,66 dias/pleito (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

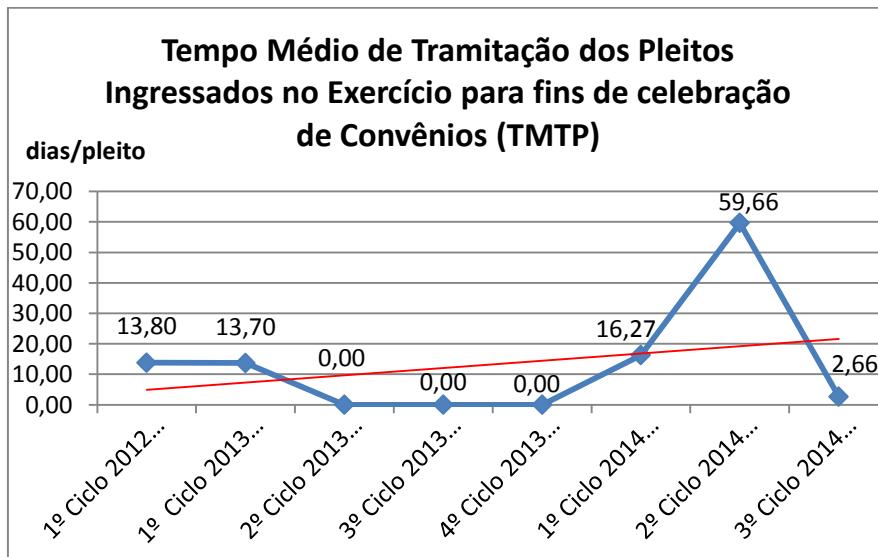

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{60 \text{ dias}}{5 \text{ pleitos}} = 12 \text{ dias/pleito}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado ideal (dias/pleito): (quanto menor melhor)

i) Periodicidade: jan-ago/2014

e) Comentários: -

f) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = Não existia o indicador (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = Não existia o indicador (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0 dias/pleito (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 5 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 5 dias/pleito (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 5 dias/pleito (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 5 dias/pleito (2º ciclo 2014)

g) Representação gráfica:

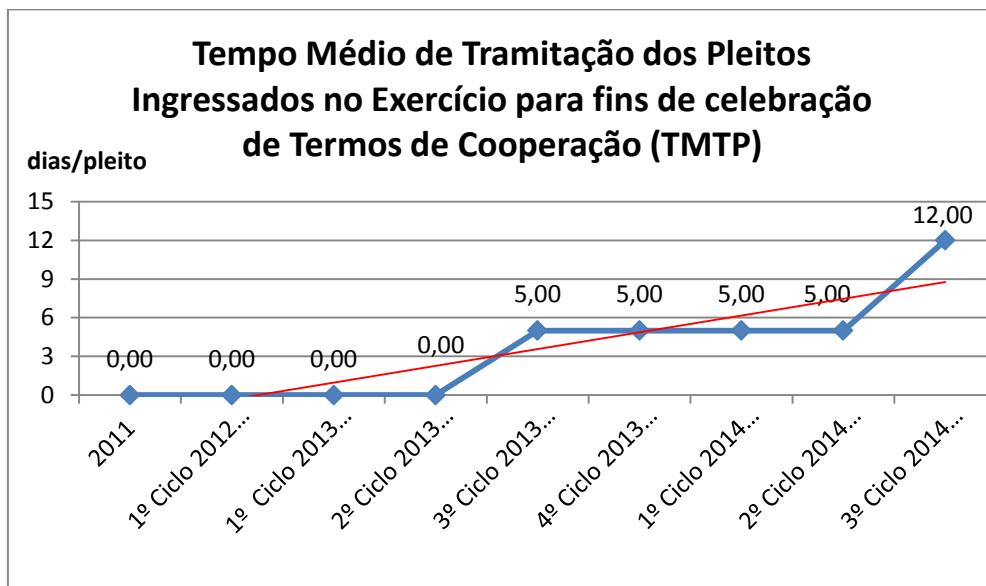

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;


- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"}}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar}} \times 100 = \frac{34}{36} \times 100 = 94,44\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios, com o apoio da Comissão Permanente de TCE.
- d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-ago/2014
- f) Comentários: Percebe-se que a SUDENE vem reduzindo, de forma significativa o passivo dos Convênios, no entanto os processos aqui citados são Convênios celebrados pela extinta SUDENE e pela ADENE, ou seja, fazem parte do passivo da SUDENE. Outrossim, a Autarquia vem adotando, dentro do possível, as providências necessárias ao encerramento das avenças: emissão de Laudo Técnico, emissão de Análise Financeira e Notificação aos convenentes, entretanto ainda persiste a dificuldade de pessoal. Em cumprimento às determinações legais, bem como dos órgãos de controle, tentamos esgotar todas as providências administrativas, antes de instaurar Tomada de Contas Especial. Vale lembrar, que existem processos na situação de “A PROVAR”, que estão localizados na CPTCE, ou seja, estão em Tomada de Contas Especial. Neste contexto, para que o índice reduza é necessário a conclusão dos convênios em TCEs.
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = não existia o indicador.
 Jan a out/2012 = não foi apurado. (1º e único Ciclo 2012)
 Jan a dez/2012 = 80,4 % (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 95,1 % (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 92,7 % (3º Ciclo 2013)
 Jan a Nov/2013 = 87,8% (4º ciclo 2013)
 Jan a dez/2013 = 87,8% (1º ciclo 2014)
 Jan a ago/2014 = 102,7% (2º ciclo 2014)
- h) Representação gráfica:

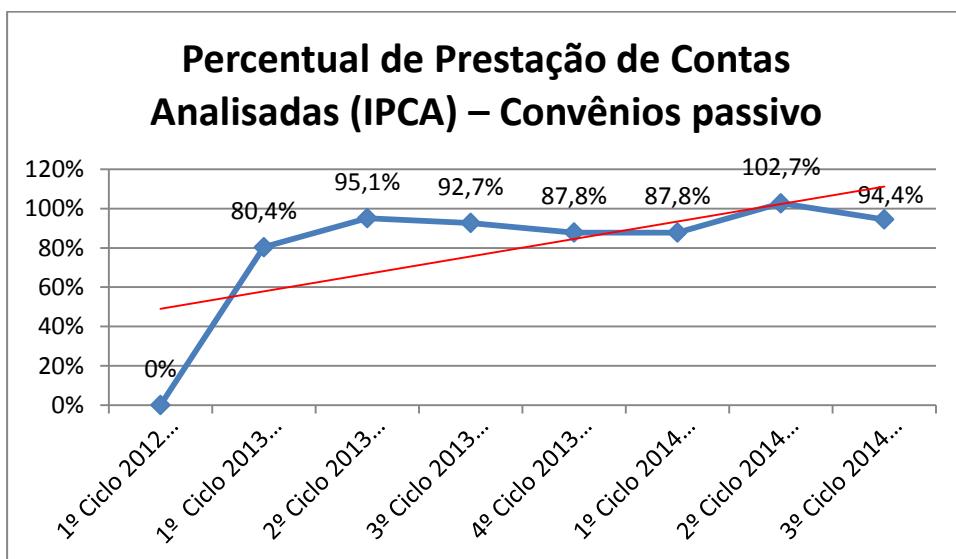


Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"} \times 100}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} = \frac{10 \times 100}{8} = 125\%$
- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-ago/2014
- f) Comentários: A SUDENE está adotando, dentro do possível, as providências necessárias ao encerramento das avenças: emissão de Laudo Técnico (CGDS), emissão de Análise Financeira (CGC) e notificação aos convenentes (CGC), entretanto tem dificuldades de pessoal. Lembramos, outrossim, as dificuldades dos convenentes na operacionalização do SICONV. O convenente só deve encaminhar a Prestação de Contas, no SICONV, após; o encaminhamento, a análise e aprovação dos Relatórios de Execução, em cumprimento aos Manuais de operacionalização do SICONV. A tendência deste percentual será sempre de aumentar, haja vista a celebração de novos convênios em cada exercício, ou seja, o volume de convênios firmados, e consequentemente o volume de Prestação de Contas apresentadas no SICONV. Inclusive as análises das Prestações de Contas dos convênios, celebrados no SICONV, são mais céleres.
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Jan a out/2012 = 92,7 % (1º e único Ciclo 2012)
 Jan a dez/2012 = 75,0 % (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 71,4% (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 57,1 % (3º Ciclo 2013)
 Jan a Nov/2013 = 57,1% (4º ciclo 2013)
 Jan a dez/2013 = 57,1% (1º ciclo 2014)
 Jan a mai/2014 = 200% (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

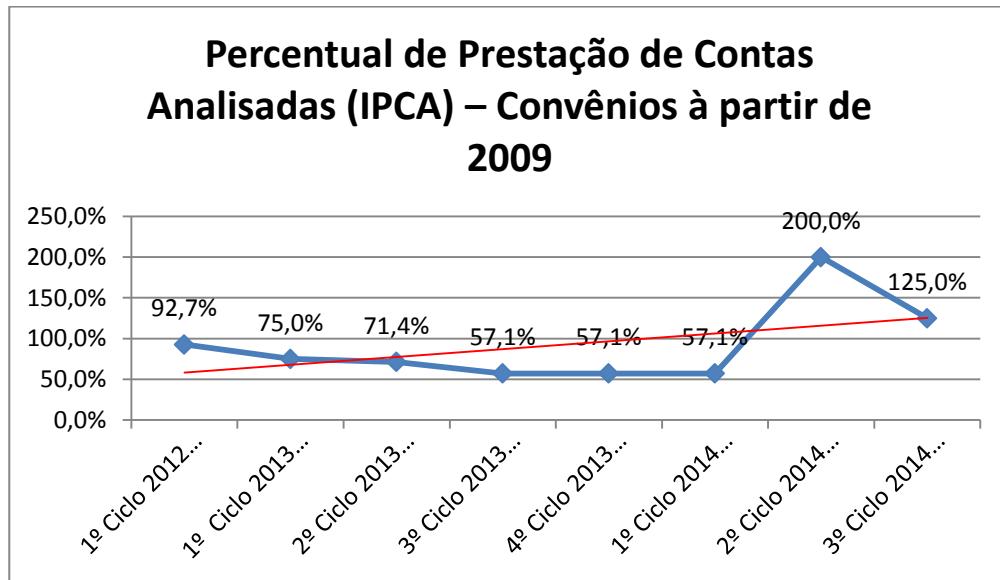

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{121 \times 100}{199} = 60\%$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-ago/2014

f) Comentários: A capacitação dos servidores da Sudene tende a ser acrescida a partir do mês de setembro/2014, tendo em vista a inclusão dos servidores concursados, embora esteja previsto o número de servidores para o exercício. Registrarmos que a participação em eventos de capacitação alcança no presente Ciclo o número de **259**.

g) Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2012 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 71,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,65 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 18,0 % (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 38,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 45,4 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 47% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

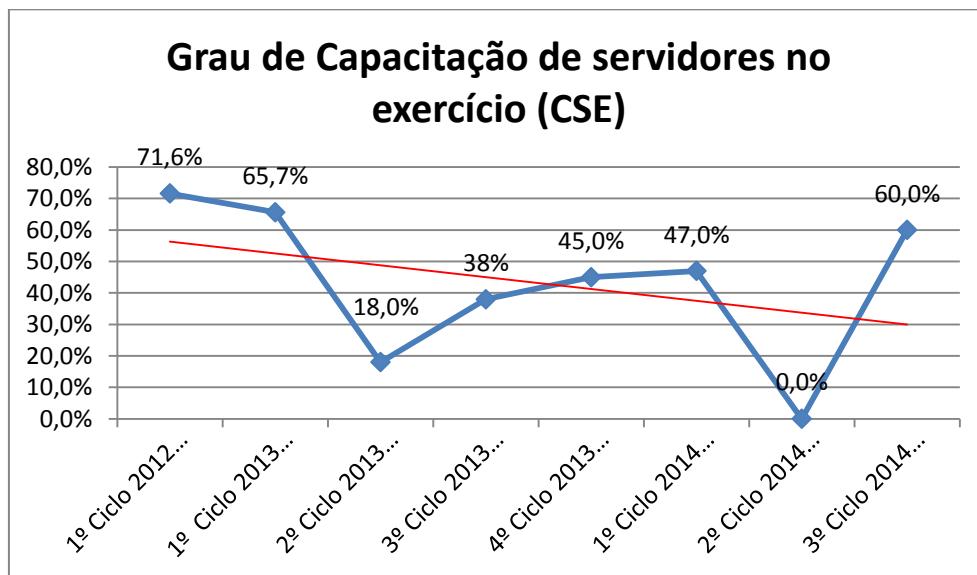

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{36 \times 100}{40} = 90\%$

b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-ago/2014

f) Comentários: O número de capacitação apresenta, até o presente Ciclo, a realização prevista.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 66,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 80,0 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 17,0 % (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 60,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 157,0 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 174% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

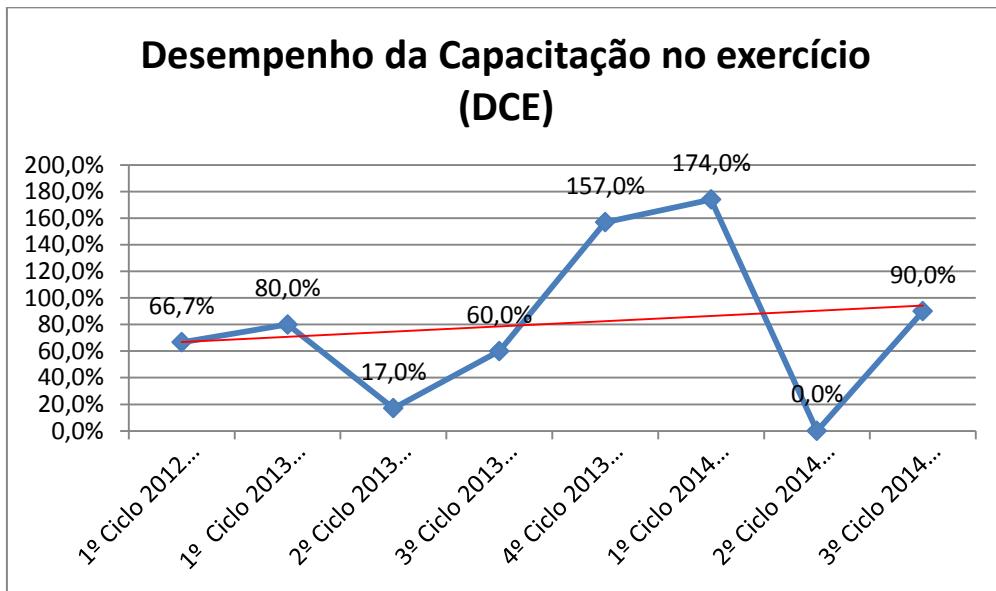

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.}}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} \times 100 = \frac{122.807,56}{500.000,00} \times 100 = 24,56\%$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2014

f) Comentários: O percentual de valor de investimento atingido até o presente Ciclo está inferior ao previsto, tendo em vista as capacitações realizadas com menor custo, em parceria com as Escolas de Governo.

g) Resultados Anteriores (NIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 27,8 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 8,49 % (2º Ciclo 2013)


Jan a ago/2013 = 29,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 37% (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 38,25% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

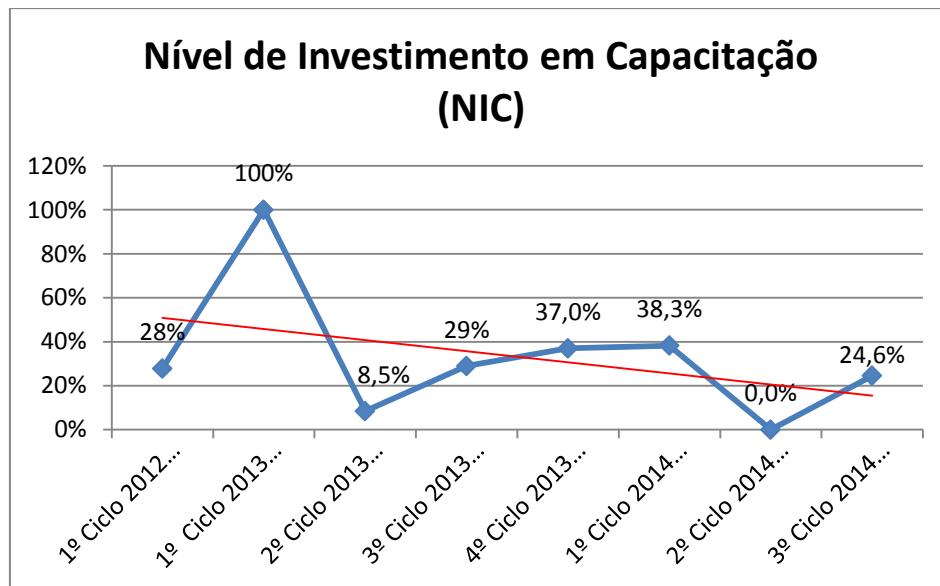

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{55\% + 18,4\% + 87\% + 22,14\%}{4} = 45,64\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 29/agosto/2014

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (55%); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (18,4%); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (87%); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (22,14%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 (4 projetos) = 33,9 % (resultado influenciado pelo detalhamento previsto desses projetos) (1º Ciclo 2013)

Até mai/2013 = 43,67% (2º Ciclo 2013)


Até ago/2013 = 61,7% (3º Ciclo 2013)

Até nov/2013 = 38,55% (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 41,63% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 43,99% (2º ciclo 2014)

i) Representação gráfica

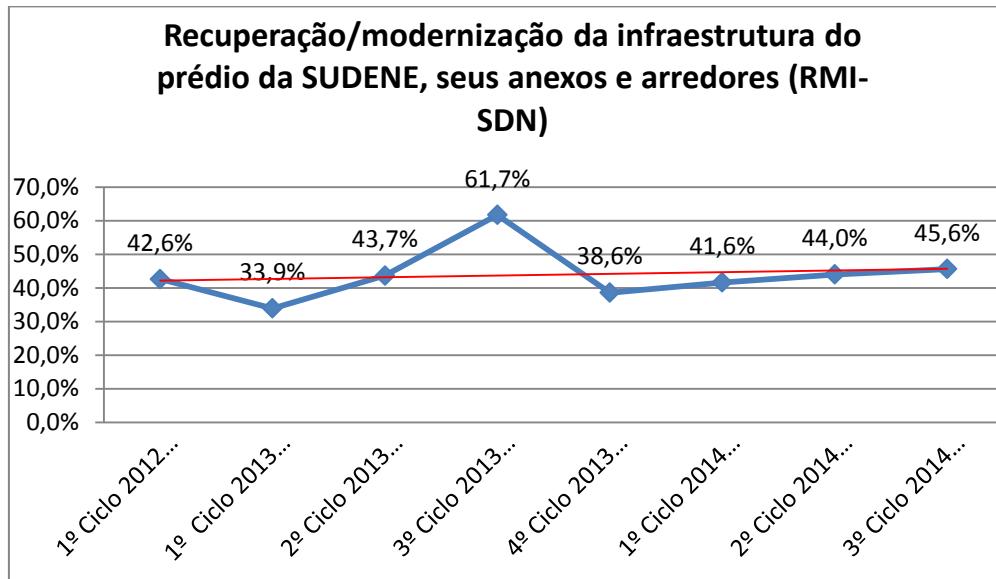

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é obtido do respectivo Plano Operativo interno.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos}}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}} \times 100 =$

$$\frac{(2.630.114,65+30.000,00+5.023.543,17+100.000,00)}{3.193.554,19+30.000,00+8.229.186,02+100.000,00} \times 100 = 67,37 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação das fundações do prédio sede, recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, sistema de combate a incêndio e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 29/agosto/2014

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 2.630.114,65 e novo limite autorizado acumulado=R\$ 3.193.554,19); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (aplicado acumulado de R\$ 30.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 30.000,00). f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 5.023.543,17 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.229.186,02); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 100.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 48,5 % (1º Ciclo 2013)

Mai/2013 = 60,4 % (2º ciclo 2013)

Ago/2013 = 42,6 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 73,92 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 53,56% (1º ciclo 2014)


Jan a mai/2014 = 67,37% (2º Ciclo 2014)

Notas:

1- os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

2- O percentual do 2º ciclo 2014 foi corrigido por que o limite financeiro dado pelo MI para a obra de modernização das subestações foi de R\$100.000,00 e não R\$ 2.940.394,45 como informado no ciclo anterior.

h) Representação gráfica:

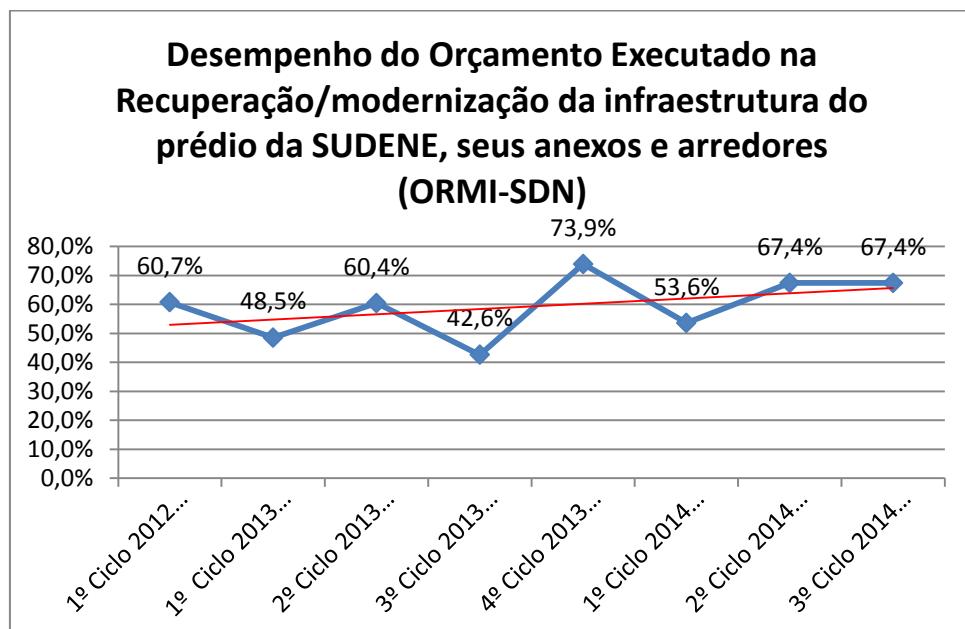

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 107, de 28/11/2013, alterado pela Portaria SUDENE nº 134, de 18/09/2014 (ADI)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc. executado das metas e dos projetos¹ =

$$\frac{82\% + 100\% + 79,5\% + 100\% + 73\% + 100\% + 87\% + 100\% + 100\% + 85\% + 78\%}{11}$$

$$= 89,5\%$$

b) Objetivo: Aferir o estágio de execução do conjunto dos projetos estratégicos escolhidos como metas para avaliação de desempenho institucional, cuja apuração final dar-se-á em 30/set/2014.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI).

Notas:

1-As fontes de dados são as detentoras de projetos inscritos na Portaria SUDENE nº 107, de 28/11/2013, alterada pela Portaria SUDENE nº 134, de 18/09/2014, adiante relacionadas: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN), da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN) e Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF/DFIN), ambas vinculadas à Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN); Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas (CGC/DAD), Coordenação de Serviços Gerais e Logística (CSG/DAD), Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DAD) vinculadas à Diretoria de Administração (DAD); e, Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

2-A Portaria SUDENE nº 134/2014 também supriu o projeto do Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, relacionado à Ações 8340-Rede Regional de Inovação (1 projeto) pois o Projeto de Inserção Tecnológica na Educação (PIT 3D) foi cancelado devido a cortes no orçamento; motivo semelhante que também atingiu o Objetivo Estratégico 1.1- Aumentar a Competitividade do Setor Produtivo, fortalecendo Cadeias e Arranjos Produtivos, Estimulando a Inovação, Articulando-os a Investimentos Estruturadores (2 projetos), pois o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro, não contou com limite orçamentário do MI e o da reorganização da Malha Aérea Regional, além disso, foi retirado por recomendação da Casa Civil, que passou a concentrar as articulações.

3-Também foram ajustadas as metas da CGC, que a pedido da unidade, passou a trabalhar com “2 projetos realizados” como meta, incorporando as oficinas previstas, haja vista as dificuldades criadas pelos estados para dar o apoio necessário à realização desses eventos.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 29/08/2014

f) Comentários: Os valores utilizados no cálculo foram obtidos da relação entre metas alcançadas e previstas, e dos percentuais físicos dos planos operativos (projetos) selecionados segundo programas e ações do PPA 2012-2015, e Diretrizes/Objetivos Estratégicos do planejamento estratégico da SUDENE, na data da aferição.

g) Quadro de metas e resultados alcançados:

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)	Percentual apontado pelo PO ou pela unidade administrativa	Status
2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração da unidade	Projeto implementado	1	DAD-PO 52 - Recuperação do anexo Nilo Coelho.	82%	Em Andamento
	4572- Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada	40	DAD/CRH-Auto-explicável (53 capacitações realizadas entre out/2013 e mar/2014)	100%	Concluído
	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos atendidos	341	DFIN/Incent Fiscais -Auto-explicável (271 pleitos atendidos)	79,5%	Em Andamento
	0355- Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	R\$ 2.000.000.000	DFIN/FDNE-Cálculo computado após aprovação do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE. Acréscimos a projetos em execução, desde que aprovados pelo mesmo colegiado, poderão ser computados como meta física. Até ago/2014=R\$ 2.807.476.612,52.	100%	Concluído
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918-Ampliação e fortalecimento das Estruturas Produtivas	Projeto	1	DPLAN/CGDS-PO 04- APL da ovinocaprinocultura - Capacitação de produtores familiares e fortalecimento das estruturas produtivas da caprinocultura e apicultura no estado de Pernambuco ou projeto novo.	73%	Em Andamento
	20N9-Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Projeto	1	DPLAN/CGDS-PO 01-Cadeia do mel - Capacitação de 140 apicultores em associativismo, cooperativismo e formação de redes de comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel - Chapada do Araripe ou projeto novo.	100%	Concluído
	8902-Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Projeto	1	DPLAN/CGDS- PO 05-Plano estratégico de consolidação dos eixos integrados de desenvolvimento do estado da Paraíba ou projeto novo.	87%	Em Andamento
	8689-Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Projeto	1	DPLAN/CGDS-PO 03- Zoneamento de áreas vulneráveis à desertificação do Estado de Pernambuco ou projeto novo.	Em análise pelo Diretor da DPLAN a manutenção no rol de metas	Em Andamento

	4640-Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Projeto	1	DPLAN/CGDS-PO 08-Capacitação de recursos humanos para a competitividade - mulheres na construção civil.	100%	Concluído
2068 - Saneamento Básico	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco (Água para Todos)	Famílias beneficiadas	4000	DPLAN/CGDS. Adotado o mesmo indicador em uso pelo MI. Até mar/14= 9.480 famílias. (se resultado for maior que 100%, será fixado em 100%)	Programa em revisão	Concluído
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.5-Fortalecer as administrações públicas	Projeto realizado	2	CGC-Projeto 1 - (PO 50) - Oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados no SICONV, bem como, orientações legais, da fase inicial, de celebração dos convênios na área de atuação da SUDENE (5 foram realizadas) (100%); e, Projeto 2 - (PO 51) - oficina para transmitir aos convenentes, orientações de acompanhamento, execução e prestação de contas dos convênios vigentes (1 realizada como previsto) (100%).	100%	Concluído
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	1	AGI- PO 47-Regimento interno da SUDENE.	85%	Em Andamento
	O3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planos aprovados	2	DAD/CSISR-(PO 58)-PETI (56%) e (PO 59)-PDTI (100%) aprovados pela Diretoria colegiada (RESULTADO DA MÉDIA=78%)	78%	Concluído
MÉDIA ARITMÉTICA					89,5 %	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

Observações:

1- Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.

2- Todos os dados informados são de responsabilidade dos gestores de cada projeto.

3-De acordo com o Decreto nº 7.133/2010, o percentual e 89,5% equivale a 71,6 pontos para fins de cálculo da parcela institucional das Gratificações GPGPE e GDACE.

Referência : 3º Ciclo 2014.

Convenções:


Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

h) Resultados anteriores:

Mar-2014 = 51 % (1º Ciclo 2014)

Mai-2014 = 69 % (2º Ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

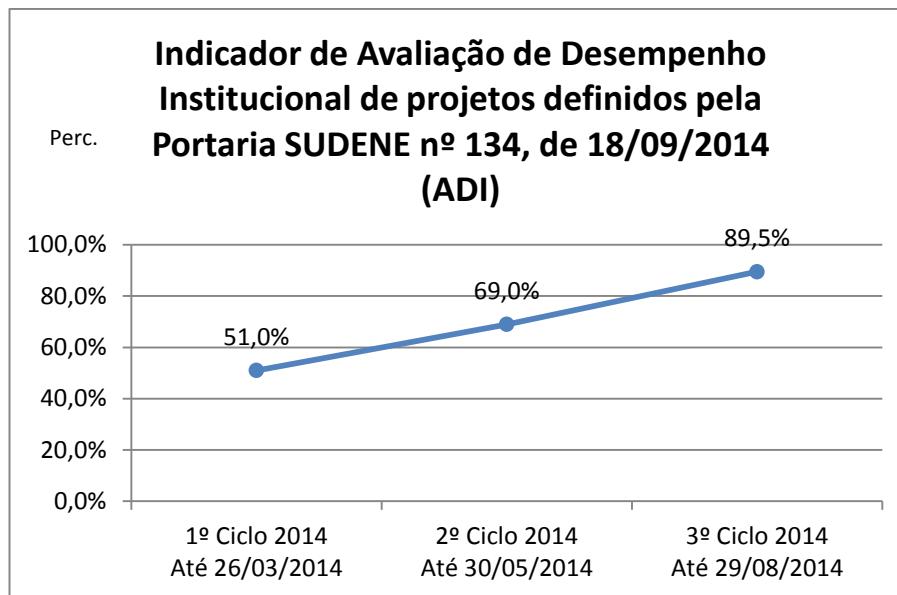

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas:

¹ Os projetos referenciados são os constantes de Planos Operativos internos que se utilizam de programas do PPA e das definições estratégicas da Superintendência da SUDENE, relacionadas no quadro acima, inclusive metas de investimento do FDNE.

- O percentual de 89,5%, convertido em pontos para fins de cálculo da parcela de desempenho institucional, cujo limite é de até 80 pontos, equivale a 71,6 pontos.

8 – Observações e Deliberações em plenária de 25/09/2014

As deliberações ou encaminhamentos foram postas na ordem de seu surgimento no debate, daí o sequenciamento das declarações vinculadas a POs.

- POs 16 a 18 - Superintendente José Márcio: A despeito da retirada dos projetos Malha Aérea Regional, Inserção Tecnológica na Educação (PIT 3D) e Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Competitividade (PPDTC), a serem retirados do processo ciclo de monitoramento por: posição de Casa Civil da Presidência da República no sentido de coordenar a discussão, pelas limitações orçamentárias em 2013 e 2014, e pela inexistência de orçamento em 2014, respectivamente, decidiu que a SUDENE continue perseguindo a retomada desses projetos da DPLAN, cancelados, e faça gestões, via MI, para que a SUDENE possa participar do processo de discussão do primeiro, e junto ao Congresso Nacional, para que os parlamentares possam viabilizar emendas ao orçamento destinadas a suprir as necessidades do PIT 3D e do PPDTC.

- Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Frederico Cavalcanti: A respeito da questão anterior, sugere retomar os acordos e discussões com os estados interessados no prosseguimento do apoio via PIT 3D, ancorado por uma nova estratégia e outra forma de execução. Quanto ao PPDTC sugere reduzir a abrangência e tentar fazê-lo no próximo ano.

- **Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Henrique Tinoco:** Ainda sobre o assunto sugere que a DPLAN faça um texto historiando todo o processo e um ofício sinalizando para os governadores os desdobramentos para o PIT 3D, bem como, as dificuldades verificadas, porém no contexto de uma nova estratégia, para oferecer uma posição clara e definitiva.

- **Superintendente José Márcio:** Pediu que a DPLAN inserisse o projeto do “Trem Turístico de Passageiros” no próximo ciclo de monitoramento.

- **PO 19** - Coordenador de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Lautemyr Canel – expôs sobre a avaliação de um projeto piloto atendendo determinação do TCU, em Acórdão exarado que estabelecia o cumprimento pela SUDENE, em ato vinculado ao Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, a cumprimento de atribuição de avaliar programas e projetos sob sua responsabilidade. Nesse sentido, o Coordenador expôs o andamento dos trabalhos, em fase de coleta de informações e revisão metodológica, recebendo do Superintendente a recomendação no sentido de apresentar esquema de trabalho à Diretoria Colegiada para deliberação haja vista que o prazo para isso se encerrará no dia 22/12/14, e muito ainda há que fazer.

- **POs 20 a 45** - Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Henrique Tinoco: tratando da quantidade de projetos na situação de atraso, em que pese alguns nessa condição estar concluídos, e que o problema adviria de posição do banco operador que não tem prazo legal para emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI), que a equipe da Coordenação-Geral de Fundos/DFIN providenciasse a atualização dessas datas com duas alternativas a considerar: dar por encerrada a parte da SUDENE, ou, como sugestão da CGGI, inserir como nova etapa, o “Atestado de Conclusão” dado pelo banco operador para aqueles casos de projetos concluídos, mas que dependam tão somente do CEI.

- **POs 01 a 14** - Coordenadora da CGDS, Maria Helena, observou a necessidade de alterar o peso percentual das etapas de “execução” e “encerramento” dos projetos com implantação por meio de convênios, por entender a sua equipe que ainda há uma desproporção no balanceamento dessa distribuição haja vista que o esforço maior é na execução. Sobre o assunto, o Diretor de Fundos e Incentivos, Henrique Tinoco, o Diretor de Planejamento, Sérgio Alencar, e o Senhor Superintendente, José Márcio, reiteraram o entendimento de que qualquer alteração nesse processo, ou ainda, o ingresso de um novo projeto ou alguma supressão, terá que se dar por meio de apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada da SUDENE, até por que, lembra o Diretor Henrique, os prazos, em alguns casos, são gerenciais, a exceção daqueles referentes a convênios, que seguem o que consta do plano de trabalho.

- **PO 58** - Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Henrique Tinoco: Após exposição do técnico Luiz Carlos (TI) sobre o projeto do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) recomendou que as discussões e desdobramentos sobre o PETI conte com a participação de outras unidades, pois ainda muito restrita.

- Por deliberação de ciclos passados, agora reiterado pela CGGI, faz necessário a apresentação e inserção, para o quarto ciclo de 2014, do Plano Operativos do projeto “Água Para Todos”, sob responsabilidade do Sr. Péricles Nunes, bem como a apresentação do projeto dos Seminários Continuados (Nordeste 2030), sob responsabilidade da Coordenadora Albertina (DPLAN) e da Coordenadora Anita Rozenblit (ASCOM).

9 – Conclusão

O 3º ciclo de monitoramento marcou a retomada dos eventos presenciais após o período de jogos da copa 2014, que dificultou a agenda de reuniões no mês de junho. Também consolida um modelo voltado para a melhoria da gestão por meio de discussões e negociações envolvendo a área técnica e a alta administração. Trata-se de um processo onde a participação é transparente e democrática, contribuindo para a redução do risco de insucesso dos projetos, na medida em que todos os aspectos que podem ser vislumbrados como problemas podem ser abertamente discutidos com a participação de membros da alta administração, e a busca de soluções é compartilhada por todos.

Neste ciclo a ênfase foi dada aos projetos que estavam na condição de “Atrasado” ou que estavam em “Em Andamento”, mas tinham alguma etapa naquela condição.

Nesse sentido, o destaque foram os projetos do FDNE cujo atraso se devia a cronograma não atualizado pelo agente operador, bem como, os que foram cancelados, aqui já mencionados.

Os Diretores de Gestão de Fundos (Henrique Tinoco) e de Planejamento (Sérgio Alencar), reiteraram preocupação quanto ao atraso na conclusão de alguns projetos de convênios, alguns de 2012, que recomendam um acompanhamento “mais de perto” sobre os executores.

O Superintendente José Márcio, ressaltou sua preocupação com a fragilidade de nossas fontes orçamentárias e sobre as providências que ensejarão articulação parlamentar no sentido de se buscar alternativas que não deixem a nossa execução orçamentária, principalmente a de 2015, tão a mercê de contingenciamentos.

Sobre os resultados da avaliação de desempenho institucional em particular, e com base nos resultados do 2º ciclo deste ano, a CGGI encaminhou recomendação lastreada em posicionamento técnico da DPLAN, que foi acatada e aprovada na 178ª reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 18 de setembro de 2014, no sentido de retirar do processo de avaliação institucional os projetos cancelados, e proceder ajustes que se fizeram necessários a partir do pressuposto de que não foram decorrentes de má gestão interna (§2º, art. 5º do Decreto n 7.133/2010), mas unicamente, de medidas adotadas por agentes externos que inviabilizaram a execução, ou adequação de projetos ou metas por razões semelhantes, mostrando a importância do monitoramento como efetiva ferramenta de controle e acompanhamento da execução.

Mais uma vez, e tendo por base o andamento de alguns projetos do Programa 2029- Desenvolvimento Regional, Territorial..., do PPA, registra-se a deficiência do planejamento por parte de entidades públicas detentoras de convênios com a SUDENE, e isso tem se demonstrado pelos inesperados atrasos em fases que envolvem licitação, situação que impacta o cronograma de execução do plano de trabalho, levando à necessidade de aditivações que normalmente não são tempestivamente apresentadas à Autarquia, refletindo isso no status do projeto no momento do monitoramento.

Também cabe reconhecer, em que pesem as mudanças positivas dos processos internos de controle, que algumas melhorias podem ser implementadas pelas próprias unidades, principalmente aquelas que levem à antecipação de medidas para redução de riscos, tanto para contratos como para convênios, e capacitação no tema “administração de riscos” parece ser pertinente para a Autarquia.

A data do 4º ciclo está definida conforme calendário adiante, lembrando que a data de referência para os dados é a mesma para atualização dos indicadores. Significa isso que os indicadores, cujo cálculo é cumulativo, deverão ser atualizados sempre de janeiro até a data de entrega dos dados.

Agenda de Encaminhamentos do 4º Ciclo de 2014

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
4º	28/11/14	05/12/14	18/12/14

Fonte: CGGI/SUDENE

Para 2015, a agenda é a seguinte:

Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos de Monitoramento da SUDENE no Exercício de 2015

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	13/03/15	20/03/15	02/04/15
2º	29/05/15	05/06/15	18/06/15
3º	28/08/15	04/09/15	25/09/15
4º	27/11/15	04/12/15	17/12/15

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 01
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturantes nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Finalidade da ação:	Apoiar a organização social de atores, visando à gestão compartilhada do desenvolvimento, estimulando a sinergia de ações, o comprometimento e a capacidade de identificação e o encaminhamento de demandas, por meio da formação de capital social, ...; ampliar a viabilidade e a sustentabilidade das atividades produtivas, fortalecendo o associativismo e (ou) o cooperativismo como opções de organização social e produtiva. Ampliar as oportunidades de acesso ao mercado e ao desenvolvimento do APL em que as cooperativas e associações estão envolvidas.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Organização social, frágil; Mercado restrito.				
Projeto:	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.				
Objetivo do projeto:	Fortalecer a organização social, criar uma rede de comunicação entre as associações de Apicultores dos munic. principais produtores Cadeia do Mel -Meso do Araripe, visando para ampliar oportunidades de inserção produtiva.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor	Valor Total	Cronograma de Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				SUDENE no Projeto (R\$)	do Projeto (R\$ 1,00)		
		250	GND 3	30	126.368,00	133.269,00	Pago até o ano anterior R\$ 115.800,00
Previsão de Conclusão:	18/02/2014	CONVÉNIO Nº 771203/2012 (Proposta SICONV 027116/2012)				74.838,00	A realizar no exercício (RAP 2012) R\$ -
Data Atualização:	29/08/2014					40.962,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Maria do Socorro Vilar - SUDENE / Gieldson Alves e Paulo da Fonte - CONDEPE/FIDEM					Cancelado 690,00	Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						115.800,00	Valor liberado no Exercício (2014) R\$ -
						6.901,00	Saldo a liberar (2014) R\$ -
						-	Saldo a Empenhar no exercício (2014) R\$ -
							Total Liberado até o exercício (2014) R\$ 115.800,00

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas									
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor												
INICIAÇÃO (Peso 20%)																				
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	03/04/2012		20/03/2012	03/04/2012		100%	Concluído										
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	05/04/2012	19/04/2012		05/04/2012	19/04/2012		100%	Concluído										
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído										
4	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS - ASCOM	10/05/2012	14/05/2012		10/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído										
5	Divulgação Chamamento - Prorrogação	CGDS/SUDENE	25/05/2012	31/05/2012		25/05/2012	31/05/2012		100%	Concluído										
6	Análise técnica	CGDS/SUDENE	01/06/2012	15/06/2012		01/06/2012	15/06/2012		100%	Concluído										
7	Resultado do Chamamento - prorrogação	CGDS - ASCOM	19/06/2012	29/06/2012		19/06/2012	29/06/2012		100%	Concluído										
8	Análise técnica e parecer	CGDS/SUDENE	Não informado	07/07/2012	Não informado	29/06/2012			100%	Concluído										
9	Etapas de formalização do convênio	CGC - COCF - PRD																		
10	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado	Não informado	18/10/2012			100%	Concluído										
11	Publicação do convênio	CGC/SUDENE																		
EXECUÇÃO (Peso 60%)																				
* Liberação da primeira parcela de recursos																				
12	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	Não informado	30/08/2013		16/06/2013	16/08/2013		100%	Concluído										
13	Meta 1 - Capacitar 140 Apicultores em Associativismo e Cooperativismo (R\$ 79.324,00)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	01/09/2013	15/10/2013		02/09/2013	29/10/2013		100%	Concluído	Previsão de início e término reprogramada em razão do ajuste no plano de trabalho, após 2º TA, de prazo, assinado em 16/08/2013, publicado em 19/08/2013. Processo licitatório concluído. Empresa para prestação de serviços técnicos, contratada. Reunião de planejamento realizada - atividades reprogramadas.									

13.1	Etapa 1.1 – Mobilização Social	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	02/09/2013	06/09/2013		02/09/2013	06/09/2013		100%	Concluído		
13.2	Etapa 1.2 – Realizar 7 oficinas (Associativismo / Cooperativismo) p/ 140 Apicultores associados = 20 associados x 7 associações	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	11/10/2013	22/10/2013		13/10/2013	22/10/2013		100%	Concluído		
	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/10/2013	22/10/2013		15/10/2013	18/10/2013		100%	Concluído		
14	Meta 2 - Capacitar 140 Apicultores em Formação de Redes de Comunicação (R\$ 42.687,00)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	16/10/2013	30/11/2013		11/10/2013	18/10/2013		100%	Concluído		
14.1	Etapa 2.1 – Realizar 07 oficinas sobre Formação de Redes de Comunicação	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	16/10/2013	30/11/2013		11/10/2013	18/10/2013		100%	Concluído	Verificou-se no acompanhamento que a oficina de IPUBI não ocorreu (uma apicultrora, associada, foi morta no 1º dia do evento).	
	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	1º/11/2013	30/11/2013	40.962,00	21/11/2013	21/11/2013	40.962,00	100%	Concluído		
	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	11/11/2013	20/11/2013		18/11/2013	20/11/2013		100%	Concluído		
15	Meta 3 - Realizar 1 Seminário Temático sobre Formação de Redes de Comunicação p/140 Apicultores (R\$ 11.258,00)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	01/12/2013	18/02/2014			07/12/2013		100%	Concluído		
15.1	Etapa 3.1 - Realizar seminário temático; diagnóstico - potencialidades/desafios com vistas a construção de uma Rede de comunicação (Plano)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	01/12/2013	18/02/2014		07/12/2013	18/02/2014		100%	Concluído		
	* Liberação da terceira parcela de recursos	SUDENE	1º/12/2013	30/12/2013	10.568,00				-	Cancelado	Foi solicitado pela Convenente o cancelamento da liberação da 3ª parcela (Ofício CONDEPE / FIDEM Nº 008/2014 - DEAG), devido a existência de saldo suficiente para o pagamento do contrato executado.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)							20,0%		Concluído	Prazo de vigência expirado em 18/2/2014, em fase de prestação de contas. Solicitada pelo convenente e acatada pela SUDENE alteração/adaptação do plano de trabalho, por razões de ordem operacional (Plano de trabalho - Plano de aplicação detalhado), que impossibilitavam a prestação de contas.	
16	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	19/02/2014	18/04/2014		14/02/2014	22/05/2014		100%	Concluído	Foram analisados e aprovados os Relatórios de Execução, referentes aos aspectos técnicos e emitido o Parecer Técnico final.	
17	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGC/DAD/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Relatórios Financeiros analisados e aprovados.	
			Valor Previsto:	126.368,00		Valor realizado:	115.800,00	100,0%		Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

Datas de início e conclusão das metas do projeto ajustadas conforme 2º TA, datado de 16/08/2013, publicado em 19/08/2013.

3º Ciclo 2014.

Obs 1. Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 006/2012 / Programa: 5320320120015. Enviada para análise em 31/05/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 29/06/2012, seguindo nessa data p/ CGC/DAD. Retornou à CGDS em meados de julho para indicação dos técnicos responsáveis, devolvido no dia seguinte c/ Mem. informando responsáveis.(...) Data de assinatura: 18/10/2012. Publicação DOU: 30/10/2012. Depósito da contrapartida realizado em 29/11/2012. Liberação da 1ª parcela: 14/12/2012, após novo ajuste do PT. Solicitado, analisado e aprovado aditamento da vigência do convênio, para recomposição de prazo; cf. 1 TA, de 18/03/2013, vigência prorrogada até 18/08/2013. Recomposição do prazo para 18/02/2014, conforme 2º TA. Procedidos ajustes no Plano de Trabalho.

Obs 2. O convênio teve sua execução física concluída dentro do prazo de vigência, encerrado em 18/02/14.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				SUDENE no Projeto (R\$		CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
				100	234.105,49	139.865,15	7.361,32	mai/12	147.226,47		139.865,15
					94.240,34	94.240,34	4960,01	jun/12	99.200,35	A realizar no exercício (2014) RAP 2012	R\$ 94.240,34
					234.105,49	234.105,49	12.321,33	-	246.426,82	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:	06/02/2015	CONVÉNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)				Valor Empenhado no Exercício				R\$ -	
Data Atualização:	29/08/2014	Vigência: 18/12/12 a 06/02/2015				Valor liberado no Exercício				R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Glielson Alves da Silva - CONDEPE/FIDEM					Saldo a liberar				R\$ 94.240,34	
						Saldo a Empenhar no exercício				R\$ -	
						Total Liberado até o exercício				R\$ 139.865,15	

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)										
1 Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
3 Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído	
4 Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído	
5 Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100%	Concluído	
6 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído	
7 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)										
Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2012	31/12/2012	139.865,15	17/04/2013	01/08/2013	139.865,15	100%	Concluído	
8 Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/04/2013	14/10/2013		100%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.
9.1 Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	01/12/2013	06/02/2015		01/12/2013			36%	Em Andamento	
9.2 Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	01/12/2013	14/01/2014		01/12/2013	14/03/2014		100%	Concluído	
9.3 Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	03/01/2014	31/01/2014		23/01/2014	23/01/2014		100%	Concluído	
9.4 Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir		14/03/2014			85%	Em Andamento	Termo aditivo assinado/Ajuste do Plano de Trabalho concluído
9.5 Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2014	01/10/2014	94.240,34				0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.
9.6 Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	05/03/2014	05/11/2014					0%	A Iniciar	Reaplicação de etapas, em razão da liberação da 2ª parcela antes da realização da visita técnica.
										Reaplicação de data

9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	06/05/2014	06/01/2015					0%	A Iniciar	Datas repactuadas	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	As datas para emissão de parecer dependem da finalização do projeto	
11	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	234.105,49	Valor realizado:	139.865,15	67,13%		Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

3º Ciclo - 2014. Alterações realizadas na etapa 9.3.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 03
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do	Cronograma de Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				no Projeto (R\$ 1,00)	Projeto (R\$ 1,00)		
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00	CONCEDENTE CONVENENTE MÊS TOTAL	Pago até o ano anterior R\$ 265.241,25
Previsão de Conclusão:	31/12/2014	CONVÉNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)				265.241,25 58.942,50 DEZ/2012 324.183,75	A realizar no exercício (RAP 2012) R\$ 265.241,25
Data Atualização:	29/08/2014					265.241,25 -- MAIO/2013 265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Ferreira da Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE					Valor Empenhado no Exercício R\$ -
	Conveniente	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE					Valor liberado no Exercício R\$ -
							Saldo a liberar R\$ 265.241,25
							Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
							Total Liberado até o exercício R\$ 265.241,25

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100%	Concluído	
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído	
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100%	Concluído	
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído	
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	265.241,25	100%	Concluído	
6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado		--	50%	Em Andamento	Consta no SICONV, até o momento, informações relativas apenas à contratação dos serviços de aluguel de veículos e aquisição de combustível.

7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco (R\$ 356.560,00)	SEMAS/PE	01/07/2014	31/12/2014					0%	A Iniciar	
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano (R\$ 146.400,00)	SEMAS/PE	01/07/2014	31/10/2014					0%	A Iniciar	
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/09/2014	30/09/2014	265.241,25				0%	A Iniciar	
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto (R\$ 176.960,00)	SEMAS/PE	01/11/2014	09/12/2014					0%	A Iniciar	Foram realizados ajustes dos períodos de execução das Metas/ Etapas em virtude do Primeiro Termo Aditivo, que concedeu ampliação do prazo de vigência para 31/12/2014. Foi informado pela Convenente que o início da realização dos Encontros estará acontecendo em meados de Setembro/2014.
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da C34 Desertificação na Região Nordeste (R\$ 33.200,00)	SEMAS/PE	10/12/2014	31/12/2014					0%	A Iniciar	
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco (R\$ 232.865,00)	SEMAS/PE	01/05/2014	31/12/2014					0%	A Iniciar	
8.1	META 2/ETAPA1 – Realizar a identificação, caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas (R\$ 182.865,00)	SEMAS/PE	01/05/2014	31/12/2014					0%	A Iniciar	
8.2	META2/ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas (R\$ 50.000,00)	SEMAS/PE	15/11/2014	31/12/2014					0%	A Iniciar	
***	Visita para emissão de Laudo/Parecer Técnico Final	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/01/2015	01/03/2015					0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:	530.482,50	Valor realizado:	265.241,25	38,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

3º Ciclo 2014

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 04				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária					Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria				
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas					Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.				
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.										
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas					Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS				
Dirutor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães					Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto				
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.										
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.										
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		100/250	GND 3 e 4	30	694.459,19	771.621,32					
Previsão de Conclusão:	30/12/2014	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)					CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	
Data Atualização:	29/08/2014						419.104,63	77.162,13	dez/12	496.266,76	
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Marcelo de Castro Viana, Victor Uchôa Ferreira da Silva e Marcelo Saiki Braga - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo					137.677,28	--	jan/13	137.677,28	Pago até o ano anterior	R\$ 419.104,63
						137.677,28	--	abr/13	137.677,28	A realizar no exercício (2014)	R\$ 275.354,56
						694.459,19	77.162,13	-	771.621,32	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ 137.677,28
										Saldo a liberar (2014)	R\$ 137.677,28
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 556.781,91

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							20,0%	Concluído	
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não Informado	10/05/2012		Não Informado	10/05/2012		100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								52,7%	Em Andamento	
8	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE	18/06/2013	02/07/2013		23/07/2013	28/08/2013		100%	Concluído	
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/10/2012	Não Informado	419.104,63	23/11/2012	12/12/2012	419.104,63	100%	Concluído	
9	Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		25/11/2013			87%	Em Andamento	Realizados 35 cursos de ovinocaprinocultura, 87% do previsto.
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		13/01/2014			91%	Em Andamento	Realizados 11 cursos de apicultura, 91% do programado.
	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	Não Informado		28/01/2014	06/02/2014		100%	Concluído	A viagem de supervisão foi realizada no período de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	137.677,28	09/04/2104	19/05/2014	137.677,28	100%	Concluído	No mês de junho será dada continuidade das capacitações.

11	Adquirir 540 colméias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014			07/08/2014	22/08/2014		100%	Concluído	A viagem de supervisão foi realizada no período de 07 a 08/08/2014 e 20 a 22/08/2014, na área de atuação do Projeto	
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/11/2014	137.677,28				0%	A Iniciar		
13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrifuga extratora de mel, Mesa	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob aspecto físico e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/SUDENE	18/08/14	02/01/2015					0%	A Iniciar		Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
15	Análise da PTC, sob aspecto financeiro final.	CGC/SUDENE	18/08/14	02/01/2015					0%	A Iniciar		Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
			Valor Previsto:		694.459,19	Valor realizado:		556.781,91	72,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:

Em 16/06/2014 foi assinado o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 30/12/2014

3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconómicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	1.794.595,93	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$	-
	250 e 100	3330.41	30	R\$ 1.794.595,93	2.000.000,00	732.887,59	79.238,97	nov/12	812.126,56		Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
Previsão de Conclusão:	29/08/2014	CONVÉNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)				527.102,12	67.204,78	nov/13	594.306,90		Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Data Atualização:	29/08/2014			534.606,22	58.960,32	dez/13	593.566,54				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$	-
				1.794.595,93	205.404,07	-	2.000.000,00				Saldo a liberar	R\$	-
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
											Total Liberado até o exercício	R\$	1.794.595,93

Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel de Sá Jardim Neto - SUDENE / Gustavo Nogueira e Luiz Carlos Soares - SEPLAG-PB
-----------------------------	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor (SUDENE)	Inicio	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	14/12/2012	18/12/2012		14/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	02/01/2013		18/12/2012	02/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							60,0%	Concluído	O convênio foi prorrogado "de ofício" após a data de referência do PO para 28/05/14.		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	732.887,59	01/11/2012	30/11/2012	732.887,59	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/2013	25/07/2013		100%	Concluído	Edital da licitação (nº 001/2013) registrado na CGE-Controladoria Geral do Estado, sob nº 13-00476-0 e publicado em 23/04/2013, nos jornais de grande circulação e diários oficiais. Contrato com a empresa vencedora assinado em 25/07/13, mas só registrado no SICONV após formalização do 2º Termo Aditivo.	
9	Meta I: Estruturação do Plano Estratégico da Micrológistica do Transporte de Cargas do Estado da Paraíba (R\$ 274.617,39)	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
9.1	Diagnóstico das cadeias produtivas paraibanas	SEPLAG/PB	01/08/2013	27/09/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.2	Diagnóstico da infra-estrutura da logística do transporte de cargas do estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	11/10/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.3	Priorização dos Projetos Estratégicos Micrológisticos para o estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.4	Relatório Intermediário do Plano de Micrológistica do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	08/11/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		

	Liberação da 2ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2013	30/11/2013	527.102,12	25/11/2013	02/12/2013	527.102,12	100%	Concluido		
9.5	Relatório Final do Plano de Micrológistica do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
10	Meta II: Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial do Estado da Paraíba (R\$ 463.979,98)	SEPLAG/PB	30/08/2013	28/01/2014		30/08/2013	11/02/2014		100%	Concluido		
10.1	Avaliação do Potencial Econômico das Cadeias Produtivas	SEPLAG/PB	30/08/2013	18/10/2013		30/08/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.2	Estudo de Mercado dos Produtos Priorizados	SEPLAG/PB	13/09/2013	08/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.3	Priorização dos cinco Produtos-Chaves	SEPLAG/PB	01/11/2013	22/11/2013		01/11/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.4	Elaboração de um Plano de Implementação	SEPLAG/PB	22/11/2013	06/12/2013		22/11/2013	11/02/2014		100%	Concluido		
10.5	Relatório Intermediário do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	22/11/2013		01/08/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.6	Relatório Final do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	11/02/2014		100%	Concluido		
11	Meta III: Plano Estratégico de Energia do Estado da Paraíba (R\$ 298.553,40)	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
11.1	Avaliação da Situação Atual do Suprimento e Distribuição de Energia da Paraíba	SEPLAG/PB	13/09/2013	25/10/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
11.2	Avaliação das necessidades energéticas da Paraíba	SEPLAG/PB	11/10/2013	08/11/2013		11/10/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
11.3	Avaliação dos "gaps" e priorização dos investimentos em energia na Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	22/11/2013		25/10/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
11.4	Realização de 2ª visita técnica de acompanhamento	CGDS/SEPLAG	12/12/2013	12/12/2013		12/12/2013	12/12/2013		100%	Concluido		
11.5	Relatório Intermediário de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	22/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
	Liberação da 3ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2013	31/12/2013	534.606,22	19/12/2013	30/12/2013	534.606,22	100%	Concluido		
11.6	Relatório Final de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12	Meta IV: Plano Estratégico de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação (R\$ 380.603,91)	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
12.1	Verificar estado atual de TIC do Estado da Paraíba e estimar oferta de serviços.	SEPLAG/PB	27/09/2013	18/10/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.2	Identificar prioridades e demandas do plano de desenvolvimento industrial e logístico e mapear necessidades futuras de TIC.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.3	Explicitar lacunas entre necessidades projetadas e oferta planejada.	SEPLAG/PB	11/10/2013	15/11/2013		11/10/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.4	Identificar alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de uma infraestrutura de TI.	SEPLAG/PB	08/11/2013	22/11/2013		08/11/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.5	Desenvolver e priorizar iniciativas para atender à demanda por serviços.		15/11/2013	29/11/2013		15/11/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.6	Consolidar o Plano de TIC.	SEPLAG/PB	22/11/2013	20/12/2013		22/11/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.7	Relatório Intermediário do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	20/12/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.8	Relatório Final do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13	Meta V: Plano Estratégico de Capacitação do Capital Humano para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba(R\$ 376.841,25)	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluido		
13.1	Mapear a demanda de recursos humanos, por tipo de capacitação profissional, visando o crescimento e investimentos do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13.2	Projetar atual oferta de mão-de-obra no estado.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13.3	Definir ajustes na oferta de capacitação de mão-de-obra visando o crescimento do estado.	SEPLAG/PB	29/11/2013	13/12/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13.4	Dimensionar investimentos necessários para formação profissional.	SEPLAG/PB	13/12/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13.5	Consolidar o Plano de Capacitação do Capital Humano do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	20/12/2013	28/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13.6	Relatório Intermediário do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13.7	Relatório Final do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluido		
14	Relatório Final consolidado do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/04/2014		01/08/2013	18/02/2014		100%	Concluido		

15	Finalização do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	18/02/2014	28/05/2014					100%	Concluído	A SEPLAG formalizará solicitação de utilização dos recursos oriundos dos rendimentos de aplicação a serem aplicados em atividades de desdobramento do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								6,8%	Em Andamento		
16	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/05/2014	29/08/2014					68%	Em Andamento	Relatórios de execução (técnico) aprovados, à emitir o laudo técnico.	
16.1	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGDS/SUDENE	29/05/2014	29/08/2014					0%	Em Andamento	Não informado em razão de não ser de responsabilidade desta unidade.	
			Valor Previsto:	1.794.595,93	Valor realizado:	1.794.595,93	86,8%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba (CNPJ: 08761124000100)

Observações:

2º Termo Aditivo foi solicitado pelo conveniente por meio do SICONV em 12/08/13, sendo publicado em 01/11/13.

Em 18/02/2014 a equipe técnica participou de um Seminário em João Pessoa/PB com o Governador do Estado, Secretário de Planejamento e Gestão, Gestores e Técnicos do Governo do Estado, Universidades Federal e Estadual, Parlamentares etc, onde foram apresentados Plano Estratégico da Paraíba, relativo aos resultados do Projeto "Eixos Integrados de Desenvolvimento da Paraíba – uma visão estratégica para o Estado.

3º Ciclo 2014 - Repactuada a etapa 16

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Diretor:	Henrique Tinoco (interino)		
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Crono Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros		
						CONCEDENTE CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior (2013)
	250	GND 3	30	825.379,68	280.000,00 8.400,00	288.400,00	R\$ 540.000,00	
					260.000,00 8.400,00	268.400,00	R\$ 260.000,00	
					260.000,00 8579,68	268.400,00	Orgânto Autorizado no exercício	R\$ -
					800.000,00 25.379,68	825.379,68	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
							Valor liberado no Exercício	R\$ 260.000,00
							Saldo a liberar	R\$ -
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
							Total Liberado até o exercício	R\$ 800.000,00

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2012	13/06/2012		13/06/2012	13/06/2012		100%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/06/2012	16/06/2012		15/06/2012	16/06/2012		100%	Concluído	
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	20/06/2012	21/06/2012		20/06/2012	21/06/2012		100%	Concluído	
4	Emissão de Parecer	CGDS/SUDENE	21/06/2012	28/06/2012		22/06/2012	28/06/2012		100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	28/06/2012	23/08/2012		29/06/2012	23/08/2012		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	24/08/2012	24/08/2012		24/08/2012	24/08/2012		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
8	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2012	01/09/2012	280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 1ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.
9	Meta 1	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013		100%	Concluído	Houve atraso devido recurso judicial contra procedimento licitatório
9.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído	
9.2	Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apiloadoo.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído	
9.3	Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para execução das	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/08/2013	30/09/2013		100%	Concluído	
9.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/06/2013	03/07/2013		27/03/2013	30/03/2013		100%	Concluído	
10	Meta 2	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	30/09/2014		01/09/2013			98%	Em Andamento	

10.1	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2013	30/09/2013	260.000,00	14/11/2013	14/11/2013	260.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 2ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Solicitada prorrogação de ofício, por mais 73 dias, alterando a data de conclusão para 12/06/2014
10.2	Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	01/08/2013		01/09/2013	28/02/2014		100%	Concluído		
10.3	Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	09/12/2013	30/09/2014		01/12/2013			90%	Em andamento		
10.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/09/2013	02/10/2013		05/12/2013	08/12/2013		100%	Concluído		
10.5	Liberação da 3ª parcela	COFC /CGAF / DAD	27/12/2013	27/12/2013	260.000,00	06/04/2014	06/04/2014	260.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 3ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi solicitado termo aditivo ao convênio pelo coveniente, por mais 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014
10.6	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/02/2014	17/02/2014		10/04/2014	17/04/2014		100%	Concluído		
11	Meta 3		01/10/2014	12/10/2014					0%	A Iniciar		
11.1	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2014	12/10/2014					0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)												
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final		19/10/2014	11/12/2014					0%	A Iniciar	O prazo para análise da PTC é de 60 dias após o encerramento do convênio	
Valor Previsto:				800.000,00	Valor realizado:				800.000,00	65%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen. Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12. Informações referentes à data de 19/04/2013:

(2) Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Este atraso inicial repercutiu em todo o processo, gerando retardo nas demais etapas.

(3) Foi concluído o processo licitatório e homologada e empresa vencedora da licitação. Conforme informação do engenheiro civil responsável pelos projetos e acompanhamento de fiscalização da obra de construção da ponte de concreto armado no município de Ruy Barbosa/RN, a empresa vencedora já está informada referentes à data de 29/11/2013:

(4) No 4º ciclo 2013 foi apresentada alteração na etapa 1 da meta 2.

(5) No 1º ciclo 2014 estavam concluídas a concretagem de pilares, longarinas e transversinas que compõem a estrutura de sustentação da ponte, restando a laje de concreto armado de piso, guarda-rodas e muro de proteção nas laterais da ponte. Foi concluído o muro de arrimo de proteção, constituindo-se de alvenaria de pedra argamassada, marroada, rejuntada com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4

(6) Na avaliação feita quando do 3º ciclo 2014 constava como concretada a laje de piso da ponte em concreto armado com concreto fck = 45 Mpa e espessura de 30 cm, de acordo com o projeto estrutural. Havia sido solicitadas amostras ensaiadas para controle do fck do concreto.

(7) O coveniente se comprometeu a liberar as contrapartidas em três parcelas, como segue: 1ª parcela: Out/2012 - 2ª parcela: Set/2013 - 3ª parcela: Abr/2014

(8) Em 28/08/2014, o EngºCivil Givanildo Ramos de Souza foi incorporado ao processo como responsável técnico auxiliar.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria			
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.			
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS			
Dirutor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto			
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.					
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas					
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	9.452.840,00	9.452.840,00	
Previsão de Conclusão:	30/12/2014					
Data Atualização:	29/08/2014					
Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT . Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100%	Concluído	
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100%	Concluído	
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013		100%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2013 ano base 2012(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais; Participação em Oficina de Trabalho "Balanços Energéticos Estaduais" na EPE em 27 e 28/11/2013	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	30/11/2014	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético - Repactuação de datas: Em análise Propostas/Plano de Trabalho para elaboração de balanços energéticos dos estados da PB e SE. Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais maio/2014. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético.
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	30/12/2015		19/06/2013			70%	Em Andamento	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região Previsto para o orçamento 2014(R\$ 5.000.000,00) ACT aprovado pela Diretoria Colegiada, encaminhado para alterações na minuta à CGC e posterior chancela da PRD e em seguida a formalização.
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2014, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2015/2016, com prazo previsto para até 30/11/2014.	SUDENE	24/05/13	30/11/14	R\$ 100.000,00				50%	Em Andamento	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa. Repactuação de datas - para novembro de 2014 Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Em processo de organização.

Valor Previsto: R\$ 4.452.840,00 Valor realizado: R\$ 352.840,00 85,0% Em Andamento Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs. 3º Ciclo 2014 - Repactuadas as Atividades/Etapas 6, 7 e 8

Os recursos previstos nas Etapas 5, 6 e 7, são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.		
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Cooperação		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	IFPB	agosto	única	1.018.500,00	Pago até o ano anterior	R\$ 465.202,30
	100/250	GND 3	30	1.018.500,00	1.018.500,00							A realizar no exercício (2014)	R\$ 553.297,70
Previsão de Conclusão:	13/06/2014											Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Data Atualização:	29/08/2014											Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Edson Iaranjeiras, Macira Sotero e Vinícius Medeiros (SUDENE/CGDS)										Valor liberado no Exercício	R\$ -
	Convenente	Prof.ª Vania Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB).										Saldo a liberar	R\$ 553.297,70
												Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
												Total Liberado até o exercício	R\$ 465.202,30

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	IFPB				2012	08/05/2013		100%	Concluído	Era 22/03/13, foi realizada reunião na SUDENE para apresentar a proposta de projeto Mulheres na Construção - segundo modelo implantado pela SUDECOP - para o IFRN e o IFPE. Na ocasião, o IFPB apresentou o projeto elaborado em 2012 a ser executado em 2013-2014.	
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE				02/05/2013	07/05/2013		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto a SUDENE	IFPB				08/05/2013	23/05/2013		100%	Concluído		
4	Formalização do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE				09/05/2013	05/08/2013		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE				15/05/2013	15/05/2013		100%	Concluído	Ata n.º 138 da Diretoria Colegiada	
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE				13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído	Assinado em 13/06/13.	
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE				13/06/2013	05/08/2013		100%	Concluído	Publicado no DOU em 05/08/13.	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		Continuidade das ações do projeto previsto no Termo de Execução Descentralizada para o exercício de 2014.
	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	01/05/2013	01/06/2013	R\$ 1.018.500,00	23/05/2013	21/08/2013	R\$ 465.202,30	100%	Concluído	Do montante descentralizado no valor de R\$ 1.018.500,20 dos quais R\$ 469.472,00 para investimento e R\$ 549.028,20 para custeio, foram devolvidos os valores R\$ 41.865,00 – Investimento – e R\$ 511.432,90 – custeio. Estes valores totalizam R\$ 553.297,90 e o IFPB recebeu pelo montante empenhado: R\$ 37.595,30 para as despesas correntes e R\$ 427.607,00 para as despesas de capital, perfazendo um total de R\$ 465.202,30 para as despesas no ano de 2013.	

8	Capacitação de 320 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 16 turmas de 20 alunos.	IFPB	13/06/2013	31/12/2013	*			*	-	Cancelado	Por conta da data de disponibilidade do recurso para o IFPB, agosto de 2013, ficou inviável o empenho de recursos para a licitação do corpo docente, início e término dos cursos ainda no ano de 2013. A experiência com a execução de cursos de curta duração, tem demonstrado que na interrupção de cursos sem data prevista para o reinício ocorre, geralmente, grande evasão o que comprometeria o objetivo de qualificar as 320 mulheres na área de construção civil.	Ínicio das aulas em Maio 2014
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído		
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído		
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014	--	100%	Concluído		
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/10/2013	08/11/2013	--	100%	Concluído		
8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013		01/11/2013	30/12/2013	--	100%	Concluído		
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	26/12/2013	--	-	Cancelado	Apesar de ter se procedido ao processo de pregão para aquisição de material de consumo, a empresa vencedora apresentou problemas com a documentação, não sendo possível o empenho do referido material. Não havia tempo hábil para a segunda vencedora, considerando o limite de prazo, 31 de dezembro de 2013. Quanto a aquisição do laboratório móvel a empresa que ganhou a licitação está atrasada com o prazo de entrega e o IFPB abriu processo para a apuração dos fatos, conforme explicado no memorando nº 96/2014/DAMRP/IFPB.	
8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico; Curso de Pintura de Obras; Curso Auxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	01/08/2013	31/10/2013					-	Cancelado	Continuidade das ações do projeto previsto no Termo de Execução Descentralizada para o exercício de 2014.	
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	01/11/2013	31/12/2013					-	Cancelado	Continuidade das ações do projeto previsto no Termo de Execução Descentralizada para o exercício de 2014.	
9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	12/06/2013	13/06/2014		31/01/2014	31/07/2014		100%	Concluído	O conveniente apresentou problemas no processo de licitação dos serviços e produtos, comprometendo a execução das ações. Todavia, as metas não concluídas serão executadas no TED ano 2014.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)												
10	Relatório Final de Acompanhamento Técnico do Projeto	CGDS/SUDENE				11.08.2014	20.08.2014		100%	Concluído	O IFPB enviou relatório de execução das atividades do ano de 2013. Os técnicos/CGDS responsáveis pelo projeto analisaram o relatório e elaboraram o Parecer Técnico de Encerramento do TC.	
				Valor Previsto:	R\$ 1.018.500,00	Valor realizado:	R\$ 465.202,30	100,0%		Concluído	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

IFPB

Observações:

3º Ciclo 2014.

O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível concluir-lo em 2013. A Diretoria Colegiada da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165. O TC foi finalizado em condições excepcionais pelos motivos de não terem sido utilizados os recursos em sua totalidade, ficando, contudo, a continuidade das ações para 2014.

ATENÇÃO: Com a impossibilidade de concluir o projeto em 2013, por dificuldade de empenho pelo IFPB, houve devolução de R\$ 553.297,70.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 09
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014 (2ª etapa)
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.		
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				100/250	1.183.120,40	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
						IFPB	Sudene	1ª parc. Maio	714.000,40		-
						IFPB	Sudene	2ª parc. Agosto	469.120,00		1.183.120,40

Previsão de Conclusão:	28/05/2015
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Edson Fernando Laranjeiras, Macira Sotero e Vinícius Medeiros (SUDENE/CGDS)
	Convenente	Prof. ^a Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Alexandre Urquiza (IFPB).

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014	22/05/2015		100%	Concluído	Em ofício nº 052/2014 o reitor do IFPB solicitou a continuidade do projeto iniciado em 2013 e a descentralização de recursos no valor de R\$ 1.183.120,40 para a qualificação de 640 mulheres para a Construção Civil.
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014		100%	Concluído	Ata nº 165 da Diretoria Colegiada da Sudene.
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014		100%	Concluído	DOU de 24.04.2014 - nº 77 - fl.129
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							33,5%	Em Andamento		
	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R\$ 1.183.120,40	100%	Concluído	Descentralizado e efetuado o repasse financeiro dos valores: R\$ 714.000,40 referente à primeira parcela e R\$ 469.120,00 referente à 2ª parcela.
8	Capacitação de 640 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas.	IFPB	Abri/Julho e Set/Nov/2014	Abri/Julho e Set/Nov/2014		01/04/2014		--	5%	Em Andamento	Aula inaugural referente ao início das capacitações para 50% do total das alunas a serem capacitadas no projeto.
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído	
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído	
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014	--	100%	Concluído	
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		Não Informado	Não Informado	--	100%	Concluído	

8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013		--	--	100%	Concluído		
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	--	--	0%	Atrasado	Valor empenhado para a aquisição do laboratório móvel: R\$ 427.607,00. A empresa licitada não entregou no prazo a unidade móvel. Em negociação entre a empresa e o IFPB.
8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico; Curso de Pintura de Obras; Curso Auxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	Abril/Julho e Set/Nov/2014		01/04/2014			5%	Em Andamento	Ínicio com a Aula inaugural.
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	30/01/2015					0%	A Iniciar	A capacitação da 1ª etapa com 50% das alunas não foi finalizada, atrasando a inserção no mercado de trabalho.
9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/04/14	28/05/15		31/01/14			5%	Em Andamento	Acompanhamento para a participação na aula inaugural em 27/05/2014 - foi prejudicada por conta de acidente com os técnicos. Reunião no IFPB em 31.07.2014 sobre andamento do projeto.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Relatório Final de Acompanhamento Técnico do Projeto	CGDS/SUDENE	22/08/2015	22/10/2015					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	1.183.120,40	Valor realizado:	1.183.120,40	53,5%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

IFPB

Observações:

3º Ciclo 2014.

O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível concluir-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.

Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.

A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e API, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça a atração de investimentos públicos e privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
				250	GND 3 (3330.41)	30	485.874,65	511.447,00	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL
Previsão de Conclusão:	30/12/2014	CONVÉNIO Nº 794997/2013								Pago até o ano anterior	R\$ -	
Data Atualização:	29/08/2014	Vigência: 31/12/13 a 30/12/14								A realizar no exercício (2014) RAP 2013	R\$ 485.874,65	
Responsável(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Henrique Oliveira Pires e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Tiago Cançado Diniz - IDENE								Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
										Valor liberado no Exercício (2014)	R\$ 255.723,17	
										Saldo a liberar (2014)	R\$ 230.151,48	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
										Total Liberado até o exercício	R\$ 255.723,17	

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído	
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE	26/09/2013				26/09/2013		100%	Concluído	
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído	
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído	
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído	
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		18,3%	Em Andamento	
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/02/2014	26/05/2014	R\$ 255.723,17	01/02/2014	26/05/2014	255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.
7	Processo licitatório	IDENE	01/03/2014	30/04/2014		14/08/2014	21/08/2014		100%	Concluído	O edital do pregão está sendo analisado pelo setor de licitações do IDENE. Após a retirada da cláusula suspensiva, o Idene solicitará prorrogação da vigência do convênio de modo a corresponder com o processo licitatório e contrato a ser firmado a partir do certame.
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/04/2014	A definir					5%	Em Andamento	O parecer técnico de análise da proposta indicou um prazo maior para execução do convênio. Aprovada a prorrogação da vigência. Solicitado pelo Convenente a inclusão de uma nova etapa, aguardando a justificativa/detalhamento para iniciarmos a análise e posterior ajuste do Plano de Trabalho - Repactuada as etapas.
8.1	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	01/05/2014	A definir					35%	Em Andamento	
8.2	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/06/2014	A definir					25%	Em Andamento	
8.3	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/08/2014	21/08/2014		21/08/2014	21/08/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/05/2014	A definir	R\$ 230.151,48				0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.

8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	01/08/2014	31/08/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	01/09/2014	10/10/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de	IDENE/SUDENE	05/10/2014	20/10/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
9	Evento de Divulgação	IDENE/SUDENE	20/10/2014	31/10/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/10/2014	31/10/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
ENCERRAMENTO (Peso 20 %)									0,0%	A Iniciar		
11	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE							0%	A Iniciar		
11.1	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGDS/DPLAN/SUDENE							0%	A Iniciar		

Valor Previsto:

R\$ 485.874,65

Valor realizado:

255.723,17

38,3%

Em Andamento

Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

3º Ciclo 2014 - Aprovada a prorrogação da vigência. Solicitado pelo Convenente a inclusão de uma nova etapa, aguardando a justificativa/detalhamento para iniciarmos a análise e posterior ajuste do Plano de Trabalho - Repactuada da etapa.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 11 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexiste ncia de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -		
		280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90		107.354,71	5.650,24	FEV/2014	113.004,95
Previsão de Conclusão:	01/03/2015	CONVÉNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)				100.187,91	5.273,04	JUN/2014	105.460,95		
Data Atualização:	29/08/2014			207.542,62	10.923,28	-	218.465,90				
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Ferreira da Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM										

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100%	Concluído	
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100%	Concluído	
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100%	Concluído	
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	(a partir de) 27/10/2014		107.354,71	--	--	--	0%	A Iniciar	Trata-se de convênio celebrado com cláusula suspensiva, que condicionou a manutenção do mesmo e a liberação da 1ª parcela dos recursos a apresentação do Termo de Referência revisado/ajustado, para análise técnica. A condição foi atendida, entretanto, em observância à lei eleitoral, aguarda o término do período eleitoral para a liberação dos recursos e efetivo início da execução. A nova previsão de liberação toma por base a realização do 2º turno das eleições.
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	--	--		--	--	--	0%	A Iniciar	Encaminhadas providências relativas a prorrogação "de ofício", datada de 29/08/2014, ao que se sucedeu o ajuste no plano de trabalho e, de modo particular, a recomposição as metas e etapas, cronograma de desembolso etc.. Quando efetivada a liberação, esta poderá ensejar nova repactuação.
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	02/09/2014	31/01/2015		--	--	--	0%	A Iniciar	
10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	02/09/2014	31/10/2014		--	--	--	0%	A Iniciar	
10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	01/11/2014	31/12/2014		--	--	--	0%	A Iniciar	

10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	01/01/2015	31/01/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0%	A Iniciar		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	27/12/2014		100.187,91	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	01/02/2015	10/02/2015		--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	11/02/2015	19/02/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	13/06/2014	14/07/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	20/02/2015	01/03/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGC/DAD/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		

Valor Previsto: 207.542,62 Valor realizado: 0,00 20,0% Em Andamento Status do Projeto

Parceiros institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

3º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida ,em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estrutura e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrópicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS
Previsão de Conclusão:	31/08/2014	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)							167.999,61		
Data Atualização:	29/08/2014										
Responsável(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcélo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito										

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído	
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/2012		Não informado	09/05/2012		100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	25/06/2012		09/05/2012	25/06/2012		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/2012	20/12/2012		25/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		Não informado	04/01/2013		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								25,0%	Em Andamento	O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2013, passando a vigência para 31/08/2014.
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/2013	28/06/2013	167.999,61	14/06/2013	28/06/2013	167.999,61	100%	Concluído	
8	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/2013	20/03/2014		31/08/2013	30/07/2014		50%	Atrasado	O processo licitatório está praticamente finalizado para a compra do material didático, faltando dispensa de licitação para aquisição dos equipamentos.
9	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/2014	30/01/2014		30/01/2014	30/01/2014		100%	Concluído	
10	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa Civil)	Gov/PB	30/04/2013	31/08/2014					0%	A Iniciar	
	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/2014	31/05/2014	60.797,60				0%	Atrasado	

11	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/2013	31/08/2014				0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)							0,0%			
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico e emissão de Laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	02/09/2014	17/11/2014				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob os aspectos financeiros e emissão de parecer técnico final.	CGC/DAD/SUDENE	02/09/2014	17/11/2014				0%	A Iniciar	Iclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.	
			Valor Previsto:	228.797,21	Valor realizado:	167.999,61	45,0%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil

Observações:

3º Ciclo 2014.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrópicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objet	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				100/250/280	GND 3 e 4	30	350.978,27	370.465,27	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior
Previsão de Conclusão:	28/12/2014	Convênio Nº 7703355/2012 (Proposta SICONV Nº 015048/2012)				186.696,80	19.487,00	dez/12	206.183,80	A realizar no exercício (2014)	R\$ 164.281,47		
Data Atualização:	29/08/2014					164.281,47	--	fev/13	164.281,47	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto	SUDENE/Macira Régia Sotero e Marcélia de Castro Viana - CBMCE/ Aluizio Souza Freitas				350.978,27	19.487,00		370.465,27	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
									Valor liberado no Exercício	R\$ -			
									Saldo a liberar	R\$ 164.281,47			
									Saldo do Empenhar no exercício	R\$ -			
									Total Liberado até o exercício	R\$ 186.696,80			

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
				Início	Fim	Valor					
	INICIAÇÃO (Peso 20%)						20,0%	Concluído			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012	100%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012	100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012	100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012	100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CCG/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CCG/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012	100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CCG/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)						27,6%	Em Andamento			
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	R\$ 186.696,80	29/11/2013	29/11/2013	186.696,80	100%	Concluído	A primeira parcela do convênio foi liberada em 29/11/2013, no valor de R\$ 186.696,80, através da ordem bancária 2013OB801500.
8	Processo Licitatório	GOV/CE	28/12/2012	30/12/2013		25/07/14	19.08.2014		100%	Concluído	Processo concluído.
9	Meta 1: Aquisição 13 notebooks	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013			50%	Atrasado	Licitação concluída. Aguardando ajuste do orçamento para empenho. Solicitou à Sudne a redução da meta 03 - aquisição de 14 (quatorze) câmeras fotográficas com GPS acoplado - para a aquisição somente de 04 (quatro) unidades e a utilização de saldo residual da compra de 08 (oito) projetores - ação já executada - e de parte dos rendimentos de aplicação financeira, para complementação desta aquisição de 13 (treze) notebooks.
10	Meta 2: Aquisição 08 projetores multimídia	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013	13/12/2013		100%	Concluído	
11	Meta 3: Aquisição 14 câmeras fotográficas integradas com GPS	GOV/CE	28/12/2012	13/12/2013		25/07/2014			50%	Atrasado	Aguardando formalização da alteração do objeto do convênio (Aditivo).
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	28/12/2012	13/12/2013					0%	Atrasado	

Liberação da 2ª parcela		SUDENE	28/12/2012	A definir	R\$ 164.281,47				0%	A Iniciar		
13	Meta 4: Realização 14 cursos de capacitação de Agentes de Proteção de defesa Civil	GOV/CE	25.08.2014	05/12/2014		25.08.2014			14%	Em andamento	Iniciados 02 cursos em Icó e Quixeramubim.	
14	Meta 5: Realização um Fórum Internacional Sobre Evidência Sísmicas no Ceará.	GOV/CE	19/11/2014	22/11/2014					0%	A Iniciar	Decreto do Governador suplementando orçamento do Corpo de Bombeiros para dar inicio a licitação. Previsão de início do evento novembro/2014.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
15	Visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0%	A Iniciar		
15.1	Análise da PTC sob os aspectos financeiros e emissão de parecer final	CGC/DAD/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 350.978,27	Valor realizado:	R\$ 186.696,80	47,6%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Observações:

3º ciclo 2014

Obs1: O Convenente depositou a contrapartida em 07.10.2013, no valor de R\$ 19.487, 00.

Obs2: O convenente solicitou Termo Aditivo de prorrogação de vigência para 28 de dezembro de 2014 por meio de ofício anexo SICONV em 20/11/13. Aguardando inserção no SICONV do Termo Aditivo de Prorrogação.

Obs3: O Plano de Trabalho será repactuado quando for aditado o Termo Aditivo com a nova data da vigência.

O convenente solicitou a redução da meta 03 - aquisição de 14 (quatorze) câmeras fotográficas com GPS acoplado - para a aquisição somente de 04 (quatro) unidades e a utilização de saldo residual da compra de 08 (oito) projetores - ação já executada - e de parte dos rendimentos de aplicação financeira, para complementação desta aquisição.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 14 (ex PO13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Insuficiência de opções de oleaginosas apropriadas(materia prima) para viabilizar o avanço do Programa Nacional de Biodiesel no Nordeste.		
Projeto:	Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biodiesel no Nordeste Brasileiro: Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.		
Objetivo do projeto:	Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	700.000,00	
			250	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00		700.000,00				
Previsão de Conclusão:	10/04/2014												
Data Atualização:	22/09/2014												
Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira											
	Convenente	Andre Galenbeck											

Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		18/12/2012	18/12/2012	-	18/12/2012	18/12/2012	-	100%			
1 Celebração de Termo de Descentralização	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)								Concluído		
2 Publicação no DOU	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	20/12/2012	20/12/2012	-	20/12/2012	20/12/2012	-	100%	Concluído		
3 Liberação da parcela única	SUDENE (COCF-Brivaldo Soares)	01/01/2013	31/03/2013	700.000,00	27/03/2013	27/03/2013	700.000,00	100%	Concluído		
4 Aquisição de equipamentos (R\$ 613.045,57)	CETENE (Andre Galenbeck)	31/01/2013	30/05/2013	-	31/03/2013	31/08/2013	-	100%	Concluído	Equipamentos adquiridos	
5 Instalação dos equipamentos (R\$ 20.390,63)	CETENE (Andre Galenbeck)	30/05/2013	30/10/2013	-	01/09/2013	14/01/2014	-	100%	Concluído	Repactuar as datas previstas de início e término.	Prazos prorrgado de ofício para 10/04/2014
6 realização de ensaios	CETENE (Andre Galenbeck)	31/06/2013	31/11/2013	-	14/01/14	25/04/14	-	100%	Concluído	Repactuar as datas previstas de início e término. Aguardando técnico da Alemanha para montagem e regulagem. Há a necessidade de obtenção de mais informações do CETENE sobre a previsão da conclusão desta etapa.	
7 Apresentação de relatório final	CETENE (Andre Galenbeck)	01/12/2013	31/12/2013	-	25/04/14	25/04/14	-	100%	Concluído	Não foi possível atualizar as datas	
8 Emissão de Laudo Técnico	SUDENE (Vernon Walmsley)	02/01/2014	31/01/2014	-	29/04/14	11/06/14	-	100%	Concluído	O processo não se encontra na Dplan	
9 Análise da Prestação de Contas	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	01/02/2014	28/02/2014	-	29/04/14	11/06/14	-	100%	Concluído		
10 Encerramento	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/03/2014	31/03/2014	-	04/08/14	22/09/14	-	100%	Concluído		
		Valor Previsto:	700.000,00		Valor realizado:	700.000,00	100%		Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

O projeto será executado através de descentralização orçamentária e financeira para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)- MCT

Observações:

3º Ciclo 2014

Processo nº 59334.002518/2012-09

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 15 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Dirutor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros
				(R\$ 1,00)	(R\$ 1,00)		
	250	4.4.30.00	Descentralização	857.015,99	965.632,35	CONCEDENTE CONVENENTE Liberação TOTAL	Pago até o ano anterior R\$ 274.405,33
				274.405,33	108.616,36	Mai/2013	383.021,69 A realizar no exercício (RAP 2012) R\$ 582.610,66
				582.610,66	0,00	Julho/2013	582.610,66 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
				857.015,99	108.616,36	-	965.632,35 Valor Empenhado no Exercício R\$ -
Previsão de Conclusão:	31/12/2014						Valor liberado no Exercício (RAP 2012) R\$ -
Data Atualização:	26/08/2014						Saldo a liberar R\$ 582.610,66
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira					Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
	Convenente	Jussara Santanna Alves					Total Liberado até o exercício R\$ 274.405,33

Aguardando atualização do Plano de Trabalho pelo convenente.

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído	
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído	
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014					100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela. Repactuar datas previstas de início e término. Prazo prorrogado para 31/12/2014
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	A definir.	A definir	582.610,66				0%	A Iniciar	Aguardando relatório da visita técnica Relatório preliminar pronto. Aguardando aprovação
7	Vistoria de campo	DPLAN (Albertina Pereira)	A definir.	A definir					0%	A Iniciar	Verificar com Maurício Nascimento quais as novas datas das etapas
8	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	01/12/2014	28/02/2015					0%	A Iniciar	
9	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira)	A definir.	A definir.					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		857.015,99	Valor realizado:		274.405,33	56%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:**Observações:****3º Ciclo 2014.**

Existe a necessidade de deliberação sobre a continuação ou não desses acordos. Como não há diretor de planejamento, quem toma a decisão? Creio que a SUDENE deve resolver o problema de responsáveis na DPLAN pelas áreas, pois no momento não temos a quem recorrer. Apesar das solicitações da Procuradoria, o Termo de Cooperação foi encaminhado para assinatura, tendo inclusive a UFPB assinado o termo. Existem diversas solicitações da procuradoria sobre esses acordos: Solicitações da procuradoria:

1. Manifestação da área técnica sobre a existência ou necessidade de um Plano de trabalho para o Termo de Cooperação
2. Caso haja, é necessário Parecer Técnico sobre o Plano de Trabalho existente no processo com os devidos ajustes
3. Anexar autorização da Diretoria Colegiada
4. Documentação do representante do UF's e respectivo ato de delegação
5. Verificar se haverá ou não nesse acordo transferência de recursos.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Falta de cobertura da malha aérea em cidades de grande e médio porte do Nordeste, prejudicando a movimentação de passageiros e cargas, com perdas econômicas para a Região.		
Projeto:	Malha aeroviária regional		
Objetivo do projeto:	Articulação para incrementar malha aérea na área de atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	A definir			

Previsão de Conclusão:	dezembro-13
Data Atualização:	26/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	
-----------------------------	--

Projeto foi assumido pela Casa Civil
da Presidência da República (Poderá ser
montado novo PO para acompanhamento de
2014/2015. Aguardando decisão superior)

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Composição de equipe interna (definir perfis e elencar servidores)	Marcus/Adonis	19/06/12	10/08/12	-	19/06/12	29/06/12	-	100,00%	Concluído	Inicialmente Francisco Linhares fez parte da equipe, mas afastou-se por ter sido convidado a fazer parte da equipe municipal de João Pessoa. Assim a equipe técnica ficou reduzida ao economista Marcus Vinícius com apoio dos técnicos da Coordenação de Gestão de Informações.
2	Elaboração do plano de trabalho	Marcus/Adonis	01/08/12	10/08/12	-			-	50,00%	Cancelado	A equipe inicial elaborou um PT que deverá ser ajustado.
3	Levantamento da malha institucional (malha regular, companhias aéreas com abrangência local, tempo de voo, etc)	Marcus/Adônis	01/08/12	20/08/12	-			-	20,00%	Cancelado	
4	Identificação dos marcos legais	Marcus/Adônis	21/08/12	10/09/12	-				0,00%	Cancelado	
5	Levantamento do estado da arte	Marcus/Adônis	11/09/12	28/09/12	-				0,00%	Cancelado	
6	Reuniões com os stakeholders	Adônis Oliveira	01/10/12	31/10/12						Cancelado	
7	Formação de Fórum permanente voltado para o estudo de alternativas	Adônis Oliveira	01/11/12	30/11/12	-				0,00%	Cancelado	
8	Definição de critérios para estabelecimento da malha	Adônis Oliveira	03/12/12	30/11/12	150.840,00				0,00%	Cancelado	
9	Definição da malha aérea	Adônis Oliveira	03/12/12	07/12/12	-				0,00%	Cancelado	
10	Termo de Referência da malha aérea	Adônis Oliveira	10/12/12	21/12/12	27.600,00				0,00%	Cancelado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 703/2012, de 14/05/2012.
			Valor Previsto:		178.440,00	Valor realizado:		0,00	18,89%	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:**Observações:**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

3º Ciclo 2014.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz Estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos				Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 16)	
Objetivo Estratégico:	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis				Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar desigualdades regionais e erradicar a miséria				
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):					
Objetivo da ação:	Fortalecer os sistemas locais e regionais de inovação, visando à competitividade dos espaços produtivos e ao desenvolvimento regional sustentável, por meio da promoção do conhecimento e do acesso a instrumentos de apoio coletivo						
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação				
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti				
Problema (causa):	Baixo IDEB e alta evasão escolar						
Projeto:	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE						
Objetivo do projeto:	Aumentar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem, incorporando tecnologias já existentes, no ensino público fundamental e médio, na rede pública estadual da área de atuação da SUDENE						
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Aguardando decisão superior para providências (possibilidade de outro PO em 2015)		
	250	4.4.90.00	Pregão	4.971.999,00			
Previsão de Conclusão:	27/02/2015						
Data Atualização:	26/08/2014						
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti				Valores Orçamentários/ Financeiros		
					Pago até o ano anterior	R\$ -	
					A realizar no exercício	R\$ 4.971.999,00	
					Orçamento Autorizado no exercício	R\$ 4.971.999,00	
					Valor Empenhado no Exercício	R\$ 2.771.999,00	
					Valor liberado no Exercício	R\$ -	
					Saldo a liberar	R\$ 4.971.999,00	
					Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 2.200.000,00	
					Total Liberado até o exercício	R\$ -	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Termo de Referência para compra dos equipamentos e software	Marlene Franklin	01/08/2012	30/08/2012		01/08/2012	30/08/2012		100,0%	Concluído	
2	Assinatura do Termo de Cooperação	Marlene Franklin	09/11/2012	31/12/2012	0,00	09/11/2012	09/11/2012	0	100,0%	Concluído	
3	Llicitação para a compra dos Equipamentos	Frederico Cavalcanti	01/08/2012	30/08/2013	2.200.000,00	01/08/2013		0,00	30,0%	Atrasado	
3.1	Preparação do Edital	Frederico Cavalcanti	01/02/13	01/06/13		01/02/13	01/06/13		100,0%	Concluído	Prazos previstos repactuados.
3.2	Licitação	Marisa Fontaine	01/06/13	01/07/13		01/06/13			50,0%	Atrasado	Hardware - A licitação está suspensa aguardando os recursos interpostos pelas as empresas perdedoras.
3.3	Empenho	Brivaldo	01/08/13	01/08/13					0,0%	Atrasado	Os limites orçamentários foram utilizados para o convênio com o CVT de fitoterápicos de Pernambuco. Há a necessidade de verificação da possibilidade de utilização dos recursos da Administração para a realização desta compra.
3.4	Contrato	Marisa Fontaine	01/08/13	01/08/13					0,0%	Atrasado	Prazos previstos repactuados.
3.5	Pagamento	José Luis	01/08/13	01/08/13					0,0%	Atrasado	Prazos previstos repactuados.
4	Llicitação para a compra dos Softwares		01/08/2012	30/08/2013	2.771.999,00	01/08/12			60,0%	Atrasado	Aguardando assinatura do Contrato
4.1	Preparação do Edital	Frederico Cavalcanti	01/01/13	01/05/13		01/01/13	01/05/13		100,0%	Concluído	
4.2	Licitação	Marisa Fontaine	01/06/13	01/06/13		01/06/13	01/06/13		100,0%	Concluído	
4.3	Empenho	Brivaldo	01/08/13	01/08/13		01/09/13	01/09/13		100,0%	Concluído	
4.4	Contrato	Marisa Fontaine	01/08/13	01/08/13					0,0%	Cancelado	A CGU pediu esclarecimentos sobre a licitação e contrato da P3D
4.5	Pagamento	José Luis	01/08/13	01/08/13					0,0%	Cancelado	
5	Entrega na SUDENE e Montagem (Eqpts. e softwares)	Frederico Cavalcanti	01/09/2013	30/11/2013					0,0%	Cancelado	
5.1	Recebimento e conferência	Administração	set/13	set/13					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
5.2	Instalação	Informática	set/13	set/13					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
5.3	Testes	Informática	out/13	out/13					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
5.4	Validação	Informática	out/13	nov/13					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
5.5	Embalagem	Administração	nov/13	nov/13					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
6	Distribuição nas escolas	Frederico Cavalcanti	02/01/2014	30/01/2014					0,0%	Cancelado	
6.1	Evento para entrega	Frederico Cavalcanti	jan/14	jan/14					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
6.2	Treinamento	P3D	jan/14	jan/14					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
7	Fiscalização e Controle	Frederico Cavalcanti	02/01/2014	30/10/2014					0,0%	Cancelado	
7.1	Fiscalização do Treinamento	Frederico Cavalcanti	jan/14	jan/14					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
7.2	1ª Visita de acompanhamento	Frederico Cavalcanti	mar/14	mar/14					0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.

7.3	2ª Visita de Acompanhamento	Frederico Cavalcanti	jun/14	jun/14				0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
7.4	3ª Visita de Acompanhamento	Frederico Cavalcanti	out/14	out/14				0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
8	Encerramento	Frederico Cavalcanti	01/12/2014	27/02/2015				0,0%	Cancelado	
8.1	Fiscalização Final	Frederico Cavalcanti	dez/14	dez/14				0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
8.2	Relatório de avaliação do Projeto	Frederico Cavalcanti	jan/15	jan/15				0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.
8.3	Encaminhamentos	Frederico Cavalcanti	jan/15	fev/15				0,0%	Cancelado	Prazos previstos repactuados.

Valor Previsto: 4.971.999,00 Valor realizado: 0,00 36,25% Cancelado Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Estados da área de atuação da SUDENE

Observações:

4º Ciclo

Obs.: Software - A CGU solicitou esclarecimentos sobre o projeto e a contratação da empresa P3D. Ainda não houve resposta. Hardware - A licitação está suspensa aguardando os recursos interpostos pelas as empresas perdedoras.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340-Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Formular e implementar os marcos legais das Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento Territorial, contribuindo para a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Existência de impedimentos técnicos e estruturais ao desenvolvimento da educação fundamental do Nordeste		
Projeto:	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDTC-NE)		
Objetivo do projeto:	Apoiar programas/projetos de pesquisa nas áreas de biotecnologia aplicada à indústria, à agropecuária, aos recursos naturais, à saúde, ao controle de pragas e doenças, como também, a programas de inovação tecnológica em pós-colheita, em novos materiais para o uso em energia solar e outros. Também propiciará estudos e capacitação dirigidos ao semiárido nordestino.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
		250	3.3.30.00	20.000.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2014
Data Atualização:	26/08/2014

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
--	----------------------

Aguardando decisão superior para providências
(possibilidade de outro PO em 2015)

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 5.000.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 5.000.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Assinatura do Termo de Cooperação	Frederico Cavalcanti	01/07/13	27/12/13	0,00	Não informado	Não informado		44%	Em Andamento	Foram analisadas as propostas encaminhada pelas UFRPE (2); UFRN e UFPB. Emitido parecer técnico e encaminhado para convênio com a minuta do Termo de Cooperação
1.1	Solicitação de Proposta - Universidades Federais	Frederico Cavalcanti	01/07/13	30/09/13	0,00	Não informado	Não informado		100%	Concluído	
1.2	Análise das Propostas	Frederico Cavalcanti	30/09/13	16/12/13	0,00	Não informado	Não informado		100%	Concluído	
1.3	Preparação de Minuta para Acordo	Frederico Cavalcanti	16/12/13	17/12/13	0,00	Não informado	Não informado		20%	Concluído	
1.4	Trâmites Internos	Frederico Cavalcanti	17/12/13	26/12/13	0,00				0%	Em Andamento	
1.5	Assinatura e Publicação	Frederico Cavalcanti	27/12/13	27/12/13	0,00				0%	Cancelado	Não há orçamento para execução
2	Descentralização Orçamentária	Frederico Cavalcanti	01/05/14	01/06/14	20.000.000,00				0%	Cancelado	
3	Implementação da proposta	Frederico Cavalcanti		31/12/14	0,00				0%	Cancelado	
			Valor Previsto:		20.000.000,00	Valor realizado:		0,00	15%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo-2014

Obs.1: Este projeto absorve o PO 15 (CAPES) monitorado até o 3º Ciclo.

Obs.2: Aguardando definição orçamentária para 2014 em razão das dificuldades apresentadas pelas Universidades Federais do RN e PB, e Rural de PE de empenhar recursos e executar algo ainda em 2013.

Obs.3: Após a viabilização do Acordo de Cooperação cada projeto se transformará em um PO. Estão previstos para a UFRN um proj., para a UFPB um proj. e para a UFRPE dois projetos.

O PPDTC/NE é o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3.Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 19
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo: 3.1.2. Modernizar a Gestão.			
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14		
Projeto:	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Estabelecimento de uma metodologia de avaliação e aplicação desta em um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
				-	
Previsão de Conclusão:	22/12/2014				Pago até o ano anterior
Data Atualização:	03/09/2014				A realizar no exercício
Responsável(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel				Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)
					Valor Empenhado no Exercício
					Valor liberado no Exercício
					Saldo a liberar
					Saldo a Empenhar no exercício
					Total Liberado até o exercício

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Definir metodologia e critérios de seleção de planos, programas e projetos a serem avaliados	Coordenação Lautemyr	01/09/2014	04/09/2014					20%	Em Andamento	
2	Selecionar projeto a ser avaliado	Coordenação Lautemyr	05/09/2014	12/09/2014					0%	A Iniciar	
3	Definir metodologia de avaliação para o projeto selecionado	Coordenação Lautemyr	15/09/2014	15/10/2014					0%	A Iniciar	
4	Encaminhar da metodologia para a apreciação da diretoria colegiada	Lautemyr	15/10/2014	24/10/2014					0%	A Iniciar	
5	Avaliar o projeto com base na metodologia aprovada	Frederico/Lautemyr	27/10/2014	21/11/2014					0%	A Iniciar	
6	Elaborar relatório final de avaliação contendo metododologia proposta, resultados obtidos e recomendações	Coordenação Lautemyr	24/11/2014	04/12/2014					0%	A Iniciar	
7	Revisão do relatório e entrega final	Lautemyr	08/12/2014	22/12/2014					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	2,9%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 18)	
Objetivo estratégico:						Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guender	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar							
Problema (causa):								
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA							
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08	Pago até o ano anterior
Previsão de Conclusão:	01/12/2015								R\$ 2.265.105.668,00
Data Atualização:	29/08/2014								A realizar no exercício
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)
									Valor Empenhado no Exercício
									Valor liberado no Exercício
									Saldo a liberar
									Saldo a Empenhar no exercício
									Total Liberado até o exercício
									R\$ -
									R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	21/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		3.876.491.700,00	Valor realizado:		3.065.105.668,00	77,78%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE) / Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteração do cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.

Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGLD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)		
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
		100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior R\$ 387.000.000,00
A realizar no exercício R\$ 1.572.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
Valor Empenhado no Exercício R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 505.925.388,15
Valor liberado no Exercício (LOA) R\$ -
Saldo a liberar R\$ 1.066.074.611,85
Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
Total Liberado até o exercício R\$ 892.925.388,15

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído	
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	639.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	639.000.000,00	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	191.544.000,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	191.544.000,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
10	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	191.544.000,00				0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	106.368.000,00				0,00%	A Iniciar	
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00		Valor realizado:	R\$ 892.925.388,15	53,85%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 20)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar							
Problema (causa):								
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)							
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoelétrica - 290 MW - Candeias/BA							
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06	Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
							A realizar no exercício	R\$ -
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
							Saldo a liberar	R\$ -
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
							Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00
Previsão de Conclusão:		01/03/2010						
Data Atualização:		29/08/2014						
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGF)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise	Mauro Povoa (SUDENE/DGF)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011. Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado					0,0%	Atrasado	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. O banco estimou 30 dias para emissão do Certificado de Implantação. O prazo já expirou para o BNB.
			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%			Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs:2 Atualizado em 08/04/2013.											
3º Ciclo 2014											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 21)				
Objetivo estratégico:							Ano:	2008				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGLD							
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Problema (causa):												
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR											
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70				Pago até o ano anterior	R\$ -	
Previsão de Conclusão:		01/08/2014					A realizar no exercício	R\$ 53.576.481,00				
Data Atualização:		29/08/2014					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -				
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
								Saldo a liberar	R\$ 53.576.481,00			
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
								Total Liberado até o exercício	R\$ -			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Directoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Conforme ofício nº 0270/2014 - Dfin/Sudene, de 25.2.2014, encaminhado ao BNB solicitado aditamento ao contrato ou novo contrato.	
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/04/14	01/05/14	42.477.417,00	-	-	-	0,00%	Paralisado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.	
6	Liberação 2	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/06/14	01/07/14	10.899.064,00	-	-	-	0,00%	Paralisado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.	
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	53.376.481,00		Valor realizado:	0,00		50,00%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014.
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs5: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB aguarda a confirmação de concurso do Agente Operador.
Obs9: Aguardando a confirmação de concurso do Agente Operador.
Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica: Objetivo estratégico: Programa: Ação: Objetivo da ação: Diretoria responsável: Diretor: Problema (causa): Projeto: Objetivo do projeto:	<p>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</p> <p>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</p> <p>2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).</p> <p>Eixo temático (MI): Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria Objetivo estratégico (MI): Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social</p> <p>Subunidade responsável: DFIN/CGLD Gestor da subunidade: Sabrina Lyra de Oliveira Guendler</p> <p>Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A</p> <p>Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE</p>	Número do Projeto: PO 24 (ex PO 22) Ano: 2011																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Dados Orçamentários</th> <th style="width: 15%;">Fonte</th> <th style="width: 15%;">Grupo de Despesa</th> <th style="width: 15%;">Modalidade</th> <th style="width: 15%;">Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</th> <th style="width: 15%;">Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>5</td> <td>90</td> <td>59.700.000,00</td> <td>111.433.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00	<p>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ 59.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ 42.723.785,57</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ 16.976.214,43</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 42.723.785,57</td> </tr> </tbody> </table>	Pago até o ano anterior	R\$ -	A realizar no exercício	R\$ 59.700.000,00	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 42.723.785,57	Saldo a liberar	R\$ 16.976.214,43	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 42.723.785,57																																																																																																																																			
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)																																																																																																																																																												
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00																																																																																																																																																												
Pago até o ano anterior	R\$ -																																																																																																																																																																
A realizar no exercício	R\$ 59.700.000,00																																																																																																																																																																
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																																																																																																																																																																
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 42.723.785,57																																																																																																																																																																
Saldo a liberar	R\$ 16.976.214,43																																																																																																																																																																
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																																																																																																																																																																
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.723.785,57																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Previsão de Conclusão:</td> <td>01/08/2014</td> </tr> <tr> <td>Data Atualização:</td> <td>29/08/2014</td> </tr> </table>		Previsão de Conclusão:	01/08/2014	Data Atualização:	29/08/2014	<p>Responsável(s) pelo Projeto Sabrina Lyra de Oliveira Guendler</p>																																																																																																																																																											
Previsão de Conclusão:	01/08/2014																																																																																																																																																																
Data Atualização:	29/08/2014																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">N.E.</th> <th style="width: 30%;">Atividades/ Etapas</th> <th style="width: 15%;">Responsável</th> <th colspan="3">Previsto</th> <th colspan="3">Realizado</th> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 15%;">Observação/Problemas</th> <th style="width: 15%;">Ações Corretivas</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="width: 15%;">Início</th> <th style="width: 15%;">Fim</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 15%;">Início</th> <th style="width: 15%;">Fim</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 15%;">Físico %</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Carta-consulta</td> <td>Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)</td> <td>13/07/11</td> <td>11/09/11</td> <td>-</td> <td>13/07/11</td> <td>28/07/11</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pré-análise</td> <td>Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)</td> <td>11/11/11</td> <td>10/01/12</td> <td>-</td> <td>11/11/11</td> <td>22/12/11</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Análise de Projeto</td> <td>BNB/A definir</td> <td>29/12/11</td> <td>10/02/13</td> <td>-</td> <td>29/12/11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td>Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Análise de Projeto - novos prazos</td> <td>BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano</td> <td>24/12/12</td> <td>24/03/13</td> <td>-</td> <td>24/12/12</td> <td>25/03/13</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td>Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada</td> <td>SUDENE</td> <td>25/03/13</td> <td>24/04/13</td> <td>-</td> <td>25/03/13</td> <td>22/05/13</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td>Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Contratação do banco operador</td> <td>SUDENE/BNB</td> <td>22/05/13</td> <td>31/05/13</td> <td></td> <td>22/05/13</td> <td>24/05/13</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Liberação 1</td> <td>SUDENE/BNB</td> <td>18/02/14</td> <td>20/03/14</td> <td>42.723.785,57</td> <td>18/02/14</td> <td>12/03/14</td> <td>42.723.785,57</td> <td>100,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Liberação 2</td> <td>SUDENE/BNB</td> <td>01/07/14</td> <td>31/07/14</td> <td>16.976.214,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td style="background-color: #FF0000;">Atrasado</td> <td>Aguardando proposta de liberação do agente operador.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Fiscalizações</td> <td>A definir</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Emissão de Certificado de Empreend. Implantado</td> <td>A definir</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td style="background-color: #0070C0;">A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Valor Previsto:</td> <td>59.700.000,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Valor realizado:</td> <td>42.723.785,57</td> <td>70,00%</td> <td style="background-color: #FF0000;">Atrasado</td> <td style="background-color: #0070C0;">Status do Projeto</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.	4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar					Valor Previsto:	59.700.000,00		Valor realizado:	42.723.785,57	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																																																																																																																																																						
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %																																																																																																																																																								
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																							
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																							
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.																																																																																																																																																						
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.																																																																																																																																																						
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.																																																																																																																																																						
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído																																																																																																																																																							
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído																																																																																																																																																							
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.																																																																																																																																																						
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																							
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																							
			Valor Previsto:	59.700.000,00		Valor realizado:	42.723.785,57	70,00%	Atrasado	Status do Projeto																																																																																																																																																							
Parceiros institucionais:																																																																																																																																																																	
Observações:																																																																																																																																																																	
3º Ciclo 2014. Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE. Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise. Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes. Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa. Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.																																																																																																																																																																	

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 25 (ex PO 23)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar
Problema (causa):		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00	R\$	-
Previsão de Conclusão:	30/05/2014					Pago até o ano anterior	R\$ -
Data Atualização:	29/08/2014					A realizar no exercício	R\$ 54.900.000,00
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 53.635.943,87
						Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniele/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	54.900.000,00		Valor realizado:	53.635.943,87	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:											
Observações:											
3º Ciclo 2014											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.											

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 26 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD				
Diretor(a) responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar						
Problema (causa):							
Projeto:	Eólica Falsa I Geração e Comercialização de Energia Ltda						
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
				100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70	R\$ -	Pago até o ano anterior

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
R\$	-
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.439.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 63.942.862,59
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	25.868.946,48	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.
8	Liberação2		01/07/14	31/07/14	38.570.053,52				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	64.439.000,00		Valor realizado:	63.942.862,59	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 27 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faixa II Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90		

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.864.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 59.864.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marliujo/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	24.054.463,06				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	35.809.536,94				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	59.864.000,00		Valor realizado:	0,00	60,00%		Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014.
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 26)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD			
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Falsa III Geração e Comercialização de Energia LTDA										
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60					
Previsão de Conclusão:		01/08/2014				Pago até o ano anterior	R\$	-			
Data Atualização:		29/08/2014				A realizar no exercício	R\$	55.278.000,00			
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	
								Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	54.848.909,88	
								Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-	
								Saldo a liberar	R\$	429.090,12	
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
								Total Liberado até o exercício	R\$	54.848.909,88	
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	22.192.548,86	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	33.085.451,14				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	55.278.000,00	Valor realizado:	54.848.909,88	70,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:											
3º Ciclo 2014											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 144/2013.											
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Falsa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55		
Previsão de Conclusão:	01/08/2014						
Data Atualização:	29/08/2014						

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior R\$ -
A realizar no exercício R\$ 55.273.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
Valor Empenhado no Exercício R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA) R\$ -
Saldo a liberar R\$ 55.273.000,00
Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	22.200.954,82				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	33.072.045,18				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
Valor Previsto:			55.273.000,00			Valor realizado:			0,00	60,00%	Atrasado
Status do Projeto											

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014.
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 30 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	64.455.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pre-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012. Prazos de análise sobreestados.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	25.909.829,46				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	38.545.170,54				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		64.455.000,00	Valor realizado:		0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do EDNE e das demais Fontes.

Obs1: O valor total do Projeto Incluir os recursos do FINE e das Demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial, - 30 dias, concedido pelo RNP, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SLUDENE.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestendidos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, a

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012,

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00		Pago até o ano anterior R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior R\$ -
A realizar no exercício R\$ 33.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
Valor Empenhado no Exercício R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 28.688.696,90
Saldo a liberar R\$ 5.211.303,10
Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
Total Liberado até o exercício R\$ 28.688.696,90

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10			-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	33.900.000,00		Valor realizado:	28.688.696,90	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
3º Ciclo 2014.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 30)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2011				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Subunidade responsável:	DFIN/CGFD				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00					
Previsão de Conclusão:		30/05/2014				Pago até o ano anterior	R\$ -				
Data Atualização:		29/08/2014				A realizar no exercício	R\$ 50.000.000,00				
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 46.786.085,39			
							Saldo a liberar	R\$ 3.213.914,61			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 46.786.085,39			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implementado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	50.000.000,00		Valor realizado:	46.786.085,39		70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando confirmação de conclusão do Agente Operador.											
3º Ciclo 2014											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62	

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 49.690.000,03
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 49.687.713,17
Saldo a liberar	R\$ (0,00)
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe.Joema J.Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído	
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	Não há tempo determinado para a fiscalização.
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	Não há tempo determinado para a emissão do certificado de implantação
			Valor Previsto:	49.690.000,03	Valor realizado:	49.687.713,17	80,00%		Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

3º Ciclo 2014.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 32)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Subunidade responsável:	DFIN/CGLD			
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Problema (causa):											
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
	100	5	90	46.701.999,96	85.684.069,03	Pago até o ano anterior	R\$	-			
						A realizar no exercício	R\$	46.701.999,96			
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-			
						Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	34.986.862,96			
						Saldo a liberar	R\$	11.715.137,00			
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
						Total Liberado até o exercício	R\$	34.986.862,96			
Previsão de Conclusão:		01/04/2014									
Data Atualização:		29/08/2014									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler									
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas		Ações Corretivas		
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %	
1	Carta-consulta		Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído
2	Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12		-	100,00%	Concluído
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Danielle/Marluí/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído
6	Liberação 1		SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído
7	Liberação 2		SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	11.715.137,00				0,00%	Atrasado
8	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar
				Valor Previsto:	46.701.999,96	Valor realizado:	34.986.862,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

3º Ciclo 2014.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 33)					
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social					
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGLD					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar												
Problema (causa):													
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A												
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Elétrica - 18,0 MW - Sobradinho/BA												
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						
		100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00							
Previsão de Conclusão:	30/05/2014						Pago até o ano anterior	R\$	-				
Data Atualização:	29/08/2014						A realizar no exercício	R\$	29.040.000,00				
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-			
								Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	21.755.374,08			
								Saldo a liberar	R\$	7.284.625,92			
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
								Total Liberado até o exercício	R\$	21.755.374,08			
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas		Ações Corretivas				
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe: Daniel/ Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
	Emissão do Certificado de Empreend. Implementado		A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	21.755.374,08	70,00%	Atrasado	Status do Projeto			
Parceiros institucionais:													
Observações:													
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.													
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.													
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.													
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.													
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.													
3º Ciclo 2014													

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
CANCELADO	Cancelado
PARALISADO	Paralisado


 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 36 (ex PO 34)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	DFIN/CGFD						
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)					
		100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00					
Previsão de Conclusão:		01/08/2014									
Data Atualização:		29/08/2014									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
									Pago até o ano anterior	R\$ -	
									A realizar no exercício	R\$ 53.959.000,00	
									Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
									Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
									Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 40.423.492,77	
									Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -	
									Saldo a liberar	R\$ 13.535.507,23	
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
									Total Liberado até o exercício	R\$ 40.423.492,77	
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/ Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implementado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	53.959.000,00	Valor realizado:	40.423.492,77	70,00%	Atrasado	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
3º Ciclo 2014.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 37 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100	99.970.000,00	
Previsão de Conclusão:	01/08/2014					Pago até o ano anterior R\$ -
Data Atualização:	30/05/2014					A realizar no exercício R\$ 99.970.000,00
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 96.407.194,96
						Saldo a liberar R\$ 3.562.805,04
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ 96.407.194,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 203/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	99.970.000,00		Valor realizado:	96.407.194,96	70,00%		Atrasado	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		
Problema (causa):			
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP		
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00		
Previsão de Conclusão:	30/07/2015						
Data Atualização:	29/08/2014						
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	48.707.006,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	22.281.666,00				0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/15	31/01/15	18.954.422,00				0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	15.245.856,75				0,00%	A Iniciar	
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	303.000.000,00	Valor realizado:	105.409.597,25	41,67%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste							Número do Projeto:	PO 39 (ex PO 37)		
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores							Ano:	2012		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGFD						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar										
Problema (causa):											
Projeto:	Aratu Empreendimentos Ltda										
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00	Pago até o ano anterior	R\$	-		
Previsão de Conclusão:		30/12/2017					A realizar no exercício	R\$	80.590.017,00		
Data Atualização:		29/08/2014					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$			
Responsáv(eis) técnico(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício	R\$	-		
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-		
							Saldo a liberar	R\$	270.582.240,00		
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$			
							Total Liberado até o exercício	R\$	-		
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1	Consulta prévia	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	54.516.375,00				0,00%	Atrasado	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	31/08/14	29/11/14	12.381.495,00				0,00%		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/11/14	28/02/15	13.692.147,00				0,00%		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	29/05/15	25.480.367,00				0,00%		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/05/15	29/08/15	26.388.906,00				0,00%		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	31/08/15	29/11/15	6.557.454,00				0,00%		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	30/11/15	28/02/16	9.615.399,00				0,00%		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	29/02/16	29/05/16	26.795.017,00				0,00%		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	31/05/16	29/08/16	29.260.923,00				0,00%		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	31/08/16	29/11/16	20.665.368,00				0,00%		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	30/11/16	28/02/17	7.019.491,00				0,00%		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	28/02/17	29/05/17	4.091.190,00				0,00%		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	31/05/17	29/08/17	18.422.784,00				0,00%		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	31/08/17	29/11/17	15.695.324,00				0,00%		
19	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
20	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	270.582.240,00	Valor realizado:	0,00	20,00%		Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:											
Observações:											
3º Ciclo 2014											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fone: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.		
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61	

Previsão de Conclusão: 30/12/2014

Data Atualização: 29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior	R\$ -	
A realizar no exercício	R\$ 23.855.042,00	
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 13.862.197,00	
Saldo a liberar	R\$ 9.992.845,00	
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
Total Liberado até o exercício	R\$ 13.862.197,00	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobretempo dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/09/14	30/11/14	9.992.845,00			-	0,00%	A Iniciar		
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	23.855.042,00		Valor realizado:	13.862.197,00	62,50%		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)



Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 41 (ex PO 39)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar										
Problema (causa):											
Projeto:	Deten Química S.A.										
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00					
Previsão de Conclusão:		30/01/2016					Pago até o ano anterior	R\$ -			
Data Atualização:		29/08/2014					A realizar no exercício	R\$ 17.287.600,00			
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ 31.256.000,00			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ -			
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto		Realizado		Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
1	Consulta prévia		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído
2	Análise de Projeto		BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído
4	Contratação do banco operador		SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído
5	Liberação 1		SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00			-	0,00%	Atrasado
6	Liberação 2		SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00			-	0,00%	A Iniciar
7	Liberação 3		SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00				0,00%	A Iniciar
	Liberação 4		SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00			-	0,00%	A Iniciar
	Liberação 5		SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00			-	0,00%	A Iniciar
	Liberação 6		SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00			-	0,00%	A Iniciar
8	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar
				Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	0,00	33,33%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:											
Observações:											
3º Ciclo 2014.											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 42 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE				Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).				Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos				Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar					
Problema (causa):						
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.					
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão: 30/10/2014

Data Atualização: 29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 61.867.350,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 61.867.350,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	liberações concluidas
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87			-	0,00%	Cancelado	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	61.867.350,00		Valor realizado:	61.867.350,00	75,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

--

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 41)																									
Objetivo estratégico:						Ano:	2012																									
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																									
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																									
Objetivo da ação:																																
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Subunidade responsável:	DFIN/CGFD																									
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																									
Problema (causa):																																
Projeto:	Cone Multicenter Ltda																															
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico																															
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)																										
		100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00																										
Previsão de Conclusão:		30/03/2017																														
Data Atualização:		29/08/2014																														
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																														
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>107.720.106,00</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>191.238.424,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> </table>									Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	107.720.106,00	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	191.238.424,00	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	-
Pago até o ano anterior	R\$	-																														
A realizar no exercício	R\$	107.720.106,00																														
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																														
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																														
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-																														
Saldo a liberar	R\$	191.238.424,00																														
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																														
Total Liberado até o exercício	R\$	-																														
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																						
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %																							
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído																						
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído																						
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído																						
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído																						
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00			-	0,00%	Atrasado																						
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00			-	0,00%	Atrasado																						
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00			-	0,00%	A Iniciar																						
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00			-	0,00%	A Iniciar																						
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00			-	0,00%	A Iniciar																						
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00			-	0,00%	A Iniciar																						
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00			-	0,00%	A Iniciar																						
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00			-	0,00%	A Iniciar																						
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar																						
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar																						
			Valor Previsto:	191.238.424,00		Valor realizado:	0,00	28,57%	Atrasado	Status do Projeto																						
Parceiros institucionais:																																
Observações:																																
3º Ciclo 2014.																																
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																																
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.																																

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S.A.		
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1.00)
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão:	30/11/2014
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 50.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 50.000.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluidas
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	50.000.000,00		Valor realizado:	50.000.000,00	71,43%		Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014.
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 45
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD			
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A					
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	1.075.935.000,00	1.956.601.489,00		Pago até o ano anterior R\$ -	
Previsão de Conclusão:	30/09/2017						A realizar no exercício R\$ -	
Data Atualização:	29/08/2014						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -	
Responsáv(el)(es) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
							Valor Empenhado no Exercício R\$ -	
							Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -	
							Saldo a liberar R\$ 1.075.935.000,00	
							Saldo a Empenhar no exercício R\$ -	
							Total Liberado até o exercício R\$ -	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Atrasado	o banco pode prorrogar por mais 60 dias e ainda pedir prorrogação a Sudene
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00				0,00%	A Iniciar	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00				0,00%	A Iniciar	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00				0,00%	A Iniciar	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00				0,00%	A Iniciar	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00				0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00				0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00				0,00%	A Iniciar	
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	1.075.935.159,00	Valor realizado:	0,00	26,92%		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014.
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 46 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2008
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Responsável :	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)		
Problema (causa):	Disfunções/desvios entre atribuições e a ocupação de cargos em decorrência de não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219, de 04/10/2007.		
Projeto:	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE (proposta).		
Objetivo do projeto:	Elaborar novo Decreto de estrutura regimental para corrigir as não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219/2007, particularmente a recomposição de funções e atribuições funcionais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				100	1			Pago até o ano anterior	R\$ -
				90	0,00	R\$ -		A realizar no exercício	R\$ -
								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
								Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
								Valor liberado no Exercício	R\$ -
								Saldo a liberar	R\$ -
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
								Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	07/03/2014
Data Atualização:	30/05/2014
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Encaminhamento do Projeto de Lei de criação de cargos pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados.	Casa Civil da Presidência da República (MPO)	16/05/08	01/12/08	-	16/05/08	11/10/12	-	100%	Concluído	
2	Aprovação da Lei de criação dos novos cargos e funções gratificadas	Presidência da República (Casa Civil, Min. Fazenda e MI)	02/12/08	04/03/09	-	02/12/08	17/12/12	-	100%	Concluído	Lei nº 12.742, de 17/12/2012
3	Elaboração de minuta de decreto de Estrutura Regimental para a SUDENE	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	04/01/13	11/01/13	-	04/01/13	11/01/13	-	100%	Concluído	Of. nº 003/2013/SUDENE/GAB
4	Solicitação de ajustes à minuta de decreto de estrutura regimental com o corte de 3 cargos DAS.	Amarildo Baesso (Diretor de Programas do MI)	18/03/13	18/03/13	-	18/03/13	18/03/13	-	100%	Concluído	
5	Revisão da proposta de Decreto da nova estrutura regimental da SUDENE e envio ao MI.	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	18/03/13	19/03/13	-	18/03/13	19/03/13	-	100%	Concluído	O MI em 09/05 encaminhou ajustes na estrutura sem possibilidade de alteração, solicitando do Superintendente, a validação para continuidade da tramitação. Esses ajustes unilaterais não conferem com a posição da AGI.
6	Encaminhamento da minuta pelo MI ao MPO	Secretaria Executiva/MI	15/05/13	15/05/13	-	15/05/13	07/06/13	-	100%	Concluído	
7	Análise Técnica e aprovação pela Secretaria de Gestão Pública/MPOG	Secretaria de Gestão Pública/MPOG	08/06/13	20/09/13	-	08/06/13	10/10/13	-	100%	Concluído	Os prazos dados são expectativas baseadas em posição da SEGEOP/MPO.
8	Manifestação da CONJUR/MPOG	Consultoria Jurídica do MPOG	15/10/13	24/10/13	-	15/10/13	30/10/13	-	100%	Concluído	
9	Proposta do Decreto de estrutura regimental da SUDENE	Casa Civil da Presidência da República (MPO e MI)	29/10/13	25/02/14	-	29/10/13	14/11/13	-	100%	Concluído	A proposta encontra-se no MPOG e está pronta para assinatura da Presidenta da República, porém enfrenta agenda política.
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014.

obs.: A parte da preparação interna (SUDENE) objeto deste PO foi concluída e aprovada pelo Superintendente. A proposta de Decreto já se encontra aprovada pelo MPOG e pela Casa Civil da Presidência da República desde mar/2014. Aguardando apenas assinatura e publicação.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 47 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor	Valor Total	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				SUDENE no Projeto (R\$)	do Projeto (R\$ 1,00)	
				0,00	R\$ -	
Previsão de Conclusão:	06/11/2014					
Data Atualização:	15/09/2014					
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca					

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior R\$ -
A realizar no exercício R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
Valor Empenhado no Exercício R\$ -
Valor liberado no Exercício R\$ -
Saldo a liberar R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/06/14	04/07/14		30/06/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
2	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	03/07/14	04/07/14		03/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído	
3	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/07/14	22/07/14		07/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
4	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/07/14	23/07/14		28/07/14	22/08/14		100,00%	Concluído	
5	Elaboração da Portaria que aprova as Siglas da Sudene. Abertura de processo, envio à Procuradoria, Assinatura do Superintendente.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/09/14	09/09/14		01/09/14	09/09/14		100,00%	Concluído	Só foi possível elaborar as siglas quando as unidades retornaram com as competências analisadas e os nomes correspondentes.
6	Apresentação das siglas para conhecimento à Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/09/14	19/09/14		11/09/14	11/09/14		100,00%	Concluído	Em função de algumas observações que surgiram na reunião houve a necessidade de alguns ajustes
7	Retorno das competências pelas unidades para apresentação dos resultados e novos ajustes	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/09/14	26/09/14		15/09/14			60,00%	Em Andamento	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgência tão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
8	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio às unidade para análise final	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	29/09/14	24/10/14		07/07/14			20,00%	Em Andamento	

9	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	24/10/14	31/10/14				0,00%	A Iniciar		
10	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	05/11/14	05/11/14				0,00%	A Iniciar	Esta etapa depende do retorno dentro do prazo de todas as unidades e do dia da reunião da Diretoria Colegiada	Prazos definidos em função do esquema montado pela CGGI para os devidos encaminhamento em regime de urgência tão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
11	Publicação no DOU e Boletim interno.	Samuel (SAD/GAB)	06/11/14	06/11/14				0,00%	A Iniciar	Depende da etapa anterior	
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:		61,82%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Observações:

3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 48 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Responsável :	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)		
Problema (causa):	Disfunções/devios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.		
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				100	1				
Previsão de Conclusão:						08/11/2015			
Data Atualização:						18/09/2014			
Responsáv(el)(es) técnico(s) pelo Projeto						Carmen Lúcia Couto Fonseca e Manoel Barreiros			

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído	
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE, para nivelamento de conceitos e apresentação detalhada dos avanços do MI e da proposta de plano de trabalho da SUDENE, para construção de seu EP.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).
3	Reunião com unidades internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.
5	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explicação sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14		11/09/14	11/09/14		100%	Concluído	
6	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14		11/09/14	18/09/14		100%	Concluído	
4	Projeto piloto (mapeamento dos principais processos da CGGI)	Carmen Fonseca e Víncius Vieira (CGGI/SUDENE)	11/08/14	30/09/14		11/08/14			30%	Em Andamento	
7	Retorno das unidades com a indicação dos nomes para o EP	Unidades da Sudene	18/09/14	23/09/14					0%	A Iniciar	
8	Reunião de planejamento, para discussão das propostas para a construção do EP (missão, visão, valores, objetivos do EP, Finalidade (papéis, responsabilidades, objetivos e funções/atribuições), apresentação do Mapa de Relacionamento, da minuta de portaria para implementação dos trabalhos e escolha dos primeiros processos a serem mapeados.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	08/10/14	08/10/14	-				0%	A Iniciar	
9	Ajuste do mapa de relacionamentos.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	08/10/14	15/10/14	-			-	0%	A Iniciar	

10	Reunião com o grupo para apresentar o trabalho realizado. Consolidação do plano de trabalho com cronograma para os primeiros processos a serem mapeados após a AGI. Selecionar nova unidade e metodologia de mapeamento e início dos trabalhos piloto.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	16/10/14	20/10/14					0%	A Iniciar		
11	Mapeamento piloto dos processos da unidade escolhida.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	20/10/14	30/10/14					0%	A Iniciar		
12	Reunião interna com gestores de todas as unidades para apresentação dos resultados dos primeiros processos mapeados (piloto) e preparação de apresentação sobre os resultados já alcançados, para a Diretoria Colegiada.	Equipe do EP, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e interlocutor da unidade trabalhada.	04/11/14	04/11/14					0%	A Iniciar		
13	Apresentação à Diretoria Colegiada da SUDENE, dos primeiros resultados mapeados no piloto, para deliberação.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir	-			-	0%	A Iniciar		
14	Atualização do cronograma de mapeamento, com inserção de novas unidades, ajustes na abordagem e nas estratégias de sensibilização.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
15	Reuniões com as novas unidades para preparação dos trabalhos de mapeamento.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
16	Início dos trabalhos de mapeamento de processos com as novas unidades incorporadas ao processo.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
17	Treinamento e teste de funcionalidade dos novos mapeamentos.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
18	Manualização e revisão/ajuste de todos os processos mapeados.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
19	Aprovação geral da sistemática de procedimentos com base no mapeamento realizado.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	08/11/15	-			-	0%	A Iniciar		

Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	28%	Em Andamento	Status do Projeto
------------------------	------	-------------------------	------	-----	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014.

Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 49
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Suplementação emergencial do quadro funcional.		
Diretoria responsável:	Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Aguda escassez de servidores comprometendo a eficiência da gestão.		
Projeto:	Ingresso dos Servidores Concursados 2013		
Objetivo do projeto:	Fortalecer a força de trabalho da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros	
	250					
Previsão de Conclusão:	31/12/2014					
Data Atualização:	19/09/2014					
Responsável(s) pelo Projeto	Ângela Maria Lima Gouveia					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
1	Estudo do quantitativo dos candidatos aprovados no concurso	Ângela Lima	10/01/14	31/01/14	0,00	10/01/14	31/01/14	0,00	100%	Concluído	
2	Acompanhamento da autorização de provimento dos cargos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e	Ângela Lima	02/01/14	05/05/14	0,00	02/01/14	05/01/14	0,00	100%	Concluído	
3	Análise e redimensionamento da demanda de cargos por unidade administrativa da Sudene	Diretorias e Ângela Lima	01/04/14	09/05/14	0,00	01/04/14	09/05/14	0,00	100%	Concluído	
4	Elaboração de comunicação e documentos para divulgação no site da Sudene	Ângela Lima e ASCOM	01/04/14	11/04/14	0,00	01/04/14	11/04/14	0,00	100%	Concluído	
5	Divulgação de comunicação no site da Sudene	Ângela Lima e ASCOM	14/04/14	16/06/14	0,00	14/04/14	16/06/14	0,00	100%	Concluído	
6	Estudo de vagas no SIAPE	Márcia Santos	01/04/14	07/05/2014	0,00	01/04/14	07/05/14	0,00	100%	Concluído	
7	Elaboração e publicação de Portaria de nomeação	Ângela Lima	05/05/14	19/05/14	0,00	05/05/14	19/05/14	0,00	100%	Concluído	
8	Capacitação para inserção de novos servidores no SIAPE	Márcia Santos	02/06/14	06/06/14	0,00	02/06/14	03/06/14	0,00	100%	Concluído	
9	Organização de cronograma para exames admissionais	Ester Lucila e Jane Nicéas	12/05/14	14/05/14	0,00	12/05/14	14/05/14	0,00	100%	Concluído	
10	Organização de Pastas Funcionais	Tânia Souza e Geraldo Silva	01/05/2014	30/06/2014	0,00	01/05/2014	30/06/2014	0,00	100%	Concluído	
11	Planejamento de solenidade de Posse e Capacitação para os novos servidores	Ângela Lima e Andrilene Santos	15/05/2014	06/06/2014	0,00	15/05/2014	06/06/2014	0,00	100%	Concluído	
12	Realização de exames admissionais e entrega de documentação	Cláudio Bueno, Ester Lucila, Geraldo Santos e Tânia Souza	20/05/2014	13/06/2014	0,00	20/05/2014	13/06/2014	0,00	100%	Concluído	
13	Elaboração de comunicação de datas para a Posse dos servidores concursados	Ângela Lima	02/06/2014	06/06/2014	0,00	02/06/2014	06/06/2014	0,00	100%	Concluído	
14	Contratação de empresas para realização da capacitação	Ângela Lima	16/06/2014	27/06/2014	0,00	16/06/2014	27/06/2014	0,00	100%	Concluído	
15	Elaboração de Termos de Posse	Ângela Lima	06/06/2014	13/06/2014	0,00	06/06/2014	13/06/2014	0,00	100%	Concluído	
16	Realização da capacitação pré-serviço	Ângela Lima	30/06/2014	11/07/2014	0,00	30/06/2014	11/07/2014	0,00	100%	Concluído	
17	Inserção dos servidores no sistema SIAPE	Márcia Santos, Tânia Souza e Geraldo Silva	13/06/2014	15/07/2014	0,00	13/06/2014	15/07/2014	0,00	100%	Concluído	

18	Lotação dos servidores	Márcia Santos, Tânia Souza e Geraldo Silva	13/06/2014	15/07/2014	0,00	13/06/2014	15/07/2014	0,00	100%	Concluído		
19	Distribuição dos servidores nas áreas	Ângela Lima	11/07/2014	14/07/2014	0,00	11/07/2014	14/07/2014	0,00	100%	Concluído		
20	Estudo do quantitativo dos candidatos desistentes	Ângela Lima	21/07/2014	31/07/2014	0,00	21/07/2014	31/07/2014	0,00	100%	Concluído		
21	Elaboração de comunicação e documentos para divulgação no site da Sudene	Ângela Lima	21/07/2014	31/07/2014	0,00	21/07/2014	21/07/2014	0,00	100%	Concluído		
22	Divulgação de comunicação no site da Sudene	Ângela Lima e ASCOM	28/07/2014	30/08/2014	0,00	28/07/2014	30/08/2014	0,00	100%	Concluído		
23	Elaboração e publicação de Portaria de nomeação	Ângela Lima	01/08/2014	05/08/2014	0,00	01/08/2014	11/08/2014	0,00	100%	Concluído		
24	Organização de cronograma para exames admissionais	Ester Lucila e Jane Nicéas	11/08/2014	15/08/2014	0,00	11/08/2014	15/08/2014	0,00	100%	Concluído		
25	Planejamento de solenidade de Posse e Capacitação para os novos servidores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/08/2014	22/08/2014	0,00	01/08/2014	22/08/2014	0,00	100%	Concluído		
26	Realização de exames admissionais e entrega de documentação	Cláudio Bueno, Ester Lucila, Geraldo Santos	20/08/2014	08/09/2014	0,00	20/08/2014	08/09/2014	0,00	100%	Concluído		
27	Elaboração de comunicação de datas para a Posse dos servidores concursados	Ângela Lima	25/08/2014	08/09/2014	0,00	25/08/2014	08/09/2014	0,00	100%	Concluído		
28	Contratação de empresas para realização da capacitação	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	20/08/2014	30/08/2014	0,00	20/08/2014	30/08/2014	0,00	100%	Concluído		
29	Elaboração de Termos de Posse	Marlene Franklin e Marina Braga	25/08/2014	08/09/2014	0,00	25/08/2014	08/09/2014	0,00	100%	Concluído		
30	Realização da capacitação pré-serviço	Marlene Franklin e Marina Braga	01/09/2014	05/09/2014	0,00	01/09/2014	05/09/2014	0,00	100%	Concluído		
31	Inserção dos servidores no sistema SIAPE	Márcia Santos, Tânia Souza e Geraldo Silva	01/09/2014	15/09/2014	0,00	01/09/2014	15/09/2014	0,00	100%	Concluído		
32	Lotação dos servidores	Márcia Santos, Tânia Souza e Geraldo Silva	01/09/2014	15/09/2014	0,00	01/09/2014	15/09/2014	0,00	100%	Concluído		
33	Distribuição dos servidores nas áreas	Ângela Lima	01/09/2014	15/09/2014	0,00	01/09/2014	15/09/2014	0,00	100%	Concluído		

Valor Previsto:

Valor realizado:

100%

Concluído Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Ano:	2014
Programa do PPA:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão eficiente, eficaz e efetiva
Ação do PPA:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO -DAD	Subunidade responsável:	CGC
Dirutor:	MARCOS ROBALINHO	Gestor da subunidade:	ZIZETE NOGUEIRA
Problema (causa):	Dificuldade dos proponentes na apresentação de propostas no SICONV, em decorrência do desconhecimento legal bem como na operacionalização do SICONV		
Projeto:	Realização de oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados, no SICONV, bem como transmitir orientações legais, da fase inicial, de celebração dos Convênios, na área de atuação da SUDENE;		
Objetivo do projeto:	Orientar os proponentes para elaboração e apresentação de propostas, no SICONV, objetivando celebração de convênios com a SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
					Pago até o ano anterior

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Zizete Falcão Nogueira
-----------------------------	------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros
Pago até o ano anterior
A realizar no exercício
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)
Valor Empenhado no Exercício
Valor liberado no Exercício
Saldo a liberar
Saldo a Empenhar no exercício
Total Liberado até o exercício

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Realizar oficinas, nos Estados, da área de atuação da SUDENE.	CGC/CGDS	01/02/14	30/05/14		01/02/14	30/05/14		100%	Concluído	
2	Reunião com a CGDS para alinhar a programação dos eventos	CGC/CGDS	01/02/14	28/02/14		01/02/14	28/02/14		100%	Concluído	
3	Elaborar Cronograma dos Eventos	CGC	01/02/14	28/02/14		01/02/14	28/02/14		100%	Concluído	
4	Encaminhar Ofícios aos Estados	CGC	01/02/14	01/03/14		01/02/14	01/03/14		100%	Concluído	
5	Elaborar material para as oficinas	CGC/CGDS	01/02/14	28/02/14		01/02/14	28/02/14		100%	Concluído	
6	Realizar das Oficinas nos Estados	CGC/CGDS	01/03/14	30/03/14		01/03/14	30/03/14		100%	Concluído	
7	Elaborar Relatório com o feedback das oficinas	CGC	01/04/14	30/05/14		01/04/14	30/05/14		100%	Concluído	
			Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:
3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 47)					
Objetivo estratégico:	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas				Ano:	2014					
Programa do PPA:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI				Eixo temático (MI):	Implementar Gestão eficiente, eficaz e efetiva					
Ação do PPA:	2000 - Administração de Unidade				Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão					
Objetivo da ação:					Subunidade responsável:	CGC					
Diretoria responsável:	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO -DAD				Gestor da subunidade:	ZIZETE NOGUEIRA					
Diretor:	MARCOS ROBALINHO										
Problema (causa):	Desconhecimento dos convenientes na utilização do SICONV e na aplicação da legislação que rege a matéria										
Projeto:	Realização de oficina, com os convenientes, objetivando transmitir orientações de acompanhamento, execução e Prestação de Contas dos convênios vigentes;										
Objetivo do projeto:	Orientar os convenientes, objetivando a execução do objeto do Convênio.										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros					
						Pago até o ano anterior					
						A realizar no exercício					
						Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.)					
						Valor Empenhado no Exercício					
						Valor liberado no Exercício					
						Saldo a liberar					
						Saldo a Empenhar no exercício					
						Total Liberado até o exercício					
Previsão de Conclusão:		30/05/2014									
Data Atualização:		30/05/2014									
Responsável(s) pelo Projeto		Zizete Nogueira									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas				
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Realizar 01 oficina com os convenientes	CGC	01/03/14	30/05/14		01/03/14	30/05/14		100%	Concluído	
2	Elaborar material para a reunião	CGC	01/03/14	01/04/14		01/03/14	01/04/14		100%	Concluído	
3	Encaminhar convites para os convenientes	CGC	01/03/14	30/04/14		01/03/14	30/04/14		100%	Concluído	
4	Realizar a oficina	CGC/CGDS	01/03/14	30/05/14		01/03/14	30/05/14		100%	Concluído	
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -		100,0%	Concluído	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
3º Ciclo 2014.											

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 49)	
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2012	
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva			
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão			
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.					
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças			
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior			
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho					
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho					
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				250	44	90	7.482.242,89	7.482.242,89	Pago até o ano anterior (2013) R\$ 2.397.648,13
Previsão de Conclusão:	21/08/2015								A realizar no exercício 2014 (RAP 2013) R\$ 563.439,54
Data Atualização:	29/08/2014								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2014) R\$ 1.000.000,00
									Valor Empenhado no Exercício (2014) R\$ -
									Valor liberado no Exercício (2014) R\$ 232.466,52
									Saldo a liberar (RAP 2013) R\$ 563.439,54
									Saldo a Empenhar no exercício (2014) R\$ -
									Total Liberado até o exercício R\$ 2.630.114,65

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
-----------------------------	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12, Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído	
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.
3	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.
4	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.
5	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.
6	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.
7	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	19/09/14	0,00	20/01/14			60%	Em Andamento	A Área de Engenharia, em 07/05/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação desses projetos, acompanhado da proposta de uma empresa, no valor de R\$ 273.600,00.

8	Contratação das poltronas para os auditórios	Elaine Ferrari e Mariza Fontaine	02/12/13	31/07/14	960.000,00	06/02/14			95%	Atrasado	A Área de Engenharia recebeu proposta das empresas Flexform, Alberflex e Marelli, aguardando conclusão da licitação (etapa 7) e autorização superior para aquisição das poltronas.
9	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Empresa a contratar	22/09/14	22/03/15	273.600,00				0%	A Iniciar	A empresa de projetos apresentará o Projeto Básico para a licitação da execução da obra, contendo o Orçamento Básico com todos os elementos necessários para essa contratação.
10	Licitação da obra de ambientação final	Eneida (SUDENE/CPL)	17/11/14	20/02/15	0,00				0%	A Iniciar	
11	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	23/02/15	21/08/15	3.300.000,00				0%	A Iniciar	A Área de Engenharia estimou o valor global da execução da obra de ambientação em R\$ 3.300.000,00.
12	Fiscalização da obra de ambientação final	José Wilson Galdino e José Villeneuve	23/02/15	21/08/15	0,00				0%	A Iniciar	
13	Entrega da obra			21/08/15					0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:	7.482.242,89	Valor realizado:	2.630.114,65	55%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Diretor:	Marcos Robalinho		
Problema (causa):	Desgaste dos equipamentos e instalações de combate a incêndio pela falta de manutenção e divergentes da atual norma brasileira vigente, colocando em risco a segurança do edifício.		
Projeto:	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.		
Objetivo do projeto:	Execução das obras de instalação de proteção contra incêndio do Edifício SUDENE e seus anexos (Biblioteca, Condel, Restaurante e Antigo serviço médico)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
						Pago até o ano anterior	R\$ 30.000,00	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 700.000,00
		250	33	90	2.700.000,00					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000,00

Previsão de Conclusão: 31/05/2016
Data Atualização: 29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico/Projeto executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	30.000,00	30/06/2009	22/09/2010	30.000,00	100%	Concluído	Entrega do projeto básico e do projeto executivo realizado pela empresa Policonsult.	Entrega do projeto básico à CPL para lançar licitação.
2	Licitação	Eneida (Sudene/CPL)	22/12/11	06/03/12	-	22/12/2011	06/03/2012	-	100%	Concluído	Licitação deserta	Revisar planilha orçamentária e relançar licitação.
4	Modificação do Projeto	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	15/06/12	30/07/12	-	15/06/2012	13/08/2012	-	100%	Concluído	O atraso se deu em virtude de estarmos aguardando o envio de informações técnicas adicionais pela empresa de consultoria (Policonsult)	Encaminhar e-mail à Policonsult cobrando informações e estabelecendo prazo.
5	Nova licitação (retomada)	Eneida (Sudene/CPL)	30/07/12	16/11/12	-	13/08/2012	05/12/2012	-	100%	Concluído	A fase de habilitação da licitação ocorreu em 08/10/2012, tendo comparecido apenas a empresa P. C. Campano Com. e Serv. ME, a qual foi inabilitada por questões formais, concedendo-se à licitante o prazo legal de oito dias úteis para apresentação dos documentos requeridos, para revisão da sua inabilitação.	Foi julgado improcedente o recurso da licitante pela CPL e mantida a inabilitação, o que ocasionou o fracasso da licitação. A SUDENE irá revisar as planilhas orçamentárias para abrir nova licitação e consultar a PRD sobre dispensa de licitação dessa obra.
6	Elaboração do Projeto Básico para contratação de empresa de consultoria	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	02/01/14	25/11/14	-	17/03/2014			60%	Em Andamento	A Área de Engenharia está elaborando o Termo de Referência necessário para a contratação de empresa de consultoria, a qual será responsável pela atualização do Projeto Executivo e elaboração do Projeto Básico para a contratação das obras e posterior assessoria à Comissão de Fiscalização.	
7	Licitação da Consultoria	Eneida (Sudene/CPL)	26/11/14	26/02/15	-				0%	A Iniciar		
8	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Empresa a ser contratada	27/02/15	27/05/15	30.000,00				0%	A Iniciar		
9	Relançamento da licitação da obra (3ª tentativa)	Eneida (Sudene/CPL)	28/05/15	28/08/15	-				0%	A Iniciar		
10	Execução da Obra	Empresa a ser contratada	31/08/15	31/05/16	2.400.000,00				0%	A Iniciar	O orçamento básico para a contratação da obra será elaborado pela empresa de consultoria, sendo estimado, pela área de Engenharia, o valor global da obra em torno de R\$ 2.400.000,00.	

11	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização e Empresa a ser contratada	31/08/2015	31/05/2016	240.000,00			0%	A Iniciar		
12	Entrega da obra	Empresa a ser contratada	-	31/05/2016	-			0%	A Iniciar		
		Valor Previsto:	2.700.000,00	Valor realizado:	30.000,00	18,40%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Ministério da Saúde; IBGE; CODEVASF; TRT 6ª Região; CTI/NE; Ministério do Planejamento; Banco do Brasil; Banco no Nordeste; INSS; IFPE; e DFRP/MI.

Observações:

3º Ciclo 2014

A Área de Engenharia solicita repactuação de prazo de 90 (noventa) dias.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Diretor:	Marcos Robalinho		
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	8.229.186,02	8.229.186,02

Previsão de Conclusão:	22/07/2015
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
-----------------------------	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 5.023.543,17
A realizar no exercício 2014 (RAP 2012+2013)	R\$ 3.205.642,85
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito 2014)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício 2014	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP 2012/2013)	R\$ -
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$ 3.205.642,85
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 5.023.543,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Llicitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Recebimento Definitivo da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	02/04/12	02/05/12	0,00	02/04/12	02/05/12	0,00	100%	Concluído	Somente foram recuperados 119 blocos de fundação com dotação de 2010 e 2011. A análise preliminar feita pela empresa contratada subestimou o tamanho do problema com as fundações do prédio, vindo a requerer complementação dos trabalhos.	Lançamento de licitação para complementação da obra.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12		100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.

8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/07/15	4.301.950,47	22/10/12		2.098.803,99	70%	Paralisado	Os serviços de recuperação das fundações estão com 102 blocos concluídos e 4 sapatas concluídas. A obra foi paralisada pela Contratada em 20/12/2013, sob o argumento da impossibilidade de executar serviços em áreas ocupadas pelo TRT, bem como pela necessidade de celebração do 2º Termo Aditivo.	A Sudene celebrou o 3º Termo Aditivo de prazo de 30 dias e a Área de Engenharia está aguardando o envio da planilha do 4º Termo Aditivo, por parte da Contratada, que acrescentará prazo e valores ao Contrato.
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012	22/10/12	22/07/15	0,00	22/10/12			70%	Paralisado	A Comissão de Fiscalização é composta pelos engenheiros civis dos seguintes Órgãos: SUDENE - Wilson Galdino e José Villeneuve; Ministério da Saúde - Cláudia Nascimento e IBGE - Edith Negromonte.	
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/07/15	0,00				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	8.229.186,02	Valor realizado:	5.023.543,17	87%	Paralisado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Os serviços de remoção do painel Brennand existente no Condel, que está impedindo a execução dos serviços de recuperação de cinco blocos de fundação daquela área, foram iniciados no dia 19/08/2014, com prazo de 90 dias.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Diretor:	Marcos Robalinho		
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Substituição (modernização) de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento alternativo de energia do prédio da SUDENE, que hoje serve a diversos condôminos, por sua vez consumidores de diferentes cargas, nele instalados		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				250	33		2.892.394,45	2.892.394,45
Previsão de Conclusão:	22/03/2015						Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 70.000,00
Data Atualização:	29/08/2014						A realizar no exercício (2014) (RAP 2013)	R\$ 30.000,00
Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2014)	R\$ -
							Valor Empenhado no Exercício (2014)	R\$ -
							Valor liberado no Exercício (RAP 2013)	R\$ 30.000,00
							Saldo a liberar (2014) RAP 2013	R\$ -
							Saldo a Empenhar no exercício (2014)	R\$ 2.792.394,45
							Total Liberado até o exercício (2012-2014)	R\$ 100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14			65%	Em Andamento	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetrados várias impugnações ao Edital.
6	Execução da Obra	A definir	22/09/14	22/03/15	2.732.394,45				0%	A Iniciar	O valor previsto, R\$ 2.871.334,88, foi fornecido pela empresa Elétrica Engenharia em 28/02/2014. Em 17/04/2014 esse valor foi revisado para R\$ 2.732.394,45, a partir da adoção de BDI diferenciado para os itens 7 e 8 do orçamento básico.
7	Fiscalização da Obra	A definir	22/09/14	22/03/15	60.000,00				0%	A Iniciar	
8	Entrega da obra				22/03/15				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:			2.892.394,45	Valor realizado:			100.000,00 22,14%	Em Andamento Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 56 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE.		
Projeto:	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	251.373,39

Previsão de Conclusão: 24/04/2014
Data Atualização: 29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto Angela Nascimento

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	251.373,39
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	251.373,39
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	251.373,39
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total liberado até o exercício	R\$	251.373,39

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do projeto	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/08/2012	10/11/2012		15/08/2012	10/11/2012		100%	Concluído		
2	Captação de recursos	Angela Nascimento	11/11/2012	20/02/2013	-	11/11/2012	20/02/2013		100%	Concluído		
3	Contatos com articulistas	Marcos Costa Lima	02/01/2013	31/01/2013	-	02/01/2013	31/01/2013		100%	Concluído		
4	Identificação de recursos no orçamento 2013	Angela Nascimento e Frederico Cavalcanti	20/04/2013	20/04/2013		20/04/2013	20/04/2013		100%	Concluído		
5	Orientação para instrução do processo e abertura de processo	Shieley Câmara, Zizete Nogueira, Frederido Cavalcanti, Brivaldo Soares e Eva Porto	03/05/2013	20/05/2013		03/05/2013	20/05/2013		100%	Concluído		
6	Encaminhamento a DAD	Angela Nascimento	22/05/2013	22/05/2013		22/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído		
7	Emissão de Parecer pela Procuradoria Federal/SUDENE	Romoaldo Goulart	24/05/2013	06/06/2013		06/06/2013	06/06/2013		100%	Concluído		
8	Elaboração de Nota Técnica e Plano de Trabalho	Angela Nascimento/Adonis Oliveira	09/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
9	Encaminhamento a CGC	Angela Nascimento	10/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
10	Parecer da CGC	Zizete Nogueira	10/06/2013	11/06/2013		11/06/2013	11/06/2013		100%	Concluído		
11	Encaminhamento a COCF para informar liberação de limites orçamentários	Angela Nascimento	12/06/2013	12/06/2013		12/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído		
12	Atesto da COCF	Brivaldo Soares	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
13	Encaminhamento à Diretoria de Planejamento para inserção pauta de reunião da Diretoria Colegiada	Angela	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
14	Aprovação do Processo na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	14/06/2013	14/06/2013		14/06/2013	14/06/2013		100%	Concluído		
15	Encaminhamento do Termo de Cooperação à Universidade Federal de Pernambuco	Angela Nascimento	28/06/2013	28/06/2013		28/06/2013	28/06/2013		100%	Concluído		
16	Tramitação na UFPE	Diretoria Convênios	01/07/2013	19/07/2013		01/07/2013	19/07/2013		100%	Concluído		
17	Assinatura do Termo de Cooperação	Reitor e Superintendente	22/07/2013	26/07/2013		22/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído		
18	Publicação no DOU	Coordenação Convênios	25/07/2013	25/07/2013		25/07/2013	25/07/2013		100%	Concluído		
19	Encaminhamento de destaque orçamentário	COCF	26/07/2013	26/07/2013		26/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído		

20	Liberação e recebimento	COCF/UFPE	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	100%	Concluído	Foi transferido o valor total, do qual a UFPE irá desembolsar mensalmente os valores correspondente à folha de pagamento e contratação de serviços.	
21	Empenho UFPE	UFPE/PROEXTE	06/08/2013	06/08/2013		06/08/2013	06/08/2013		100%	Concluído		
22	Execução: 1ª reunião com coordenadores UFPE	Angela/Marcos Costa Lima	02/08/2013	41488		02/08/2013	02/08/2013		100%	Concluído		
23	Seleção de bolsistas UFPE	Marcos Costa Lima/Vildeane Borba	05/08/2013	41501		05/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído		
24	Solicitação de material e equipamento na SUDENE	Angela Nascimento	07/08/2013	15/08/2013		07/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído		
25	Capacitação de 10 bolsistas nas atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	Májory Miranda/Vildeane Borba	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído		
26	Chamamento de bolsistas técnico de nível médio	Evaldo Souza/Angela Nascimento	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído		
27	Orientação de 02 bolsistas responsáveis pela poesquisa de campo e apresentação dos mesmos à instituição de pesquisa.	Angela Nascimento	20/08/2013	23/08/2013		20/08/2013	23/08/2013		100%	Concluído		
28	Pesquisa de campo	Pedro Maranhão/Sérgio Cavalcante	26/08/2013	20/12/2013		26/08/2013	24/03/2014		100%	Concluído	O recorte temporal é 1959/1694	
29	Atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	10 bolsistas	02/09/2013	20/12/2013		02/09/2013	24/03/2014		100%	Concluído		
30	Alteração de elemento de despesa e solicitação de pagamento de bolsas	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	23/05/2013	05/09/2013		23/05/2013	05/09/2013		100%	Concluído		
31	Acervo Sonoro - Identificação/Quantificação	Silva/Alais	02/09/2013	31/10/2013		09/09/2013	22/10/2013		100%	Concluído		
32	Acervo Sonoro - Higienização (142 fitas de rolo)	Silva/Alexandre	20/10/2013	10/11/2013		10/10/2013	25/10/2013		100%	Concluído		
33	Acervo Sonoro - Digitalização	Silva/Alexandre	11/11/2013	31/10/2013		10/10/2013	24/03/2014		100%	Concluído	1959-1970	
34	Finalização (Relatório)	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	24/04/2014	24/04/2014					0%	Atrasado	Aguardando o envio do relatório pela UFPE	
			Valor Previsto:		251.373,39	Valor realizado:		251.373,39	97%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

3º ciclo 2014

Fonte: Documentação/DAD

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 57 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Dirutor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO
Problema (causa):	Disponibilização do acervo histórico do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.		
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1971/2000		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	484.650,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	484.650,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	484.650,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$	484.650,00
Valor liberado no Exercício	R\$	484.650,00
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	484.650,00

Previsão de Conclusão:	31/01/2015
Data Atualização:	29/08/2014

Responsável(s) pelo Projeto Angela Nascimento

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/14	07/04/14		15/03/14	07/04/14		100%	Concluído	
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/14	11/04/14	484.650,00	11/04/14	11/04/14	484.650,00	100%	Concluído	
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	07/04/14	15/04/14	-	07/04/14	15/04/14		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/14	22/04/14	-	17/04/14	22/04/14		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/14	30/05/14		30/05/14	30/05/14		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/14	31/12/14		04/04/14			50%	Em andamento	
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00) (642 docs./10.413 imagens)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/14	31/12/14		15/04/14			75%	Em andamento	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/14	30/11/14		02/06/14			50%	Em andamento	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/14	30/11/214		15/04/14			20%	Em andamento	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/14	31/12/14		02/06/14			40%	Em andamento	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/14	31/12/14		04/04/14			40%	Em andamento	
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/14	31/12/20147		04/04/14			40%	Em andamento	
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaíde Vilanova	04/04/14	31/12/14		05/04/14			40%	Em andamento	
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/13	16/04/14	-	17/12/13	16/04/14		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL

15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/14	30/06/14		04/04/14			100%	Concluído		
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/13	07/05/14		19/12/13	07/05/14		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros da organização); Realização igual a R\$ 100.00,00	
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/13	15/05/14		09/12/13	15/05/14		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R\$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/14	31/08/14		02/06/14	28/08/14		100%	Concluído		
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)		02/06/14	30/11/14					0%	A Iniciar		
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)		02/06/14	30/11/14					0%	A Iniciar		
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)		02/06/14	30/11/14					0%	A Iniciar		
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/204	15/08/14		11/08/14	15/08/14		100%	Concluído		
			Valor Previsto:		484.650,00	Valor realizado:		484.650,00	66%	Em andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciéncia da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

3º ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE				Número do Projeto:	PO 58 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.				Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva			
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão			
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro			
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)					
Problema (causa):	Com a criação do PEI, existe a obrigatoriedade de criação do PETI, em atendimento a legislação em vigor, acôrdão 1233/2012 - TCU - Plenário.					
Projeto:	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.					
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PETI.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				no Projeto (R\$ 1,00)	Projeto (R\$ 1,00)	
				0,00	0,00	

Previsão de Conclusão:	31/10/2014
Data Atualização:	05/09/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
-----------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Levantamento da documentação necessária.	Luiz Carlos Dourado	28/03/13	05/04/13	0,00	03/04/13	09/04/13	0,00	100%	Concluído	Atraso em função da agenda dos participantes (Edgar, Josué e Luiz Carlos).
2	Reuniões técnicas para definição do alinhamento do PETI ao Realinhamento Estratégico da Sudene - 2013/2015.	Área de TI	08/04/13	19/04/13	0,00	10/04/13	12/04/13	0,00	100%	Concluído	
3	Redação, revisão e publicação do PETI 2013/2015.	Luiz Carlos Dourado	25/06/13	16/09/13	0,00	23/07/13	27/09/13	0,00	100%	Concluído	Reprogramado em função das atribuições na Coordenação de TI - férias dos gestores. Previsão para 30/08/2013
4	Análise, formatação e minuta dos Instrumentos Normativos - aprovados com o PETI - (Portaria)*	Luiz Carlos Dourado	19/09/13	14/11/13	0,00	30/09/13	28/03/14	0,00	100%	Concluído	Reprogramado (Sudam 26 a 30/09/2013) e Licitação de equipamentos dos novos servidores (funcionários). Férias. Alinhamento Modelo de Governança.
5	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	18/11/13	22/11/13	0,00	22/04/14	25/04/14	0,00	100%	Concluído	Elaboração de novos instrumentos para o CESTI (Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação)
6	Apresentação da proposta do PETI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para conhecimento.	Luiz Carlos Dourado /CesTI	15/09/14	30/09/14	0,00			0,00	0%	A Iniciar	Aguardando reformulação da Portaria 126/2009 e de novos instrumentos. O responsável pelo Projeto esteve em tratamento de saúde de 29/06 a 28/08/2014.
7	Encaminhamento do PETI para aprovação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	A definir	A definir	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
8	Apresentação da proposta do PETI a Diretoria Colegiada, para aprovação.	Luiz Carlos Dourado.	A definir	A definir	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
9	Publicação da Portaria de aprovação do PETI.	Área de TI.	A definir	31/10/14	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
Valor Previsto:			0,00	Valor realizado:			0,00	56%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014

*No modelo proposto o CESTI é responsável, também, pela elaboração e aprovação do PETI e do PDTI (Portaria tem que ser publicada antes da aprovação do PETI)

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de alinhamento ao PETI.		
Projeto:	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.		
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PDTI alinhando-o ao Plano Estratégico da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				0,00	0,00	
Previsão de Conclusão:	30/06/2014					Pago até o ano anterior R\$ -
Data Atualização:	05/09/2014					A realizar no exercício R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.) R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício R\$ -
						Saldo a liberar R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Análise do PETI.	Luiz Carlos Dourado	25/03/14	28/03/14	0,00	25/03/2014	26/03/2014	0,00	100% Concluído	Aguardando conclusão e aprovação do PETI.	
2	Relacionar projetos de TI (PDTI atual) aos objetivos estratégicos.	Luiz Carlos Dourado	03/04/14	04/04/14	0,00	30/03/2014	08/04/2014	0,00	100% Concluído		
3	Redação, revisão e publicação da proposta do PDTI 2013/2014.	Luiz Carlos Dourado	07/04/14	23/04/14	0,00	09/04/2014	22/04/2014	0,00	100% Concluído	Aprovação dos Analistas da DAD/CSI	
4	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	23/04/14	30/04/14	0,00	28/04/2014	02/05/2014	0,00	100% Concluído	Reunião com Analistas da DAD/CSI (aprovado)	
5	Apresentação da proposta do PDTI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para aprovação.	Área de TI.	02/05/14	Não informado	0,00	06/05/2014	06/05/2014	0,00	100% Concluído	Data a ser agendada pelo Gabinete	Agendada pelo responsável pelo Projeto, por determinação do Superintendente Interino Marcos Robalinho.
6	Revisão e publicação da proposta.	Luiz Carlos Dourado	Não informado	Não informado	0,00	06/05/2014	07/05/2014	0,00	100% Concluído		Urgente (evitar a paralisação dos Projetos e Atividades contínuas de TI).
7	Encaminhamento do PDTI para homologação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	Não informado	30/06/14	0,00	07/05/2014	07/05/2014	0,00	100% Concluído	Encaminhado à Diretoria de Administração para Homologação na DC.	PDTI Homologado pela Diretoria Colegiada (DC).
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	100%		Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 60 (exPO 57)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Aumento da demanda de acesso a Internet.		
Projeto:	Melhoria da infraestrutura de comunicação		
Objetivo do projeto:	Aumentar a velocidade de acesso a Internet.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	33	90	133.999,00

Previsão de Conclusão: 30/07/2014

Data Atualização: 12/09/2014

Responsável(s) pelo Projeto Josué da Silva Ribeiro

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Cred.)	R\$ 133.999,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 133.999,00
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 133.999,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	01/07/13	01/11/13	-	01/08/13	12/11/13	-	100%	Concluído	
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação (Mariza)	25/03/14	23/05/14	-	25/03/14	13/06/14	-	100%	Concluído	
3	Contratação.	Setor de Licitação (Mariza)	16/06/14	30/06/14	-	Não informado	Não informado	-	100%	Concluído	
4	Início da prestação do serviço.	Fornecedor	02/06/14	30/07/14	-	Não informado	Não informado	-	100%	Concluído	
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

a) O valor previsto do projeto é referente a estimativa de custo anual do serviço.

¹ O projeto constituiu-se da contratação de serviços por banda larga num período de cinco anos e será prestado pela empresa Smart Telecomunicações e Serviços Eirelly-epp. O pagamento será mensal (R\$ 133.999,00/12 parcelas=R\$ 11.166,58) e assemelha-se ao de uma empresa de telefonia. Daí os dados orçamentários não terem sido objeto de desdobramento na coluna "realizado".

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 61 (ex PO 58)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Dirutor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Proporcionar melhor desempenho e disponibilidade de máquinas servidoras e PCs, com menor custo.		
Projeto:	Virtualização de recursos de informática.		
Objetivo do projeto:	Reducir o custo com aquisição de máquinas servidoras e PCs.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
	a definir	33	90	195.000,00	
Previsão de Conclusão:	14/11/2014				
Data Atualização:	05/09/2014				
Responsável(s) pelo Projeto	Josué da Silva Ribeiro.				

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	25/03/14	30/06/14	-	25/03/14			80%	Paralisado	
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/07/14	29/08/14	-				0%	A Iniciar	
3	Contratação.	Setor de Licitação	01/09/14	12/09/14	-				0%	A Iniciar	
4	Realização do serviço.	Fornecedor	15/09/14	14/11/14	195.000,00				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	195.000,00		Valor realizado:	0,00	44%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE				Número do Projeto:	PO 62 (ex PO 59)	
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.				Ano:	2014	
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI				Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade				Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação	
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração				Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro	
Diretor:	Marcos Robalinho						
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.						
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO						
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)						
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto		
		a definir	44	90	150.000,00		
Previsão de Conclusão:		31/07/2015					
Data Atualização:		05/09/2014					
Responsável(s) pelo Projeto Josué da Silva Ribeiro.							
Valores Orçamentários/ Financeiros							
Pago até o ano anterior	R\$	-					
A realizar no exercício	R\$	-					
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-					
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-					
Valor liberado no Exercício	R\$	-					
Saldo a liberar	R\$	-					
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-					
Total Liberado até o exercício	R\$	-					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído	
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído	
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	a definir	16/08/14			20%	Em Andamento	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/10/14	30/12/14	-				0%	A Iniciar	
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	02/01/15	30/04/15	-				0%	A Iniciar	
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/05/15	31/07/15	a definir				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	0,00		Valor realizado:	0,00	52%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

- a) O Valor Total do Projeto refere-se apenas ao investimento por parte da Sudene. A SUDAM participa com igual valor.
b) Em 2014 serão desenvolvidos e implantados outros módulos para este Sistema porém, ainda não é possível estimar prazos e custos.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 63 (ex PO 60)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação		
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro		
Problema (causa):	Em atendimento a legislação em vigor.				
Projeto:	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação				
Objetivo do projeto:	Elaborar a proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, para elaboração da Posic / PSI, no âmbito desta Autarquia.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
				0,00	0,00	Pago até o ano anterior	R\$	-			
Previsão de Conclusão:	01/10/2014					A realizar no exercício	R\$	-			
Data Atualização:	05/09/2014					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-			
Responsável(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado.					Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
						Valor liberado no Exercício	R\$	-			
						Saldo a liberar	R\$	-			
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
						Total Liberado até o exercício	R\$	-			

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Levantamento da legislação em vigor.	Luiz Carlos Dourado.	10/06/13	14/06/13	0,00	10/06/13	12/06/13		100%	Concluído	
2	Redação da proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.	Luiz Carlos Dourado.	29/07/13	10/08/13	0,00	25/07/13	05/09/13		100%	Concluído	
3	Revisão e publicação da proposta.	Área de TI.	09/09/13	16/09/13	0,00	04/11/13	22/11/13		100%	Concluído	
4	Análise, formatação e minuta dos Instrumentos Normativos ¹	Área de TI.	15/09/14	30/09/14	0,00				0%	A Iniciar	Falta definição dos instrumentos Normativos. O responsável pelo Projeto esteve em tratamento de saúde de 29/06 a 28/08/2014.
5	Encaminhamento da proposta para apreciação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	A definir	01/10/14	0,00				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	60%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

¹No modelo proposto é criado o CESIC - Comitê de SIC (Portaria tem que ser publicada antes da Homologação pela Diretoria Colegiada)

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	

ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2014)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + Créditos (a)	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2013	Comentários dos desvios
04	122	2111	2000	A	1	23.482.274,00	11.500.000,00	9.015.887,45	48,97	78,40	-	-	-	-	-	-
04	121	2111	2000/PO0001	A	1	500.000,00	500.000,00	196.739,24	100,00	39,35	Servidor capacitado	230		0,00		-
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	342.000,00	342.000,00	198.881,07	100,00	58,15	Pessoa beneficiada	228		0,00		-
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		-
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	39.600,00	39.600,00	6.448,20	100,00	16,28	Criança atendida	50		0,00		-
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	108.000,00	108.000,00	68.787,89	100,00	63,69	Servidor beneficiado	51		0,00		-
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	822.288,00	822.288,00	564.026,75	100,00	68,59	Servidor beneficiado	184		0,00		-
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	20.000,00	20.000,00	7.588,98	100,00	37,94	Servidor beneficiado					-
04	122	2111	09HB	A	1	3.512.829,00	3.512.829,00	1.811.043,08	100,00	-	-	-	-	-	-	-
04	122	2111	20TP	A	1	24.304.013,00	24.304.013,00	13.345.985,87	100,00	-	-	-	-	-	-	-
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI					Total	53.187.104,00	41.204.830,00	25.215.388,53	77,47	61,20	-	-	-	-	-	-
09	272	0089	0181	OP	1	1.681.678,00	1.681.678,00	1.149.423,11	100,00	68,35	-	-	-	-	-	-
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União					Total	1.681.678,00	1.681.678,00	1.149.423,11	100,00	68,35	-	-	-	-	-	-
11	128	2029	4640	A	1	2.423.950,00	1.185.000,00	1.183.120,40	48,89	99,84	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	3.000.108,00	3.000.000,00	2.000.000,00	100,00	66,67	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	1.280.000,00	930.000,00	0,00	72,66	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	2.000.000,00	450.000,00	0,00	22,50	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
19	691	2029	8902/0024	A	1	700.000,00		700.000,00	0,00	#DIV/0!	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/0020	A	1	750.000,00	460.000,00	0,00	61,33	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/0024	A	1	800.000,00		0,00	0,00	#DIV/0!	Iniciativa apoiada					
22	691	2029	8918	A	1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	80,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1	500.000,00	400.000,00	0,00	80,00	0,00	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1	1.000.000,00		484.650,00	0,00	#DIV/0!	Avaliação Realizada			#DIV/0!	-	
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	3.450.066,00	1.066.597,00	0,00	30,92	0,00	Plano Elaborado			#DIV/0!		
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	1.633.185,00	240.000,00	0,00	14,70	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7114	A	1	25.000.000,00		0,00	0,00	#DIV/0!	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/7120	A	1	15.000.000,00		0,00	0,00	#DIV/0!	Arranjo produtivo local apoiado					
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária					Total	59.537.309,00	9.331.597,00	4.367.770,40	15,67	46,81						
06	182	2040	8172	A	-	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres					Total	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 31/08/2014 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

52.518.105,00 30.732.582,04

ANEXO III

**Projetos tabulados segundo Diretrizes
e Objetivos Estratégicos da SUDENE**

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(3º Ciclo 2014)

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até mar/14	(b/a) (%)
1	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2099 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Concluído	R\$ 115.800,00	R\$ 115.800,00	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R\$ 694.459,19	R\$ 556.781,91	80%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 352.840,00	4%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Cooperação	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.018.500,00	R\$ 465.202,30	46%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 255.723,17	53%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 0,00	0%
10	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biodessej no Nordeste Brasileiro: Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	100%
11	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 274.405,33	32%
12	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Malha aeroviária regional	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Cancelado	R\$ 178.440,00	R\$ 0,00	0%
13	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDTC-NE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340- Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	0%
14	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Em Andamento	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
15	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 892.925.388,15	46%
16	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
17	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Paralisado	R\$ 53.576.481,00 -	#VALOR!	

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(3º Ciclo 2014)

18	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuacá Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 42.723.785,57	72%
19	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
20	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
21	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 0,00	0%
22	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
23	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 0,00	0%
24	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 0,00	0%
25	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 28.688.696,90	85%
26	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
27	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
28	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%
29	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 21.755.374,08	75%
30	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 40.423.492,77	75%
31	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(3º Ciclo 2014)

32	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 105.409.597,25	35%
33	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
34	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 13.862.197,00	58%
35	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 0,00	0%
36	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
37	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
38	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
39	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.000,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 1.1								8.773.188.581,77	4.791.283.747,58	54,6
40	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
41	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados, no SICONV, bem como transmitir orientações legais, da fase inicial, de celebração dos Convênios, na área de atuação da SUDENE;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
42	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficina, com os convenientes, objetivando transmitir orientações de acompanhamento, execução e Prestação de Contas dos convênios vigentes;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo Estratégico 1.5								234.105,49	139.865,15	59,7
Total da Diretriz Estratégica 1								8.773.422.687,26	4.791.423.612,73	54,6
43	17	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 4.971.999,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 2.1								4.971.999,00	0,00	0,0
44	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
Total do Objetivo Estratégico 2.3								530.482,50	265.241,25	50,0
45	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
46	13	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 350.978,27	R\$ 186.696,80	53%
Total do Objetivo Estratégico 2.4								579.775,48	354.696,41	61,2
Total da Diretriz Estratégica 2								6.082.256,98	619.937,66	10,2
47	19	3.Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(3º Ciclo 2014)

48	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE (proposta).	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	47	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2000 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
50	48	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
51	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ingresso dos Servidores Concursados 2013	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo Estratégico 3.1										
52	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 251.373,39	R\$ 251.373,39	100%
53	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
54	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Piano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Melhoria da infraestrutura de comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 133.999,00	R\$ 0,00	0%
57	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Virtualização de recursos de informática.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	0%
58	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%
59	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ml	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo Estratégico 3.2										
Total do Objetivo Estratégico 3.3										
Total da Diretriz Estratégica 3										
TOTAL GERAL										
8.802.023.789,99										
4.800.563.231,60										
54,5										

Posição: 16/09/2014

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2014

ANEXO IV

**Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA 2012-2015**

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(3º Ciclo 2014)

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até mar/14	(b/a) (%)
1	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Concluído	R\$ 115.800,00	R\$ 115.800,00	100%
Total da Ação 20N9 - Programa 2029								115.800,00	115.800,00	100,0
2	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
3	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 892.925.388,15	46%
4	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
5	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 0,00	0%
6	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 42.723.785,57	72%
7	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
8	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
9	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 0,00	0%
10	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
11	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 0,00	0%
12	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 0,00	0%
13	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 28.688.696,90	85%
14	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(3º Ciclo 2014)

15	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
16	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%
17	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 21.755.374,08	75%
18	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 40.423.492,77	75%
19	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
20	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 105.409.597,25	35%
21	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
22	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 13.862.197,00	58%
23	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 0,00	0%
24	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
25	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
26	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
27	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.000,00	R\$ 0,00	0%
Total da Ação 0355 - Programa 2029								8.735.700.392,99	4.784.785.278,54	54,8
28	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Cooperação	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.018.500,00	R\$ 465.202,30	46%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(3º Ciclo 2014)

29	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
Total da Ação 4640 - Programa 2029										
30	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biodiesel no Nordeste Brasileiro: Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	100%
31	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 274.405,33	32%
32	17	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 4.971.999,00	R\$ 0,00	0%
33	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDT-NE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	0%
Total da Ação 8340 - Programa 2029										
34	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
Total da Ação 8689 - Programa 2029										
35	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
36	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
37	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
38	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica.	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 352.840,00	4%
39	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 255.723,17	53%
40	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Malha aeroviária regional	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica.	Cancelado	R\$ 178.440,00	R\$ 0,00	0%
Total da Ação 8902 - Programa 2029										
41	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 0,00	0%
Total da Ação 8917 - Programa 2029										
42	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R\$ 694.459,19	R\$ 556.781,91	80%
Total da Ação 8918 - Programa 2029										
Total do Programa 2029										
43	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
44	13	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 350.978,27	R\$ 186.696,80	53%
Total da Ação 8172 - Programa 2040										
Total do Programa 2040										
45	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE (proposta).	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
46	47	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
47	48	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(3º Ciclo 2014)

48	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ingresso dos Servidores Concursados 2013	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	50	1. Promover a competitividade sistemática da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados, no SICONV, bem como transmitir orientações legais, da fase inicial, à celebração dos Convênios, na área de atuação da SUDENE;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
50	51	1. Promover a competitividade sistemática da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficina, com os convenientes, objetivando transmitir orientações de acompanhamento, execução e Prestação de Contas dos convênios vigentes;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
51	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.482.242,89	R\$ 2.630.114,65	35%
52	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.700.000,00	R\$ 30.000,00	1%
53	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 8.229.186,02	R\$ 5.023.543,17	61%
54	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.892.394,45	R\$ 100.000,00	3%
55	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 251.373,39	R\$ 251.373,39	100%
56	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
57	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Melhoria da infraestrutura de comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 133.999,00	R\$ 0,00	0%
60	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Virtualização de recursos de informática.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	0%
61	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%
62	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total da Ação 2000 - Programa 2111								22.518.845,75	8.519.681,21	37,8
Total do Programa 2111								22.518.845,75	8.519.681,21	37,8
63	19	3.1. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
								0,00	0,00	-
								0,00	0,00	-
Total da Ação Interna										
Total do Programa Interno										
TOTAL GERAL								8.802.023.789,99	4.800.563.231,60	54,5

Posição: 16/09/2014

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2014
