



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

# Indicadores do Monitoramento e Controle da Programação RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

**2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação  
2016**

Recife  
30 de junho de 2016

## Sumário

	Pág.
Introdução .....	3
1 – Resultados do monitoramento .....	5
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) .....	9
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais .....	23
4 – Indicadores de Gestão de Convênios .....	30
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos .....	42
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos .....	45
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) - Resultado out/15 - mai/16	48
8 – Observações e Deliberações em plenária de 30/06/2016 .....	50
9 – Conclusão .....	52
Anexo I – Quadros do monitoramento .....	54
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira até mai/2016 .....	179
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE .....	181
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA .....	187

## Introdução

Reuniram no dia 30 de junho, às 14h30, na sala JK, o Superintendente substituto, Ricardo Barros, o Diretor de Administração, Eugênio Remigio Pacelli, o Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, sua equipe, e demais coordenadores-gerais e equipes da SUDENE para apresentarem, discutirem e deliberarem sobre uma pauta de 19 projetos selecionados de um portfólio de 74 projetos segundo critério de importância e complexidade para mitigação de riscos, melhoria dos controles internos e realinhamento de encaminhamentos.

Segundo a origem, dos 74 POs, 2 são da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI/Superintendência); 10 da Diretoria de Administração (DAD); 29 da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); e 33 apoiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, da Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN). Entre os 19 projetos selecionados, 10 são apoiados por programas finalísticos e 9 são oriundos de atividades internas não-orçamentárias ou de programa de apoio. O referenciais para o enquadramento estratégico foram os mesmos do ciclo anterior. E são as diretrizes e objetivos estratégicos que orientam a execução da programação da SUDENE, juntamente com os Programas e ações do PPA 2016-2019 consignados à Autarquia neste exercício.

A reunião foi aberta pelo Superintendente substituto, que fez um relato de sua passagem por Fortaleza, quando participou de reunião promovida pelo Tribunal de Contas da União, sobre o tema “Desenvolvimento Regional”, que contou com a participação de todos os governadores do Nordeste, registrando a importância e urgência que se constitui o trabalho a ser iniciado pela SUDENE, de elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

O Superintendente também destacou a necessidade de se trabalhar as forças internas para dar celeridade às obras que irão resolver a melhoria da infraestrutura predial.

A foto abaixo mostra o momento da abertura dos trabalhos.



Foto 1 - Abertura, pelo Superintendente substituto, Ricardo Barros, dos trabalhos do 2º Ciclo de Monitoramento interno.

A foto abaixo mostra a abordagem da CGGI sobre a distribuição dos Planos Operativos segundo as unidades internas e status do andamento dos projetos.



Foto 2 - Apresentação das primeiras informações sobre os resultados do ciclo e como os 74 POs estão distribuídos pelas unidades internas.



Foto 3 - Momento em que os gestores apresentam os resultados de suas unidades

## 1- Resultados do monitoramento

### 1.1– Resultados Gerenciais do 2º Ciclo de Monitoramento 2016

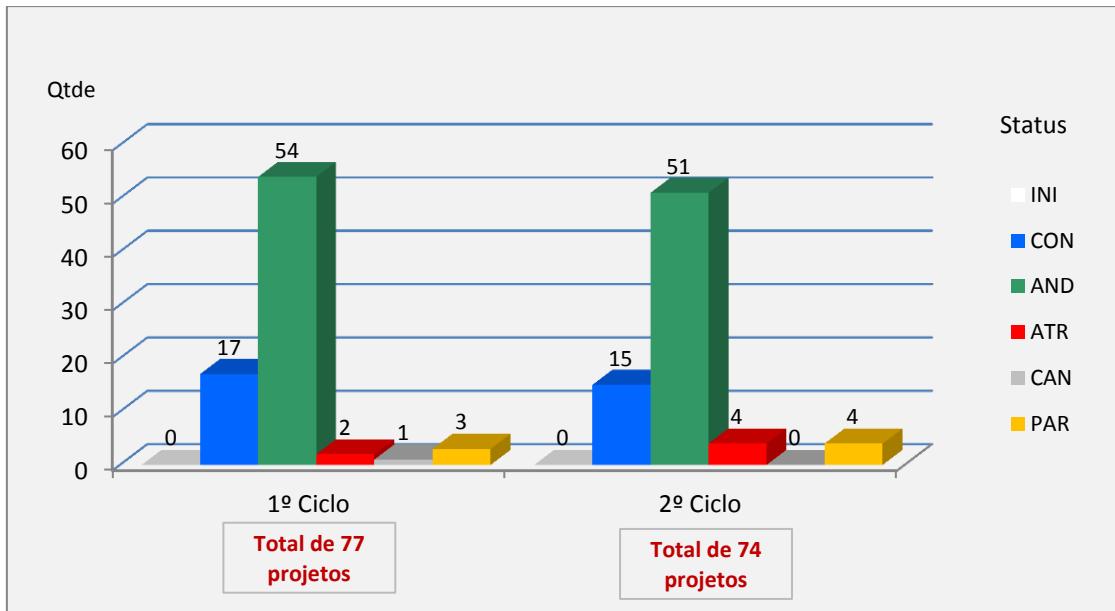


Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2016

O Gráfico acima espelha os resultados entre o 1º e o 2º ciclo de monitoramento, com destaque para um discreto aumento na quantidade de projetos em atraso e paralisados.



Foto 4 - Momento em que o técnico Renato, da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, discutia a situação dos projetos de sua unidade e os encaminhamentos realizados ou a serem trabalhados.

A Tabela 1 adiante, detalha a distribuição dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, os recursos previstos e liberados e o status desses projetos segundo a programação estratégica vigente.

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo  
Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE,  
conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico <sup>1</sup>	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status <sup>2</sup>						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	53	9.683.004,51	6.436.920,79	-	13	37	3	-	-	53
	1.4	3	0,00	0,00	-	2	-	1	-	-	3
	1.5	1	234,11	139,87	-	-	1	-	-	-	1
<b>Sub-Total</b>		<b>57</b>	<b>9.683.238,61</b>	<b>6.437.060,66</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
2	2.2	1	43.290,00	17.238,00	-	-	1	-	-	-	1
	2.3	3	1.825,31	1.182,39	-	-	2	-	-	1	3
	2.4	1	228,80	168,00	-	-	-	-	-	1	1
<b>Sub-Total</b>		<b>5</b>	<b>45.344,10</b>	<b>18.588,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
3	3.1	7	60,00	15,78	-	-	6	-	-	1	7
	3.2	2	1.179,56	1.027,54	-	-	2	-	-	-	2
	3.3	3	21.453,29	9.895,98	-	-	2	-	-	1	3
<b>Sub-Total</b>		<b>12</b>	<b>22.692,85</b>	<b>10.939,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>9.751.275,57</b>	<b>6.466.588,35</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>74</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

**Convenções:**

1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e MIN – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Referência:** 31/05/2016 (2º Ciclo de monitoramento-2016)

Sobre os marcos estratégicos, eles são os mesmos do ciclo anterior.

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo  
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Programa do PPA <sup>1</sup> (Código)	Ação do PPA <sup>1</sup> (Código)	Projetos enquadrad ados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	33	9.662.099,20	6.428.104,70		12	18	3			33
	20N7	3	1.649,00	417,15			3				3
	20WQ	3	1.814,70	1.314,70			3				3
	4640	1	1.069,87	326,62			1				1
	8689	3	1.825,31	1.182,39			2			1	3
	8902	9	12.831,99	3.448,81			9				9
	8917	1	207,54	107,35			1				1
	8340	3	3.882,02	3.657,02			3				3
	7K66	1	250,00	250,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>57</b>	<b>9.685.629,62</b>	<b>6.438.808,75</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>57</b>
2040	8172	1	228,80	168,00							1 1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>228,80</b>	<b>168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2111	2000	10	22.127,15	10.373,60			9			1	<b>10</b>
<b>Sub-Total</b>		<b>10</b>	<b>22.127,15</b>	<b>10.373,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
2069	-	1	43.290,00	17.238,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>43.290,00</b>	<b>17.238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ações Internas		5	0,00	0,00		3		1		1	4
<b>Sub-Total</b>		<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>9.751.275,57</b>	<b>6.466.588,35</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>74</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Convenções:**

1– Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação;7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.


2-INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


**Referência:** 31/05/2016 (2º Ciclo de monitoramento-2016)

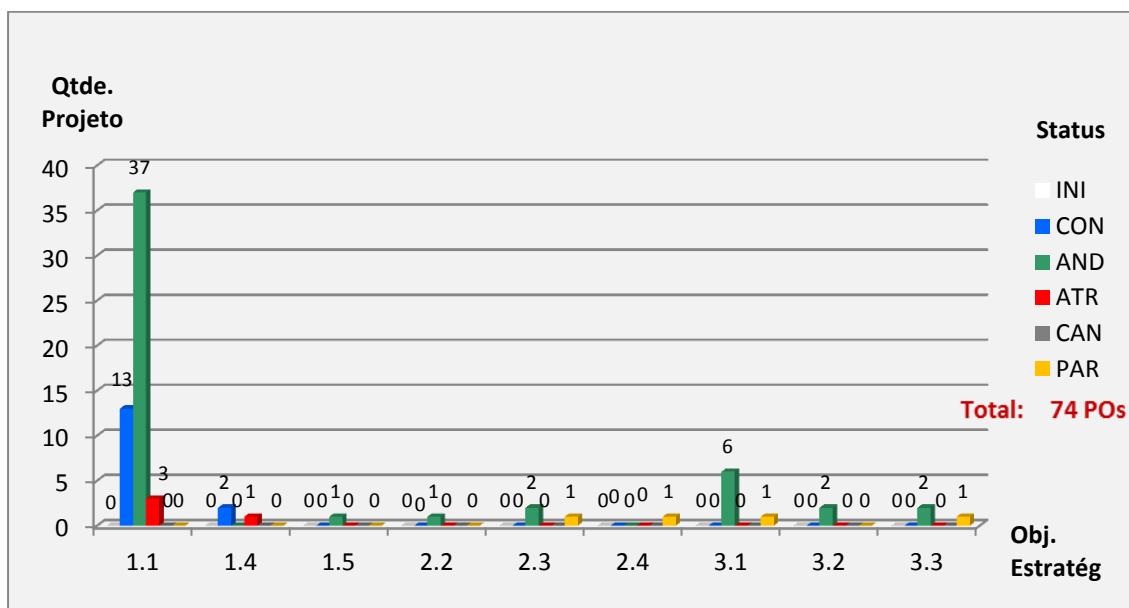

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

**Convenções:** **Obj. Estratégicos:** **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

**Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º Ciclo – 2016)**

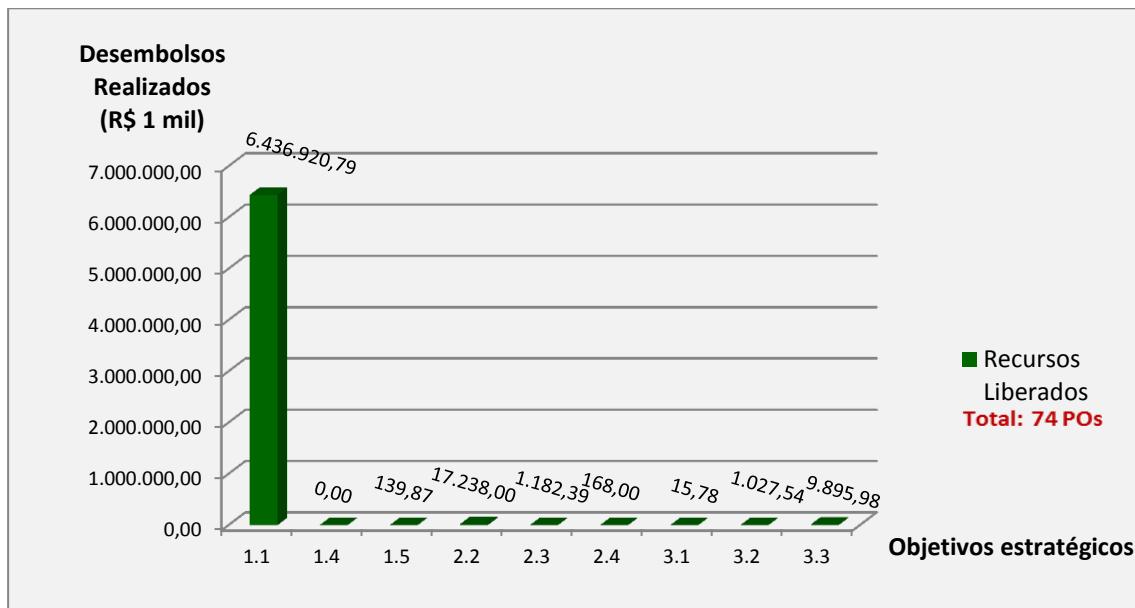

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º ciclo 2016)**

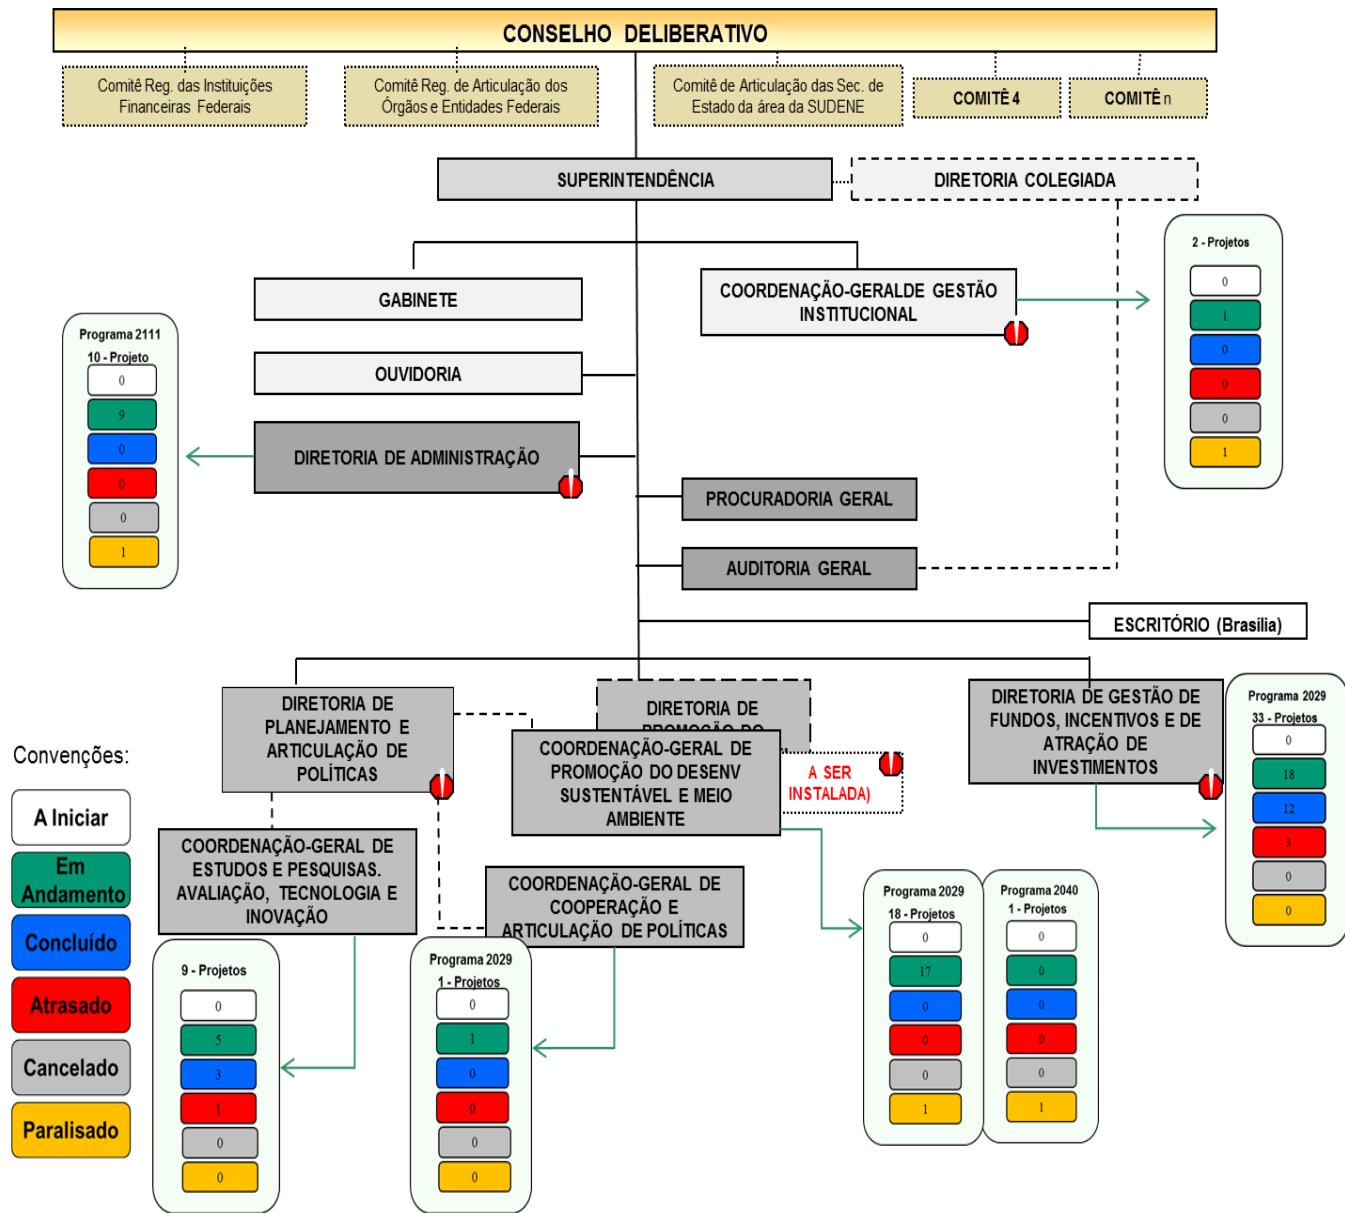


Diagrama 1 - Distribuição dos 74 Planos Operativos na Estrutura da SUDENE

## 2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

### 2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC))

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{8 \times 100}{8} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %

- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: Não foi informado
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica

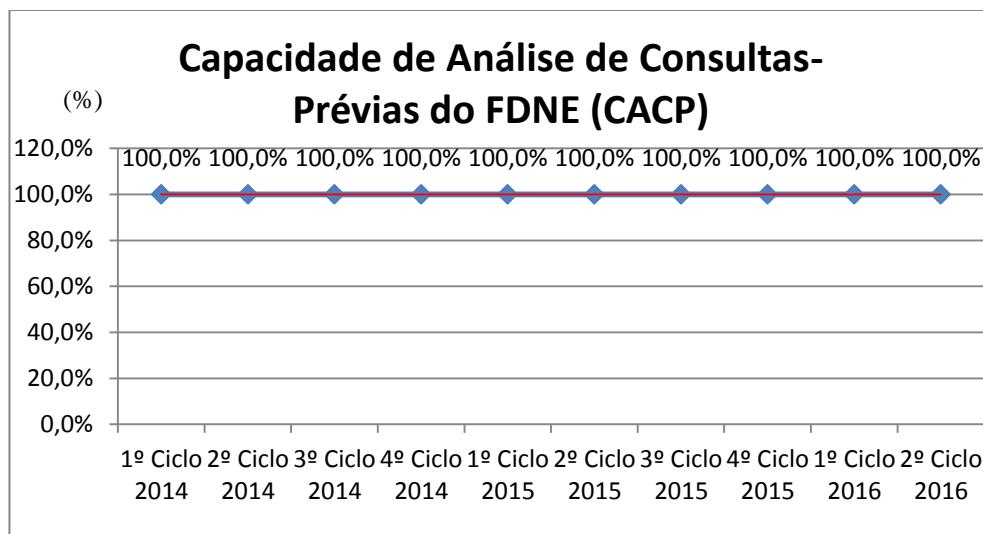

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### Nota:

<sup>1</sup> até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.


#### 2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{8}{6} = 1,33$  análises/técnico

- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: -
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	3,57 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,43 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	1,67 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	4,5 análises/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	5,7 análise/técnico	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

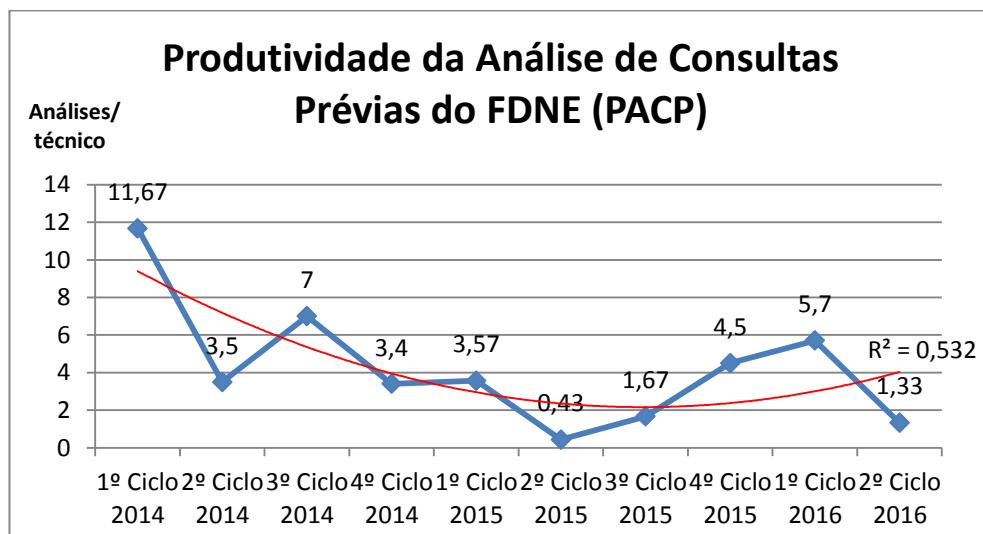

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


A tendência de melhoria da produtividade na análise de consultas-prévias, representada pela linha vermelha do gráfico, é consequência não apenas do aumento do número de técnicos no setor, em que pese o papel exercido pelo agente bancário operador nesse processo, mas também da redução da demanda durante 2015, consequência, em parte, do recuo da classe empresarial diante da retração da economia, da perda de poder aquisitivo da população que freou o consumo e consequentemente a produção, e do encarecimento do custo do crédito. Portanto, nesse momento, é um resultado que precisa ser analisado com cuidado.

### 2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{5}{8} = 62,5\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	63%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

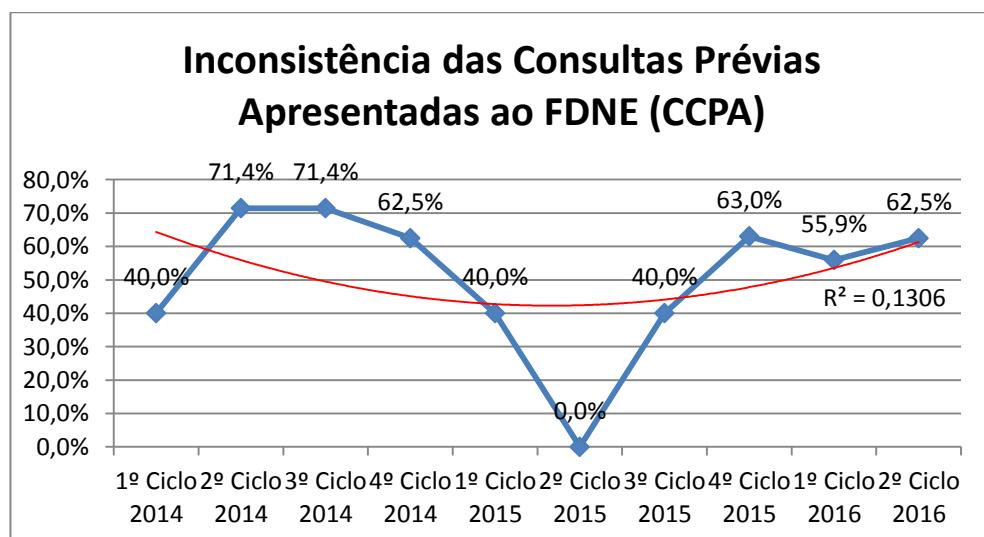

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

<sup>1</sup> Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do

prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

Atenção: A partir deste 4º ciclo o título do indicador passou a se chamar “Inconsistência das Consultas Prévias apresentadas ao FDNE (CCPA)” por adequar-se mais apropriadamente ao resultado apresentado.

## **2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)**

### **a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB**

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

### **a.2) Banco do Brasil – BB**


$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{110 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,22$$

### **a.3) Caixa Econômica Federal - CEF**

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): .... (igual ou menor que 1 (um))
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

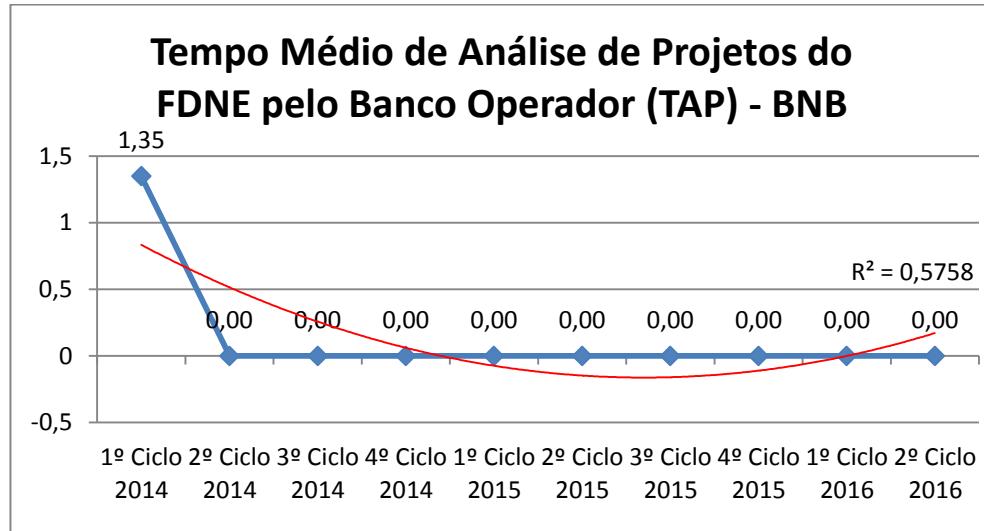


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

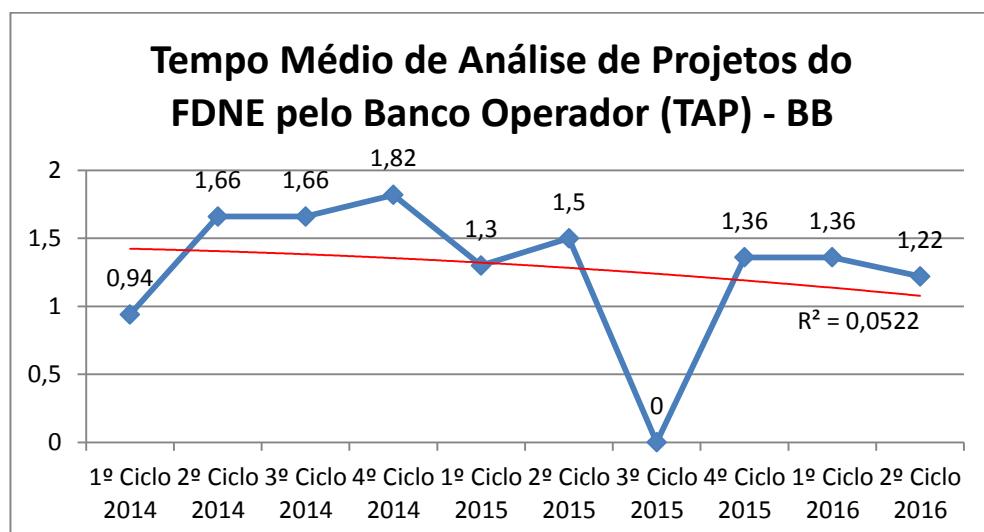

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

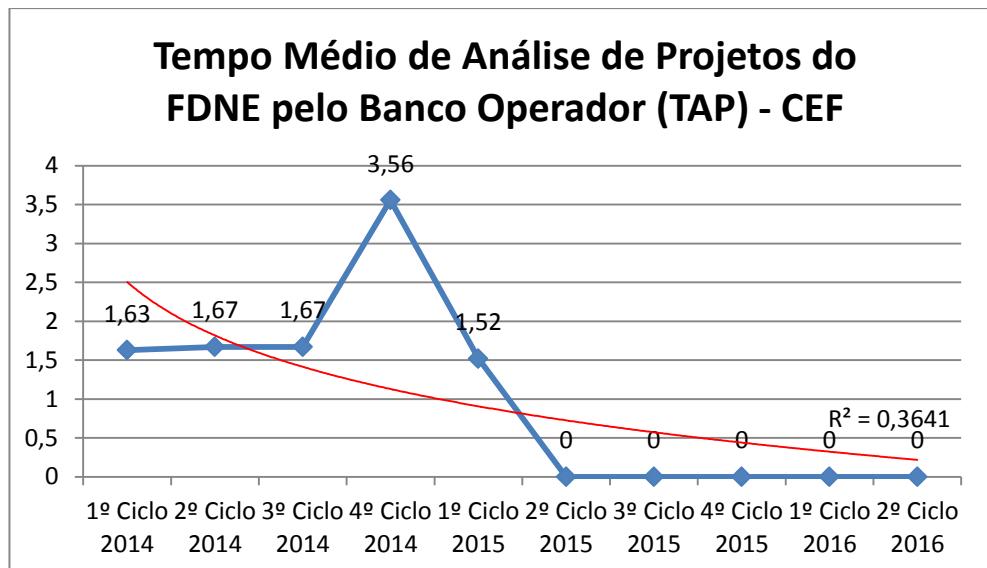

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### Notas

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

## 2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-**IPEP**)

### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

### a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{1} = 42,9\%$$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.

### a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$


- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016

f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.

g) Resultados anteriores:


Jan a Dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

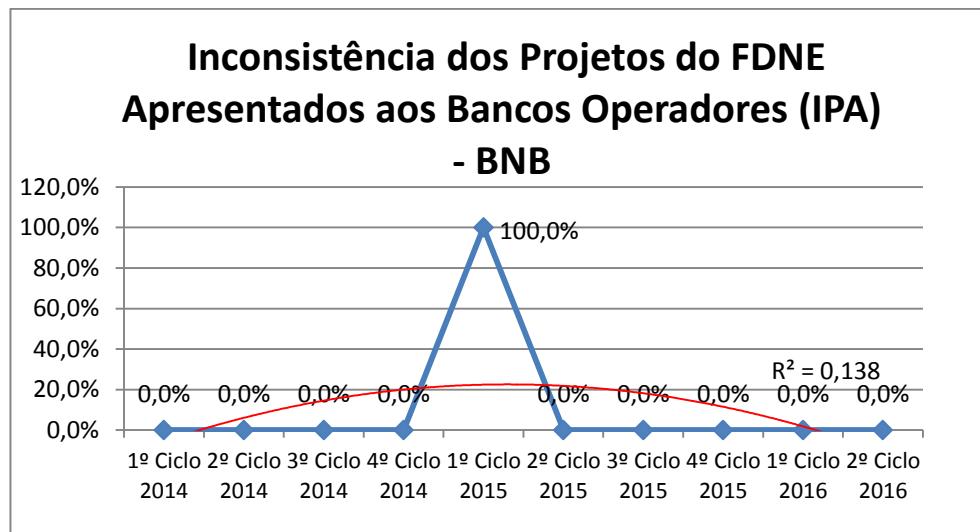


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

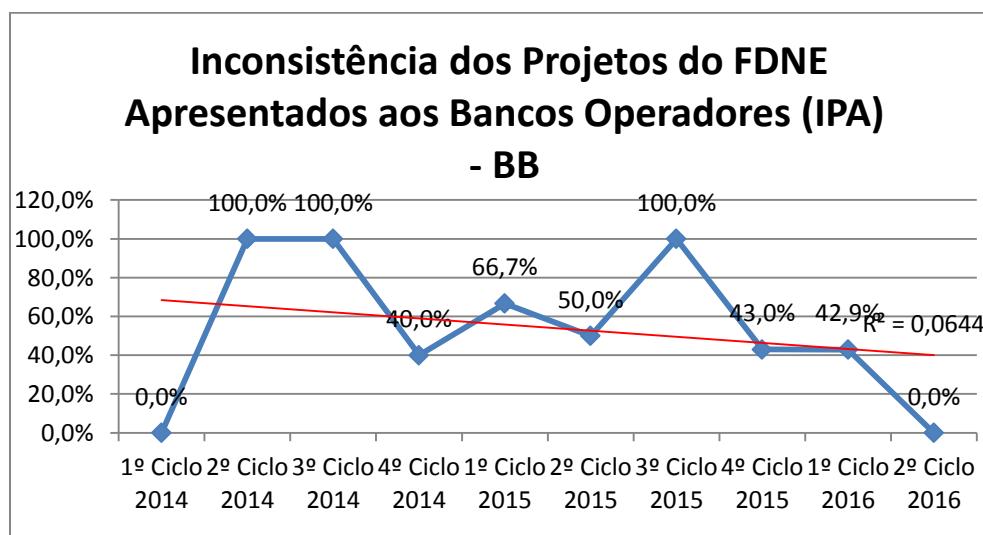

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

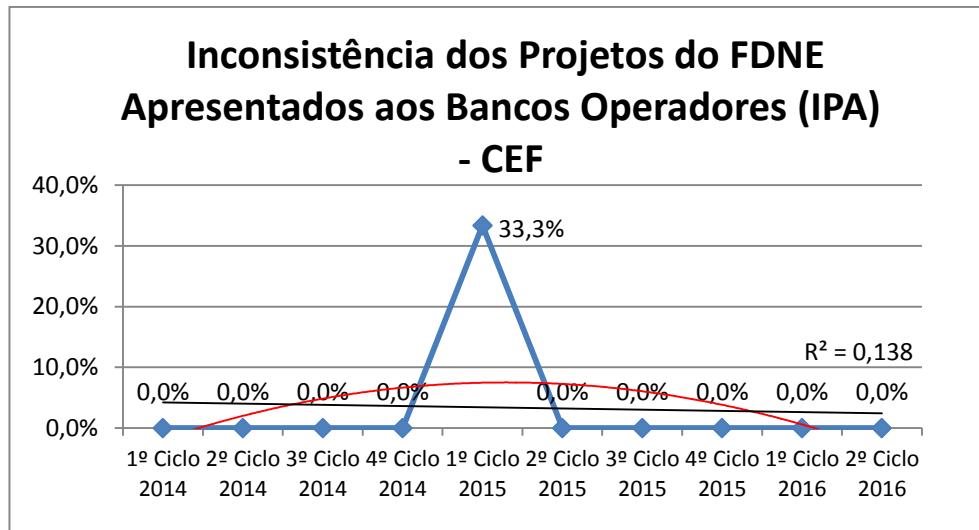

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- Fórmula:  $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2015} \times 100}{\text{Dotação LOA 2015}} = \frac{0,00}{1.895.911.874,00} = 0,00\% \%$
- Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- Resultado ideal (%): 100,00 %
- Periodicidade: Jan-maio/2016
- Comentários: Não informado.
- Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	19,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

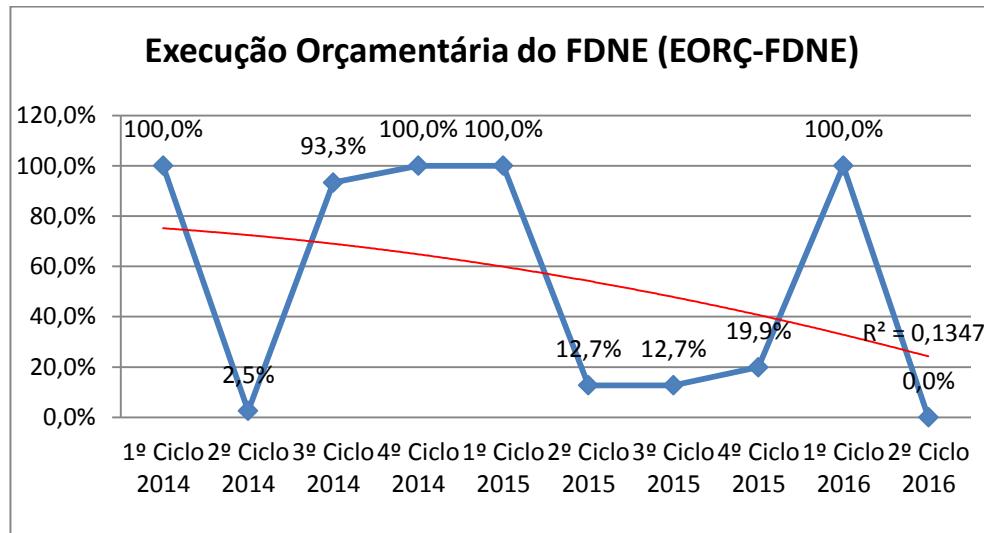

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


## 2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- Fórmula:  $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{284.940.218,20 \times 100}{4.983.840.165,08} = 5,70\%$
- Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- Resultado ideal (%): 100,00 %
- Referência da aferição: Jan-maio/2016
- Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	17,74%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

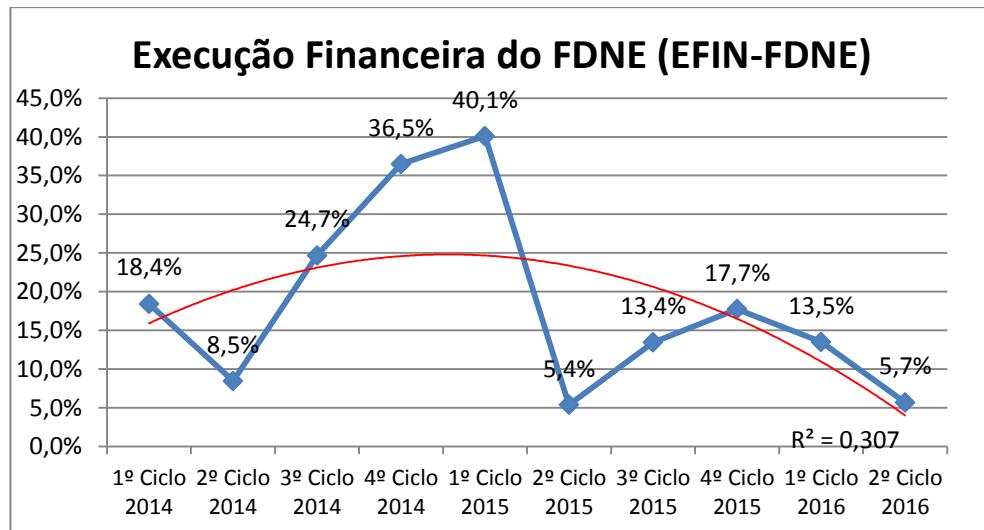

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula:  $\frac{M_1}{30 \text{ dias}} = \frac{30}{30} = 1$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-maio/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0,58	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

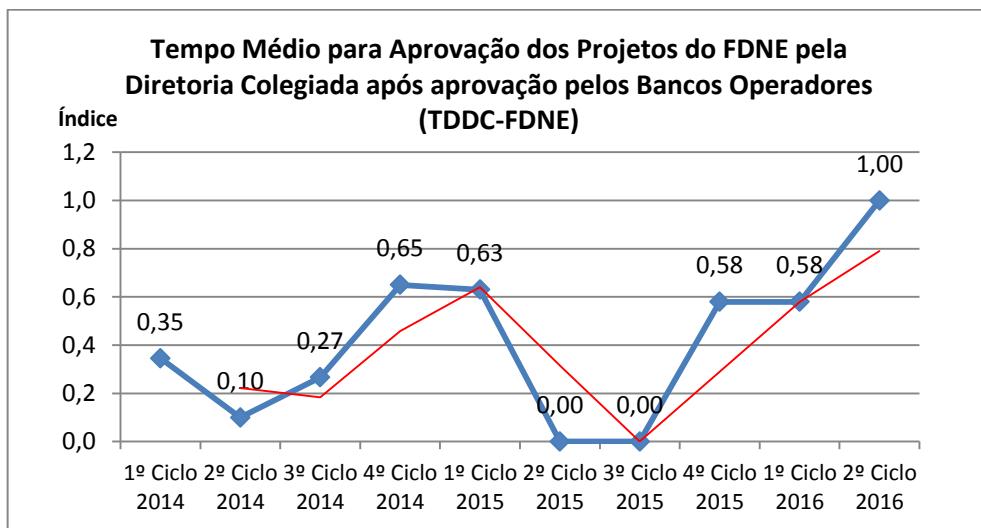

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### Convenção:

**M<sub>1</sub>** – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

### Nota:

<sup>1</sup> 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.


### 2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula:  $Tm = \frac{T}{N} = \frac{746}{2} = 373$  dias/financiamento aprovado

- b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	295,34 dias	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

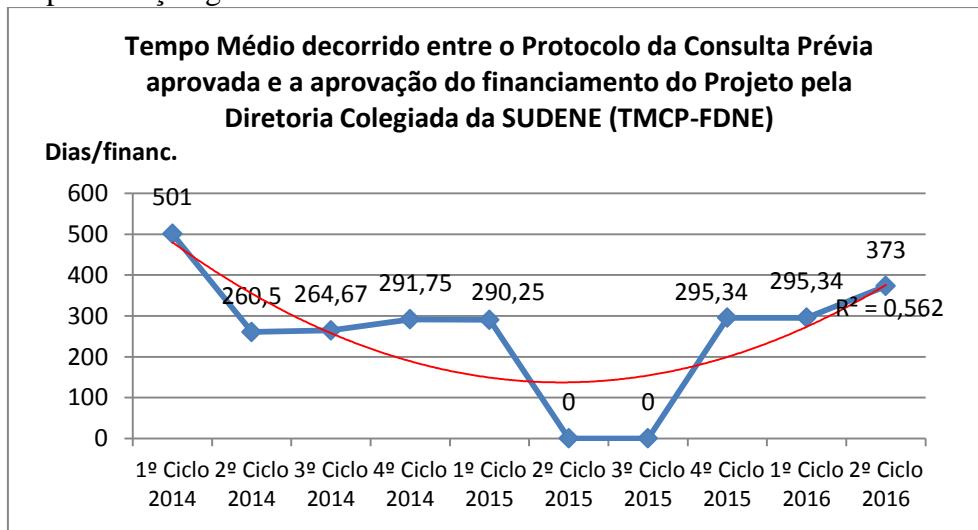

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

## 2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{2}{2} = 1,00$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-maio/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	1,0	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

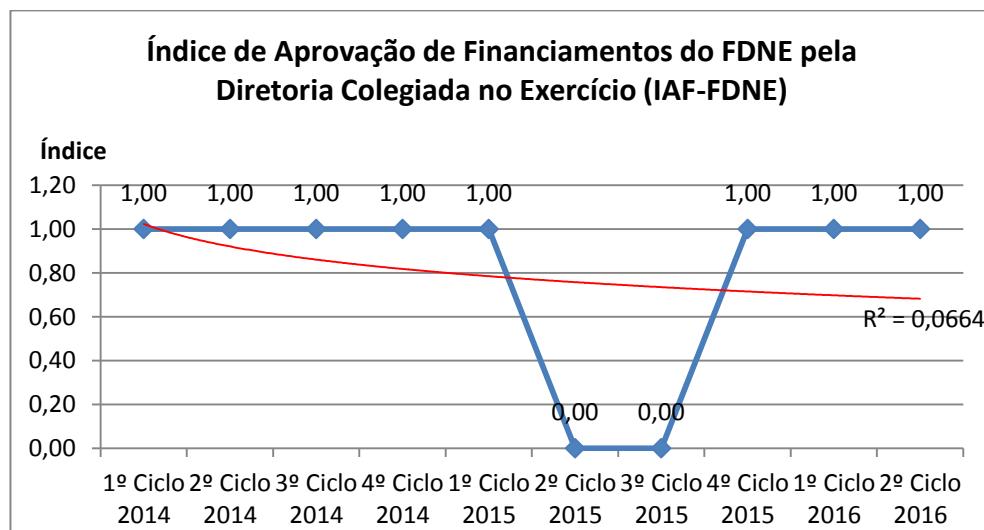

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**Nota:** resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

### 3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

#### 3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{T_1}{N} = \frac{3.141 \text{ dias}}{40 \text{ pleitos}} = 78,5 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan- maio/2016
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2016 e encerrado em 31 de maio de 2016, foram **vistoriados 40 estabelecimentos dos 95 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 78,5 dias**. O resultado foi basicamente afetado pelo período de férias uma vez que somente 4 processos dos aprovados no período foram vistoriados em fevereiro, por se localizarem em Pernambuco e não depender de passagens aéreas. Nada obstante, 3 processos cujo prazo médio entre a formalização e a vistoria alcançou 214 dias também contribuíram para esse resultado.

Em comparação com igual período de 2015, o atual resultado foi menos favorável, uma vez que o **Tempo Médio de Espera dos 5 primeiros meses de 2015 foi de 74 dias**.

Importante também ressaltar que em 2015, conforme destacado no relatório de monitoramento de período outubro 2015 a março de 2016, “**o resultado foi basicamente afetado por questões de restrição orçamentária vivenciada pela SUDENE ao longo do segundo semestre de 2015, situação somente regularizada a partir do mês de novembro de 2015**”.

Por conta disso é que dos 29 pleitos ingressados em 2015, apenas 3 foram vistoriados naquele ano. Os demais 26 somente foram vistoriados em 2016 e a partir do mês de março, quando normalmente são reiniciadas as viagens.

Convenções:


$T_1 = \Sigma$  do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	72,9 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	73,7 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	92,30 dias/pleito	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

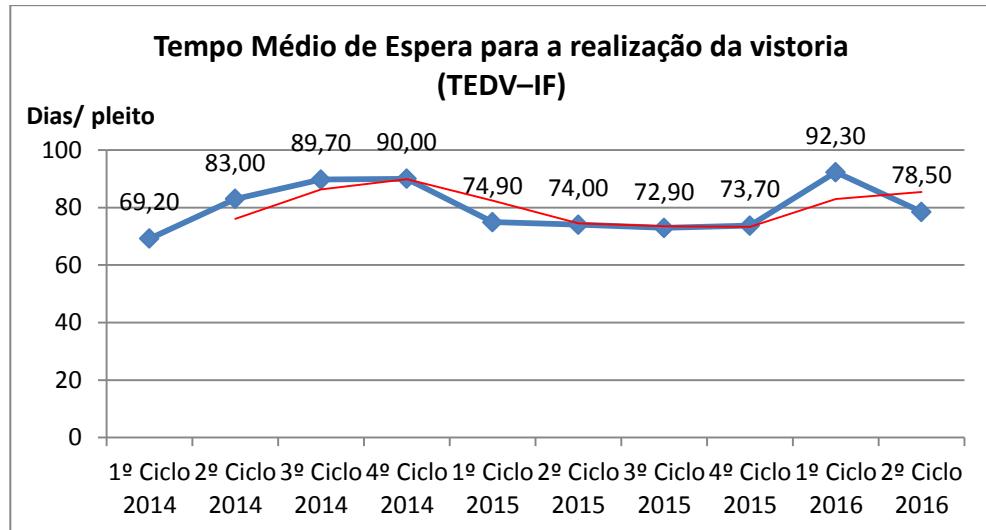

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

$T_1 = \Sigma$  do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

### 3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF\_UF-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período}}{\text{Pleitos protocolados no período}} \times 100 = \frac{0 \times 100}{127} = 0,0\%$


b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição.

Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan- maio/2016
- f) Comentários: Não informado pela unidade.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0,00%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

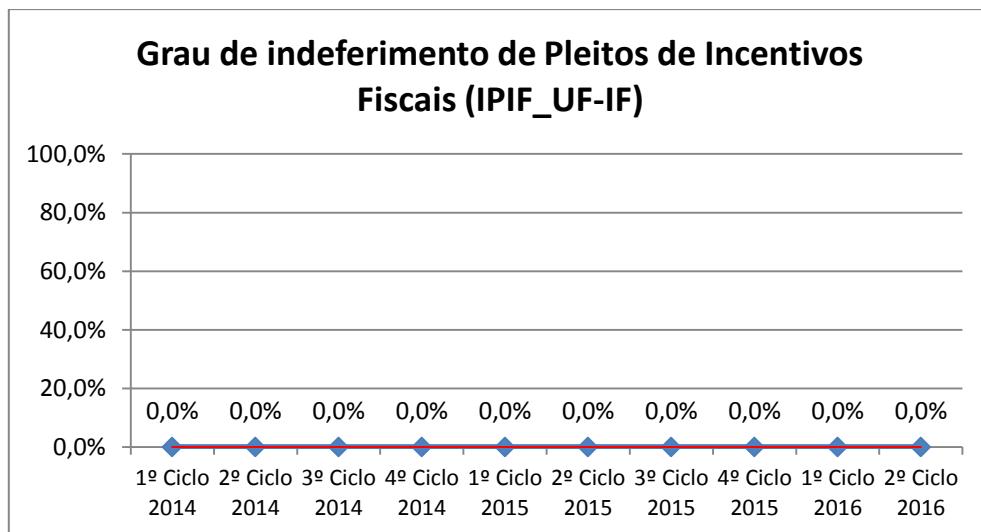

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência no tempo.

#### Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

### 3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)


a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}}$

$$\frac{71 \times 100}{127} = 55,9 \%$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan- maio/2016
- f) Comentários: no período, foram concluídas 71 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 55,9% dos pleitos ingressados.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	60,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

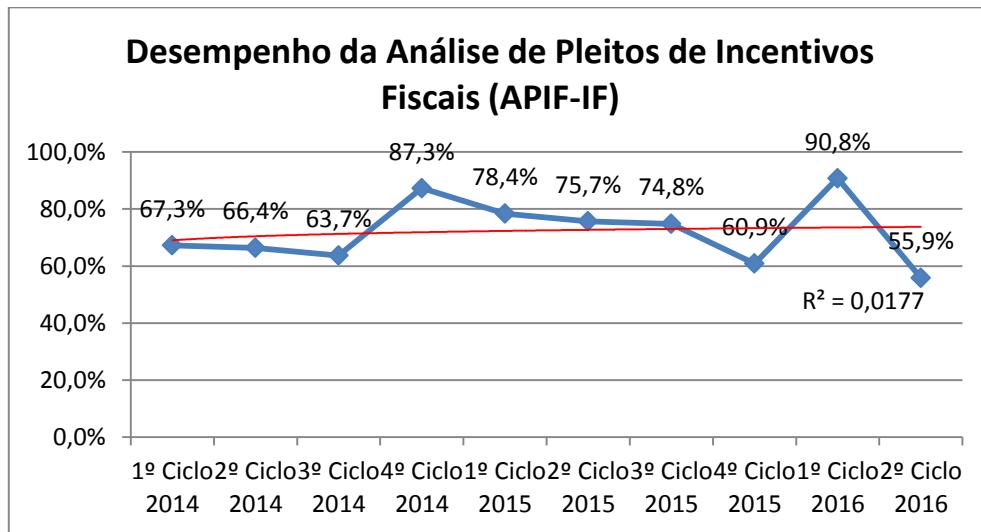

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### 3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{T_1}{N} = \frac{7.065}{71} = 99,5$  dias/pleito
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: Jan- maio/2016
- f) Comentários: o prazo médio observado, de **99,5 dias** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros cinco meses de 2016 (71). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 111,4 dias, sendo de 76,2 dias para os processos de reinvestimento.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	94,05 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

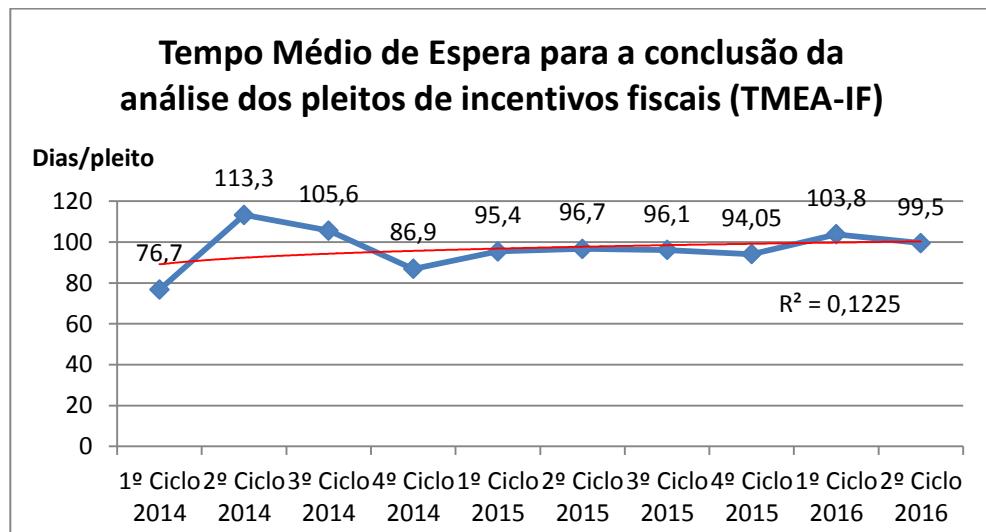

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

T1 =  $\Sigma$  do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.


### 3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{71}{21} = 3,4$  análises por técnico
- Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- Periodicidade: Jan- maio/2016
- Comentários: o número observado, de 3,4 análises por técnico, é compatível com o número de técnicos que atualmente compõe a equipe, tendo em vista o ingresso de novos servidores decorrente do último concurso.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	14,4 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	9,6 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	15 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	21,6 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	29,8 análise/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,5 análise/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	15,1 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	8,3 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	9,9 análise/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	16,5 análise/técnico	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

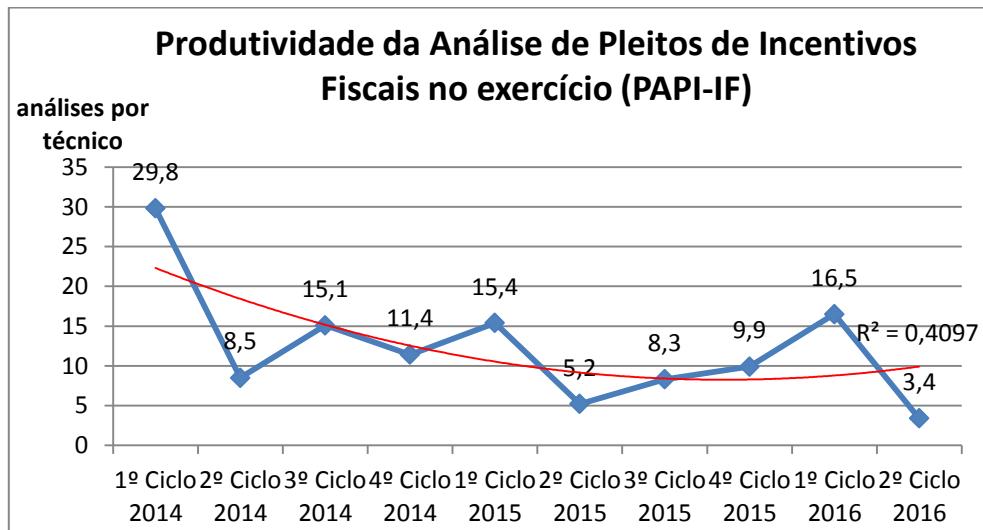

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### 3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$


$$= \frac{40}{10} = 4 \text{ vistorias/equipe}$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): .....(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan- maio/2016
- f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 58 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vistorias/equipe	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	7,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	8,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	20,1 vistorias/equipe	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

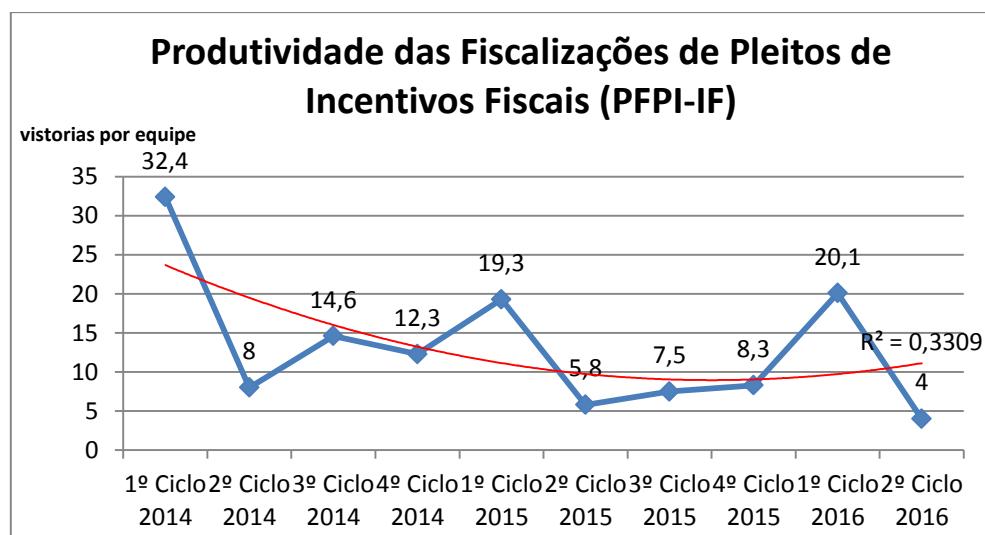

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

## 4 - Indicadores de Gestão de Convênios

### 4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{24 \times 100}{24} = 100\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: Jan-maio/2016.

f) Comentários: Houve o recebimento de 24 propostas, das quais 24 foram analisadas. Das propostas recebidas, 18 são convênios, 5 são TEDs e uma é uma proposta de Acordo de Cooperação Técnica.

h) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	93,75%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016

g) Representação gráfica:

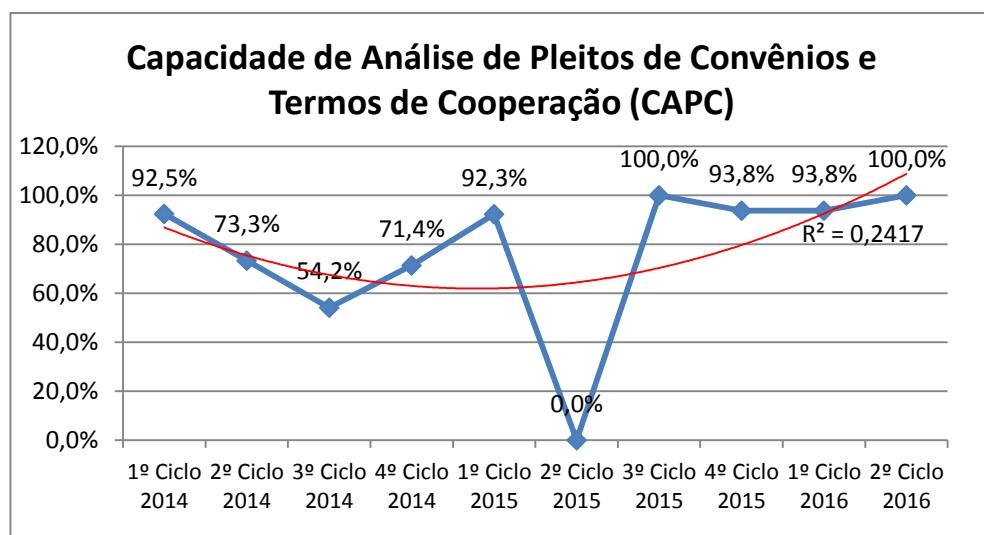

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{13 \times 100}{24} = 54,17 \%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-maio/2016.

f) Comentários: Foram analisadas 24 propostas, das quais 13 foram aprovadas, 6 rejeitadas, 5 em complementação.

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	40%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

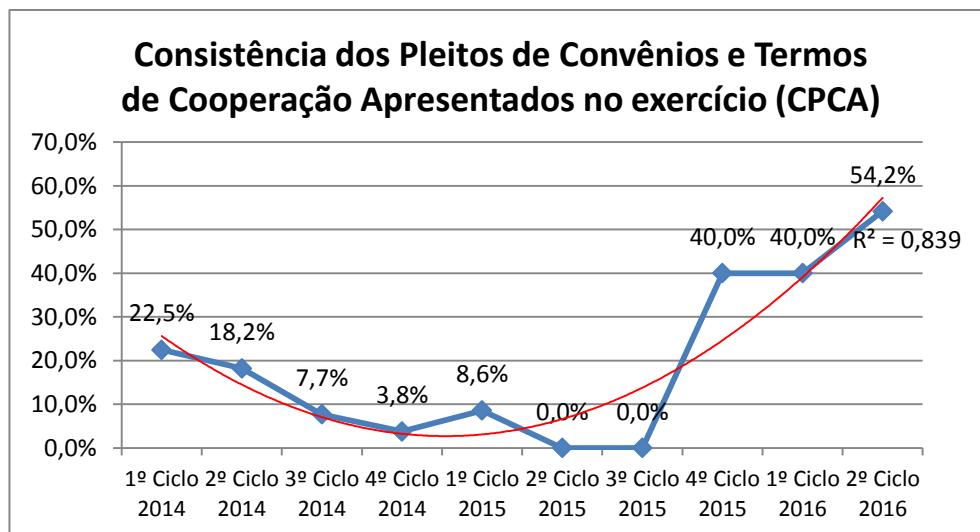

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc. x 100 =  
Pleitos protocolados no exercício

$$= \frac{6}{24} \times 100 = 25 \%$$


b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Período da aferição: Jan-maio/2016.
- f) Comentários: Foram analisadas 24 propostas, das quais 6 foram rejeitadas.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	56,25%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

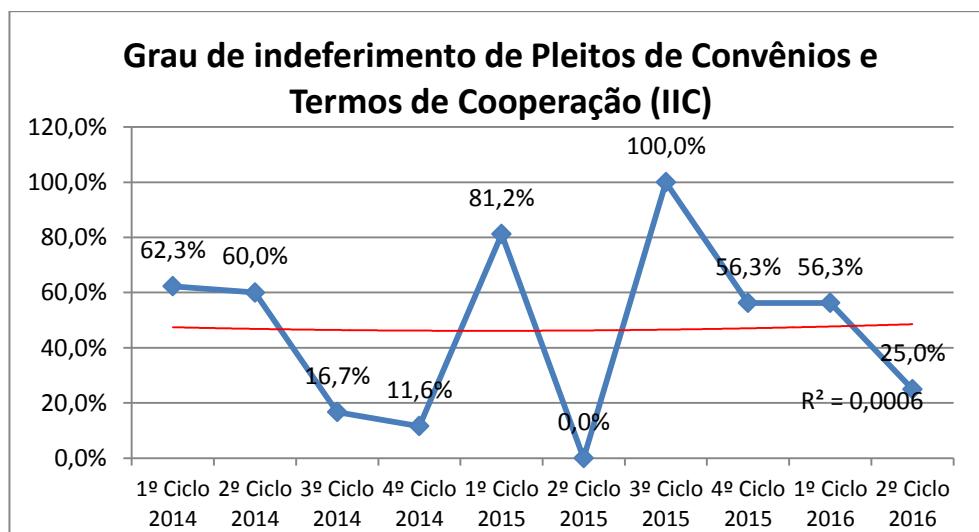

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

#### 4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{4 \times 100}{4} = 100 \%$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-maio/2016.

f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 5 viagens de acompanhamento dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral. Devido à restrição orçamentária, não foi possível a realização das viagens programadas.

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	47,22%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

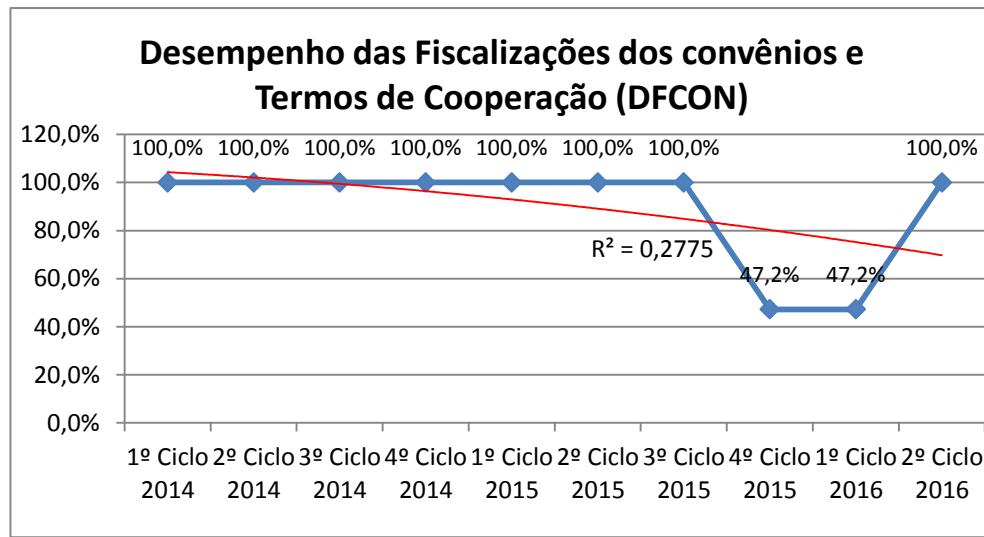

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada, entre janeiro e maio de 2016.

**ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE**  
**JANEIRO A MAIO 2016**

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião de acompanhamento dos TEDs (eólica) com o Centro de Energias Renováveis // SUDENE	08 março	Recife	Maria Helena e Isis
Acompanhamento de TED Mulheres na Construção Civil	06 de abril	Paraíba – João Pessoa	Macira e Givanildo
Acompanhamento de Convênio Goiana no Seminário Norte Metropolitano e Mata Norte - Desafios e oportunidades	28 de abril	Igarassu	Teresa, Vera, Maria Helena
Acompanhamento de TED Construindo com Mulheres	14 a 15 de maio	Alagoas - Maceió	Macira e Givanildo

**PROPOSTAS RECEBIDAS - JANEIRO A MAIO / 2016**

Entre janeiro e maio de 2016, a coordenação recebeu via SICONV 18 propostas, todas relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”, na ação 7K66 , referentes à emendas parlamentares da bancada do Rio Grande do Norte. Além disso, foram recebidas 5 propostas para Termos de Execução Descentralizada e uma proposta de Acordo de Cooperação Técnica.

**4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)<sub>Conv</sub>**

a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = 0 \text{ dias/pleito}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-maio/2016

f) Comentários: entre jan. e mai/2016, a SUDENE recebeu 18 propostas, das quais 12 (doze) se converteram em pré-convênio, iniciando assim a fase pré-celebratória, o que não implica, necessariamente, em celebração. A tabela abaixo ilustra o ocorrido:

Situação das propostas apresentadas pelo Rio Grande do Norte a partir da emenda parlamentar:


<b>SITUAÇÃO</b>	<b>Total Geral</b>
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados	12
Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise	1
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico	5
<b>Total geral</b>	<b>18</b>

Ainda não é possível calcular o índice em questão, pois não houve a celebração propriamente dita.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

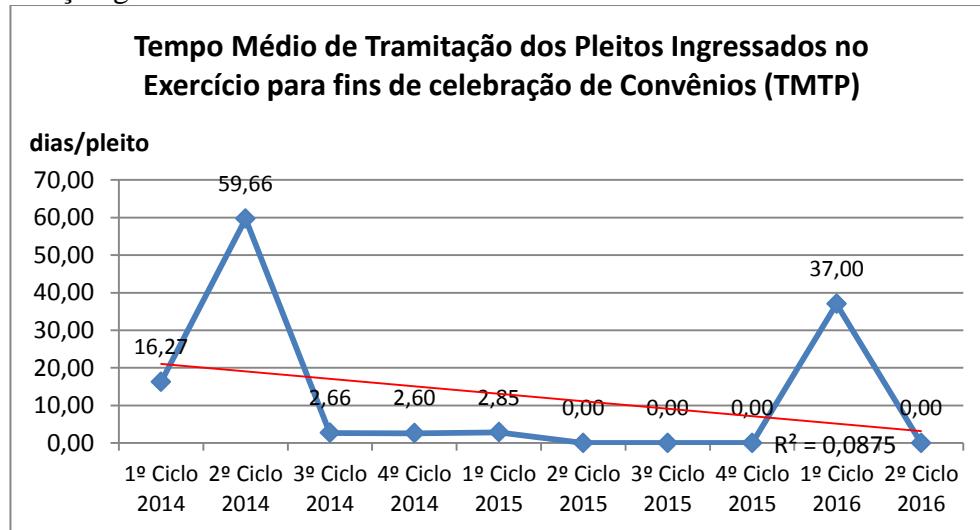

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua [celebração](#) (assinatura pelas partes).

**Notas:**

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;

- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.


#### **4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)**

- a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = 0 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: Entre Janeiro e maio/2016 não houve celebração de TED.

- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	39,25 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

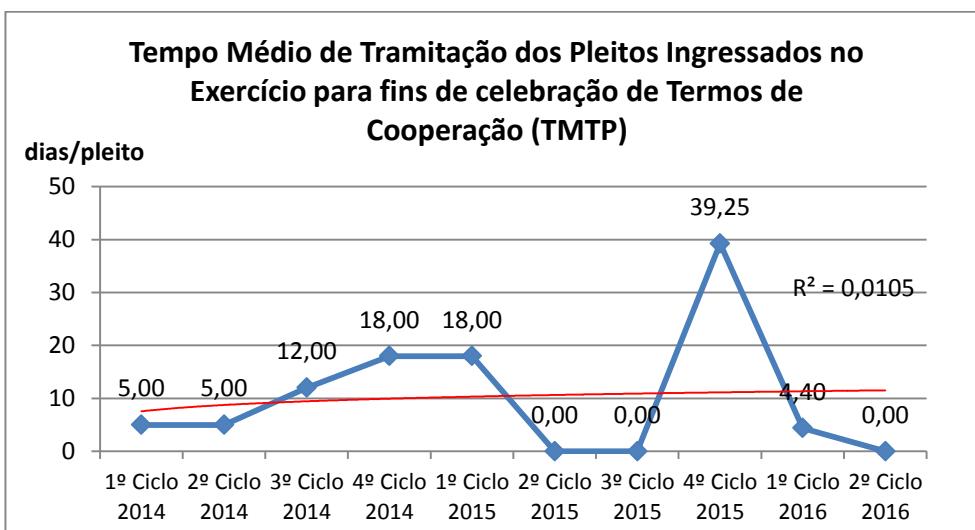

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.  
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

#### Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

### **4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo**

#### a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{Convênios\_a\_Aprovar_{FINAL}}{Convênios\_a\_Aprovar_{INICIAL}}$$

Valor do índice no ciclo:  $IPCA (\%) = 100 \times \frac{30}{30} = 100\%$

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado Ideal (%): .....% (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: A localização dos convênios na condição “A Aprovar” no SIAFI em mai/2016 é:

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENENTE	VALOR	SIT. MOT	LOCALIZAÇÃO
1993	069547	SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	6.044.165,46		CGC
1995	135783	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	10.800.000,00		CPTCE
1996	312117	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.700.000,00		CGC
1996	317428	FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	65.000,00		CGC
1996	317554	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000.000,00		CGC
1997	337849	INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRO	250.000,00		CGC
1997	338364	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		CPTCE
1997	338425	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	512.500,00		CPTCE
1997	338444	ESTADO DE MINAS GERAIS	395.964,79	I.SU 310	CPTCE
1997	338456	ASSOCIACAO CEARENSE DE ESTUDOS E PE	90.000,00		CGC

Continua

1997	338464	ESTADO DA PARAIBA	219.800,00		CPTCE
1997	338496	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	2.000.000,00		CPTCE
1997	338502	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	2.000.000,00		CPTCE
1998	339202	ESTADO DE PERNAMBUCO	150.000,00		CGC
1998	348985	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		CPTCE
1998	363977	ESTADO DE MINAS GERAIS	884.000,00		CGC
1998	368374	MUNICIPIO DE ASSARE	1.521,02		CPTCE
1998	368485	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	52.066,80	I.SU 306	CPTCE
1998	368496	CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECN	124.802,00		CGC
1998	368525	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTE	139.000,00		DPLAN/CGDS
1998	368547	FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVE	150.000,00		CGC
1998	368692	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA	24.000,00		DESAPARECIDO
<b>1999</b>	<b>374633</b>	<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA (*)</b>	<b>20.000,00</b>		<b>CGC</b>
1999	383671	ESTADO DO PIAUI	300.000,00		CPTCE
2000	399481	ASSEMP-ASSOC DAS EMP DE PLAN E CONS	30.000,00		CGC
2000	402702	FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO	132.500,00		CGC
2000	406357	ASSOCIACAO ALFASOL	3.000.000,00		AUD
2000	406376	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO EST	46.000,00		CGC
2000	406570	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	952.000,00		CPTCE
2000	407086	INSTITUTO ANTHROPOS	156.000,00		CGC

(\*) OBS: foi localizado na CGEP

Resumindo a tabela acima, temos:

LOCALIZAÇÃO	Quantidade de Convênios	Soma de Valor (R\$)
CPTCE	12	17.533.852,61
DESAPARECIDO	1	24.000,00
CGC	16	15.842.467,46
DPLAN/CGDS	1	139.000,00
AUD	1	3.000.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>31</b>	<b>36.539.320,07</b>

Entre janeiro e maio/2016 não houve variação no estoque de convênios com situação “A Aprovar”.


Os convênios supra na verdade deveriam estar em outras condições no SIAFI, mas não estão por força de decisão judicial (os que estão na CPTCE, na AUD e CGC). 1 ainda aguardam emissão de Laudo Técnico (DPLAN/CGDS), e 2 ainda estão sendo procurados na casa.

f) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015

Jan a Ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016

g) Representação gráfica:

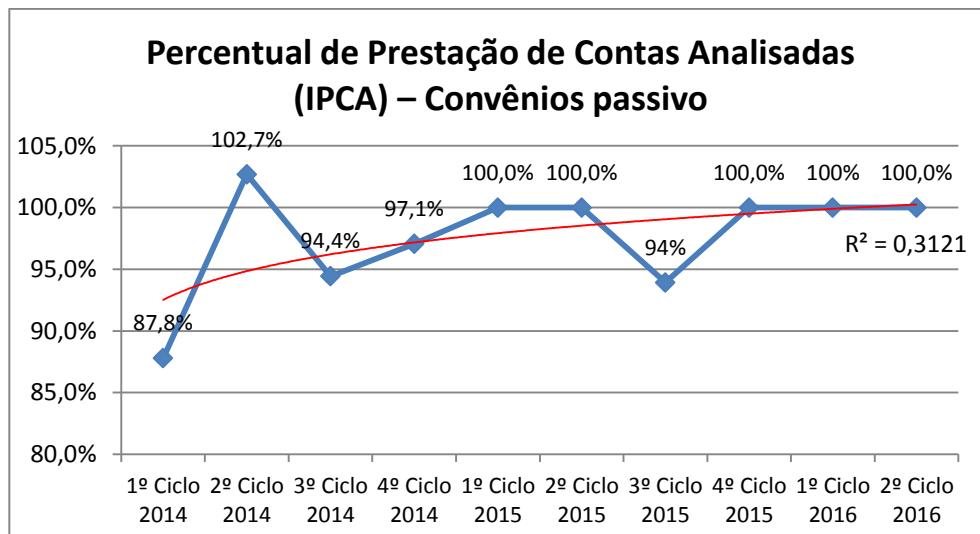

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE e SIAFI.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula:  $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios\_a\_Aprovar_{FINAL}}{Convênios\_a\_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo:  $IPCA (\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{9}{15} = 60\%$

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado Ideal (%): .... % (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016


- f) Comentários: De um total de 15 convênios em execução em 01/01/2016, 6 tiveram suas contas aprovadas até 31/05/2016, conforme mostra a tabela abaixo.

SICONV	Convenente	UF	Status em 01/01/2016	Status em 31/05/2016
744427/2010	JOSE DA PENHA PREFEITURA	RN	Em Execução	Aprovado
746462/2010	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SERIDO	RN	Em Execução	Aprovado
750323/2010	MUNICIPIO DE ASSU	RN	Em Execução	Aprovado
769783/2012	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	PE	Em Execução	Aprovado
769784/2012	ESTADO DA PARAIBA	PB	Em Execução	Aprovado
770355/2012	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	CE	Em Execução	Aprovado
813986/2014	EMEPA	PB	Em Execução	Em Execução
813695/2014	SERHMACT	PB	Em Execução	Em Execução
813665/2014	SEC. MUN. TRAB. ABAST. E ECONOMIA SOLIDARIA	AL	Em Execução	Em Execução
813604/2014	SEAD	PB	Em Execução	Em Execução
794329/2013	CONDEPE-FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
792551/2013	CONDEPE-FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
789013/2013	PREF. SABOEIRO	CE	Em Execução	Em Execução
769782/2012	CONDEPE-FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
822608/2015	SEMAS	PE	Em Celebração	Em Execução

- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	130%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	87,5%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

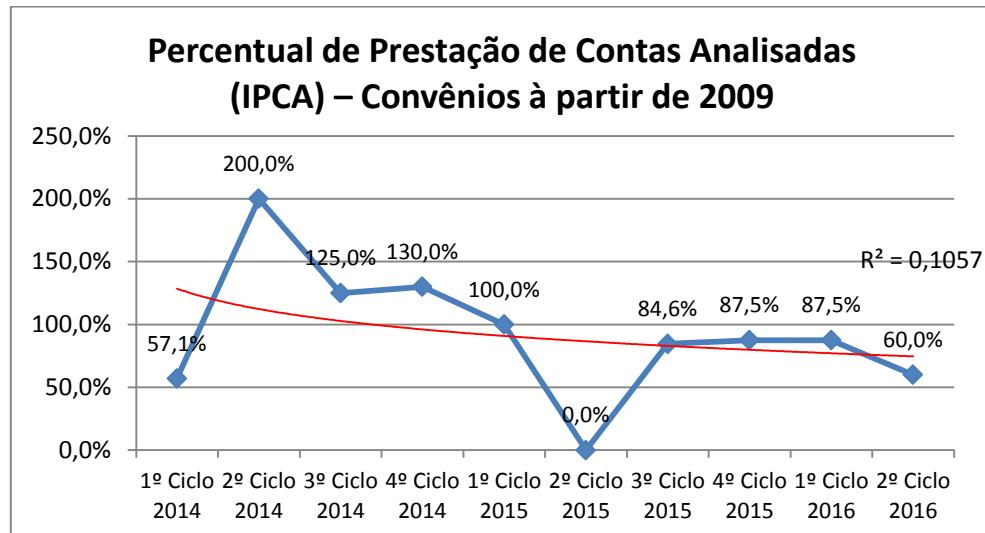

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos


### 5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- Fórmula:  $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{87 \times 100}{200} = 43,5\%$
- Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- Resultado Ideal (%): 100 %
- Período da aferição: Jan-maio/2016
- Comentários: A meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores foi parcialmente atingida, alcançando 87 (oitenta e sete) servidores, representando 43,5% da meta. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 165 (cento e sessenta e cinco) inscrições efetivamente realizadas.
- Resultados Anteriores (CSE):

Jan a Dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	60%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015

Jan a Ago/2015	48%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	69%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

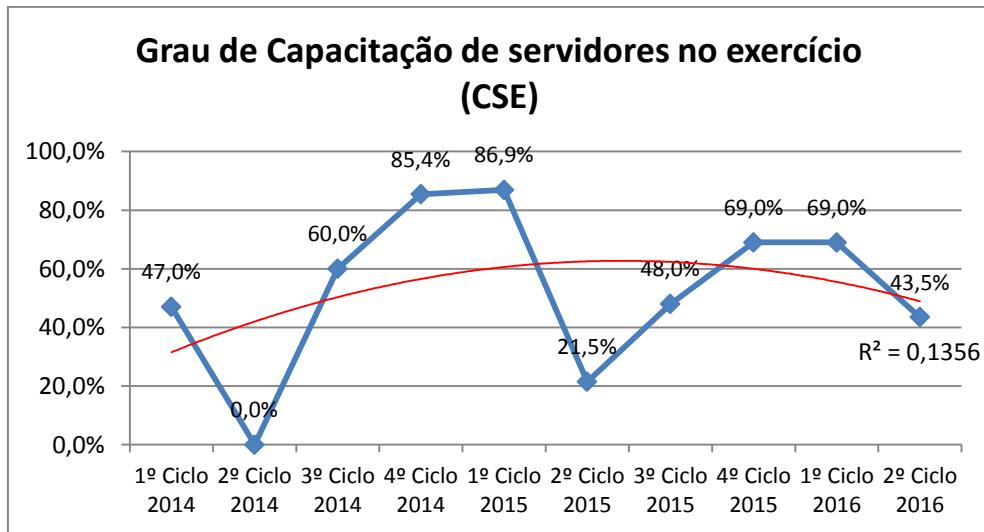

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


## 5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{22 \times 100}{50} = 44\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-maio/2016
- f) Comentários: Foram realizados 22 (vinte e dois) eventos de capacitação, priorizando os cursos *in company* e na cidade do Recife.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	90%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	102%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	180%	4º ciclo 2015

Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
----------------	------	---------------

h) Representação gráfica:

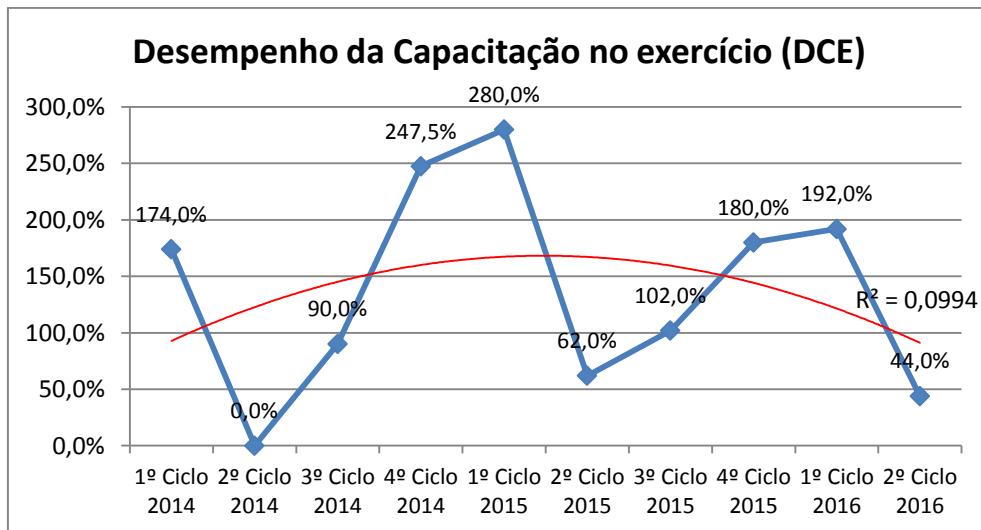

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo


### 5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{7.862,16 \times 100}{398.404,00} = 1,97\%$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100%
- e) Periodicidade: Jan-maio/2016
- f) Comentários: A Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 7.862,16 (sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), representando 1,97% do valor previsto para o investimento em capacitação. Conforme o Plano Anual de Capacitação 2016 e as normas legais, estão sendo priorizados os cursos realizados na cidade do Recife, *In company* e promovidos por Escolas de Governo.
- g) Resultados Anteriores (NIC):

Jan a Dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015

Jan a Ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	40,85%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

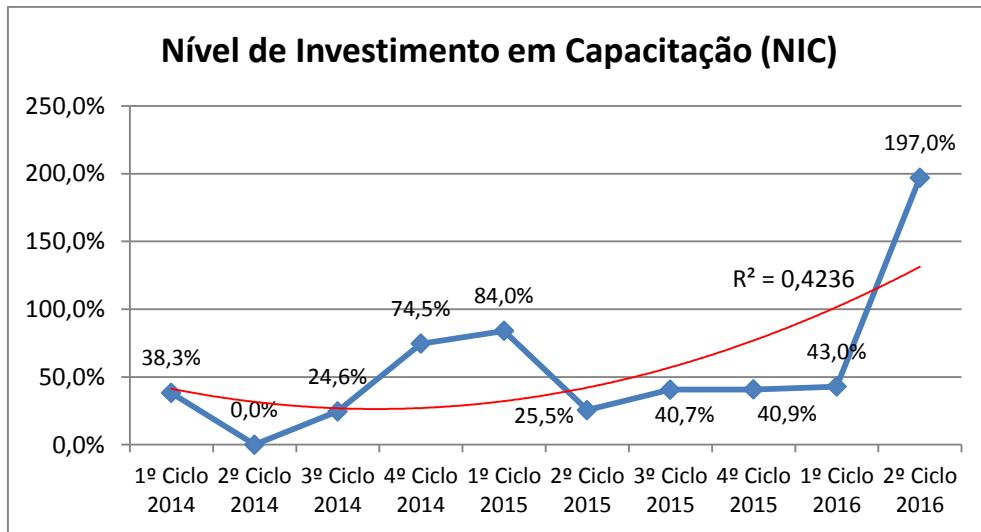

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

### 6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos<sup>1</sup> =

$$\frac{67\% + 92\% + 38\%}{3} = 65,7\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 10/06/2016


f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (67%); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (92%); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (38%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Jan a Dez/2012	33,9 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	43,67 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,7 %	3º ciclo 2013

Jan a nov/2013	38,55%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	41,63%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	43,99%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	45,64%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	46,8%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	47,6 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	47,6%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	58,70%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	61,33%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	64,7%	1º ciclo 2016

h)Representação gráfica:

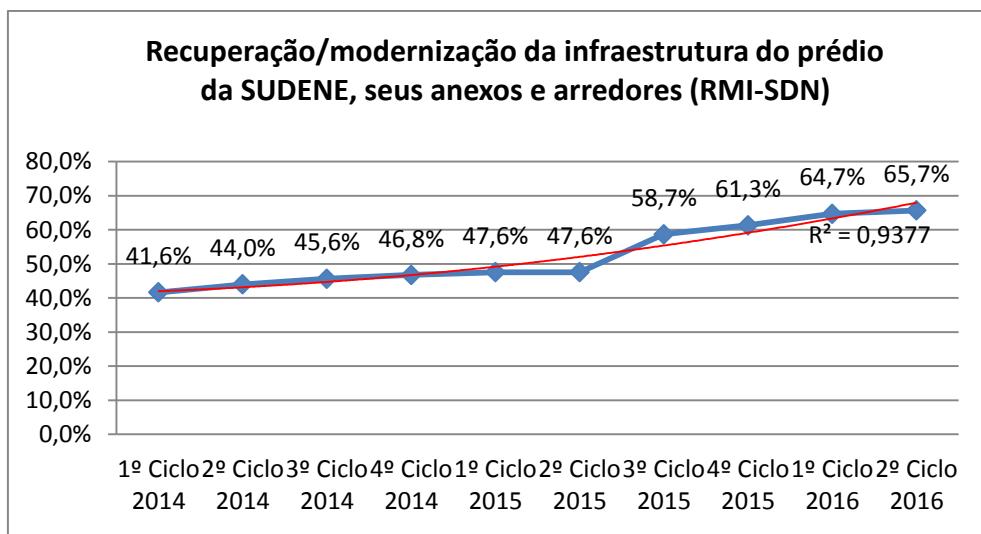

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

#### Notas:

<sup>1</sup> O percentual de execução de cada projeto é obtido da média aritmética geral lida no respectivo Plano Operativo. Neste caso, os POs 70, 71 e 72.

#### 6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula:  $\frac{\Sigma \text{dos montantes aplicados nos Projetos}}{\Sigma \text{dos limites autorizados para os Projetos}} \times 100 =$

$$\frac{(3.337.367,25 + 6.458.613,62 + 100.000,00)}{3.459.991,25 + 8.670.544,86 + 148.000,00} \times 100 = 80,6 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, recuperação das fundações do prédio sede e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 10/06/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 3.337.367,25 e limite autorizado acumulado=R\$ 3.459.991,25); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 6.458.613,62 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.670.544,86); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).


g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	48,5 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	60,4 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	42,6 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	73,92 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	53,56%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	67,37%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	67,37%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	68,2%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	71,9 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	71,2 %	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	78,9%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	79,1%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	79,1%	1º ciclo 2016

**Nota:**

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

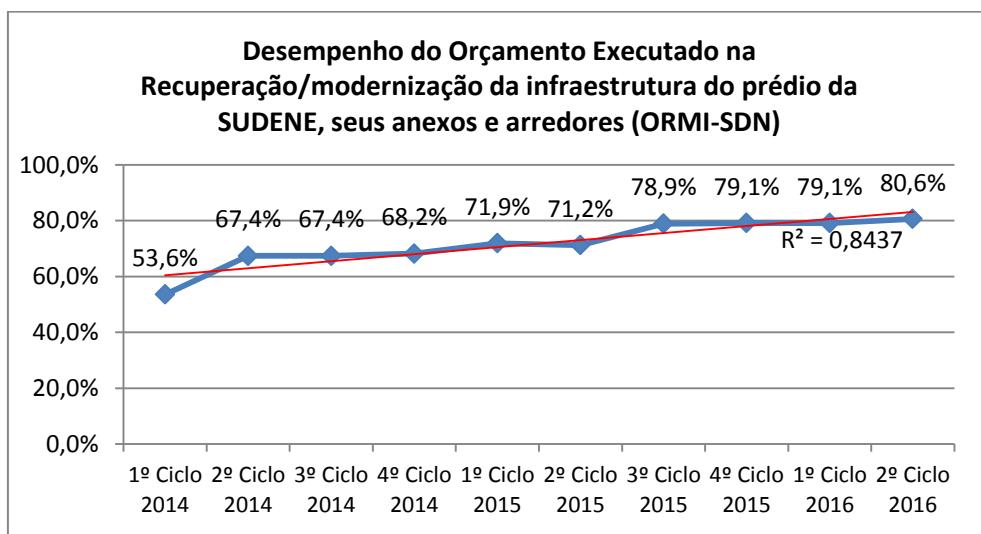

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI)

Os resultados da Avaliação de Desempenho Institucional são periodicamente calculados na época dos ciclos de monitoramento, tendo por referência o estabelecido pela Portaria SUDENE nº 166, de 21 de dezembro de 2015, e em seu anexo constam as metas transcritas abaixo, que estão disponíveis no site da SUDENE, no endereço <http://www.sudene.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/gestao-institucional>, item “Legislação” da página “Gestão Institucional”

**Quadro de Metas de Desempenho Institucional**  
**Resultado do período out/2015-mai/2016 com base na Portaria SUDENE nº 166/2015**

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (Pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
D4-Fortalecer a Imagem da SUDENE	D4.1- Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Eventos temáticos realizados	100 %	0%	0,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1ª Oficina Rotas da Integração Macrorregional Nordeste</li> <li>• Fórum Sudene de Energia e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN) – PO em elaboração</li> </ul>
	D4.1-Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Encontros realizados	100 %	0%	0,0	Realização de encontros abordando temas ambientais (Café com Sustentabilidade) Possíveis temas: 1. Energias Renováveis e Zoneamento Ecológico-Econômico - Reunião de Kick Off dos TEDs formalizados em 2015; 2. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Sudene; 3. ODS nº 7 – Energia. (CDGS/DPLAN) – PO em elaboração
D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1-Moderinizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Planejamento realinhado/ implementado	50%	45%	72,0	Execução do realinhamento/atualização do Planejamento Estratégico. (CGGI) – PO 64 (45%)
Programa 2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária (PPA 2011-2015)	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Projeto realizado	50%	100%	80,0	Execução de projeto com o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco para implantação do padrão de qualidade no “Desenvolvimento da Cadeia Bios sustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Pernambuco - Qualidade Botânica Tradicional e Molecular, Química e Microbiológica” –(CGEP/DPLAN) PO CVT Fitoterápicos II – PO 23 (71%)
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação aos semiáridos	Relatório	100%	100%	80,0	Relatório para Implementação da infraestrutura necessária para instalação de área de geoprocessamento na SUDENE. (CGEP/DPLAN) – PO GT GEO – PO 25 (100%)
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas.	100%	100%	80,0	Análise das consultas prévias protocoladas junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 3º, art. 18 do Decreto nº 7.838/2012). (CGDF/DFIN) - Indicador (100%)

Continua.

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (Pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamentos analisados.	100%	100%	80,0	Análise da participação do FDNE nos projetos aprovados pelos agentes operadores protocolados junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 2º, art. 22 do Decreto nº 7.838/2012). (CGDF/DFIN) - Indicador (100%)
	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e Portarias aprovadas	300	75%	60,0	Aprovação de incentivos fiscais. (CGIF/DFIN) – Indicador (225 aprovados até 30/05/2016)
2111 - Gestão e Manutenção do MI	4575 - Capacitação de Servidores Públicos Federais - Plano Orçamentário 0001	Projetos implementados	50%	36%	28,8	Realização de 3 (três) projetos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas: 1. Projeto de desenvolvimento de competências, mediante mapeamento, análise de gaps e validação; (54%) 2. Projeto avaliação de desempenho por competências, mediante estudos, elaboração de instrumentos e aplicação; (0,0%) 3. Projeto de planejamento da força de trabalho, mediante estudos, pesquisas e dimensionamento da força de trabalho. (0,0%) (CGGP/DAD) – PO 68 - implementado apenas o item 1-Gestão por Competências (54%/3 = 18%)
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do M.I	2000 - Administração da Unidade, plano orçamentário 0002.	Obra executada	85%	67%	63,0	Obra de recuperação do Anexo Nilo Coelho: (67%) 1. Elaboração dos projetos básico e executivo; 2. Licitação para contratação da execução da obra; 3. Execução da obra de ambientação; 4. Fiscalização e acompanhamento da obra . (CGAF/ENG/DAD) – PO Anexo Nilo Coelho – PO 70 (67%)
<b>MÉDIA ARITMÉTICA</b>			62,3%	54,38		


Fontes: : Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

Notas:

- a)Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada
- b) Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional
- c) Os resultados aplicam-se ao 7º Ciclo de avaliação GDPGPE e 4º Ciclo de avaliação GDACE- 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.
- d) Os resultados são calculados a cada ciclo e o limite de observação, pra fins de cálculo é a data de 30/09/2016.
- e) Cada ponto percentual equivale a 0,8 (8 décimos) de ponto para fins de conversão.

Referência da apuração: 30/05/2016

a) Representação gráfica:

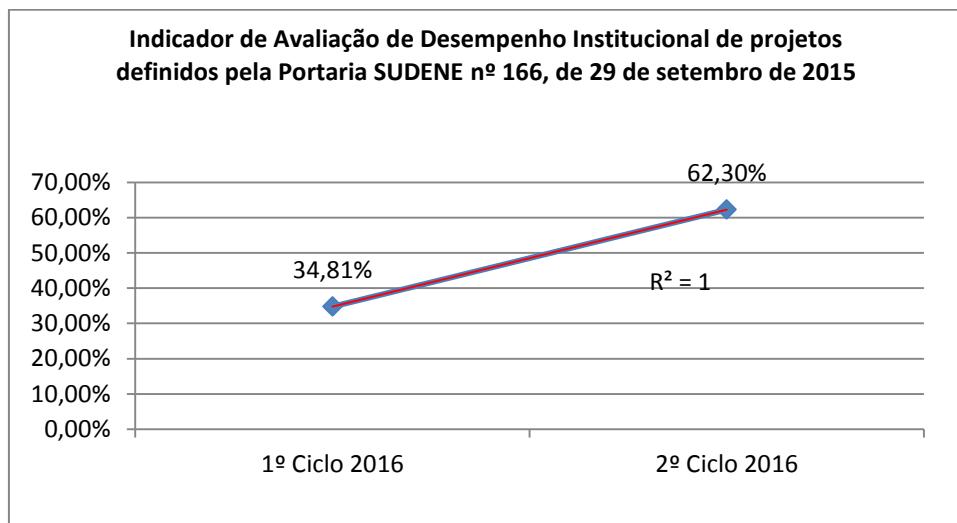

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 8 – Observações e Deliberações em plenária de 30/06/2016

### CGDS

**PO 01:** Foi pedida a liberação da 2ª parcela de recursos porem o ministério da integração está alegando falta de recursos. Em função disso o convênio está sem previsão de conclusão, sendo a previsão para dezembro, mesmo não se tendo a certeza do pagamento neste período. Tal caso foi colocado pelos coordenadores como comum a outros convênios realizados pela autarquia.

**PO 04:** o projeto encontrava-se com muitas etapas em atraso ate a data de travamento dos dados porem após tal data foram realizadas reuniões com a CONDEPE/FIDEM que relatou dificuldades com os municípios integrantes do projeto, razão da celebração de aditivo para até 30/08/16.

**PO 10:** os valores do projeto foram revistos, comprometendo-se a Coordenadora Maria Helena de encaminhar o plano operativo à CGGI com os devidos ajustes.

### CGEP

**PO 20:** Foi realizado um TED com o estado de Sergipe e o projeto encontra-se concluído tendo apenas como pendência a prestação de contas que em função de problema no Siconv não estava sendo preenchida, entretanto tal problema já foi resolvido e a prestação de contas já pode ser realizada pela convenente. Relatou a coordenado Albertina de que seria interessante um evento de inauguração contando com a participação da Sudene.

**PO 21:** O projeto está concluído desde o ciclo passado, entretanto com as diversas revisões apenas agora está apto para ser encaminhado à ASCOM. Lembrou os representantes da CGEP que tal projeto deveria ter sido realizado de forma mais abrangente com maior interação com os estados, porem pela falta de recursos para diárias o trabalho foi praticamente todo interno, do corpo técnico do setor.

**PO 28:** O projeto foi uma parceria com a FIEP da Paraíba e com o IFPB, sendo que neste momento o cronograma será reajustado, pois os consultores do projeto estão ainda em processo de alinhamento com o IFPB para a entrega dos produtos. A previsão é de setembro se ter a apresentação do plano.

## DFIN

**PO 30:** As liberações estão suspensas ate a empresa responsável adequar a execução física com a financeira do projeto. Lembrou a coordenadora geral Sabrina Lyra de que até mesmo o TCU suspendeu as liberações da obra, suspensão esta que posteriormente foi anulada. Expôs ainda, que desde agosto de 2014 nem a empresa e nem o agente operador encaminharam a SUDENE pedido de liberação de recursos.

## CGGI

**PO 63:** o Processo estava com a procuradoria da Sudene para ajustes na proposta do novo Regimento Interno, decorrente dos efeitos do Decreto nº 8.679 de 22 de fevereiro de 2016, e será publicado internamente (Boletim de pessoal e Site da SUDENE na internet), pois em função das novas e recentes mudanças na estrutura, decorrentes da Medida Provisória nº 731/2016 e do Decreto nº 8.785, ambos de 10 de junho de 2016, que provocou cortes em todos os órgãos da administração pública federal, deverá o RI recém aprovado, ser novamente revisado. Com essa medida interna poupa-se gastos com uma publicação no DOU e mais a frente, novo gasto com a retificação do RI. A base teórica desse procedimento são os princípios da racionalidade e da economicidade. A Diretoria Colegiada aprovou a medida na 235<sup>a</sup> reunião.

**PO 64:** Relatou o Coordenador-Geral da CGGI, Manoel Barreiros, que o trabalho vinha avançando conjuntamente com o Uyran Costa, Chefe do Gabinete, e já havia envolvido as unidades da Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e de Administração até a saída do Superintendente João Paulo, quando foi interrompido. A ACGGI pediu à Diretoria Colegiada para prosseguir no processo, inclusive com a elaboração do Termo de Referência para uma possível contratação, e que já estava na posse do então Chefe de Gabinete uma proposta nesse sentido, porém foi colocado pelo superintendente interino Ricardo Barros, a necessidade de, em futuro próximo, retomar a elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria externa para realização do trabalho, para evitar vícios inerentes a posicionamentos internos dos servidores. Tal posição foi bem aceita pelo gestor da CGGI e foi solicitada inclusão do tema na próxima reunião de diretoria colegiada.

## DAD

**PO 67:** Informou a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Ângela Lima, que este projeto (Gestão de Lideranças) faz parte de um projeto maior que é o projeto de gestão por competências que em parceria com a ESAF se está implantando na Sudene, com a realização num primeiro momento de capacitações com os servidores do órgão.

**PO 70:** Relataram o Coordenador-Geral de Logística, Administração e Finanças, Brivaldo Soares, e a arquiteta da Sudene, Paula Aragão, que no momento encontra-se em elaboração o projeto executivo da reforma geral do Prédio Anexo Nilo Coelho, e que de posse dele se dará a abertura do processo licitatório da obra e sua execução. Lembrou Brivaldo Soares, entretanto, a falta de orçamento para a realização do projeto.

**PO 74:** De acordo com o Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, Josué Ribeiro, o sistema encontra-se disponível para as empresas no site da SUDENE, entretanto hoje ainda há a necessidade da empresa vir até o órgão para abertura do processo, sendo que até o inicio do próximo ano, com o sistema completo, o processo será totalmente virtual.

## 9 – Conclusão

Entre este e o ciclo anterior se mantiveram as restrições orçamentárias e as fortes limitações nos gastos para diárias e passagens, comprometendo a execução de alguns convênios e levando a prorrogações de ofício, aquela em que a causa do atraso é imputada ao concedente.

Foi um período também, de mudança de Superintendente, com a saída em abril/2016, de João Paulo e sua equipe, e a assunção de Ricardo Barros, Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, substituindo o então Superintendente e acumulando as duas funções. As atenções, diante das circunstâncias, ficaram voltadas para a continuidade das providências visando a contratação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP), cujo titular, George Meireles, tinha deixado o cargo junto com a equipe do ex-Superintendente. A questão foi resolvida com a retomada, temporariamente, de alguns dos compromissos da CGCP pela Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP).

Outro assunto de grande impacto nos controles internos foram os efeitos do Decreto nº 8.785 e da Medida Provisória nº 731, ambos de 10 de junho de 2016, que estabeleceram novas reduções de cargos e funções gratificadas em órgãos da administração pública federal. Sobre o assunto, entre 2013 e 2016 a SUDENE havia perdido 42 cargos comissionados. A SUDENE negociou com o Ministério da Integração Nacional a possibilidade de sua exclusão desse novo corte, mas por meio do ofício nº 277, de 24 de junho do corrente, estabeleceu, de forma irredutível, um corte de 13,2 pontos em DAS-unitário e de 3 funções gratificadas FG-2. A Diretoria Colegiada estabeleceu que as perdas deveriam ser mínimas, orientando inclusive, que os cortes fossem aplicados preferencialmente em “vagos”. A Coordenação-Geral de Gestão Institucional reuniu todas as unidades para discutir o assunto e foi elaborada uma proposta de consenso, possível e com o menor impacto, incluindo a participação de todos os diretores na decisão. Desse processo surgiu o remanejamento interno de alguns cargos que sugerem futuras negociações com o Ministério do Planejamento para uma melhor readequação operacional em razão das perdas na estrutura.

O quadro adiante detalha os cortes sofridos entre 2014 (Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014 (nova estrutura da SUDENE), passando pelo Decreto nº 8.679, de 22 de fevereiro de 2016 (nova estrutura da SUDENE), e mais recentemente, pelo Decreto nº 8.785, de 10 de junho de 2016 (novos cortes na administração pública em geral).

### Perdas na estrutura de cargos da SUDENE entre 2014 e 2016

Cargos e FGs	Decreto nº 8.276/14 - SEGEPE/ MPO (a)	Decreto nº 8.276/14 - MI (b)	Cargos cortados pelo Dec 8.679/16 (c)	SUB-TOTAL (a+b+c)	Cargos cortados pelo MI - Dec. 8.785/16 e MP 731/16(d)	TOTAL GERAL (a+b+c+d)
DAS 1	1	7	6	14	1	15
DAS 2	0	13	2	15	2	17
DAS 3	1	6	1	8	1	9
DAS 4	1	3	-	4	2	6
DAS 5	-	1	-	1		1
<b>Total DAS</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>48</b>
FG-1	-	-	-	-	1	1
FG-2	-	-	-	-	2	2
<b>Total FGs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>51</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

a) Decretos relacionados com nova estrutura para a SUDENE: nº 8.276/14; 8.679/16, que aplicaram reduções em cargos sem redução de atribuições.

b) Atos que aplicaram cortes em órgãos da administração pública federal e foram replicados pelo MI para reduzir, mais ainda, a estrutura da SUDENE: Decreto nº 8.785/16 e MP nº 731/16

Posição: 30/06/2016

Por sua vez, a CGGI continua aguardando da Auditoria Interna a aplicação de procedimento de auditagem pedida por ela própria em set/15 ao processo de acompanhamento praticado, como forma de promover a melhoria dos controles internos, aplicar os ajustes que se façam necessários e conferir maior credibilidade ao conjunto do trabalho.

Sobre os compromissos para o próximo exercício, a agenda dos ciclos de monitoramento será a seguinte:

#### **Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos de Monitoramento da SUDENE no Exercício de 2016**

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
3º	31/08/2016	09/09/2016	22/09/2016
4º	28/11/2016	02/12/2016	15/12/2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

## **ANEXO I**

### **Quadros do Monitoramento**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 01
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82	MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 139.865,15		
Previsão de Conclusão:	07/08/2016	CONVÉNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)								A realizar no exercício	R\$ 94.240,34		
Data Atualização:	31/05/2016	Vigência: 18/12/12 a 28/06/2016								Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM									Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
										Valor liberado no Exercício	R\$ -		
										Saldo a liberar	R\$ 94.240,34		
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
										Total Liberado até o exercício	R\$ 139.865,15		

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		20,0%	Concluído	
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100,0%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100,0%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.
9	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	28/6/2016		1/12/2013			81,3%	Em Andamento	
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/7/2014		1/12/2013	14/3/2014		100,0%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTIV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100,0%	Concluído	

9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	28/9/2015		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao conveniente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	20/3/2016	20/3/2016	R\$ 94.240,34				0,0%	Paralisado	A liberação da parcela recebeu parecer positivo da equipe técnica e foi autorizada pelo gestor, no entanto, conforme comunicado pela COC, não há disponibilidade de recursos no Ministério da Integração para realizar a liberação. Não há previsão para efetuar a liberação.	Solicitou-se prorrogação de ofício por igual período de atraso na liberação da segunda parcela.
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	26/2/2016		28/5/2015	21/01/2016		100,0%	Concluído	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária. Produto entregue no dia 21/01/2016. Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015.
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/2/2016	28/6/2016		22/1/2016			50,0%	Em Andamento	Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final.	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	6/6/2016	7/6/2016		6/6/2016	7/6/2016		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho.	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/06/2016	07/08/2016					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 234.105,49	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 139.865,15	76%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

#### Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

#### Observações:

2º Ciclo - 2016. Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausência de recursos no Ministério da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício.

**Histórico:** Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEPE/FIDEM no dia 28/11/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Conveniente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas. Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho no dia 07/06/2016. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final. Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausência de recursos no Ministério da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
<span style="background-color: blue; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: green; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 02
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconómicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						MÊS	CONCEDENTE	ONVENENT	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	265.241,25	
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00	AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$	265.241,25	
						JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
Previsão de Conclusão:	27/09/2016	CONVÉNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)				<b>TOTAL</b>	<b>530.482,50</b>	<b>58.942,50</b>	<b>589.425,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
Data Atualização:	31/05/2016									Valor liberado no Exercício	R\$	-	
		Saldo a liberar								Saldo a Empenhar no exercício	R\$	265.241,25	
		Saldo a Empenhar no exercício								Total Liberado até o exercício	R\$	265.241,25	
Responsável(s) pelo Projeto	Concedente: Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE Convenente: Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE												

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								37,5%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		
6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	01/09/2013	01/12/2013	R\$ 325.222,88	15/11/2014	--	--	65,0%	Atrasado	Contratada a empresa para a conclusão das atividades da Etapa 1/Meta 1, em substituição a que realizou destrato. Além disso, encontra-se em fase de conclusão a contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1.	
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/07/2014	30/04/2016	R\$ 356.560,00	08/12/2014	--	--	40,0%	Atrasado	Foi selecionada uma nova empresa para dar continuidade às realizações dos Encontros / Diálogos Municipais.	
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015	R\$ 146.400,00	08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	Concluído	Etapas concluída após a retomada da realização dos Encontros em 21/09/2015 com a contratação de uma nova empresa.	

**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	Atrasado	A liberação da segunda parcela está condicionada à aprovação dos relatórios de execução pela equipe técnica do Concedente. No momento, encontra-se em análise pela Concedente justificativas apresentadas pela Convenente a respeito de aspectos relativos a relatórios de execução. <b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	04/01/2016	30/03/2016	R\$ 176.960,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	O processo licitatório para a execução da Etapa 2 já foi realizado e homologado. No momento, aguardam o repasse da segunda parcela de recursos para realizar os 14 workshops previstos. <b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	04/04/2016	30/04/2016	R\$ 33.200,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	<b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2014	30/04/2016	R\$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	45,0%	Atrasado	<b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Sols, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2014	30/04/2016	R\$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	90,0%	Atrasado	A convenente informou a realização de diversas atividades, indicando o estado avançado desta Etapa, entretanto, sem concluir-la. <b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>
8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/03/2016	30/04/2016	R\$ 50.000,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	<b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	30/06/2016	27/09/2016	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 0,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 265.241,25	58%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>

#### Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

#### Observações:

\* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016.

#### 2º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 03 (ex PO 04)</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>			<b>Ano:</b>	<b>2013</b>			
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria					
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.					
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconómicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.							
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS					
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto					
<b>Problema (causa):</b>	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.							
<b>Projeto:</b>	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.							
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52	Pago até o ano anterior R\$ 485.874,65
R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48	A realizar no exercício R\$ -
<b>485.874,65</b>	<b>25.572,35</b>	-	<b>511.447,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício R\$ -
				Valor liberado no Exercício R\$ -
				Saldo a liberar R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
				Total Liberado até o exercício R\$ 485.874,65

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/08/2016	<b>CONVÉNIO Nº 794997/2013</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016	Vigência: 31/12/13 a 14/05/16

<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE (Telefone: (31) 3915-5153/5258/5255
------------------------------------	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014	20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE				26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE				11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE				31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE				17/01/2014		100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014		30/12/2014		60,0%	Concluído		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			100%	Concluído	Convenente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.
8.2	Etapas 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.

8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído	Produto 2 entregue a SUDENE.	
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%	Concluído		
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído	Produto 3 entregue a SUDENE.	
8.5	Etapa 1.4: Elaboração do Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	Produto 4 entregue a SUDENE.	
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Com o Recurso de Aplicação foi autorizada a ampliação do nº de exemplares.	
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Evento de divulgação realizado dia 11 de setembro de 2015 em Montes Claros/MG	
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Visita realizada na data de divulgação do evento pela Técnica: Maria Helena de Castro Lima	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20 %)</b>												
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/07/2016	22/08/2016					0%	A Iniciar	Aguardando relatórios de execução para emissão de LT.	
				<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 485.874,65	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 485.874,65	<b>80,0%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Etapas 8.6 repartuada

2º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
■	Concluído
■	Em Andamento
■	Atrasado
■	Cancelado
■	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					<b>Número do Projeto:</b>	PO 04 (ex PO 05)											
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					<b>Ano:</b>	2013											
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.															
<b>Ação:</b>	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.															
<b>Finalidade da ação:</b>	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS															
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto															
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães																	
<b>Problema (causa):</b>	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.																	
<b>Projeto:</b>	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.																	
<b>Objetivo do projeto:</b>	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.																	
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>													
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90													
<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/07/2017	CONVENIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)																
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016																	
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)																	
<b>Meta/ Etapas</b>			<b>Previsto</b>		<b>Realizado</b>		<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>										
Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %												
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>																		
1 Lançamento/divulgação do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013	04/06/2013	18/06/2013	100,0%	Concluído											
2 Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013	19/06/2013	18/07/2013	100,0%	Concluído											
3 Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013	19/07/2013	12/08/2013	100,0%	Concluído											
4 Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	100,0%	Concluído											
5 Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--	27/08/2013	30/12/2013	100,0%	Concluído											
6 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--	31/12/2013	31/12/2013	100,0%	Concluído											
7 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--	17/01/2014	17/01/2014	100,0%	Concluído											
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>						18,9%	Em Andamento											
8 * Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0% Concluído										
9 ** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	—	—	11/09/2015	24/09/2015	--	20,0% Concluído											
10 <b>Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.</b>	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	18/03/2016	--	--	--	0,0% Atrasado	Em decorrência de solicitações da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco para a reformulação do Termo de SAD/PE para a reformulação do Termo de SUDENE, em 08/03/2016, quando da apresentação da nova solicitação de licitação e contratações para o efetivo início da execução, foi solicitada nova reunião com a conveniente, na referência, que retardaram os ritos processuais do projeto, foi necessário refazer o edital de atualização da programação de licitação o que levou a nova solicitação de atividades relativas a Meta 1. Foi prorrogado o prazo para concluir a licitação e apresentada pela conveniente a nova solicitação de licitação e contratações para o efetivo início da execução, necessidade de ampliação de prazo. De acordo com o 2º Termo Aditivo a data de do convênio (Termo Aditivo), o qual terminou a vigência passa a ser 01/06/2016. Aí foi acatado pela equipe técnica e conveniente realizou a Etapa 1.3 da Meta 1, no entanto, não apresentou informações via Siconv. A equipe técnica realizou nova reunião com a conveniente no dia 18/05/2016 a fim de avaliar o andamento das atividades das etapas 1.1 e 1.2, até a data limite do ciclo de monitoramento. A conveniente solicitou aditamento de prazo, o qual foi acatado pela equipe técnica, sendo aguardada o ajuste das datas no Plano de Trabalho Siconv, o que terá produtos referentes para a apresentação via Siconv nos "status" das Metas/ Etapas deste projeto.										
10.1 <b>Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados</b>	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	20/12/2015	--	--	--	0,0% Atrasado											
10.2 <b>Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados</b>	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	--	--	0,0% Atrasado											
10.3 <b>Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.</b>	CONDEPE/FIDEM	15/02/2016	18/03/2016	--	--	--	20,0% Concluído											
11 *** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	-	-	--	--	--	100,0% Concluído											
12 * Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	29/02/2016	29/02/2016	R\$ 100.187,91		--	0,0% Atrasado											
13 <b>Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento</b>	CONDEPE/FIDEM	21/03/2016	31/05/2016	--	--	--	0,0% Atrasado											
13.1 <b>Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.</b>	CONDEPE/FIDEM	15/04/2016	29/04/2016	--	--	--	0,0% Atrasado											
13.2 <b>Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.</b>	CONDEPE/FIDEM	02/05/2016	13/05/2016	--	--	--	0,0% Atrasado											
13.3 <b>Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.</b>	CONDEPE/FIDEM	16/05/2016	31/05/2016	--	--	--	0,0% Atrasado											
14 *** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	0,0% A Iniciar											
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>						0,0%	A Iniciar											
15 Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/2016	31/07/2017	--	--	--	0,0% A Iniciar											
<b>Valor Previsto:</b>			<b>Valor realizado:</b>		R\$ 107.354,71	39%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>										

**Parceiros institucionais:**

AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo inicio das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo inicio das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado ( 1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

2º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
<span style="background-color: blue; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: green; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: grey; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: orange; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 05 (ex PO 06)																																																																																																																																																																																									
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2013																																																																																																																																																																																									
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			<b>Eixo temático (MI):</b>		Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria																																																																																																																																																																																											
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>		Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.																																																																																																																																																																																											
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.																																																																																																																																																																																																
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			<b>Subunidade responsável:</b>		Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS																																																																																																																																																																																											
Diretor:	Sérgio Alencar			<b>Gestor da subunidade:</b>		Carlos Almíro Moreira Pinto																																																																																																																																																																																											
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.																																																																																																																																																																																																
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.																																																																																																																																																																																																
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avale os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.																																																																																																																																																																																																
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																																																																																																																																																																								
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56																																																																																																																																																																																						
	100	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30	jun/14	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08																																																																																																																																																																																						
						dez/14	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																						
						<b>TOTAL</b>	<b>359.682,64</b>	<b>18.930,66</b>	<b>378.613,30</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																						
										Valor liberado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																						
										Saldo a liberar	R\$ 138.415,08																																																																																																																																																																																						
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																						
										Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56																																																																																																																																																																																						
Previsão de Conclusão:			CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)																																																																																																																																																																																														
Data Atualização:			Vigência: 27/08/2016																																																																																																																																																																																														
Responsáveis técnico(s) pelo Projeto			Maria Helena de Castro Lima e Isis Moriera - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Meta/ Etapas</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Responsável</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">Previsto</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">Realizado</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Status</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Observação/Problemas</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Ações Corretivas</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Inicio</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Físico %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11"><b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b></td> </tr> <tr> <td>1 Lançamento do Chamamento Público 2013</td> <td>CGDS/SUDENE</td> <td>04/06/2013</td> <td>04/06/2013</td> <td></td> <td>04/06/2013</td> <td>04/06/2013</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Análise de propostas</td> <td>CGDS/SUDENE</td> <td>04/07/2013</td> <td>02/08/2013</td> <td></td> <td>18/07/2013</td> <td>19/08/2013</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Resultado do Chamamento Público 2013</td> <td>CGDS/SUDENE</td> <td>26/08/2013</td> <td>26/08/2013</td> <td></td> <td>26/08/2013</td> <td>26/08/2013</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Ajustes do projeto para formalizar convênio</td> <td>CGDS/SUDENE</td> <td>26/08/2013</td> <td>21/11/2013</td> <td></td> <td>26/08/2013</td> <td>21/11/2013</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Etapas de formalização do convênio</td> <td>SUDENE</td> <td>21/11/2013</td> <td>30/12/2013</td> <td></td> <td>21/11/2013</td> <td>30/12/2013</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Assinatura do convênio</td> <td>CGC/SUDENE</td> <td>31/12/2013</td> <td>31/12/2013</td> <td></td> <td>31/12/2013</td> <td>31/12/2013</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Publicação do convênio</td> <td>CGC/SUDENE</td> <td>17/01/2014</td> <td>17/01/2014</td> <td></td> <td>17/01/2014</td> <td>17/01/2014</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11"><b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b></td> </tr> <tr> <td>Liberação da primeira parcela</td> <td>CGDS/COF/SUDENE</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 221.267,56</td> <td>11/06/2014</td> <td>30/06/2014</td> <td>R\$ 221.267,56</td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Processo licitatório</td> <td>CONDEPE/FIDEM</td> <td>Não Informado</td> <td>Não Informado</td> <td></td> <td>11/06/2014</td> <td>10/07/2015</td> <td></td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 <b>Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno</b></td> <td>CONDEPE/FIDEM / SUDENE</td> <td>31/12/2013</td> <td>27/08/2016</td> <td></td> <td>28/08/2015</td> <td></td> <td></td> <td>53,3%</td> <td>Em Andamento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.</td> <td>SUDENE</td> <td>20/11/2014</td> <td>17/12/2014</td> <td></td> <td>20/11/2014</td> <td>17/12/2014</td> <td></td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td>Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.</td> </tr> <tr> <td>9.1 Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social</td> <td>CONDEPE/FIDEM / SUDENE</td> <td>28/08/2015</td> <td>30/12/2015</td> <td></td> <td>28/08/2015</td> <td>30/12/2015</td> <td></td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td>Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.</td> </tr> <tr> <td>9.2 Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio</td> <td>CONDEPE/FIDEM / SUDENE</td> <td>a definir</td> <td>a definir</td> <td></td> <td>18/11/2015</td> <td>18/11/2015</td> <td></td> <td>100,0%</td> <td>Concluído</td> <td>Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.</td> </tr> </tbody> </table>											Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											1 Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013	100,0%	Concluído			2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013	100,0%	Concluído			3 Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100,0%	Concluído			4 Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013	100,0%	Concluído			5 Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013	100,0%	Concluído			6 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013	100,0%	Concluído			7 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014	100,0%	Concluído			<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído		8 Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído		9 <b>Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno</b>	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	27/08/2016		28/08/2015			53,3%	Em Andamento		Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	9.1 Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.	9.2 Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.
Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																																																																																																																																																																																							
		Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				Físico %																																																																																																																																																																																						
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>																																																																																																																																																																																																	
1 Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
3 Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
4 Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
5 Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
6 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
7 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																									
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>																																																																																																																																																																																																	
Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																								
8 Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído																																																																																																																																																																																								
9 <b>Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno</b>	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	27/08/2016		28/08/2015			53,3%	Em Andamento																																																																																																																																																																																								
Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.																																																																																																																																																																																							
9.1 Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.																																																																																																																																																																																							
9.2 Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.																																																																																																																																																																																							

9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015			80,0%	Atrasado	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. As informações coletadas nessa oficina contribuirão para o diagnóstico final ainda a ser entregue para a Sudene.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizada no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2016	30/04/2016	R\$ 138.415,08				0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.(As datas já foram repactuadas - fevereiro/2016)
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	27/03/2016	26/05/2016					0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas. (As datas já foram repactuadas - fevereiro/2016)
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	27/05/2016	27/08/2016					0,0%	A Iniciar	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.(As datas já foram repactuadas - fevereiro/2016)
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
				<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 359.682,64	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 221.267,56	<b>71%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**

a) Repactuada a atividade 9.1 e 9.2

b) O convenente solicitou prorrogação da vigência, que acatamos, para que possamos repactuar as datas.// Datas repactuadas em Fevereiro/2016

2º ciclo 2016.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
<span style="background-color: blue; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Concluído
<span style="background-color: green; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					<b>Número do Projeto:</b>	PO 06 (ex PO 07)				
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					<b>Ano:</b>	2014				
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária					<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria				
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria					<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.				
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escala.					<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas					<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto				
<b>Problema (causa):</b>	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.										
<b>Projeto:</b>	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano										
<b>Objetivo do projeto:</b>	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.										
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>	<b>Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)</b>					
				100/250	R\$ 343.585,70	<b>MÊS</b>	<b>CONCEDENTE</b>	<b>CONVENIENTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>	
				GND 3 e 430	R\$ 361.725,70	dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
						nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
										Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42
<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2018	Convênio Nº 813986/2014									
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016										
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Victor Uchôa Ferreira da Silva/ Marcelo Saiki Braga /Marcelo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa										

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	Assinado 1º Termo Aditivo em 14/05/2016 prorrogando a vigência do convênio até 22/12/2016. Com a prorrogação, algumas datas de previstas foram atualizadas.
9	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	21/04/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	O convite solicitou ajustes no cronograma de desembolso
10	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	05/07/2016	-	04/11/2015		-	70%	Em Andamento	O processo licitatório que contempla essa atividade foi iniciado em 2015, mas devido a problemas jurídicos, não foi finalizado. Outra licitação foi iniciada e finalizada em 2016, com a contratação dos técnicos. Os mesmos já se encontram em atividades, executando as ações previstas. Portanto, Meta/Etapa concluída.
11	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	05/12/2016	-	24/10/2015		-	75%	Em Andamento	Já foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.
12	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/11/2016	-	02/12/2015		-	40%	Em Andamento	O processo licitatório para aquisição dos insumos veterinários para coleta de sêmen ocorreu em 02/12/2015. Os insumos já estão disponível para serem utilizados e a avaliação dos reprodutores já vem sendo feita desde do ano passado

13	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	02/12/2016	-	14/09/2015			-	40%	<b>Em Andamento</b>		
14	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	14/12/2016	-	27/11/2015			-	20%	<b>Em Andamento</b>	O processo licitatório para contratação dos instrutores e serviços de terceiros, entre outros, teve inicio em 27/11/2015 e já foi finalizado. A empresa contratada já iniciou o processo de seleção dos instrutores. Os cursos terão inicio na primeira quinzena de julho.	
15	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-				-	0%	<b>A Iniciar</b>		
16	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28					0%	<b>A Iniciar</b>	Com a nova data de vigência do convênio, houve a necessidade de repactuar a liberação da 2a parcela de recursos.	
17	Realização de visita técnica para acompanhamento para <b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>	CGDS/SUDENE	13/02/2017	17/02/2016	-				-	0%	<b>A Iniciar</b>	<b>A Iniciar</b>	
18	Análise das Prestações de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	-				-	0%	<b>A Iniciar</b>		

**Valor Previsto:** R\$ 343.585,70

**Valor realizado:** R\$ 206.151,42

**47%**

**Em Andamento** **Status do Projeto**

**Parceiros institucionais:**

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

**Observações:**

2º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 07 (ex PO 08)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	31/05/2016	

Responsável(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
-----------------------------	---

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 211.000,00
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	A realizar no exercício	R\$ 560.000,00
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>771.000,00</b>	<b>218.777,00</b>	<b>989.777,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 560.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 211.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto				Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a	
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído		
	<b>Execução (Peso 60%)</b>								10,0%	Em Andamento	Assinado o 1º Termo Aditivo em 31.03.2016, prorrogando a vigência do convênio para 22.12.2016.	
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/ SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído		
9	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016					0,0%	A iniciar	Publicado o Contrato com a empresa que fará prestação de serviços ao projeto	
10	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016					0,0%	A iniciar	Após o término do processo de licitação, terão início as reuniões de divulgação do projeto junto ao público beneficiários.	
11	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016					0,0%	A iniciar	Os cursos iniciarão após os seminários e seleção por meio de visita ao público beneficiário e aplicação de questionário.	

12	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016					0,0%	A iniciar	Terá inicio após conclusão dos cursos (item 11)	
13	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016					0,0%	A iniciar	Serão realizados intercalados com as capacitações.	
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/08/2016	19/08/2016					0,0%	A iniciar	Com a nova data de vigência do convênio, houve a necessidade repactuar nova data.	
15	Liberacao da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00				0,0%	A iniciar	Com a nova data de vigência do convênio, houve a necessidade repactuar nova data.	
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016					50,0%	Em Andamento	Pregão eletrônico concluído .Aguardando a definição do público a ser beneficiado para a entrega dos animais.	
<b>Encerramento - 20%</b>									0,0%			
17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	A iniciar		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	A iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 771.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 211.000,00	30%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

**Parceiros institucionais:**

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

**Observações:**

2º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 08 (ex PO 10)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.		
<b>Projeto:</b>	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL (R\$)	Pago até o ano anterior	R\$ 326.618,00
Previsão de Conclusão:	01/02/2017					326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 743.250,00
Data Atualização:	31/05/2016					371.625,00		jun/15	371.625,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
						371.625,00		set/15	371.625,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						<b>TOTAL</b>			<b>1.090.800,00</b>	Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 326.618,00

<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Convenente	Ricardo José Lessa Júnior (coordenador)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00
9	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	24/03/2015	24/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	100%	Concluído	
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao convenente sobre o processo de convênio.
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído	
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído	
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 41.750,00	Não informado	Não informado		100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/03/2016	30/03/2016	-	Não informado			100%	Concluído	
15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			20%	Atrasado	Só foram adquiridos os 'tablets' dos materiais e equipamentos previstos no Plano de Trabalho (R\$ 42.155,00).

16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-				0%	Atrasado	A entidade a ser contratada para fornecer a capacitação é quem ficará responsável pela elaboração do material didático e como se encontra em processo licitatório esta etapa se encontra em atraso.	
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.	
18	<b>Liberação da 2ª parcela</b>	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/07/2016	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar		
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2016	R\$ 371.625,00	15/04/2016			10%	Em Andamento	Aula inaugural e início das capacitações	
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	30/05/2016	-	15/05/2016	15/05/2016		100%	Concluído		
21	<b>Liberação da 3ª parcela</b>	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2016	<b>R\$ 371.625,00</b>				0%	A Iniciar		
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2016	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar		
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2016	-				0%	A Iniciar		
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2016	-				0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>												
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/02/2016	01/02/2017	-				0%	A Iniciar		
				<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 1.090.800,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 326.618,00</b>	<b>53%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

**Observações:**

Termo Aditivo de prorrogação do convênio para encerramento em 30/12/2016.

**Na visita técnica foi discutido sobre o pagamento das bolsas estudantis às mulheres capacitandas, se por OBTv ou qual outra modalidade factível prevista em legislação**

**2º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 09 (ex PO 11)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconómicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconómicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.		
<b>Projeto:</b>	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 458.149,49		
				R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75	AGO/2015	R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	R\$ 499.949,49	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 377.673,98		
						OUT/2015	R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	R\$ 428.743,26			Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
						-	R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	R\$ 928.692,75			Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 377.673,98		
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
										Total Liberado até o exercício	R\$ 458.149,49		

<b>Previsão de Conclusão:</b>	19/10/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016

<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Convenente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído	
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%	Concluído	
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído	
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%	Concluído	
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%	Concluído	
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%	Concluído	
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%	Concluído	
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							7,5%	Em Andamento		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/08/2015	31/08/2015	R\$ 458.149,49	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 458.149,49	100%	Concluído	
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	50%	Paralisado	A Convenente informou que o processo licitatório foi cancelado e ainda não têm data prevista para ser realizado
8	<b>Consolidação do Projeto</b>	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	11/05/2016	<b>R\$ 41.304,00</b>	--	--	--	0%	Paralisado	
9	<b>Elaboração de Diagnóstico</b>	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	<b>R\$ 458.645,49</b>	--	--	--	0%	A Iniciar	
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar	

O convênio foi prorrogado de

9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	02/09/2015	11/07/2016	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>	Inicialmente, houve atraso devido aos ajustes no TR e no plano de trabalho no SICONV como condicionantes para a liberação da primeira parcela. No momento, o início da execução está condicionado à realização do processo licitatório como indicado acima.	ofício, tendo como nova vigência 09/09/2016. Foi inserida, em 18/02/2016, no SICONV uma "Solicitação de Esclarecimento", na qual foi pedido que a Convenente apresentasse relatório descriptivo do andamento deste Convênio 813695/2014. Foi concedido o prazo até o dia 26/02/2016 para que este relatório fosse apresentado, mas, até a data limite deste PO, a "Solicitação" ainda não havia sido respondida, nem o solicitado relatório constatado no SICONV. Em 17/03/2016, a Convenente inseriu no SICONV o Ofício/GS nº 0173/2016, no qual apresentou duas alternativas de orçamentos para o projeto para a análise deste SUDENE. A equipe técnica posicionou-se contra as duas proposições apresentadas pela Convenente. Foi encaminhado um ofício à SEIRHMACT indicando o posicionamento da equipe técnica, bem como solicitando o agendamento de uma reunião presencial com os representantes da SEIRHMACT/PB, para tomada de decisão quanto aos encaminhamentos a serem adotados.
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	03/09/2015	11/07/2016	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	04/09/2015	11/07/2016	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	05/09/2015	11/07/2016	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/10/2015	31/10/2015	R\$ 377.673,98	--	--	--	0%	<b>Atrasado</b>		
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	<b>R\$ 294.170,50</b>	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	02/10/2015	10/08/2016	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	03/10/2015	10/08/2016	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	04/10/2015	10/08/2016	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	10/08/2016	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
15	<b>Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema</b>	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	09/09/2016	<b>R\$ 89.649,88</b>	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	09/09/2016	<b>R\$ 44.922,88</b>	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	<b>A Iniciar</b>		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	10/09/2016	19/10/2016					0%	<b>A Iniciar</b>	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 835.823,47	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 458.149,49	<b>28%</b>	<b>Paralisado</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

**Observações:**

O 1º Termo de Prorrogação de Ofício foi assinado em 05/11/2015, prorrogando a vigência do Convênio para 09/09/2016.

2º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	<b>A Iniciar</b>
	<b>Concluído</b>
	<b>Em Andamento</b>
	<b>Atrasado</b>
	<b>Cancelado</b>
	<b>Paralisado</b>



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>					<b>Número do Projeto:</b>	PO 10 (ex PO 12)										
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>					<b>Ano:</b>	2009										
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.				<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria											
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.				<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.											
<b>Objetivo da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.																
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN			<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS												
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães			<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto												
<b>Problema (causa):</b>	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.																
<b>Projeto:</b>	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas																
<b>Objetivo do projeto:</b>	Articular e coordenar o planejamento energético regional.																
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>												
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	R\$ 9.452.840,00	R\$ 9.452.840,00												
<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/12/2016																
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016																
<b>Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Moreira - SUDENE																
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																	
Pago até o ano anterior	R\$ 952.322,32																
A realizar no exercício	R\$ 3.100.000,00																
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -																
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																
Valor liberado no Exercício	R\$ -																
Saldo a liberar	R\$ 3.100.000,00																
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																
Total Liberado até o exercício	R\$ 952.322,32																

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CIM	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100,0%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas -	DPLAN/CGDS/CIM	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100,0%	Concluído	
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CIM	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100,0%	Concluído	
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100,0%	Concluído	Organizada pela SUDENE
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013	Sem ônus	100,0%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético
6	Articulações com a (EPE) UFCG para a elaboração do Balanço Energético Regional 2015/2016 (digital) e apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais	DPLAN/CGDS/CIM	01/12/2012	30/12/2016	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60,0%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético.
7	Formalização de Cooperação Técnica com a UFPE, para realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CIM	01/03/2013	30/04/2015	R\$ 600.000,00	19/06/2013	27/11/2015	R\$ 599.482,32	100,0%	Concluído	Identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região. Formalizados 2 (dois) TED's com o CER/UFPE
											Termos de Execução Descentralizada com o Centro de Energias Renováveis/UFPE - 1)Solar:" Estudo das características de geração de células orgânicas e módulos fabricados no Brasil"; 2) Eólica:" Anteprojeto da área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída".

8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnicas para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014	25/09/2015	Sem ônus	100,0%	<b>Concluído</b>	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.
			Valor Previsto:	R\$ 5.052.840,00	Valor realizado:	R\$ 952.322,32	95%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

**Obs.** 4º Ciclo 2015 - Repartiuada a atividade 6, 7 e 8

Os recursos previstos na etapa 6 são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

2º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				<b>Número do Projeto:</b>	PO 11 (ex PO 13)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				<b>Ano:</b>	2013			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria						
Ação:	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar						
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.								
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS						
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto						
Problema (causa):	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos								
Projeto:	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN								
Objetivo do projeto:	Adquirir frota de equipamentos agrícolas(plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)								

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$	250.000,00						
	R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00									
	R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	A realizar no exercício	R\$	-						
					Orçamento Autorizado no exercício	R\$	-						
					Valor Empenhado no Exercício	R\$	-						
					Valor liberado no Exercício	R\$	-						
					Saldo a liberar	R\$	-						
					Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-						
					Total Liberado até o exercício	R\$	250.000,00						

<b>Previsão de Conclusão:</b>	03/08/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016

<b>Responsáv(el) (eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Agrimon Marcos Brasileiro Lima/SUDENE - Marcelo Viana/Município de Currais Novos/RN.
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013	-	20%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013	-	100%	Concluído	
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014	-	100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014	-	100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013	-	31/12/2014	31/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014	-	100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida (R\$ 16.400,00)	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014		31/01/2014	31/01/2014	-	100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	
10	<b>Meta 1 (R\$ 266.400,00)</b>		31/12/2013	05/06/2015					100%	Concluído	
10.1	Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.). Valor da etapa = R\$ 196.000,00;	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015		16/07/2014	16/07/2014	-	100%	Concluído	
10.2	Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.). Valor da etapa: R\$ 34.400,00.	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015		21/08/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído	
10.3	Grade aradora(02 Unid.) Valor da etapa: R\$ 36.000,00.	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015		22/08/2014	22/08/2014	-	100%	Concluído	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
			04/08/2015	03/08/2016					0%	A Iniciar	

11	Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS	31/03/2016	09/06/2016					0%	Em Andamento	A visita técnica foi prejudicada por falta de recursos financeiros.	Laudo Técnico depende da visita "in loco".
12	Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/08/2015	03/08/2016					0%	Em Andamento		

**Parceiros institucionais:**

Município de Currais Novos/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013;
- (2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

**2º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.		
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos				
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.				
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	700.000,00
		100	GND 3	30	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.053.000,00			R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	R\$	300.000,00
Previsão de Conclusão:	17/08/2017								R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$	-
Data Atualização:	31/05/2016								R\$ 315.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
									R\$ 1.053.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$	-
										Saldo a liberar	R\$	300.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
										Total Liberado até o exercício	R\$	700.000,00

Responsáv(el)(is) técnico(s) pelo Projeto Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/2013	02/10/2013	-	03/04/2014	03/04/2014		20%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/2013	12/12/2013	-	30/09/2013	12/12/2013		100%	Concluído	
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/2013	26/12/2013	-	23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/2014	14/01/2014	-	09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014		05/02/2014	05/02/2014		100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 400.000,00	13/02/2014	13/02/2014	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	
	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	Não informado	Não informado		15/04/2015	15/04/2015		100%	Concluído	
	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	Não informado	Não informado	R\$ 300.000,00	18/11/2015	18/11/2015	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	
	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	Não informado	Não informado					0%	A Iniciar	
	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	Não informado	Não informado	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar	
10	Meta 1		30/12/2013	18/06/2016		28/02/2014			70%	Em Andamento	

10.1	Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.	Município de Saboeiro	30/12/2013	18/06/2016		28/02/2014			70%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">Em Andamento</span>	O Convenente ajustou o projeto básico e executou serviços em desacordo com o plano de trabalho aprovado.	Foi realizado o ajuste do plano de trabalho no Siconv acarretando a redução do valor total do convênio para R\$ 905.088,92. A obra está em fase de conclusão.
	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>		<b>17/08/2016</b>	<b>17/08/2017</b>					<b>0%</b>	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	17/08/2016	17/08/2017					0%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		

**Parceiros institucionais:**

Município de Saboeiro/CE

**Observações:**

- (1) O convênio teve a sua vigência prorrogada até 21/12/2015 em face da necessidade de se proceder o ajuste do plano de trabalho, que encontra-se em andamento;
- (2) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
- (4) O convênio encontra-se em processo de auditamento de prazo por mais 90 dias.

**2º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
<span style="background-color: #0000ff; color: white; padding: 2px;"> </span>	Concluído
<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;"> </span>	Em Andamento
<span style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px;"> </span>	Atrasado
<span style="background-color: #cccccc; color: black; padding: 2px;"> </span>	Cancelado
<span style="background-color: #ffd700; color: black; padding: 2px;"> </span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 13 (ex PO 16)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria.
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
<b>Projeto:</b>	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	200.000,00	
		100	GND 3	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizar no exercício	R\$	200.000,00	
						R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orcamento Autorizado no exercício	R\$	-	
						R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
										Valor liberado no Exercício	R\$	-	
										Saldo a liberar	R\$	200.000,00	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
										Total Liberado até o exercício	R\$	200.000,00	

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014		100%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014		100%	Concluído	
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014		100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído	
10	<b>Meta 1. Valor total da etapa: R\$ 210.000,00</b>	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016			20%	Em Andamento	<i>Até a data desta apuração só haviam sido gastos R\$ 80.000,00.</i>
10.1	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016			20%	Em Andamento	O Município procedeu o ajuste do projeto básico e a licitação foi homologada.
11	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar	O projeto foi reavaliado e a obra está em execução.
12	<b>Meta 2. Valor total da etapa R\$ 210.540,15</b>	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	04/09/2016					0%	A Iniciar	

12.1	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	04/09/2016					0%	A Iniciar	O Município procedeu o ajuste do projeto básico e a licitação foi homologada.	O projeto foi reavaliado e a obra está em execução.
	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>		<b>03/11/2016</b>	<b>03/11/2017</b>					<b>0%</b>	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	03/11/2016	03/11/2017					0%	A Iniciar		
					<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>46%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Município de Jardim de Piranhas/RN

**Observações:**

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014

(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.

(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.

(6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.

**2º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 14 (ex PO 17)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
<b>Projeto:</b>	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$	150.000,00	
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$	150.000,00	
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$	-	
				Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
				Valor liberado no Exercício	R\$	-	
				Saldo a liberar	R\$	150.000,00	
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
				Total Liberado até o exercício	R\$	150.000,00	

Previsão de Conclusão:	16/10/2017
Data Atualização:	31/05/2016

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
--	---

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>										
1 Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014		04/04/2014	04/04/2014		100%	Concluído	
2 Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		06/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído	
3 Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014		18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído	
4 Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		18/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído	
5 Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014		26/08/2014	04/12/2014		100%	Concluído	
6 Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014		05/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	
7 Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015		08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>										
8 Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 5.000,00.	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014		04/02/2015	04/02/2015		100%	Concluído	
9 Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	
10 Meta 1. Valor total da etapa: R\$ 155.000,00.	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016		28/07/2015	25/05/2016		100%	Concluído	
10.1 Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor total da etapa R\$ 310.000,00.	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016		28/07/2015	25/05/2016		100%	Concluído	O Município ajustou o projeto básico e foi aprovado o ajuste do plano de trabalho.
11 Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	30/06/2016	R\$ 150.000,00	05/06/2016			50%	Em Andamento	O plano de trabalho foi ajustado no Siconv e foi solicitada a liberação da última parcela de recursos.
12 Meta 2. Valor total da etapa: R\$ 155.000,00.	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	17/08/2016					0%	A Iniciar	
12.1 Reforma do Mercado Público - Parte 2	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	17/08/2016					0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>										
		16/10/2016	16/10/2017					0%	A Iniciar	

13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	16/10/2016	16/10/2017					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	R\$ 300.000,00	Valor realizado:	R\$ 150.000,00	62%	Em Andamento	Status do Projeto			

**Parceiros institucionais:**

Município de Messias Targino/RN

**Observações:**

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014

(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015

(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.

(2) Os recursos financeiros da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho

(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

(4) A vigência do convênio foi aditada para 18/06/2016.

**2º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 15 (ex PO 18)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Contexto de fragilidade socioeconômica em que vivem as populações de pescadores e pescadoras artesanais no município de Goiana-PE. Organização coletiva precária e dependência de atravessadores.		
<b>Projeto:</b>	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover maior inclusão produtiva dos pescadores e pescadoras, permitindo que tenham maior autonomia sobre o seu trabalho e oferecer um produto com maior valor agregado.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-	
		100/250	GND 3 e 4	30	534.417,84	539.816,00	fev/16	377.417,84	5.398,16	382.816,00	R\$	534.417,84	
Previsão de Conclusão:	30/03/2018				Convênio Nº 822608/15	jun/16		157.000,00		157.000,00			
Data Atualização:	31/05/2016					<b>TOTAL</b>	<b>534.417,84</b>	<b>5.398,16</b>	<b>539.816,00</b>				

**Responsável(s) pelo Projeto** SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / Vera Lúcia Assunção/ SEMAS - Rafael Siqueira

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>												
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	01/07/2015	06/09/2015		01/07/2015	06/09/2015		20,0%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	01/07/2015	06/09/2015		27/08/2015	27/08/2015		100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		27/08/2015	01/10/2015		100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		01/10/2015	10/11/2015		100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		11/11/2015	24/11/2015		100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	30/12/2015		100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		30/12/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído		
<b>Execução (Peso 60%)</b>												
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 377.417,84				0,0%	Em Andamento	O início da execução do projeto está no aguardo do cumprimento de cláusulas condicionantes: Termos de Referência; Projeto Básico; e Comprovação da propriedade pública dos terrenos. Está sendo avaliada a possibilidade de inclusão da Prefeitura de Goiana-PE como interveniente do convênio. Foi encaminhada consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene a esse respeito.	
9	Realizar 03 mapeamentos da cadeia produtiva das comunidades.	SEMAS/PE	01/02/2016	30/04/2016					0,0%	Atrasado		
10	Realizar 09 oficinas de capacitação, 03 por comunidade, com cessão de uso às associações dos bens e materiais adquiridos	SEMAS/PE	01/05/2016	31/06/2016					0,0%	A iniciar		
11	Elaborar 03 planos de gestão dos bens adquiridos, 01 por comunidade	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	A iniciar		

11.1 Aquisição dos bens e planejamento de sua gestão com	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	<b>A iniciar</b>		
11.2 Construção ou reforma de estrutura física para abrigar os bens adquiridos	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	<b>A iniciar</b>		
14 Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado					0,0%	<b>A Iniciar</b>		
15 Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 157.000,00				0,0%	<b>A Iniciar</b>		
16 Realização de 21 visitas técnicas de acompanhamento dos três primeiros meses de	SEMAS/PE	01/09/2016	30/11/2016					0,0%	<b>A Iniciar</b>		
<b>Encerramento - 20%</b>								<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
17 Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado					0,0%	<b>A iniciar</b>		
18 Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	30/03/2017	30/03/2018					0,0%	<b>A iniciar</b>		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 534.417,84	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 0,00	20%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

SEMAS - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade

**Observações:**

2º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 16 (ex PO 19)
<b>Objetivo estratégico:</b>	Aumentar a Competitividade do Setor Produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando à Geração Distribuída		
Objetivo do projeto:	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58

Previsão de Conclusão:	27/12/2016	TED 05/2015
Data Atualização:	31/05/2016	Vigência: 27/11/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Prof. Alexandre Costa (Telefone: 2126-7326/ 99706-9585)
-----------------------------	--

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	A realizar no exercício	R\$ -
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Orcamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>R\$ 277.371,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 277.371,58</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>										
1 Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	
2 Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído	
3 Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	Concluído	
4 Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	
5 Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	
6 Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	
7 Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado		100%	Concluído	
8 Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>										
9 Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	Concluído	
10 Reunião de inicio do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016					0%	Atrasado	
11 Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016		3/12/2015			20%	Em Andamento	
12 Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	01/05/2016					0%	Atrasado	
13 2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir					0%	A iniciar	
14 Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	31/7/2016					0%	A iniciar	
15 Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2019	1/11/2016					0%	A iniciar	
16 3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir					0%	A iniciar	

17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	27/12/2016				0%	A iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17				0%	A iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 277.371,58	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 277.371,58	<b>28,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

UFPE - Centro de energias renováveis

**Observações:**

**2º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
A iniciar	A Iniciar
Concluído	Concluído
Em Andamento	Em Andamento
Atrasado	Atrasado
Cancelado	Cancelado
Paralisado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 17 (ex PO 20)
<b>Objetivo estratégico:</b>	Aumentar a Competitividade do Setor Produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
<b>Secretaria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
<b>Projeto:</b>	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	322.110,74	
	250	GND 3	30	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	
Previsão de Conclusão:	27/12/2016	TED											
Data Atualização:	31/05/2016	Vigência: 27/11/2016											
Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)												

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1 Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015			29/06/2015			100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2 Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3 Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN	
4 Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015			12/11/2015			100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5 Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6 Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN	
7 Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015			27/11/2015			100%	Concluído		
8 Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015			02/12/2015			100%	Concluído		
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
9 Liberação dos recursos	COCAF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%	Concluído		
10 Reunião de inicio do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016					0%	A Iniciar		
11 Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016		3/12/2015			20%	Em Andamento		

12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2016		3/12/2015			50%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">Em Andamento</span>	A UFPE e o CSEM ainda não formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica, com isso, algumas etapas foram atrasadas. Todavia foram disponibilizados as células e os módulos fotovoltaicos para os ensaios.	
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016					0%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	31/09/2016		1/1/2016			20%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">Em Andamento</span>		
15	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2019	1/11/2016					0%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado					0%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	27/12/2016					0%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>												
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17					0%	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">A Iniciar</span>		

**Valor Previsto:** R\$ 322.110,74    **Valor realizado:** R\$ 322.110,74    **33%** Em Andamento Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
<span style="background-color: #002060; color: white; padding: 2px;">■</span>	A Iniciar
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">■</span>	Concluído
<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px;">■</span>	Em Andamento
<span style="background-color: #E63333; color: white; padding: 2px;">■</span>	Atrasado
<span style="background-color: #BDBDBD; color: black; padding: 2px;">■</span>	Cancelado
<span style="background-color: #FFC107; color: black; padding: 2px;">■</span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos					<b>Número do Projeto:</b>	PO 18				
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental					<b>Ano:</b>	2015				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária					<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria				
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico					<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.				
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território										
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas					<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS				
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães					<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto				
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.										
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.										
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25	SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL		
						R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25		
								R\$ 0,00			
Previsão de Conclusão:	31/12/2016	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015					R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	
Data Atualização:	31/05/2016	Vigência: 31/12/2016									
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto		CGDS / SUDENE	Carlos Almíro Moreira Pinto / Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino								
		SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel								
	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	A Iniciar		
1	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído	
2	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído	
3	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído	
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído	
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído	
	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído	
6	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído	
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído	
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)								27,9%	Em Andamento		
9	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído	
10	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da

10.1	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Início da mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.HSF
11	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		Não informado	Não informado		100%	Concluído	A SUDENE participou do <b>Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos</b> indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.
12	<b>Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF</b>	MMA	08/03/2016	10/07/2016		08/03/2016			25%	Em Andamento	
12.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	08/03/2016	21/04/2016		08/03/2016			30%	Atrasado	Encontra-se em execução, entretanto, foi informado que houve problemas com relação a composição da equipe técnica executiva, o que resultou em atraso na execução desta Etapa.
12.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	22/04/2016	11/05/2016		22/04/2016			70%	Atrasado	Foi apresentada uma primeira versão do diagnóstico do meio socioeconômico, que encontra-se em análise preliminar pelo MMA para depois ser encaminhado para apreciação do Grupo de Trabalho de acompanhamento da atualização e complementação do diagnóstico MacroZEE da BHSF.
12.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	12/05/2016	31/05/2016					0%	A Iniciar	
12.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	01/06/2016	10/07/2016					0%	A Iniciar	
13	<b>Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF</b>	MMA	11/07/2016	09/08/2016					0%	A Iniciar	
13.1	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	11/07/2016	09/08/2016					0%	A Iniciar	
14	<b>Sistematização e divulgação dos resultados</b>	MMA	10/08/2016	08/09/2016					0%	A Iniciar	
14.1	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	10/08/2016	29/08/2016					0%	A Iniciar	
14.2	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	30/08/2016	08/09/2016					0%	A Iniciar	
15	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>								0,0%	A Iniciar		
16	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	08/11/2016	09/01/2017				0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 459.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 459.000,00	<b>48%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

**Observações:**

2º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 19 (ex PO 21)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 167.999,61
	100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12	dez/12	167.999,61	25.421,91	193.421,52	A realizar no exercício	R\$ 60.797,60
Previsão de Conclusão:	09/09/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)				fev/13	60.797,60	--	60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Data Atualização:	31/05/2016					-	228.797,21	25.421,91	254.219,12	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcélo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito									Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 60.797,60
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 167.999,61

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		100,0%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12		100,0%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100,0%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100,0%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100,0%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100,0%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100,0%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	100,0%	Concluído	
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50,0%	Paralisado	
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100,0%	Concluído	
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0,0%	Paralisado	
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	Paralisado	
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R\$ 60.797,60				0,0%	Paralisado	
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroneletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14					0,0%	Paralisado	Processo em tramitação na Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas, para devolução dos recursos financeiros não aplicados.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	09/09/15					0,0%	Paralisado	
			<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 228.797,21</b>		<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 167.999,61</b>	<b>41%</b>	<b>Paralisado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>
Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
<b>Observações:</b>
Obs.: De acordo com o técnico Marcelo Viana, o projeto será cancelado por dificuldades de execução
2º ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
<span style="background-color: blue; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Concluído
<span style="background-color: green; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 20 (ex PO 26)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
<b>Projeto:</b>	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 857.015,99
		250	4.4.30.00	Convênio	857.015,99	274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
						582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
						857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 857.015,99

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/06/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016

<b>Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Convenente	Jussara Santanna Alves

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído	
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído	
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	Vistoria realizada
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e avaiamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014		100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada
											Prorrogado para 31/07/2015

9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2015					0%	<span style="background-color: #ccc; color: black;">Cancelado</span>	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	SEDETEC/SE irá enviar o Relatório atualizado até 29/05/2015, será avaliada a necessidade de se fazer uma visita anterior a prestação de contas, mas de acordo com informações colhidas no SICONV, o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2º Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015		27/07/2015	27/07/2015		100%	<span style="background-color: #0070C0; color: white;">Concluído</span>	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações financeiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santana Alves) - SEDETEC	31/10/2015	30/12/2015		31/10/2015			0%	<span style="background-color: #FFD700; color: black;">Paralisado</span>	Devido ao erro que ocorreu no SICONV, a SEDETEC não conseguiu incluir a prestação de contas no sistema.	A SEDETEC está entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente do SICONV para solucionar o problema.
12	Envio de Relatório de Execução por e-mail	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santana Alves) - SEDETEC	04/03/2016	11/04/2016		22/03/2016	29/03/2016		100%	<span style="background-color: #0070C0; color: white;">Concluído</span>	Devido ao erro que ocorreu no SICONV, foi acordado com a SEDETEC que seria elaborado e enviado por e-mail o relatório técnico final, sem incluir as questões financeiras. Prazos repactuados.	
13	Emissão de Relatório Técnico sobre a prestação de contas (sem incluir o SICONV)	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	18/03/2016	04/04/2016		29/03/2016	04/04/2016		100%	<span style="background-color: #0070C0; color: white;">Concluído</span>	Este Relatório técnico será para acompanhamento interno e não terá validade perante o SICONV.	Foi alterada a previsão do término do Laudo Técnico sem a prestação de contas.
14	Apresentação da prestação de contas (após solução dos problemas)	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santana Alves) - SEDETEC	04/04/2016	04/04/2016		04/04/2016			80%	<span style="background-color: #FF0000; color: black;">Atrasado</span>	Foi resolvido o problema da inclusão dos dados da prestação de contas, porém, verificou-se que os valores de devolução calculados pelo sistema não estão de acordo com os respectivos valores de devolução previstos.	Aguardando liberação do sistema para análise da prestação de contas. A SUDENE encaminhou ofício via CGC para o Ministério do Planejamento solicitando que fosse alterado de OBTV para o modo não OBTV de forma que possibilite o cálculo manual dos valores que serão devolvidos para a Convenente e Concedente.
15	Realização de visita técnica para subsidiar o laudo técnico.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	23/05/2016	25/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	<span style="background-color: #0070C0; color: white;">Concluído</span>	Foi alterada a previsão da viagem tendo em vista que os problemas operacionais na prestação de contas ainda persistem. A elaboração do Laudo técnico será concluída após a solução das pendências no SICONV.	Foi realizada a visita técnica às instalações do CVT de Confecções de Tobias Barreto para levantar informações que serão utilizadas para embasar a análise da prestação de contas do conveniente. (de acordo com o status do item 14)
16	Elaboração de Relatório sobre a visita técnica	DPLAN (Robson e Marcus)	27/05/2016	08/06/2016		27/05/2016			10%	<span style="background-color: #66CDAA; color: black;">Em Andamento</span>	esta atividade foi incluída para registro da visita técnica.	
17	Emissão de Laudo Técnico (final)	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	14/04/2016	22/04/2016					0%	<span style="background-color: #FFD700; color: black;">Paralisado</span>	Emissão do Laudo Técnico somente será iniciado após o envio da prestação de contas. (de acordo com o prazo do item 14).	
18	Emissão de Laudo Técnico Financeiro	Coordenação de Gestão de Convênios	22/04/16	02/05/16					0%	<span style="background-color: #FFD700; color: black;">Paralisado</span>		
19	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	02/05/2016	30/06/2016					0%	<span style="background-color: #66CDAA; color: black;">A Iniciar</span>		
				<b>Valor Previsto:</b>	857.015,99	<b>Valor realizado:</b>	857.015,99	72%	<span style="background-color: #66CDAA; color: black;">Em Andamento</span>	<b>Status do Projeto</b>		

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2016

Houve necessidade de reprogramar este PO, acrescentando novas etapas, tendo em vista os problemas operacionais do SICONV.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
<span style="background-color: #0070C0;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: #0070C0;"></span>	Concluído
<span style="background-color: #66CDAA;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: #FF0000;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: #ccc;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: #FFD700;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 21 (Ex PO 23)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido.	<b>Ano:</b>	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de Diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais conforme estabelece o inciso II, art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014.		
Projeto:	Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal		
Objetivo do projeto:	Promover a Diferenciação Regional da Política Industrial		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão: 23/11/2015

Data Atualização: 31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto Albertina Pereira

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Produto 1 - Análise das Últimas Três Políticas Industriais	Miguel Vieira	09/03/2015	09/04/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	Concluído	
1.1	Análise da PITCE	José Luis	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	25/03/2015		100%	Concluído	
1.2	Análise da PDP	Marcus Vinícius	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	Concluído	
1.3	Análise do PBM	Miguel Vieira	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	02/04/2015		100%	Concluído	
1.4	Relatório Produto 1	Miguel Vieira, com o apoio de José Luis e Marcus Vinícius	30/03/2015	09/04/2015		06/04/2015	09/04/2015		100%	Concluído	
2	Produto 2 - Análise de Indicadores Industriais	José Luis	10/04/2015	01/06/2015		10/04/2015	16/06/2015		100%	Concluído	
2.1	Obtenção dos Dados	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	10/04/2015	19/05/2015		10/04/2015	12/05/2015		100%	Concluído	
2.2	Relatório Produto 2	José Luis, com o apoio de Marcus Vinícius e Miguel Vieira	20/05/2015	01/06/2015		13/05/2015	16/06/2015		100%	Concluído	
3	Produto 3 - Gargalos e Potencialidades do Nordeste por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	16/09/2015		10/04/2015	14/09/2015		100%	Concluído	
3.1	Levantamento das Potencialidades por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		10/04/2015	27/08/2015		100%	Concluído	Atividade antecipada, em razão de articulação com os governos da Bahia e Pernambuco.
3.2	Relatórios parciais, por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		05/05/2015	14/09/2015		100%	Concluído	O planejamento inicial previa visita aos estados para execução desta etapa. Devido ao corte de diárias e passagens, esta etapa precisou ser replanejada e, consequentemente, as posteriores

3.3	Matrizes estaduais e síntese	Marcus Vinícius	09/07/2015	11/09/2015		09/07/2015	22/09/2015		100%	Concluído		
3.4	Matriz regional e síntese	Marcus Vinícius	14/09/2015	16/09/2015		09/07/2015	24/09/2015		100%	Concluído		
4	Produto 4 - Relatório Base para Elaboração de Diretrizes para Regionalização da Política Industrial	Marcus Vinícius, Marina Barbosa, Miguel Vieira e Tássia Germano	31/08/2015	23/09/2015		25/09/2015	29/10/2015		100,0%	Concluído		
4.1	Introdução	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	17/09/2015	18/09/2015		25/09/2015	30/09/2015		100%	Concluído		
4.2	Capítulo 1 - Síntese das três últimas políticas industriais	Marina Barbosa	31/08/2015	04/09/2015		05/10/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
4.3	Capítulo 2 - Síntese dos indicadores da indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	08/09/2015	11/09/2015		19/10/2015	23/10/2015		100%	Concluído		
4.4	Capítulo 3A - Apreciação geral sobre as potencialidades e gargalos nos estados	Marina Barbosa	14/09/2015	18/09/2015		23/10/2015	26/10/2015		100%	Concluído		
4.5	Capítulo 3B - Gargalos e Potencialidades à indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	21/09/2015	23/09/2015		26/10/2015	29/10/2015		100%	Concluído		
4.6	Conclusão	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	24/09/2015	25/09/2015		28/10/2015	29/10/2015		100%	Concluído		
5	Revisão e entrega final	Albertina Pereira	28/09/2015	30/09/2015		29/10/2015	23/12/2015		100%	Concluído	As atividades foram desdobradas para melhor esclarecer o andamento.	
5.1	Revisão	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	28/09/2015	21/11/2015		29/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído		
5.2	Ajustes	Marina Barbosa e Marcus Vinícius	03/11/2015	21/11/2015		18/11/2015	16/12/2015		100%	Concluído		
5.3	Entrega final	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	23/11/2015	23/11/2015		16/12/2015	23/12/2015		100%	Concluído	Documento final entregue à Coordenação Geral da CGEP. Foi recomendada a elaboração de um resumo executivo.	
			Valor Previsto: R\$ -			Valor realizado: R\$ -			100%	Concluído	Status do Projeto	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

Responsável Produto 1 - Miguel Vieira; Responsável Produto 2 - José Luis; Responsável Produto 3 - Marcus Vinícius; Responsáveis Produto 4 - José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira.

Inclusão de uma atividade do produto 3 em função de maior compreensão do produto via desmembramento de atividade

Observação para o 3º ciclo: dada a restrição de diárias e passagens, houve a necessidade de readequar o planejamento e execução deste PO

2º Ciclo 2015 - Plano Operativo concluído no 1º ciclo 2015, porém apresentou etapas que tiveram ajustes entre março e maio/2016.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 22 (ex PO 28)</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2014</b>		
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria			
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.			
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.					
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação			
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti			
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.					
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE					
<b>Objetivo do projeto:</b>	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.					

<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>	<b>Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)</b>				<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>		
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00	ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 2.000.000,00	
Previsão de Conclusão:	30/06/2016					1.277.000,00	0,00	Novembro/2014	1.277.000,00	A realizar no exercício	R\$ -	
Data Atualização:	31/05/2016					723.000,00	0,00	Março/2015	723.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto	Unidade Descentralizadora	Albertina de Souza Leão Pereira (SUDENE)				2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima (UFPE)								Valor liberado no Exercício	R\$ -	
										Saldo a liberar	R\$ -	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
										Total Liberado até o exercício	R\$ 2.000.000,00	

<b>N.E.</b>	<b>Metas/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>				<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
			<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Físico %</b>			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014	Não se aplica	13/08/2014	13/08/2014		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014	Não se aplica	12/11/2014	12/11/2014		100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014	Não se aplica	17/11/2014	17/11/2014		100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	R\$ 1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	R\$ 1.277.000,00	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015	Não se aplica	27/02/2015	27/02/2015		100%	Concluído		
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	R\$ 723.000,00	10/03/2015	23/03/2015	R\$ 723.000,00	100%	Concluído	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2a parcela. Liberação autorizada em 23/03/2015, mas aguardando limite financeiro. (Foi liberado com atraso)	
7	Solicitação de Termo aditivo financeiro	UFPE (Cláudia Sampaio)	27/05/2015	27/05/2015	Não se aplica			Não se aplica	0%	Cancelado	Foi solicitado um aditivo no valor de R\$ 252.045,00, mas a executora decidiu não pedir mais o termo aditivo financeiro, uma vez que conseguiu adequar o andamento do plano de trabalho ao valor inicial.	
8	Paracer técnico referente ao termo aditivo financeiro	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	27/05/2015	29/05/2015	Não se aplica			Não se aplica	0%	Cancelado		
9	Trâmites burocráticos	Convênios e Procuradoria	01/06/2015	30/06/2015	Não se aplica			Não se aplica	0%	Cancelado		

10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	16/03/2016	30/03/2016	Não se aplica	30/03/2016	30/03/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>	Os prazos foram reprogramados tendo em vista que o projeto foi analisado pela Auditoria Interna e esta atividade não foi prevista.	
11	Realização de encontro para apresentação dos resultados.	UFPE (Cláudia Sampaio); DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel, )	03/05/2016	03/05/2016	Não se aplica	03/05/2016	03/05/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>	Foi incluída uma nova atividade (encontro para apresentação dos resultados) a ser realizada no auditório panorâmico da SUDENE, por solicitação da UFPE.	
12	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel, Robson Brandão, Técnico em Química)	03/05/2016	03/05/2016	Não se aplica	13/05/2016	13/05/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>	A visita técnica foi realizada após o encontro para apresentação dos resultados, que se realizou no auditório panorâmico da SUDENE, em 03/05/2016.	
13	Relatório da visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz e Técnico em Química)	16/05/2016	20/05/2016	Não se aplica	16/05/2016		Não se aplica	80%	<b>Atrasado</b>	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica, dada constatação da necessidade de criar condições adequadas para a elaboração a emissão do laudo/parecer final.	
14	Elaboração e emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz e Técnico em Química)	16/05/2016	30/06/2016	Não se aplica	16/05/2016			60%	<b>Paralisado</b>	Datas da coluna "previsto" foram reprogramadas tendo em vista que o Laudo Técnico só poderá ser concluído após os ajustes acordados no decorrer da visita técnica, ocorrida em 13/05/2016.	
			<b>Valor Previsto:</b> R\$ 2.000.000,00		<b>Valor realizado:</b> R\$ 2.000.000,00		95%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2016

Tendo em vista que a servidora Jéssica Rivas pediu exoneração, foram designados para acompanhar a execução deste projeto os servidores Gabriela Isabel e Robson Brandão. Para as atividades pertinentes aos itens de números 13 e 14, foi designado o servidor Marcus Paz  
As linhas 12 e 13 foram retiradas pois não há obrigatoriedade de prestação de contas junto à SUDENE no caso de Termo de Execução Descentralizada

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 23
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação 8902 - Promoção de Investimento em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poço aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
	286 e 280	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	1.025.000,00	1.025.000,00	800.000,00	0,00	Fevereiro/2016	800.000,00	A realizar no exercício	R\$ 1.025.000,00
						225.000,00	0,00	junho/2016	225.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
						1.025.000,00	0,00	-	1.025.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.025.000,00
<b>Previsão de Conclusão:</b>	02/05/2017									Valor liberado no Exercício	R\$ 800.000,00
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016									Saldo a liberar	R\$ 225.000,00
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Unidade Descentralizadora	Albertina de Souza Leão Pereira (SUDENE)								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima (UFPE)								Total Liberado até o exercício	R\$ 800.000,00

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto				Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor		Início	Fim	Valor			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)								100%	Concluído	A visita técnica foi substituída por reuniões realizadas nas instalações da CGEP nas quais estiveram presentes técnicos da UFPE e da SUDENE.
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	01/12/2015	01/12/2015			01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído	
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	03/12/2015	03/12/2015			03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído	
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00		11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	100%	Concluído	
5	Reunião para programar visitas técnicas e de campo	SUDENE E UFPE	11/03/2016	11/03/2016			11/03/2016	11/03/2016		100%	Concluído	Verificou-se a importância e necessidade de que a equipe UFPE forneça relatórios parcial (regime trimestral) das atividades desenvolvidas no projeto. Em virtude disto, foram acrescentadas novas etapas no PO (Apresentação do relatório parcial).
6	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/03/2016	11/04/2016			17/03/2016	21/03/2016		100%	Concluído	Relatório entregue pelo técnico SUDENE em 21/03/2016
7	Apresentação do 1º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/03/2016	18/03/2016			18/03/2016	23/03/2016		100%	Concluído	Relatório entregue pela UFPE em 23/03/2016. Ressalta-se que este relatório apresenta informações relativas ao cronograma das atividades iniciais de abertura do projeto, não sendo necessário parecer técnico sobre o assunto.

8	Vistoria de campo aos seis municípios do projeto	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/04/2016	11/10/2016		14/06/2016			0%	A Iniciar	As atividades de mobilização e sensibilização (visitas de campo iniciais) foram prejudicadas pela ausência de recursos financeiros (carro, motorista, combustível) que seriam disponibilizados pela UFPE. Previsão de viagem a Caruaru em 14/06/2016.	A UFPE agendou visita a Picos no período de 09 a 11 de maio. Data alterada em virtude de inviabilidade de agenda, a ser definida. Conforme ofício LBQ64/2016, a nova data agendada para a reunião será 01/06, realizada através de docentes da UFPI/LAFIPI.
9	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	14/05/2016		14/05/2016	14/05/2016		100%	Concluído	Visita realizada pela Coordenadora Albertina em 14/05/16.	
	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	23/05/2016		16/05/2016				Atrasado	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica..	
10	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/05/2016	11/06/2016	R\$ 225.000,00	20/05/2016			20%	Em Andamento	Os documentos comprobatórios estão em análise.	
11	Apresentação do 2º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/06/2016	18/06/2016		27/05/2016	27/05/2016		100%	Concluído		
12	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	11/06/2016	11/07/2016		06/06/2016			0%	A Iniciar		
13	Apresentação do 3º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/09/2016	18/09/2016					0%	A Iniciar		
14	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	01/12/2016	01/02/2017					0%	A Iniciar		
15	Emissão de laudo/parecer final	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	01/02/2017	02/05/2017					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 1.025.000,00	Valor realizado:		R\$ 800.000,00	61%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 24
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico
<b>Finalidade da ação:</b>	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidades responsáveis:</b>	CGEP e CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestores das subunidades:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.		
<b>Projeto:</b>	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatú Bola, em Pernambuco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

Previsão de Conclusão:	28/02/2017
Data Atualização:	31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Marcus Vinicius e Miguel Vieira - CGEP/DPLAN ; Caio de Assis e Renato Vaz (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
	749.000,00	0,00	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-		0,00	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	749.000,00	0,00	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015		20,0%	Concluído	
2	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015		100%	Concluído	
3	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015		100%	Concluído	
4	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015		100%	Concluído	
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015		100%	Concluído	
6	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído	
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído	
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
9	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído	
10	Meta 1: Levantamento etnobotânico. Valor da etapa: R\$ 76.800,00.	UFPE	10/12/2015	10/11/2016		18/01/2016	25/05/2016		100%	Concluído	
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016		10/03/2016	10/03/2016		100%	Concluído	
10.2	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio. O técnico Renato (CGDS) está elaborando relatório da visita (ainda sem data definida).


11	<b>Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico. Valor da etapa: R\$ 138.000,00.</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016					0%	A Iniciar		
11.1	2º Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016					0%	A Iniciar		
12	<b>Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular. Valor da etapa: R\$ 373.400,00.</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016					0%	A Iniciar		
12.1	3º Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016					0%	A Iniciar		
13	<b>Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final. Valor da etapa: R\$ 160.800,00.</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016					0%	A Iniciar		
13.1	Visita técnica (oficinas devolutivas)		01/11/2016	03/11/2016					0%	A Iniciar		
14	Apresentação de relatório final	UFPE	01/12/2016	31/12/2016					0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									0,0%	A Iniciar		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	01/01/2017	28/02/2017					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 749.000,00	Valor realizado:		R\$ 749.000,00	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
 PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 25
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2015
Programa:	Ação interna	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	II. Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
Finalidade da ação:	-	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti   Albertina Souza Leão
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	A inexistência de base de dados geográficos estruturada, que possibilite integrar espacialmente as informações entre as áreas desta Superintendência; A criação, pelo Ministério da Integração Nacional, do Observatório do Desenvolvimento Regional – ODR, que necessita de informações georreferenciadas das autarquias vinculadas; A carência de informações geográficas estruturadas para suporte à tomada de decisões sobre os problemas existentes na área de atuação da SUDENE; O interesse da SUDENE em colaborar com criação de tal base de dados geográficos estruturada, que permitirá a implantação de um Núcleo de Geoprocessamento, já expressamente manifestada, bem assim de fazer uso efetivo desta.		
Projeto:	Grupo de Trabalho para a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE		
Objetivo do projeto:	Elaborar relatório conclusivo contendo a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
						ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	-
	-	-	-	-	-		0,00		0,00	A realizar no exercício	-
							0,00		0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	-
						0,00	0,00	-	0,00	Valor Empenhado no Exercício	-
Previsão de Conclusão:	04/03/2016									Valor liberado no Exercício	-
Data Atualização:	31/05/2016									Saldo a liberar	-
Responsável(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado Robson Brandão									Saldo a Empenhar no exercício	-
										Total Liberado até o exercício	-

Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1 Elaboração da Resolução do GTGEO	Ludmilla e Robson	01/09/2015	14/09/2015	-	01/09/2015	14/09/2015	-	100%	Concluído	
2 Aprovação da Resolução pela Diretoria Colegiada	GTGEO	15/09/2015	19/09/2015	-	23/09/2015	23/09/2015	-	100%	Concluído	
3 Publicação da Resolução no Boletim Interno	CGEP	20/09/2015	23/09/2015	-	03/11/2015	03/11/2015	-	100%	Concluído	
4 Primeira Reunião do GTGEO	GTGEO	25/09/2015	29/09/2015	-	04/11/2015	04/11/2015	-	100%	Concluído	
5 Elaboração do 1º Relatório sobre o Plano Cartográfico da SUDENE 1960-1990	Ludmilla e Robson	30/09/2015	04/10/2015	-	05/11/2015	10/11/2015	-	100%	Concluído	
6 Reunião de trabalho para validação do 1º relatório	GTGEO E CGEP	05/10/2015	14/10/2015	-	11/11/2015	11/11/2015	-	100%	Concluído	
7 Segunda Reunião do GTGEO	GTGEO	15/10/2015	19/10/2015	-	12/11/2015	15/11/2015	-	100%	Concluído	
8 Elaboração do 2º Relatório sobre o Quadro atual da Cartografia na SUDENE (1990-2015)	Ludmilla e Robson	20/10/2015	24/10/2015	-	16/11/2015	08/12/2015	-	100%	Concluído	
9 Reunião de trabalho para validação do 2º relatório	GTGEO E CGEP	25/10/2015	30/10/2015	-	09/12/2015	09/12/2015	-	100%	Concluído	
10 Terceira Reunião do GTGEO	GTGEO	01/11/2015	14/11/2015	-	10/12/2015	10/12/2015	-	100%	Concluído	
11 Solicitação de prorrogação do Prazo do GTGEO	GTGEO	21/12/2015	23/12/2015	-	21/12/2015	23/12/2015	-	100%	Concluído	Prazo estendido até 21/02/2016
12 Elaboração do 3º Relatório: proposta de implantação do núcleo de geoprocessamento na SUDENE	GTGEO	15/12/2015	12/02/2016	-	15/12/2015	12/02/2016	-	100%	Concluído	
13 Reunião de trabalho para validação do 3º relatório	GTGEO	11/02/2016	16/02/2016	-	12/02/2016	16/02/2016	-	100%	Concluído	
14 Ajustes e correções finais do relatório	GTGEO	16/02/2016	19/02/2016	-	16/02/2016	19/02/2016	-	100%	Concluído	
15 Entrega do Relatório à Diretoria Colegiada	GTGEO	22/02/2016	22/02/2016	-	22/02/2016	22/02/2016	-	100%	Concluído	
16 Aprovação do Relatório Final pela Diretoria	GTGEO	22/02/2016	04/03/2016	-	22/02/2016	17/03/2016	-	100%	Concluído	Status do Projeto
		Valor Previsto:	R\$ 0,00		Valor realizado:	R\$ 0,00	100%			

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 26
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	Ação interna	<b>Eixo temático (M):</b>	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (M):</b>	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
<b>Finalidade da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Prover os agentes públicos e privados de informações regionais, objetivando subsidiar planos e programas para o Nordeste.		
<b>Projeto:</b>	Nordeste em Números 2015		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Sistematizar um conjunto de informações sócio-econômicas referente à região Nordeste e estados que a compõem, atualizando a versão anterior do Nordeste em Números 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-	Pago até o ano anterior R\$ -
Previsão de Conclusão:	29/04/2016					A realizar no exercício R\$ -
Data Atualização:	31/05/2016					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Gabriela Isabel Limoeiro Alves Nascimento / José Luís Alonso					Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício R\$ -
						Saldo a liberar R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Coleta de dados	José Luis	10/09/2015	10/11/2015		10/09/2015	10/11/2015		100%	Concluído	Algumas informações apresentadas no Nordeste em Números 2011, não estavam mais disponíveis.
2	Tabulação e crítica dos dados coletados	Gabriela Isabel / José Luis	10/11/2015	24/11/2015		10/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	
3	Elaboração de Gráficos e Mapas	Gabriela Isabel / José Luis	24/11/2015	08/12/2015		24/11/2015	08/12/2015		100%	Concluído	
4	Confecção da publicação (Parte I - capítulo 1 a 9)	Gabriela Isabel / José Luis	08/12/2015	22/12/2015		08/12/2015	18/12/2015		100%	Concluído	
5	Confecção da publicação (Parte II - capítulo 10 a 18)	Gabriela Isabel / José Luis	22/12/2015	15/01/2016		18/12/2015	15/01/2016		100%	Concluído	
6	Revisão do documento	Gabriela Isabel / José Luis	15/01/2016	19/02/2016		15/01/2016	19/02/2016		100%	Concluído	Durante a revisão do documento, observou-se a necessidade de acrescentar mais informações relativas ao Semiárido e a características hidrológicas.
7	Ajustes após revisão	Gabriela Isabel / José Luis	19/02/2016	18/03/2016		19/02/2016	18/05/2016		100%	Concluído	Acrescentada uma etapa para adequação dos ajustes do documento, que não tinha sido previstos.
8	Revisão da formatação final/Layout e publicação no site do primeiro capítulo	Gabriela Isabel / José Luis / ASCOM	01/04/2016	08/04/2016					0%	Cancelado	A conclusão do documento foi postergada tendo em vista que o coordenador geral sugeriu acréscimos de tabelas ao 1º cap.
9	Revisão da formatação final/Layout	ASCOM	18/03/2016	18/04/2016		18/05/2016			30%	Atrasado	O cronograma das atividades foi alterado em virtude da inclusão de novas etapas. Em 09/05, a publicação por capítulos foi suspensa retornando ao formato original de "documento completo", sendo enviado a ASCON em 18/05/16.
10	Catalogação	Biblioteca	18/04/2016	22/04/2016		01/07/2016			0%	Atrasado	Esta atividade será realizada após a conclusão da atividade anterior (item 10)
11	Publicação no site	ASCOM	22/04/2016	29/04/2016		15/07/2016			0%	Atrasado	Esta atividade será realizada após a conclusão da atividade anterior (item 11)
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	73,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 27
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2016
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14		
Projeto:	Elaboração de um resumo do Relatório de Avaliação da UAB		
Objetivo do projeto:	Publicação de um capítulo em um artigo do IPEA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-	

Previsão de Conclusão:	08/03/2016
Data Atualização:	31/05/2016

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Realizar resumo sobre o artigo da UAB	Gabriela Lins, Gabriela Nascimento, Marina Barbosa, Tássia Germano.	17/02/2016	19/02/2016		17/02/2016	18/02/2016		100%	Concluído	
2	Adaptação do Relatório UAB para formato de Capítulo para livro do IPEA	Gabriela Lins, Gabriela Nascimento, Marina Barbosa, Tássia Germano.	17/02/2016	02/03/2016		17/02/2016	02/03/2016		100%	Concluído	
3	Envio para Coordenação	Frederico/Lautemyr	02/03/2016	03/03/2016		21/03/2016	21/03/2016		100%	Concluído	
4	Normatização pela biblioteca	Juçara	03/03/2016	05/03/2016		-	-		0%	Cancelado	Não houve necessidade de contato com a Biblioteca uma vez que a equipe de normatização do IPEA se encarregará.
5	Envio para Ascom	Mariana Melcop	06/03/2016	08/03/2016		24/03/2016	24/03/2016		100%	Concluído	Enviado por e-mail para a ASCOM e para George Meireles.
6	Efetivo envio para IPEA	Mariana Melcop	09/03/2016	10/03/2016		20/05/2016	20/05/2016		100%	Concluído	Diversas tentativas de contato por parte da CGEP e ASCOM. Com a saída da equipe do então Superintendente João Paulo, o processo passou a ser coordenado pela CAV/CGEP. Em 20/05/2016 foram enviados por email os arquivos em definitivo ao senhor Guilherme Resende - Diretor Adjunto do IPEA.  Designar a estagiária Núbia Costa para acompanhamento do processo.
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceleros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
<span style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: green; width: 20px; height: 10px;"></span>	Concluído
<span style="background-color: #668d4c; width: 20px; height: 10px;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; width: 20px; height: 10px;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: grey; width: 20px; height: 10px;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 28
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b> 2015	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - NE	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED(CG-2035		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicosocial e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
						ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	500.000,00
				280	Custeio	Descentralização	500.000,00	500.000,00							
Previsão de Conclusão:	30/11/2016														
Data Atualização:	31/05/2016														
Responsável(s) pelo Projeto		Unidade Descentralizadora				Anita Rozenblit									
		Unidade Descentralizada				Maíra Souza Melo - IFPB									

Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1 Articulação para elaboração do Termo de Execução Descentralizada - TED	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	15/05/2015	10/12/2015		15/05/2015	10/12/2015		100%	Concluído	Articulação para elaboração dos Plano Estratégico de Campina Grande/PB
2 Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e IFPB	10/12/2015	18/12/2015		10/12/2015	18/12/2015		100%	Concluído	
3 Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/12/2015	21/12/2015		21/12/2015	21/12/2015		100%	Concluído	
4 Descentralização do crédito e a Transferência do limite orçamentário	CGAF/COCF	24/12/2015	24/12/2015		24/12/2015	24/12/2015		100%	Concluído	Encaminhamento de providências para liberação de R\$ 500.000,00.
5 Reunião com IFPB e a empresa contratada para elaboração do Plano a partir do diagnóstico. Solicitar ajustes no cronograma de execução do Plano de Trabalho.	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	26/02/2015	26/02/2015		26/02/2015	26/02/2015		100%	Concluído	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisará ser repactuado
6 Reunião (em João Pessoa): Apresentação do projeto técnico da Macroplan e o ajuste do cronograma do Plano de trabalho.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	21/03/2016	21/03/2016		21/03/2016	21/03/2016		100%	Concluído	Aguardando o ofício pelo IFPB constando: solicitação dos recursos financeiros do TED e o novo Cronograma de Execução (já ajustado), observados os produtos inseridos no Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada
7 Recebimento por e-mail do Ofício nº 175/2016/GR/IFPB, encaminhado pelo IFPB e assinado pela Pró-Reitora Mary Roberta Meira Marinho, onde solicita formalmente a alteração do Cronograma de Execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande e Municípios do Entorno - PED(CG-2035.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	18/04/2016	18/04/2016		18/04/2016	03/05/2016		100%	Concluído	Aguardando o ofício pelos correios para dar andamento ao processo de liberação da 1ª e única parcela dos recursos financeiros do TED nº 10/2015 SUDENE/IFPB.
8 Elaboração do parecer técnico	DPLAN (Anita Rozenblit)	03/05/2016	10/05/2016		03/05/2016	10/05/2016		100%	Concluído	No dia 03/05/16 o parecer técnico foi enviado à Coordenação Geral, passando por ajustes e correções, e no dia 11/05/16 foi enviado à DPLAN para providências pertinentes.

9	Análise da DPLAN em relação ao Parecer Técnico da CGEP e providências pertinentes	DPLAN (Sérgio Alencar)	11/05/2016	11/05/2016		11/05/2016	12/05/2016		100%	Concluido	No dia 12/05/2016 foi enviado, pelo diretor, o processo do TED nº 10/2015 à DAD, para liberação da parcela única.	
10	Liberação da parcela única	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	12/05/2016	15/05/2016	R\$ 500.000,00	18/04/2016	13/05/2016	R\$ 500.000,00	100%	Concluido	Previsão de liberação da 1ª parcela no mês de maio de 2016.	Autorizado pela SUDENE a liberação da parcela única em 13/05/2016. Diretora do PROEXT - IFPB.
11	<b>Produto 1:</b> Aprofundamento da Visão de Futuro da Cidade de Campina Grande 2015 ( construída na fase de diagnóstico) - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 1</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	30/06/2016		17/05/2016			0%	Em Andamento		
12	<b>Produto 2:</b> Construção da Visão de futuro Complexo Aluísio Campos - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 2</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	30/06/2016					0%	A Iniciar		
13	<b>Produto 3:</b> Desenho urbano conceitual da cidade de Campina Grande e conexões com os municípios do entorno - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 3</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/06/2016	29/07/2016					0%	A Iniciar		
14	<b>Produto 4:</b> Visão de Futuro: desafios, estratégias e metas - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 4</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/06/2016	29/07/2016					0%	A Iniciar		
15	<b>Produto 5:</b> Realização de seis oficinas de reflexão estratégica, uma em cada município envolvido - <b>Parecer sobre os resultados das oficinas</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	29/07/2016					0%	A Iniciar	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisou ser repactuado de maio a agosto de 2016.	
16	<b>Produto 6:</b> Pesquisa de opinião pública via internet - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 6</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	29/07/2016					0%	A Iniciar		
17	<b>Produto 7:</b> Realização de Concurso sobre o tema "Campina do Futuro", junto à estudantes dos 1 e 2 graus - <b>Parecer sobre resultados do concurso</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	29/07/2016					0%	A Iniciar		
18	<b>Produto 8:</b> Transferência Institucional do Portal 2035 e canais de acompanhamento do projeto pela sociedade e incorporação de propostas de outras fontes (blogs, redes sociais, debates e mídias sociais) - <b>Parecer sobre resultados</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/08/2016	31/08/2016					0%	A Iniciar		
19	Parecer final de acompanhamento SUDENE envolvendo todas as etapas do processo.	DPLAN (Anita Rozenblit)	01/10/2016	31/10/2016					0%	A Iniciar		
20	Revisão	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/11/2016	30/11/2016					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 500.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2 Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

A Iniciar
Concluido
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 29 (ex PO 31)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	<b>Ano:</b>	2013
Programa do PPA:	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO	Eixo temático (MI):	Garantir Segurança Hídrica
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MI):	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
Objetivo da ação:	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade equitativa suficiente à segurança alimentar e nutricional.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	-
Diretor:	Sérgio Alencar		
Problema (causa):	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social		
Projeto:	Programa Água para Todos		
Objetivo do projeto:	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
		100	44	40.42	R\$ - R\$ 43.290.000,00

Previsão de Conclusão:	28/02/2017
Data Atualização:	10/06/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
-----------------------------	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.878.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 9.360.000,00
Saldo a liberar	R\$ 3.432.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 17.238.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 35	MI - Sudene	01/09/2013	26/09/2013		01/09/2013	02/09/2013		100%	Concluído	
2	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/2013	02/10/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído	
3	Abertura e Intrução dos Processos	GTAPT	01/09/2013	09/09/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído	
4	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/2013	23/12/2013		01/10/2013	01/10/2013		100%	Concluído	
5	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/2014	30/01/2014		01/11/2013	01/12/2013		100%	Concluído	
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/2014	30/05/2014		01/04/2014	01/05/2014		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.
7	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014		02/04/2014	02/05/2014		100%	Concluído	Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram sucesso para empenho.
8	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014	R\$ 8.658.000,00	01/04/2014	01/05/2014	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte forma: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba.
9	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/2015	31/07/2015		01/03/2015	31/07/2015		100%	Concluído	A Comissão de Força Tarefa obteve 93 respostas às solicitações de Ofícios.
10	Analise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015			80%	Atrasado	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.
11	Analise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	27/05/2016		100%	Concluído	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.

12	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	01/02/2016		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/2015	03/12/2015		01/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/2015	04/12/2015		03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	
15	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/2015	31/12/2016	R\$ 34.632.000,00	01/12/2015		R\$ 9.360.000,00	58%	Em Andamento	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N° 35/2013 é atender 50 municípios, até a data de hoje os recursos financeiros descentralizados para a SUDENE contemplam 41 municípios. A Comissão de Força Tarefa efetuou a liberação de 30 municípios até o momento.	Com o valor descentralizado até momento a SUDENE continuará com 09 municípios em Restos a Pagar.
16	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/2016	01/10/2016		01/02/2016			40%	Em Andamento		
17	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/2015	01/10/2016		10/12/2015			56%	Em Andamento		
18	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	30/09/2016	30/11/2016					0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/12/2016	01/02/2017					0%	A Iniciar		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/12/2016	01/02/2017					0%	A Iniciar		
21	Encerramento do PAPT	FTAPT	01/02/2017	30/06/2017					0%	A Iniciar		

Valor Previsto: R\$ 43.290.000,00 Valor realizado: R\$ 17.238.000,00 73,0% Em Andamento Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Programas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Programas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.

**Observações:**

2º Ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>30 (ex PO 32)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2008</b>
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA		
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)													
						Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00	A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:	01/12/2015	Data prevista para implantação do empreendimento.																	
Data Atualização:	31/05/2016																		

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
-----------------------------	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto				Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor		Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.		
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE,antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).		
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.		
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.		
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído			
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).		
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).		
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.		
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).		
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.	
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21/09/12, aprovou a desmodularização do projeto.		

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.		
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.	
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).		
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.		
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.		
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Atrasado			
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/01/10</b>	<b>31/05/15</b>	<b>3.876.491.700,00</b>	<b>12/01/10</b>	<b>-</b>	<b>3.065.105.668,00</b>	<b>83%</b>	<b>Atrasado</b>			
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>												<b>92%</b>	<b>Atrasado</b>
17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar			
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar			
<b>Encerramento (Banco)</b>			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar			
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			Valor Previsto:	3.876.491.700,00				3.065.105.668,00	77,78%	Atrasado	Status do Projeto		
<b>Parceiros institucionais:</b>													
<b>Observações:</b>													
2º Ciclo 2016													
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.													
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).													
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.													
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.													
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.													
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.													
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.													
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.													
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.													
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.													
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.													
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repartindo condições de financiamento dos envolvidos no projeto													
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto													

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 31 (ex PO 33)																				
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2013																				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																							
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGDF																							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																							
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros																											
Problema (causa):																												
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)																											
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano																											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ 1.593.233.020,25</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ 365.766.979,75</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ 206.991.566,24</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (LOA)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ 158.775.413,51</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 1.800.224.586,49</td> </tr> </table>					Pago até o ano anterior	R\$ 1.593.233.020,25	A realizar no exercício	R\$ 365.766.979,75	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 206.991.566,24	Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ 158.775.413,51	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 1.800.224.586,49
Pago até o ano anterior	R\$ 1.593.233.020,25																											
A realizar no exercício	R\$ 365.766.979,75																											
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																											
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																											
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 206.991.566,24																											
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -																											
Saldo a liberar	R\$ 158.775.413,51																											
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																											
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.800.224.586,49																											
Previsão de Conclusão:	28/12/2016	Data prevista para implantação do empreendimento.																										
Data Atualização:	31/05/2016																											
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																											
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																	
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.																	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído																		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído																		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.																	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído																		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído																		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.																	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.																	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.																	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.																	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	140.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.																	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído	Liberação concluída.																	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.																	
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído	Liberação concluída.																	
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	158.775.413,51	-	-		0,00%	A Iniciar	Aguardando pedido de liberação.																	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	01/07/16	1.954.000.000,00	24/10/13	-	1.800.224.586,49	89%	Em Andamento																		
									94%	Em Andamento																		
Competência da SUDENE /Banco																												

15	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 1.954.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.800.224.586,49	81,25%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2016
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.
Obs.6 A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 32 (ex PO 34)				
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2008				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CDDF							
Dirutor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Problema (causa):												
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)											
Objetivo do projeto:	Geração de energia termelétrica - 290 MW - Candeias/BA											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06	Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00					
						A realizar no exercício	R\$ -					
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -					
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -					
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -					
						Saldo a liberar	R\$ -					
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -					
						Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00					
Previsão de Conclusão:		01/03/2010		Data prevista para implantação do empreendimento.								
Data Atualização:		31/05/2016										
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %		
1	Carta-consulta		Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias
3	Análise de Projeto		Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses
4	Aprovação do projeto ( O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.  Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)				24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído	
5	Liberação (parcela única)		SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)				21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluido	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	Não informado	Não informado		-	-		0,0%	A Iniciar	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibilização da Resolução N° 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.	
	Encerramento (Banco)	17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:							
Observações:							
2º Ciclo 2016							
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Número do Projeto:</b> PO 33 (ex PO 35)					
<b>Objetivo estratégico:</b>							<b>Ano:</b> 2008					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CDF							
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Problema (causa):												
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR											
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70				Pago até o ano anterior R\$ -			
Previsão de Conclusão:	31/12/2016		Data prevista para implantação do empreendimento.						A realizar no exercício (RAP) R\$ 53.576.481,00			
Data Atualização:	31/05/2016								Orcamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valor Empenhado no Exercício R\$ -					
							Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 42.477.417,63					
							Saldo a liberar R\$ 11.099.063,37					
							Saldo a Empenhar no exercício R\$ -					
							Total Liberado até o exercício R\$ 42.477.417,63					
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	-	-	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	A Iniciar	O BNB indica que há possibilidade de não liberação do restante dos recursos, sendo esta condicionada à readequação do projeto. Ainda não houve formalização.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		-	-	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	50%	Em Andamento		
	Competência da SUDENE /Banco								75%	Em Andamento		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar			
	Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento		Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.

Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.

Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.

Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.

Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.

Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BN

Obs9: Aguardando a confirmação de concurso do Agente Operador.

Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 34 (ex PO 36)																				
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2011																				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																							
<b>Objetivo da ação:</b>																												
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF																							
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																							
<b>Problema (causa):</b>																												
<b>Projeto:</b>	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A																											
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE																											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ 42.723.785,57</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ 16.976.214,43</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 59.700.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.000)		Pago até o ano anterior	R\$ 42.723.785,57	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 16.976.214,43	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.000)																												
Pago até o ano anterior	R\$ 42.723.785,57																											
A realizar no exercício	R\$ -																											
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																											
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																											
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 16.976.214,43																											
Saldo a liberar	R\$ -																											
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																											
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00																											
Previsão de Conclusão:	01/08/2015																											
Data Atualização:	31/05/2016																											
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																											
Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																		
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11				-	100,00%	Concluído															
2	Pré-análise	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído																		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.																	
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marliu/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.																	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.																	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído																		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído																		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído																		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluidas.																	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído																		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído																	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .																	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar																		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 59.700.000,00			Valor realizado: 59.700.000,00			80,00%	Atrasado	Status do Projeto																	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabeleceu que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6 Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Número do Projeto:</b> PO 35 (ex PO 37)				
<b>Objetivo estratégico:</b>							<b>Ano:</b> 2011				
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
<b>Objetivo da ação:</b>											
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGLDF						
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
<b>Problema (causa):</b>											
<b>Projeto:</b>	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A										
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN										
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>				<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>		
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00				Pago até o ano anterior R\$ 53.635.943,87		
<b>Previsão de Conclusão:</b>	13/08/2016		Data prevista para implantação do empreendimento.							A realizar no exercício R\$ 1.264.056,13	
<b>Data Atualização:</b>										Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -	
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b> Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										Valor Empenhado no Exercício -	
										Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 1.264.056,13	
										Saldo a liberar -	
										Saldo a Empenhar no exercício R\$ -	
										Total Liberado até o exercício R\$ 54.900.000,00	
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
			<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			Valor Previsto: 54.900.000,00			Valor realizado: 54.900.000,00			80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 36 (ex PO 38)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CDF
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Previsão de Conclusão:

Data Atualização:

Data prevista para conclusão do empreendimento.

31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto

Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.

Atividades da Unidade (SUDENE)

13/07/11

05/06/13

0,00

13/07/11

15/05/13

0,00

100%

Concluído

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)

15/05/13

31/07/16

64.439.000,00

15/05/13

-

63.942.862,59

67%

Em Andamento

Competência da SUDENE /Banco

83%

Em Andamento

Fiscalizações

A definir

Não informado

Não informado

-

-

0,00%

A Iniciar

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado

A definir

Não informado

Não informado

-

-

0,00%

A Iniciar

Encerramento (Banco)

Não informado

Não informado

0,00

-

-

0,00

0%

A Iniciar

Resultado Geral do Projeto

Valor Previsto:

64.439.000,00

Valor realizado:

63.942.862,59

70,00%

Em Andamento

Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Número do Projeto:</b>	PO 37 (ex PO 39)																						
<b>Objetivo estratégico:</b>							<b>Ano:</b>	2012																						
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																						
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																						
<b>Objetivo da ação:</b>							<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CDF																						
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																						
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros																													
<b>Problema (causa):</b>																														
<b>Projeto:</b>	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA																													
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE																													
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>																									
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90																									
		Data prevista para conclusão do empreendimento.																												
<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/01/2017																													
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016																													
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																												
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ 59.435.321,28</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ 428.678,72</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (LOA)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ 428.678,72</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 59.435.321,28</td> </tr> </table>													Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28	A realizar no exercício	R\$ 428.678,72	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ 428.678,72	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28																													
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72																													
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																													
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																													
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -																													
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -																													
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72																													
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																													
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28																													
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>																			
			<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Físico %</b>																					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído																				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído																				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestimados.																			
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniela/Marluio/Emilia	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.																			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.																			
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>																				
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído																				
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.																			
8	Liberação 2		01/07/16	31/07/16	428.678,72	-	-		0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.																			
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/07/16</b>	<b>59.864.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>-</b>	<b>59.435.321,28</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>																				
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>																			
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar																				
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar																				
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>																				
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b> 59.864.000,00			<b>Valor realizado:</b> 59.435.321,28			<b>70,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>																			

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestrados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


  
**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 40)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Dirutor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros							
Problema (causa):								
Projeto:	Eólica Faixa III Geração e Comercialização de Energia LTDA							
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
		100	5	90	55.278.000,00 96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	27/01/2017
Data Atualização:	31/05/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$	429.090,12
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	54.848.909,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto				Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor		Inicio	Fim	Valor	Físico %		
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-		13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-		28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-		07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-		24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-		06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.

Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/16	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	67%	Em Andamento		
---	--	--	----------	----------	---------------	----------	---	---------------	-----	--------------	--	--

Competência da SUDENE /Banco										83%	Em Andamento		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	--	--

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
----------------------	--	--	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--	--

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	55.278.000,00	Valor realizado:	54.848.909,88	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					<b>Número do Projeto:</b>	PO 39 (ex PO 41)	
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					<b>Ano:</b>	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros							
Problema (causa):								
Projeto:	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA							
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE							
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55	Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60	
						A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40	
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	
						Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -	
						Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40	
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
						Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60	

Previsão de Conclusão:	27/01/2017
Data Atualização:	31/05/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(s) pelo Projeto

Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.
8	Liberação 2		01/07/16	31/07/16	1.056.552,40	-	-		0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/16	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco								83%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	55.273.000,00	Valor realizado:	54.216.447,60	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto
<b>Parceiros institucionais:</b>							
<b>Observações:</b>							
2º Ciclo 2016							
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.							
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.							
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.							
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					<b>Número do Projeto:</b>	PO 40 (ex PO 42)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
<b>Objetivo da ação:</b>										
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGRDF					
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
<b>Problema (causa):</b>										
<b>Projeto:</b>	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA									
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE									

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						Pago até o ano anterior	R\$	-	
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83	A realizar no exercício	R\$	64.455.000,00	
<b>Previsão de Conclusão:</b>	09/03/2016	Data prevista para conclusão do empreendimento.							
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016					Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler								

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>11/09/15</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>100%</b>	<b>Concluído</b>
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Atrasado</b>	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
 PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 41 (ex PO 43)				
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2011				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CDF				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros											
Problema (causa):												
Projeto:	Eólica Icaraí Geração e Comercialização de Energia											
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
		100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00						
Previsão de Conclusão:	01/08/2015		Data prevista para conclusão do empreendimento.									
Data Atualização:	31/05/2016											
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90				
							A realizar no exercício	R\$ -				
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -				
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -				
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10				
							Saldo a liberar	R\$ -				
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -				
							Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00				
N.E.		Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto

Valor Previsto:

33.900.000,00

Valor realizado:

33.900.000,00

80,00%

Atrasado

Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>					<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 42 (ex PO 44)</b>																											
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>					<b>Ano:</b>	<b>2011</b>																											
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																													
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																													
<b>Objetivo da ação:</b>						<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF																											
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																													
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros																																	
<b>Problema (causa):</b>																																		
<b>Projeto:</b>	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A																																	
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN																																	
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>																												
		100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00																												
<b>Previsão de Conclusão:</b>		13/08/2016			Data prevista para conclusão do empreendimento.																													
<b>Data Atualização:</b>		31/05/2016																																
<b>Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>46.786.085,39</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>3.213.914,61</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>3.213.914,61</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>50.000.000,00</td> </tr> </table>											Pago até o ano anterior	R\$	46.786.085,39	A realizar no exercício	R\$	3.213.914,61	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	3.213.914,61	Saldo a liberar	R\$	-	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	50.000.000,00
Pago até o ano anterior	R\$	46.786.085,39																																
A realizar no exercício	R\$	3.213.914,61																																
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	3.213.914,61																																
Saldo a liberar	R\$	-																																
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																
Total Liberado até o exercício	R\$	50.000.000,00																																
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>																							
			<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>				<b>Físico %</b>																						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído																								
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído																								
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.  Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.																							
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.																							
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.																							
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>07/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>																								
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído																								
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído																								
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.																							
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>15/02/16</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>																								
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>																																		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar																								
10	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar																								
<b>Encerramento (Banco)</b>			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar																								
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b> 50.000.000,00			<b>Valor realizado:</b> 50.000.000,00			<b>80,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>																							

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias , concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6 Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 43 (ex PO 45)																		
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012																		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																					
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																					
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CDF																					
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros																									
Problema (causa):																										
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A																									
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN																									
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto																				
		100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62																				
Previsão de Conclusão:		08/02/2015			Data prevista para conclusão do empreendimento.																					
Data Atualização:		31/05/2016																								
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																								
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ 49.687.713,17</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 49.687.713,17</td> </tr> </table>											Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17																									
A realizar no exercício	R\$ -																									
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																									
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																									
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -																									
Saldo a liberar	R\$ -																									
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																									
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17																									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas															
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %																	
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído																
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído																
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.															
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Joema/J. Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.															
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.															
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído																
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído																
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído																
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.															
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído																
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído															

8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar						
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .					
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado					
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto				
<b>Parceiros institucionais:</b>															
<b>Observações:</b>															
2º Ciclo 2016															
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.															
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.															
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.															
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.															
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.															

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Atrasado	Cancelado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 44 (ex PO 46)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGDF						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto					
		100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31					
Previsão de Conclusão:	31/05/2016		Data prevista para conclusão do empreendimento.								
Data Atualização:	31/05/2016										
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>											
Pago até o ano anterior			R\$ 40.845.410,40								
A realizar no exercício			R\$ -								
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)			R\$ -								
Valor Empenhado no Exercício			R\$ -								
Valor liberado no Exercício (RAP)			R\$ -								
Saldo a liberar			R\$ -								
Saldo a Empenhar no exercício			R\$ -								
Total Liberado até o exercício			R\$ 40.845.410,40								
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>			<b>Ações Corretivas</b>		
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Início 01/09/11 Fim 31/10/11 Valor -	Início 01/09/11 Fim 26/10/11 Valor - Físico % 100,00%	Concluído						
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Início 07/12/11 Fim 05/02/12 Valor -	Início 07/12/11 Fim 01/02/12 Valor - Físico % 100,00%	Concluído						
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	Início 06/02/12 Fim 10/02/13 Valor -	Início 06/02/12 Fim - Valor - Físico % 100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.			Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	Início 24/12/12 Fim 24/03/13 Valor -	Início 24/12/12 Fim 25/03/13 Valor - Físico % 100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.					
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Início 25/03/13 Fim 24/04/13 Valor -	Início 25/03/13 Fim 15/05/13 Valor - Físico % 100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.					
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	Início 15/05/13 Fim 31/05/13 Valor -	Início 15/05/13 Fim 24/05/13 Valor - Físico % 100,00%	Concluído						
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	Início 01/02/14 Fim 03/03/14 Valor 34.986.862,96	Início 13/12/13 Fim 24/01/14 Valor 34.986.862,96 Físico % 100,00%	Concluído						
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	Início 01/03/14 Fim 14/06/13 Valor 5.858.547,44	Início 06/11/15 Fim 01/12/15 Valor 5.858.547,44 Físico % 100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.					
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 40.845.410,40			Valor realizado: 40.845.410,40			80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				<b>Número do Projeto:</b>	PO 45 (ex PO 47)	
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				<b>Ano:</b>	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF				
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Problema (causa):							
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A						
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,00 MW - Sobradinho/BA						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00	
Previsão de Conclusão:	19/05/2015	Data prevista para conclusão do empreendimento.							
Data Atualização:	31/05/2016								
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00		
						A realizar no exercício	R\$ -		
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -		
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
						Saldo a liberar	R\$ -		
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
						Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00		

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Martilio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-			0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-			0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		29.040.000,00	Valor realizado:		29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 46 (ex PO 48)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CDFG						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto						
				100	53.959.000,00	127.613.439,00					
Previsão de Conclusão:	19/05/2015	Data prevista para conclusão do empreendimento.									
Data Atualização:	31/05/2016										
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)											
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00										
A realizar no exercício	-										
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	-										
Valor Empenhado no Exercício	-										
Valor liberado no Exercício (RAP)	-										
Valor liberado no Exercício (LOA)	-										
Saldo a liberar	-										
Saldo a Empenhar no exercício	-										
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %		
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniele/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	53.959.000,00	Valor realizado:	53.959.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fone: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 47 (ex PO 49)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geracão de Energia Fólica - 420 MW - Paracuru/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.00)
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00	Pago até o ano anterior R\$ 96.407.194,96
Previsão de Conclusão:	28/12/2016	Data prevista para conclusão do empreendimento.				
Data Atualização:	31/05/2016					
Responsáv(el)eis técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	

Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/06/16	01/07/16	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)	22/05/13	01/07/16	99.970.000,00	22/05/13	-	96.407.194,96	67%	<span style="background-color: #2e7131; color: white;">Em Andamento</span>	
Competência da SUDENE /Banco							83%	<span style="background-color: #2e7131; color: white;">Em Andamento</span>	

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--

Parceiros institucionais:

**Observações:****2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

**Legenda**

A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 48 (ex PO 50)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CDF						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Problema (causa):											
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP										
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto					
		100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00					
Previsão de Conclusão:		29/07/2016									
Data Atualização:		31/05/2016									
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler									
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b> Pago até o ano anterior R\$ 269.869.740,06 A realizar no exercício R\$ 33.130.259,94 Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ - Valor Empenhado no Exercício R\$ - Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ - Saldo a liberar R\$ 33.130.259,94 Saldo a Empenhar no exercício R\$ - Total Liberado até o exercício R\$ 269.869.740,06											
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.130.259,94	-	-	-	0,00%	Atrasado	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/16	31/01/16	3.000.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/01/16	303.000.000,00	19/04/13	-	269.869.740,06	67%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco										83%	Em Andamento
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	303.000.000,00	Valor realizado:	269.869.740,06	63,64%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
2º Ciclo 2016											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.											
Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 51)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:			DFIN/CGDF				
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:			Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Problema (causa):											
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)										
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto						
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00						
Previsão de Conclusão:	29/03/2019						Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
Data Atualização:	31/05/2016						Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00			
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						A realizar no exercício	R\$ 108.616.000,00			
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenrado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.
4	Atividades da Unidade (SUDENE)		14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído	
6	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
8	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
13	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
14	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/13	30/12/13	13.852.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
15	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
16	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
17	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
18	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
19	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
20	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
21	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento	
22	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			270.582.240,00	Valor realizado:	30.000.000,00	22,73%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**2º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 50 (ex PO 52)																																																								
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012																																																								
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																																											
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																																											
Objetivo da ação:																																																																
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF																																																											
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																																											
Problema (causa):																																																																
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.																																																															
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos																																																															
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>19.539.983,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>4.315.058,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>4.315.058,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>19.539.983,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						Pago até o ano anterior	R\$	19.539.983,88				A realizar no exercício	R\$	4.315.058,12				Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-				Valor Empenhado no Exercício	R\$	-				Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-				Saldo a liberar	R\$	4.315.058,12				Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-				Total Liberado até o exercício	R\$	19.539.983,88			
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																																																
Pago até o ano anterior	R\$	19.539.983,88																																																														
A realizar no exercício	R\$	4.315.058,12																																																														
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																																														
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																																														
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-																																																														
Saldo a liberar	R\$	4.315.058,12																																																														
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																																														
Total Liberado até o exercício	R\$	19.539.983,88																																																														
Previsão de Conclusão:	31/12/2016		Data prevista para conclusão do empreendimento.																																																													
Data Atualização:	31/05/2016																																																															
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																																															
Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																																																						
		Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				Físico %																																																					
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobretempo dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.																																																					
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído																																																						
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.																																																					
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído																																																						
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído																																																						
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído																																																						
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído																																																						
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Ver Observação 4.																																																					
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																						
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Em Andamento																																																						
Competência da SUDENE /Banco										80%	Em Andamento																																																					
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																						
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																						
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar																																																						
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	23.855.042,00	Valor realizado:	19.539.983,88	60,00%	Em Andamento	Status do Projeto																																																							
<b>Parceiros institucionais:</b>																																																																
<b>Observações:</b>																																																																
2º Ciclo 2016																																																																
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																																																																
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.																																																																
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.																																																																
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)																																																																

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 51 (ex PO 53)																																			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012																																			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																						
Objetivo da ação:																																											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF																																						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																						
Problema (causa):																																											
Projeto:	Deten Química S.A.																																										
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos																																										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto																																						
				100	31.256.000,00	78.140.000,00																																					
Previsão de Conclusão:	30/01/2016																																										
Data Atualização:	31/05/2016																																										
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>15.447.600,00</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>15.808.400,00</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>15.808.400,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>15.447.600,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)										Pago até o ano anterior	R\$	15.447.600,00	A realizar no exercício	R\$	15.808.400,00	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	15.808.400,00	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	15.447.600,00
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																											
Pago até o ano anterior	R\$	15.447.600,00																																									
A realizar no exercício	R\$	15.808.400,00																																									
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																									
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																									
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-																																									
Saldo a liberar	R\$	15.808.400,00																																									
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																									
Total Liberado até o exercício	R\$	15.447.600,00																																									
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>		<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>																															
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %																																	
1	Consulta prévia		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído																																
2	Análise de Projeto		BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído																																
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.																															
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>				05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído																																
4	Contratação do banco operador		SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído																																
5	Liberação 1		SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.																															
6	Liberação 2		SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.																															
7	Liberação 3		SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																
8	Liberação 4		SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																
9	Liberação 5		SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																
10	Liberação 6		SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>				10/09/13	30/12/15	31.256.000,00	10/09/13	-	15.447.600,00	29%	Atrasado																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">Competência da SUDENE /Banco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right; padding-right: 20px;">64% <span style="color: red;">Atrasado</span></td> </tr> </tbody> </table>										Competência da SUDENE /Banco										64% <span style="color: red;">Atrasado</span>																							
Competência da SUDENE /Banco																																											
64% <span style="color: red;">Atrasado</span>																																											
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																
<b>Encerramento (Banco)</b>			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar																																	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			Valor Previsto:		31.256.000,00	Valor realizado:	15.447.600,00	41,67%	Atrasado	Status do Projeto																																	
<b>Parceiros institucionais:</b>																																											
<b>Observações:</b>																																											
2º Ciclo 2016																																											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																																											
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.																																											
Obs3: A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.																																											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 52 (ex PO 54)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
<b>Objetivo da ação:</b>				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.										
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas										
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>				
		100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00					
Previsão de Conclusão:	23/12/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.					Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00		
Data Atualização:	31/05/2016							A realizar no exercício	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ -			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00			
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
			<b>Ínicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Ínicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14	-	27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									100%	Concluído	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015.
<b>Encerramento (Banco)</b>			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			Valor Previsto:		61.867.350,00	Valor realizado:	61.867.350,00	66,67%	Atrasado	Status do Projeto	
<b>Parceiros institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
2º Ciclo 2016											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


  
 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
 PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 55)																										
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012																										
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																													
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																													
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGDF																													
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																													
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros																																	
Problema (causa):																																		
Projeto:	Cone Multicenter Ltda																																	
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico																																	
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto																													
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00																													
Previsão de Conclusão:		30/03/2017																																
Data Atualização:		31/05/2016																																
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>177.367.554,00</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>191.238.424,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> </table>											Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	177.367.554,00	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	191.238.424,00	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	-
Pago até o ano anterior	R\$	-																																
A realizar no exercício	R\$	177.367.554,00																																
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-																																
Saldo a liberar	R\$	191.238.424,00																																
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																
Total Liberado até o exercício	R\$	-																																
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas			Ações Corretivas																									
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %																									
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído																								
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído																								
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.																							
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído																								
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído																								
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																								
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																								
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																								
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																								
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																								
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																								
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar																								
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar																								
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Em Andamento																								
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>																																		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																								
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																								
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar																								
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	191.238.424,00	Valor realizado:	0,00	28,57%	Em Andamento	Status do Projeto																									
<b>Parceiros institucionais:</b>																																		
<b>Observações:</b>																																		
2º Ciclo 2016 Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador. Obs3: O projeto está sendo totalmente rerealizado pelo agente operador.																																		
Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)																																		

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 54 (ex PO 56)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Braskem S.A.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
						Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
				100	5 90	50.000.000,00	478.494.548,00			Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor						
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído				
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído				
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.			
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído				
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído				
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.			
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído				
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído				
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar				
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .			
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar				
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	50.000.000,00	Valor realizado:	50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto					
Parceiros institucionais:														
Observações:														
2º Ciclo 2016														
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.														
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.														

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
 PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 55 (ex PO 57)				
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CDF							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros											
Problema (causa):												
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A											
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00					Pago até o ano anterior	R\$ -
Previsão de Conclusão:		30/09/2017				A realizar no exercício	R\$ 963.665.191,00					
Data Atualização:		31/05/2016				Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -					
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				Físico %
1	Consulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/13	06/07/14	0,00	19/12/12	27/06/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Atrasado	Minuta de contrato enviada ao Banco.	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Contrato CEF/Empresa em fase de formalização. Cronograma de desembolso será repactuado.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/06/14	31/07/17	1.075.935.159,00	16/05/14	-	0,00	6%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco											53% Em Andamento	
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 1.075.935.159,00			Valor realizado: 0,00			26,92%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
2º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 56 (ex PO 58)</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	2014			
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGDF			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. ( antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)										
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário										
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>				
		100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88					
Previsão de Conclusão:	29/06/2017						Pago até o ano anterior	R\$ 178.622.724,54			
Data Atualização:	31/05/2016						A realizar no exercício	R\$ 177.924.928,79			
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Orcamento Aprovado no Exercício (LOA+Créd.)	R\$ -		
								Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
								Valor liberado no Exercício	R\$ 67.883.618,19		
								Saldo a liberar	R\$ 169.076.219,79		
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
								Total Liberado até o exercício	R\$ 246.506.342,73		
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
			<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/05/13</b>	<b>20/03/14</b>	<b>0,00</b>	<b>03/05/13</b>	<b>21/02/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/08/16	31/08/16	85.128.647,73	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	83.947.572,06	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/02/14</b>	<b>31/12/16</b>	<b>415.582.562,52</b>	<b>21/02/14</b>	<b>-</b>	<b>246.506.342,73</b>	<b>71,43%</b>	<b>Em Andamento</b>	
										<b>86%</b>	<b>Em Andamento</b>
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 415.582.562,52</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 246.506.342,73</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		
<b>Parceiros institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
2º Ciclo 2016											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs3: A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 57 (ex PO 59)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGLDF																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Problema (causa):																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Projeto:	Cone S/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Objetivo do projeto:	Implantação de plataforma de serviços de logística																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97	Pago até o ano anterior	R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							A realizar no exercício	R\$ 123.186.471,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Orçamento Aprovado no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 123.186.471,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Valor liberado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Saldo a liberar	R\$ 123.186.471,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 123.186.471,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Total Liberado até o exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Previsão de Conclusão:		29/08/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Data Atualização:		31/05/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N.E.</th> <th rowspan="2">Atividades/ Etapas</th> <th rowspan="2">Responsável</th> <th colspan="3">Previsto</th> <th colspan="3">Realizado</th> <th rowspan="2">Status</th> <th rowspan="2">Observação/Problemas</th> <th rowspan="2">Ações Corretivas</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Físico %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consulta prévia</td> <td>Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)</td> <td>12/12/13</td> <td>11/01/14</td> <td>-</td> <td>12/12/13</td> <td>26/12/13</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Análise de Projeto</td> <td>BB</td> <td>23/05/14</td> <td>20/10/14</td> <td>-</td> <td>23/05/14</td> <td>19/09/14</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada</td> <td>SUDENE</td> <td>02/04/14</td> <td>02/05/14</td> <td>-</td> <td>02/04/14</td> <td>12/11/14</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Atividades da Unidade (SUDENE)</td> <td>12/12/13</td> <td>02/05/14</td> <td>0,00</td> <td>12/12/13</td> <td>12/11/14</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Contratação do banco operador</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>18/11/14</td> <td>15/12/15</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td>Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Cronograma de desembolso será reajustado.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Liberação 1</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/12/14</td> <td>31/12/14</td> <td>60.559.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Liberação 2</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/02/15</td> <td>03/03/15</td> <td>8.986.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Liberação 3</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/04/15</td> <td>01/05/15</td> <td>4.616.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Liberação 4</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/06/15</td> <td>01/07/15</td> <td>4.289.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Liberação 5</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/08/15</td> <td>31/08/15</td> <td>14.059.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Liberação 6</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/10/15</td> <td>31/10/15</td> <td>11.656.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Liberação 7</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/12/15</td> <td>31/12/15</td> <td>11.751.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Liberação 8</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/02/16</td> <td>02/03/16</td> <td>7.270.471,03</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</td> <td>18/11/14</td> <td>02/03/16</td> <td>123.186.471,03</td> <td>00/01/00</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">Competência da SUDENE /Banco</td> <td>50,00%</td> <td>Em Andamento</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Fiscalizações</td> <td>A definir</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Emissão de Certificado de Empreend. Implantado</td> <td>A definir</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Encerramento (Banco)</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Resultado Geral do Projeto</td> <td>Valor Previsto:</td> <td>R\$ 123.186.471,03</td> <td>Valor realizado:</td> <td>R\$ -</td> <td>21,43%</td> <td>Em Andamento</td> <td colspan="2">Status do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Parceiros Institucionais:</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Observações:</td> </tr> <tr> <td colspan="12">2º Ciclo 2016</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Obs.: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.</td> </tr> </tbody> </table>										N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %	1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	Atividades da Unidade (SUDENE)			12/12/13	02/05/14	0,00	12/12/13	12/11/14	0,00	100,00%	Concluído		4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-			-	0,00%	Atrasado	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Cronograma de desembolso será reajustado.	5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	Atrasado		Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			18/11/14	02/03/16	123.186.471,03	00/01/00	-	0,00	0,00%	A Iniciar		Competência da SUDENE /Banco										50,00%	Em Andamento	13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 123.186.471,03	Valor realizado:	R\$ -	21,43%	Em Andamento	Status do Projeto		Parceiros Institucionais:												Observações:												2º Ciclo 2016												Obs.: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status				Observação/Problemas	Ações Corretivas																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor		Físico %																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Atividades da Unidade (SUDENE)			12/12/13	02/05/14	0,00	12/12/13	12/11/14	0,00	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-			-	0,00%	Atrasado	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Cronograma de desembolso será reajustado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			18/11/14	02/03/16	123.186.471,03	00/01/00	-	0,00	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Competência da SUDENE /Banco										50,00%	Em Andamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 123.186.471,03	Valor realizado:	R\$ -	21,43%	Em Andamento	Status do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Parceiros Institucionais:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Observações:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2º Ciclo 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Obs.: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Número do Projeto:</b> PO 58 (ex PO 60) <b>Ano:</b> 2015																	
<b>Objetivo estratégico:</b>																								
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						<b>Eixo temático (MI):</b> Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						<b>Objetivo estratégico (MI):</b> Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas																	
<b>Objetivo da ação:</b>																								
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						<b>Subunidade responsável:</b> DFIN/CGDF																	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros						<b>Gestor da subunidade:</b> Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																	
<b>Problema (causa):</b>																								
<b>Projeto:</b>	Iraeta Brasil S/A																							
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de uma unidade de fabricação de flanges eólicas																							
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>																			
	100	5	90	34.102.182,00	89.861.866,00																			
<b>Previsão de Conclusão:</b> 28/04/2016 <b>Data Atualização:</b> 31/05/2016																								
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b> Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																								
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ 34.102.182,00</td> </tr> <tr> <td>Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)</td> <td>R\$ 34.102.182,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ 34.102.182,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ 34.102.182,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> </table>									Pago até o ano anterior	R\$ -	A realizar no exercício	R\$ 34.102.182,00	Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 34.102.182,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ 34.102.182,00	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 34.102.182,00	Total Liberado até o exercício	R\$ -
Pago até o ano anterior	R\$ -																							
A realizar no exercício	R\$ 34.102.182,00																							
Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 34.102.182,00																							
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																							
Valor liberado no Exercício	R\$ -																							
Saldo a liberar	R\$ 34.102.182,00																							
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 34.102.182,00																							
Total Liberado até o exercício	R\$ -																							
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>													
			<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Físico %</b>															
1	Consulta prévia	Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)	07/10/14	06/11/14	-	07/10/14	24/10/15	-	100,00%	Concluído														
2	Análise de Projeto	BB	02/04/15	30/08/15	-	02/04/15	28/08/15	-	100,00%	Concluído														
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/08/15	27/09/15	-	28/08/15	23/09/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.													
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			07/10/14	27/09/15	0,00	07/10/14	23/09/15	0,00	100,00%	Concluído														
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/09/15	26/01/16	-	-	-	-	50,00%	Atrasado	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Autorizado a prorrogação do prazo de contratação pelo BB até 26/01/2016.													
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador. Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.													
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			28/09/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	0,00	25,00%	Atrasado														
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									63%	Atrasado														
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar														
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar														
<b>Encerramento (Banco)</b>			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar														
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			Valor Previsto:	R\$ 34.102.182,00	Valor realizado:	R\$ -	50%	Atrasado	<b>Status do Projeto</b>															
<b>Parceiros Institucionais:</b>																								
<b>Observações:</b>																								
2º Ciclo 2016																								
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																								

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b> <b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>					<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 59 (ex PO 61)</b>					
<b>Objetivo estratégico:</b>						<b>Ano:</b>	2015					
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de					
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGLDF					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros											
Problema (causa):												
Projeto:	Sauípe S/A											
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>						
	100	5	90	68.299.987,00	193.893.821,06	Pago até o ano anterior	R\$ -					
						A realizar no exercício	R\$ -					
						Orcamento Aprovado no Exercício (LOA+Créd.)	R\$ 68.299.987,00					
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -					
						Valor liberado no Exercício	R\$ -					
						Saldo a liberar	R\$ 68.299.987,00					
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 68.299.987,00					
						Total Liberado até o exercício	R\$ -					
Previsão de Conclusão:		30/07/2018										
Data Atualização:		31/05/2016										
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Consulta prévia	Ademir Vilaça/Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	09/10/14	08/11/14	-	09/10/14	30/10/14	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/05/15	22/10/15	-	25/05/15	26/10/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	26/10/15	25/11/15	-	26/10/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 231/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			09/10/14	25/11/15	0,00	09/10/14	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/16	01/05/16	10.133.063,55	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	16.330.175,83	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	6.085.184,11	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	12.766.884,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/04/17	01/05/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/10/17	31/10/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	5.731.169,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			16/11/15	31/01/18	68.299.987,00	-	-	0,00	5,56%	Em Andamento		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										53%	Em Andamento	
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			Valor Previsto:	R\$ 68.299.987,00	Valor realizado:	R\$ -	25%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>			
<b>Parceiros institucionais:</b>												
<b>Observações:</b>												
2º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Número do Projeto:</b>	PO 60 (ex PO 62)
<b>Objetivo estratégico:</b>		<b>Ano:</b>	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGLF
Diretoria responsável:	Secretaria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
Problema (causa):			
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																	
						Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	-	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	39.800.940,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	39.800.940,00
Previsão de Conclusão:	31/12/2016																						
Data Atualização:	31/05/2016																						
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																						

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	09/05/16	-	-	0,00%	Atrasado	Pedido de liberação em análise.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	-	0,00	50,00%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									75%	Em Andamento	

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:	R\$ -	57%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2016	

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 61 (Ex PO 63)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGLDF
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S/A		
Objetivo do projeto:	Modernização do Centro de Petroquímicos Básicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	188.283.235,00	418.407.190,00	

Previsão de Conclusão:	27/01/2017
Data Atualização:	31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 188.283.235,00
Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 188.283.235,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Austriclinio (SUDENE/DFIN)	03/02/15	05/03/15	-	03/02/15	26/02/15	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	04/08/15	01/01/16	-	04/08/15	28/12/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/01/16	31/01/16	-	12/01/16	11/02/16	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 241/2015.
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/02/15	31/01/16	0,00	03/02/15	11/02/16	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/02/16	16/06/16	-	17/02/16	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	188.283.235,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/02/16	31/07/16	188.283.235,00	17/02/16	-	0,00	25,00%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									62,5%	Em Andamento	

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar			
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	-------	-----------	--	--	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 188.283.235,00	Valor realizado:	R\$ -	50%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2016	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 62 (ex PO 64)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CDF
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S/A		
Objetivo do projeto:	Modernização das unidades industriais de vinílicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	62.999.857,00	139.999.682,00

Previsão de Conclusão:	27/01/2017
Data Atualização:	31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 62.999.857,00
Orçamento Aprovado no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 62.999.857,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	03/02/15	05/03/15	-	03/02/15	26/02/15	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	04/08/15	01/01/16	-	04/08/15	28/12/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/01/16	31/01/16	-	12/01/16	11/02/16	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 242/2015.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/02/15</b>	<b>31/01/16</b>	<b>0,00</b>	<b>03/02/15</b>	<b>11/02/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/02/16	16/06/16	-	17/02/16	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	62.999.857,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>17/02/16</b>	<b>31/07/16</b>	<b>62.999.857,00</b>	<b>17/02/16</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>62,5%</b>	<b>Em Andamento</b>	
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 62.999.857,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>50%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 63 (ex PO 66)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b>	2016
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
<b>Unidade Responsável:</b>	Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI)	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte aos Colegiados (CGP/CGGI)
<b>Responsável:</b>	Manoel Francisco Barreiros (Coordenador-Geral)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carmen Lúcia Couto Fonseca
<b>Problema (causa):</b>	Mudanças no Decreto nº 8.276, de 27/06/14, feitas pelo Decreto nº 8.679, de 22/02/2016, reduziu 9 cargos comissionados, afetando o funcionamento de algumas unidades da estrutura organizacional da SUDENE.		
<b>Projeto:</b>	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adequar, até 13/06/2016, o atual RI da SUDENE aos cortes estabelecidos pelo Decreto nº 8.679/2016, sancionado em 22/02/2016 e publicado no DOU em 23/02/2016.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				0,00	R\$ -	
Previsão de Conclusão:	16/06/2016					Pago até o ano anterior
Data Atualização:	31/05/2016					A realizar no exercício
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca					Orçamento Aprovado (LOA + Credito)
						Valor Empenhado no Exercício
						Valor liberado no Exercício
						Saldo a liberar
						Saldo a Empenhar no exercício
						Total Liberado até o exercício

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Reunião com as unidades internas para a apresentação da metodologia e dos encaminhamento necessários (prazos e produtos esperados) para a adequação do Regimento interno vigente aos cortes. Espaço Cultural Celso Furtado - 8º andar, sala 01-Ala Norte, 9h30	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/03/16	01/03/16		01/03/16	01/03/16		100,00%	Concluído	Os novos ajustes do RI da SUDENE terão como base a Resolução da DC nº 230 que aprovou o RI em 2015, bem como, o Decreto nº 8.276/14, o Decreto nº 8.679/2016 que estabeleceu cortes na estrutura de cargos daquele Decreto, ademais das contribuições das unidades. Além disso os efeitos do Decreto nº 8.679/2016 começam vinte e um dias após a sua publicação. Ou seja, 15/03/16.
2	Análise das unidades e encaminhamento das propostas de ajuste	Gestores das unidades internas	01/03/16	18/03/16		01/03/16	23/05/16		100,00%	Concluído	Devido ao pouco tempo e escassez do quadro da CGGI não haverá prorrogação. A unidade que não se manifestar até a data será interpretada como aderente à proposta vigente no Regimento Interno aprovado pela RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA nº 230/2015.
3	Retorno das unidades internas	Gestores das unidades internas	12/04/16	12/04/16		16/05/16	23/05/16		100,00%	Concluído	Apenas as unidades afetadas pelo Decreto nº 8.679/16 (Coordenação-Geral de Adm. e Finanças e Coordenação-Geral de TI) encaminharam propostas.
4	Reunião presencial com as unidades e últimos ajustes, conforme o caso.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	13/04/16	19/04/16		24/05/16	24/05/16		100,00%	Concluído	
5	Montagem da primeira minuta e envio às unidades para apreciação	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	06/04/16	08/04/16		25/05/16	25/05/16		100,00%	Concluído	
6	Envio da proposta do RI ajustado à Procuradoria da SUDENE para análise da proposta.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	25/04/16	25/04/16		30/05/16	30/05/16		100,00%	Concluído	
7	Análise e entrega da minuta analisada pela Procuradoria da SUDENE	Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)	30/05/16	10/06/16		30/05/16			20,00%	Em Andamento	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.
8	Ajuste do Regimento Interno a depender de observações da PRD da SUDENE.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	13/06/16	13/06/16					0,00%	A Iniciar	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.

9	Reunião prévia de esclarecimento e alinhamento de posições com os Diretores de Administração, de Fundos e Incentivos, e de Planejamento	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/06/16	14/06/16					0,00%	A Iniciar	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.	
10	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/06/16	15/06/16					0,00%	A Iniciar	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.	
11	Encaminhamento para publicação no DOU e Boletim interno.	Gabinete da Superintendência	16/06/16	16/06/16					0,00%	A Iniciar	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades. O prazo limite é 13/06/16 (90 dias contados do início dos efeitos do Decreto nº 8.679/2016) contudo as unidades atrasaram a entrega de suas propostas.	
12	Análise da alteração do siglário das unidades da Sudene.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	16/06/16	16/06/16					0,00%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>		0,00	<b>Valor realizado:</b>		52%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Unidades Administrativas internas.

**Observações:**

2º Ciclo 2016

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 64
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;	<b>Ano:</b>	2016
<b>Sub Objetivo:</b>	3.1.1-Reestruturar as unidades gestoras		
<b>Programa do PPA:</b>		<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
<b>Objetivo da ação:</b>	Ação prevista no rol das atribuições da Coordenação-Geral de Gestão Institucional		
<b>Unidade responsável:</b>	Superintendência	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
<b>Gestor:</b>	Ricardo Barros (Superintendente interino).	<b>Gestor da subunidade:</b>	Manoel Francisco Barreiros
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de realinhamento da programação do planejamento estratégico vigente objetivando mais clareza e foco, paralelamente com o trabalho de melhoria da vinculação das metas e ações às atribuições e processos gerenciais.		
<b>Projeto:</b>	Realinhamento do planejamento estratégico institucional com a definição de metas e ações, integradamente com a atualização das atribuições regimentais e dos processos mapeados em 2012		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realinhamento do planejamento estratégico da SUDENE, das atribuições regimentais e dos processos mapeados em 2012, sua atualização/complementação objetivando adequação desses referenciais à realidade da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				0,00	R\$ -	Pago até o ano anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Previsão de Conclusão:	19/07/17					A realizar no exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Data Atualização:	31/05/16					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Uyran Costa (Chefe de Gabinete) e Manoel Barreiros (Coordenador-Geral da CGGI)					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						Valor liberado no Exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						Saldo a liberar	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Reunião com a Chefia de Gabinete para início dos trabalhos incluindo a definição da condução do novo realinhamento, responsabilidades, envolvidos inicialmente, metodologia, referenciais, testes de validação, organização de apresentações, agenda	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	06/04/16	06/04/16		06/04/16	06/04/16		100%	Concluído	
2	Escolha da unidade administrativa para aplicação da metodologia (teste de validação metodológica da análise integrada entre o estratégico, o regimental e o processo mapeado)	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	07/04/15	07/04/16		07/04/16	07/04/16		100%	Concluído	Foi escolhida a Diretoria de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento e suas duas Coordenações Gerais: Fundos de Desenvolvimento e Financiamento, e Benefícios e Incentivos Fiscais
3	Reestudo das competências regimentais vigentes da SUDENE, aprovadas pela Diretoria Colegiada por meio da Resolução nº 230, de 21 de outubro de 2015, integrando-a aos objetivos do planejamento estratégico vigente para o período 2013-2016, e ao mapeamento de processos atualizando o que foi realizado em 2012	Uyran Costa (Gabinete) e Manoel Barreiros (CGGI)	06/04/16	23/08/16		06/04/16			70%	Paralisado	O trabalho foi assumido pelas Diretorias de Gestão de Fundos e de Administração, avançou, mas a decisão de sua continuidade foi, em 25/04/16, repassada pelo então Superintendente João Paulo para o Diretor de Planejamento, Sérgio Alencar, e não teve continuidade. Ajuste da data de "fim previsto".
4	Apresentação dos resultados do projeto "piloto" à Diretoria Colegiada para deliberação.	Uyran Costa (Gabinete) e Manoel Barreiros (CGGI)	24/08/16	24/08/16					0%	A Iniciar	
5	Apresentação da proposta para os Coordenadores Gerais da SUDENE	Uyran Costa (Gabinete) e Manoel Barreiros (CGGI)	30/08/16	30/08/16					0%	A Iniciar	
6	Apresentação da proposta para os Coordenadores Gerais	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	31/08/16	07/12/16					0%	A Iniciar	
7	1ª Apresentação do andamento dos trabalhos para a Diretoria Colegiada	Uyran Costa (Gabinete) e Manoel Barreiros (CGGI)	14/12/16	14/12/16					0%	A Iniciar	
8	Continuidade dos trabalhos	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	07/02/17	31/05/17					0%	A Iniciar	

9	2ª Apresentação do andamento dos trabalhos para a Diretoria Colegiada	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	07/06/17	07/06/17					0%	A Iniciar		
10	Ajustes da proposta	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	08/06/17	14/07/17					0%	A Iniciar		
11	Apresentação final para aprovação da Diretoria Colegiada	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	19/07/17	19/07/17					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	25%	Paralisado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 65 (ex PO 67)
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	3.1.2. Modernizar a gestão	<b>Ano:</b>	2016
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes
Diretor:	Eugenio Pacelli		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				-	-

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
-----------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1 Processo nº 59335.000175/2012-20 (SIAFI n.º 769473), Aprovação de Relatório de Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/01/2016	19/01/2016	ñ se aplica	04/01/2016	04/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
2 Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783 ), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/01/2016	03/02/2016	ñ se aplica	19/01/2016	20/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
3 Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/01/2016	05/02/2016	ñ se aplica	21/01/2016	26/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
4 Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783 ), Análise Financeira complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/03/2016	05/04/2016	ñ se aplica	21/03/2016	22/03/216	ñ se aplica	100%	Concluído	
5 Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Reanálise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/03/2016	05/04/2016	ñ se aplica	21/03/2016	31/03/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
6 Processo nº 59335.000116/2012-51 (SIAFI n.º 769782),Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/04/2016	19/04/2016	ñ se aplica	04/04/2016	29/04/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
7 Processo nº 59333.000262/2005-78 (SIAFI n.º 542944), Análise Financeira complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/04/2016	04/05/2016	ñ se aplica	19/04/2016	04/05/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
8 Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365),Reanálise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/05/2016	04/06/2016	ñ se aplica	20/05/2016	24/05/2016	ñ se aplica	100%	Concluído	
9 Processo nº 03054.000003/99-74 (SIAFI n.º 374633),Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	27/05/2016	11/06/2016	ñ se aplica	27/05/2016		ñ se aplica	50%	Em Andamento	
		Valor Previsto:			Valor realizado:			94%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

**Observações:**

2º ciclo 2016 - Jan/2016 a Mai/2016

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b> 3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		<b>Número do Projeto:</b> PO 66 (ex PO 68)
<b>Sub-Obj. estratégico:</b> 3.1.2. Modernizar a gestão		<b>Ano:</b> 2016
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI): Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI): Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
Diretor:	Eugenio Pacelli	Gestor da subunidade: Heber Leandro Nunes
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.	
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.	

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				-	-

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/05/2016

Responsável(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
-----------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	30/06/2016	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tendo em vista a remessa de documentação pelo potencial responsável, foi solicitada a emissão de laudo técnico complementar
2	Processo TCE n.º , Ref. Conv. SIAFI n.º 317557 (Processo n.º 03057.000002/96-93) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	26/10/2015	30/06/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações
3	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	03/10/2016	N/A	06/04/2016		N/A	66%	Em Andamento	
4	Processo TCE n.º 59335.000538/09-21, Ref. Conv. SIAFI n.º 406596 (Processo n.º 59313.000105/00-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	26/10/2015	30/06/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações
			Valor Previsto:		-	Valor realizado:		-	77%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros Institucionais:**

Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

**Observações:**

2º ciclo 2016 - Jan/2015 a Mai/2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 67 (ex PO 69)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Diretor :	Eugenio Pacelli		
Problema (causa):	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe		
Projeto:	Desenvolvimento de Lideranças		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.000,00	25.000,00

Previsão de Conclusão:	17/11/2019
Data Atualização:	01/06/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
--	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 9.580,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.580,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14		17/11/14	28/11/14		100%	Concluído	
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído	
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14		11/12/14	11/12/14		100%	Concluído	
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15		03/02/15	31/03/15		100%	Concluído	
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15		01/04/15	30/04/15		100%	Concluído	
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/06/16	15.420,00	04/05/15			50%	Em Andamento	Processo de contratação em análise na Procuradoria. Datas repactuadas.
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/12/15	30/06/16	7.980,00	04/12/15		7.980,00	50%	Em Andamento	O curso já foi realizado porém não chegaram os certificados.
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/07/16	30/11/16					0%	A Iniciar	
9	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e equipe	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	01/08/16	16/12/16					0%	A Iniciar	
10	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/16	30/12/16					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		25.000,00	Valor realizado:		9.580,00	60%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Ciclo janeiro a maio de 2016. O projeto é uma ação interligada ao Projeto Gestão por Competências e ambos ocorrerão nos próximos 04 anos conforme previsto no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2016/2019.
2º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 68 (ex PO 70)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Eugenio Pacelli	Gestor da subunidade:	Angela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.		
Projeto:	Gestão por Competências		
Objetivo do projeto:	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																
		250	3.3.90.00	25.000,00	25.000,00	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ 25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ 25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> </table>	Pago até o ano anterior	R\$ -	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 25.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.000,00	Total Liberado até o exercício	R\$ -
Pago até o ano anterior	R\$ -																					
A realizar no exercício	R\$ -																					
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 25.000,00																					
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																					
Valor liberado no Exercício	R\$ -																					
Saldo a liberar	R\$ -																					
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.000,00																					
Total Liberado até o exercício	R\$ -																					

Previsão de Conclusão:	10/11/2019
Data Atualização:	01/06/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Angela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14		24/11/14	12/12/14		100%	Concluído	
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15		19/01/15	30/01/15		100%	Concluído	
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15		02/02/15	31/03/15		100%	Concluído	
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/06/16	25.000,00	01/04/15			50%	Em Andamento	Processo de contratação em análise na Procuradoria. Datas já repactuadas.
5	Reunião de orientação para descrição de competências por unidade organizacional	Ángela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	16/02/16	16/02/16		16/02/16	16/02/16		100%	Concluído	
6	Levantamento das competências das unidades organizacionais	Gestores das unidades organizacionais	16/02/16	29/02/16		16/02/16	29/02/16		100%	Concluído	
7	Mapeamento das competências	Marlene Franklin e Marina Braga	29/02/16	23/03/16		29/02/16	23/03/16		100%	Concluído	
8	Elaboração do projeto de gestão por competências	Marlene Franklin e Marina Braga	23/03/16	30/03/16		23/03/16	30/03/16		100%	Concluído	
9	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	27/06/16	18/10/16					0%	A Iniciar	
10	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	27/06/16	18/10/16					0%	A Iniciar	
11	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	06/07/16	15/09/16					0%	A Iniciar	
12	Elaboração de Plano para o desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	21/09/16	05/10/16					0%	A Iniciar	
13	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
14	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	

Valor Previsto: 25.000,00 Valor realizado: 0,00 54% Em Andamento Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Ciclo de janeiro a maio de 2016. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.
2º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 69 (ex PO 71)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b> 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.			
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Diretor :	Eugenio Pacelli		
Problema (causa):	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral		
Projeto:	Investindo nos Sonhos		
Objetivo do projeto:	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laborativa.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						Pago até o ano anterior	R\$	6.200,00	A realizar no exercício	R\$	-	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	-	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	6.200,00
						Pago até o ano anterior	R\$	6.200,00	A realizar no exercício	R\$	-	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	-	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	6.200,00						
Previsão de Conclusão:	30/11/2019.																																		
Data Atualização:	01/06/2016																																		
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.																																		

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14		06/10/14	10/10/14		100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14		17/10/14	17/10/14		100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14		19/11/14	05/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicosociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15		20/01/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15		01/04/15	10/04/15		100%	Concluído		
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15		13/04/15	21/05/15		100%	Concluído		
7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído		
8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15		08/06/15	26/06/15		100%	Concluído		
9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00	16/06/15	18/05/15		100%	Concluído	Os recursos não foram utilizados. Prevê-se utilizar na segunda turma.	

10	Encontros de formação de facilitadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	21/05/15	03/07/15		21/05/15	03/07/15		100%	<b>Concluído</b>		
11	Realização dos Encontros com os participantes da primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	15/09/15		01/06/15	15/09/15		100%	<b>Concluído</b>		
12	Planejamento e Homenagem aos servidores aposentados	Participantes do Projeto e facilitadores	15/09/15	22/09/15		15/09/15	22/09/15		100%	<b>Concluído</b>		
13	Planejamento para realização dos encontros da segunda turma	CGGP e facilitadores	15/09/15	02/10/15		15/09/15	02/10/15		100%	<b>Concluído</b>		
14	Realização dos Encontros - segunda turma	CGGP e facilitadores	16/10/15	18/12/15	2.500,00	16/10/15	18/12/15	1.200,00	100%	<b>Concluído</b>		
15	Encerramento do Projeto de 2015	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	18/12/15	18/12/15		18/12/15	18/12/15		100%	<b>Concluído</b>		
16	Planejamento do Projeto para 2016	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	01/09/16	09/09/16					0%	<b>A Iniciar</b>		
17	Realização dos Encontros - terceira turma	CGGP e facilitadores	12/09/16	18/11/16					0%	<b>A Iniciar</b>		
			<b>Valor Previsto:</b>		10.000,00	<b>Valor realizado:</b>		6.200,00	88%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Banco Central; Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, Igreja Batista do Cordeiro

**Observações:**

Ciclo de janeiro a maio de 2016. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.

**2º Ciclo 2016**

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 70 (ex PO 72)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>	Eugenio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Niilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Niilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Previsão de Conclusão:	06/09/2017
Data Atualização:	10/06/2016

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / Paula Aragão de Souza
-----------------------------	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.271.552,15
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 155.878,20
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 32.560,90
Valor liberado no Exercício	R\$ 65.815,10
Saldo a liberar no Exercício	R\$ 122.624,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$
Total liberado até o exercício	R\$ 3.337.367,25

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	
5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	0,00	20/01/14	13/04/15	0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compor Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R\$ 241.454,70.	
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14	05/12/14	555.861,00	100%	Concluído		As poltronas foram entregues nesta Autarquia e pagas em 28/12/2015, aguardando a reforma dos auditórios para serem instaladas.
8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	15/06/16	273.000,00	11/06/15			99%	Em Andamento	Foi celebrado em 05/02/2015 o 1º Termo Aditivo ao Contrato, acrescentando o valor de R\$ 32.560,90 e prazo de 45 dias.	

8.1	Levantamentos e estudos preliminares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/05/15		11/06/15	28/10/15	25.356,00	100%	<span style="color: blue;">Concluído</span>	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 25.356,00.	Os serviços foram concluídos em 28/10/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.2	Projeto Básico da reforma geral	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/05/15	31/12/15		27/07/15	14/12/15	60.220,50	100%	<span style="color: blue;">Concluído</span>	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 60.220,50.	Os serviços foram concluídos em 14/12/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.3	Projeto Executivo	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/06/15	15/06/16		17/08/15		65.815,10	98%	<span style="color: green;">Em Andamento</span>	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 87.478,20.	A Contratada entregou a última versão do Projeto, o qual está sob análise final da área de Engenharia da Sudene.
9	Licitação da obra de ambientação final	SUDENE/CPL	01/07/16	01/11/16	0,00			50,38	0%	<span style="color: blue;">A Iniciar</span>		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	07/11/16	06/09/17	3.300.000,00				0%	<span style="color: blue;">A Iniciar</span>		
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compor Eng. e Automação Ltda.	07/11/16	06/09/17	72.000,00				0%	<span style="color: blue;">A Iniciar</span>	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 68.400,00.	
12	Entrega da obra			06/09/17					0%	<span style="color: blue;">A Iniciar</span>		
				<b>Valor Previsto:</b>	7.553.642,89	<b>Valor realizado:</b>	3.337.417,63	67%	<span style="color: green;">Em Andamento</span>	<b>Status do Projeto</b>		

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Area de Engenharia

Legenda	
<span style="color: blue;">■</span>	A Iniciar
<span style="color: green;">■</span>	Concluído
<span style="color: green;">■</span>	Em Andamento
<span style="color: red;">■</span>	Atrasado
<span style="color: gray;">■</span>	Cancelado
<span style="color: yellow;">■</span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 71 (ex PO 73)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	<b>Ano:</b>	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Diretor :	Eugenio Pacelli		
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						Pago até o ano anterior	R\$ 6.458.613,62
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23	A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 2.211.931,24
Previsão de Conclusão:	20/08/2015					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Data Atualização:	10/06/2016					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem					Saldo a liberar no Exercício	R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total liberado até o exercício	R\$ 6.458.613,62

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído	
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído	
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.
3.1	Recuperação dos 120 blocos de fundação e sapatas do edifício SUDENE	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	12/2010	04/2012					100%	Concluído	
3.2	Recuperação dos 145 blocos de fundação e sapatas que não foram reforçados na contratação realizada sob o contrato 09/2010. (R\$ 4.167.360,00)	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	05/2012	11/2014	0,00				100%	Concluído	
3.3	Adequação do novo layout e recuperação das salas danificadas. (R\$ 1.023.726,00)	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	05/2012	11/2014	0,00				100%	Concluído	
3.4	Recuperação estrutural e fixação de paredes periféricas. (R\$ 75.025,00)	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	05/2012	11/2014	0,00				100%	Concluído	
3.5	Execução de rampa de acesso (R\$ 133.729,00)	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	05/2012	11/2014	0,00				100%	Concluído	
3.6	Recebimento Definitivo da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	02/04/12	02/05/12	0,00	02/04/12	02/05/12	0,00	100%	Concluído	Somente foram recuperados 119 blocos de fundação com dotação de 2010 e 2011. A análise preliminar feita pela empresa contratada subestimou o tamanho do problema com as fundações do prédio, vindo a requerer complementação dos trabalhos.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.
											Lançamento de licitação para complementação da obra
											Encaminhar projeto básico para a CPL.
											Lançar edital de licitação.

6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	20/08/15	5.745.805,68	22/10/12		3.533.874,44	88%	Paralisado	A Diretoria Colegiada da Sudene autorizou a realização da vistoria final dos serviços, a qual foi realizada em 25/05/16.	
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	20/08/15	0,00	22/10/12		0,00	88%	Paralisado	A Comissão de Fiscalização realizou a vistoria final dos serviços, tendo emitido o <b>Termo de Recebimento Provisório dos Serviços</b> em 02/06/2016, dando um prazo de 15 dias para a Contratada corrigir as pendências encontradas nessa vistoria.	A Comissão de Fiscalização realizou a vistoria sem a participação dos fiscais José Villeneuve e Rebeca Ramalho.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		20/08/15	0,00				0%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 72 (ex PO 74)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	<b>Ano:</b>	2009
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>	Eugenio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
<b>Problema (causa):</b>	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
<b>Projeto:</b>	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)													
	250	33	90	4.226.603,89	4.226.603,89		Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00	A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 48.000,00	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar no Exercício	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:	28/02/2017																			
Data Atualização:	10/06/2016																			

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / Diego Véras Emerenciano / Thiago Teles da Silva
-----------------------------	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.
7	Relançamento da Licitação da Obra	SUDENE/CPL	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15	15/04/15	0,00	100%	Concluído	Ficou decidido que a contratação será realizada pela Sudene, tendo sido solicitada a autorização do MI, através do Ofício GAB/SUDENE nº 371/2015, em 17/07/15, e reiterado através do Ofício GAB/SUDENE nº 492/2015, em 19/12/2015.

8	Autorização para a contratação dos serviços	Ministério da Integração Nacional	17/07/15	17/08/15	0,00	17/07/15	17/12/15	0,00	100%	Concluído	A autorização do Ministério da Integração Nacional foi proferida em 17/12/2015, em despacho do Secretário-Executivo Substituto, Sr. Laércio Roberto Lemos de Souza.	Face à necessidade de atender à Decisão judicial que anulou a interdição do Edifício SUDENE, a autorização ministerial caracterizou a contratação como emergencial.
9	Novo processo de contratação da obra	SUDENE/DAD	18/12/15	30/08/16	0,00	18/12/15			45%	Em Andamento	Em 11/04/2016, a Área de Engenharia encaminhou o Projeto Básico para a contratação da obra, que recebeu a aprovação do Diretor de Administração, reduzindo o orçamento básico da obra para 4.066.603,89.	Em 31/05/2016, o Coordenador-Geral da CGAF encaminhou o processo para a DAD, após a emissão de Parecer pela Procuradoria sobre a minuta de Edital para a contratação na modalidade Concorrência.
10	Execução da Obra	A definir	01/09/16	28/02/17	4.066.603,89					A Iniciar		
11	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Véras e empresa de consultoria	01/09/16	28/02/17	60.000,00					A Iniciar		
12	Entrega da obra			28/02/17						A Iniciar		
			Valor Previsto:		4.226.603,89	Valor realizado:		100.000,00	38%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Area de Engenharia

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 73 (ex PO 76)		
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2015		
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva			
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão			
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.					
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas			
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	-			
Problema (causa):	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)					
Projeto:	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000					
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	33	90	565.700,00	565.700,00	Pago até o ano anterior	R\$ 565.700,00
Previsão de Conclusão:	31/07/2016					A realizar no exercício	R\$ -
Data Atualização:	31/05/2016					Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Nascimento (UFPE).					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						Valor liberado no Exercício	R\$ -
						Saldo a liberar	R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ 565.700,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído	Portaria nº 046 de 13/05/2015, pela qual o Chefe de Gabinete passa a ser o coordenador institucional do Projeto
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
6	Coordenação Científica (R\$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	31/07/2016		30/04/2015			90%	Em andamento	
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R\$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/05/2016		100%	Concluído	
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassette e 200 fitas de vídeo (R\$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015		01/07/2015	31/05/2016		60%	Concluído	Problemas de equipamento impossibilitaram o cumprimento da meta.
9	Pesquisa em jornais (R\$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philipe Pedro, Sérgio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/05/2016		77%	Concluído	Crescimento dos jornais, incluindo edição às segundas e problemas no equipamentos do laboratório de micrografia impediram o cumprimento da meta.
10	Produção de Artigos e pesquisas para o site e para o Ciclo de Debates. (R\$ 24.000,00)	Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/07/2016		15/05/2015			90%	Em andamento	
11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R\$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/05/2016		100%	Concluído	
12	Coleta de depoimento ne elaboração de documentário (R\$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/10/2015	20/07/2016		01/10/2015			70%	Em andamento	
13	Alimentação e monitoramento do site (R\$ 7.800,00)	Fábricio Silva	15/05/2015	31/07/2016		15/05/2015			85%	Em andamento	
14	Produção de Artigos para o livro (R\$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	31/05/2016		01/06/2015	31/05/2016		100%	Concluído	

15	Revisão, normatização e diagramação (R\$ 6.000,00)	Contratado	01/10/2015	31/07/2016		01/10/2015			80%	Em Andamento		
16	Transcrição de depoimentos (R\$ 10.000,00)	Contratado	01/08/2015	20/07/2016		30/09/2015			80%	Em Andamento		
17	Publicação do livro (R\$ 20.000,00)	Contratado	20/06/2016	31/07/2016		20/06/2016			5%	Em Andamento		
18	Preservação analógica do acervo textual (R\$ 20.000,00)	Contratado	01/04/2016	31/07/2016		01/04/2016			5%	Em Andamento		
19	Realização de Ciclos de Debates (R\$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	31/07/2016		01/06/2015			90%	Em Andamento	Realização do IV Ciclo de Debates em Delmiro Gouveia/AL, 21/03/2016; Realização do V Ciclo de Debates em Campina Grande/PB em 18/04/2016	
20	Assistência administrativa (R\$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016					0%	Cancelado	Por necessidade de outras atividades do projeto esta ação foi cancelada.	
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R\$ 16.000,00)	M2S	01/09/2015	31/07/2016		01/09/2015			90%	Em andamento		
22	Assessoria de comunicação (R\$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016		01/05/2015			80%	Em Andamento		

Valor Previsto:

565.700,00

Valor realizado:

565.700,00

80%

Em Andamento Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciéncia Política e Ciéncia da Informação/Laboratório de Tecnologia para o Conhecimento

**Observações:**

2º ciclo 2016

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 74 (ex PO 77)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	<b>Ano:</b>	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Eugenio Pacelli Remigio Araujo	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88	613.862,88

Previsão de Conclusão:	30/12/2016
Data Atualização:	31/05//2016

Responsável(s) pelo Projeto	Lucas Noléto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
-----------------------------	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 383.999,07
A realizar no exercício	R\$ 229.863,81
Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 77.842,04
Saldo a liberar	R\$ 152.021,77
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 461.841,11

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído	
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído	
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído	
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do	Empresa Contratada.	01/04/15	30/09/15	340.953,88	06/04/15	08/09/15	35.043,28	100%	Concluído	Recursos da SUDENE
6	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - codificação e testes	Empresa Contratada.	01/10/15	30/10/15	-	19/10/15	-	76.046,79	95%	Atrasado	
7	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - especificação de requisitos, arquitetura, processos,modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/11/15	30/12/15	-	10/11/15	-	77.842,04	100%	Concluído	
8	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - codificação e testes	Empresa Contratada.	04/01/16	29/07/16	-	26/02/16	-	-	15%	Em Andamento	
9	Implantação do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador e da SUDENE	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/16	30/12/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		613.862,88	Valor realizado:		461.841,11	91%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Ministério da Integração Nacional e SUDAM

**Observações:**

2º Ciclo 2016

Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

**ANEXO II**  
**Gestão Orçamentária e Financeira**  
**Exercício 2016**

**SUDENE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2016)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/0001	A	1	15.557.318,00	10.501.620,00	3.955.804,68	67,50	37,67	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	398.404,00	303.185,00	22.068,75	76,10	7,28	Servidor capacitado	199		0,00		
4	122	2111	216H/0020	A	1	102.594,00	102.594,00	21.493,21	100,00	20,95						
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	167.788,47	100,00	29,13	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	51.290,00	51.290,00	23.031,75	100,00	44,90	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	57.207,28	100,00	23,84	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.080.000,00	1.080.000,00	533.645,84	100,00	49,41	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	22.044,00	22.044,00	591,32	100,00	2,68	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.900.000,00	3.900.000,00	1.441.116,49	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	27.034.586,00	27.034.586,00	10.668.962,98	100,00	-	-	-	-	-	-	
<b>2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI</b>						<b>Total</b>	<b>48.962.236,00</b>	<b>43.811.319,00</b>	<b>16.891.710,77</b>	<b>89,48</b>	38,56	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.305.121,00	2.305.121,00	937.316,29	100,00	40,66	-	-	-	-	-	
<b>0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>						<b>Total</b>	<b>2.305.121,00</b>	<b>2.305.121,00</b>	<b>937.316,29</b>	<b>100,00</b>	40,66	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	707.427,00	707.427,00	0,00	100,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	459.000,00	459.000,00	0,00	100,00	0,00	Zoneamento realizado - km²	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	319.486,00	319.486,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	608	2029	214S/0001	A	1	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	1.238.577,00	1.238.577,00	0,00	100,00	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	100.000,00	100.000,00		100,00	0,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO006	A	1	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7192	A	1	8.837.183,00			0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0024	A	1	10.513.654,00	7.449.219,00	5.172.497,00	70,85	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
<b>2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária</b>						<b>Total</b>	<b>24.535.327,00</b>	<b>12.633.709,00</b>	<b>5.172.497,00</b>	<b>51,49</b>	<b>40,94</b>					
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
<b>2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres</b>						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>					
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Logística, Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 31/05/2016 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

**ANEXO III**

**Projetos tabulados segundo Diretrizes  
e Objetivos Estratégicos da SUDENE**

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Piauí e Mata Norte - Ap	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres' - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
7	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 952.322,32	10%
8	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
9	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%
10	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
11	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Creme, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
12	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pescadeiras de Goiana - PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 534.417,84	R\$ 0,00	0%
13	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
14	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
15	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
16	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
17	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Bios sustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 800.000,00	78%
18	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Calimbau e Refúgio Tatú Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
19	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Grupo de Trabalho para a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
20	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035).	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%
21	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
22	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.800.224.586,49	92%
23	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
24	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
25	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embruaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
26	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
27	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
28	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
29	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
30	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
31	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
32	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
33	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
34	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
35	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
36	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
37	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
38	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
39	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
40	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
41	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
42	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
43	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
44	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
45	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
46	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
47	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
48	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
49	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
50	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
51	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 39.800.940,00	R\$ 0,00	0%
52	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 188.283.235,00	R\$ 0,00	0%
53	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 62.999.857,00	R\$ 0,00	0%
<b>Total do Objetivo 1.1</b>								<b>9.683.004.506,74</b>	<b>6.436.920.791,64</b>	<b>66%</b>
54	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Nordeste em Números 2015	Ação interna	Ação interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de um resumo do Relatório de Avaliação da UAB	Ação interna	Ação interna	Concluído	-	-	-
<b>Total do Objetivo 1.4</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
57	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
<b>Total do Objetivo 1.5</b>								<b>234.105,49</b>	<b>139.865,15</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 1</b>								<b>9.683.238.612,23</b>	<b>6.437.060.656,79</b>	<b>66%</b>
58	29	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
<b>Total do Objetivo 2.2</b>								<b>43.290.000,00</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>40%</b>
59	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
60	9	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesoregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
61	18	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozonamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
<b>Total do Objetivo 2.3</b>								<b>1.825.305,97</b>	<b>1.182.390,74</b>	<b>65%</b>
62	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
<b>Total do Objetivo 2.4</b>								<b>228.797,21</b>	<b>167.999,61</b>	<b>73%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 2</b>								<b>45.344.103,18</b>	<b>18.588.390,35</b>	<b>41%</b>

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
63	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
64	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Realimentamento do planejamento estratégico institucional com a definição de metas e ações, integradamente com a atualização das atribuições regimentais e das competências	Ação interna	Ação interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
65	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
66	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
67	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.580,00	38%
68	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%
69	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
<b>Total do Objetivo 3.1</b>								<b>60.000,00</b>	<b>15.780,00</b>	<b>26%</b>
70	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
71	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 461.841,11	75%
<b>Total do Objetivo 3.2</b>								<b>1.179.562,88</b>	<b>1.027.541,11</b>	<b>87%</b>
72	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.337.367,25	44%
73	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
74	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 4.226.603,89	R\$ 100.000,00	2%
<b>Total do Objetivo 3.3</b>								<b>21.453.288,01</b>	<b>9.895.980,87</b>	<b>46%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 3</b>								<b>22.692.850,89</b>	<b>10.939.301,98</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>9.751.275.566,30</b>	<b>6.466.588.349,12</b>	<b>66,3</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 2º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2016

**ANEXO IV**

**Projetos tabulados segundo a**

**Programação do PPA**

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.800.224.586,49	92%
3	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
13	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxoto S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicates Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
17	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
20	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shinergy do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
27	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
28	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
29	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
30	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
31	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metalicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 39.800.940,00	R\$ 0,00	0%
32	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 188.283.235,00	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
33	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 62.999.857,00	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 0355</b>										
34	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
35	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
36	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Moluscos nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 534.417,84	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 20N7</b>										
37	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com "Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
<b>P 2029 - Ação 4640</b>										
38	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
39	9	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico Econômico da Mesoregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
40	18	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozonamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	9689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 8689</b>										
41	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
42	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
43	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
44	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 952.322,32	10%
45	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%
46	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
47	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
48	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
49	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
<b>P 2029 - Ação 8902</b>										
50	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
<b>P 2029 - Ação 8917</b>										
51	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
52	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biosustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%
53	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biosustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 800.000,00	78%
<b>P 2029 - Ação 8340</b>										
54	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 7K66</b>										
55	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno da PARNA do Catimbau e Refúgio Tatuba I, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
56	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%
57	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
<b>P 2029 - Ação 20WQ</b>										
<b>Total do Programa 2029</b>										
58	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
<b>P 2040 - Ação 8172</b>										
<b>Total do Programa 2040</b>										
59	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
61	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.580,00	38%
63	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%
64	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
65	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.337.367,25	44%
66	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
67	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 4.226.603,89	R\$ 100.000,00	2%
68	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 461.841,11	75%
<b>P 2111 - Ação 2000</b>								<b>22.127.150,89</b>	<b>10.373.601,98</b>	<b>47%</b>
<b>Total do Programa 2111</b>								<b>22.127.150,89</b>	<b>10.373.601,98</b>	<b>47%</b>
69	29	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
<b>Total do Programa 2069</b>								<b>43.290.000,00</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>40%</b>
70	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
71	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Grupo de Trabalho para a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
72	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Nordeste em Números 2015	Ação interna	Ação interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
73	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de um resumo do Relatório de Avaliação da UAB	Ação interna	Ação interna	Concluído	-	-	-
74	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Realinhamento do planejamento estratégico institucional com a definição de metas e ações, integradamente com a atualização das atribuições regimentais	Ação interna	Ação interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total das Ações Internas/ Não se aplicam</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>9.751.275.566,30</b>	<b>6.466.588.349,12</b>	<b>66,3</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 2º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2016
