

# Relatório de Acompanhamento de Portfólio de Projetos

## Plano Diretor Estratégico 2024-2028


Hospital Universitário da Universidade Federal  
da Grande Dourados - HU-UFGD

**Gerente de Portfólio**

Hélcio de Brito Lima

3º Quadrimestre de 2025

Fechamento Anual

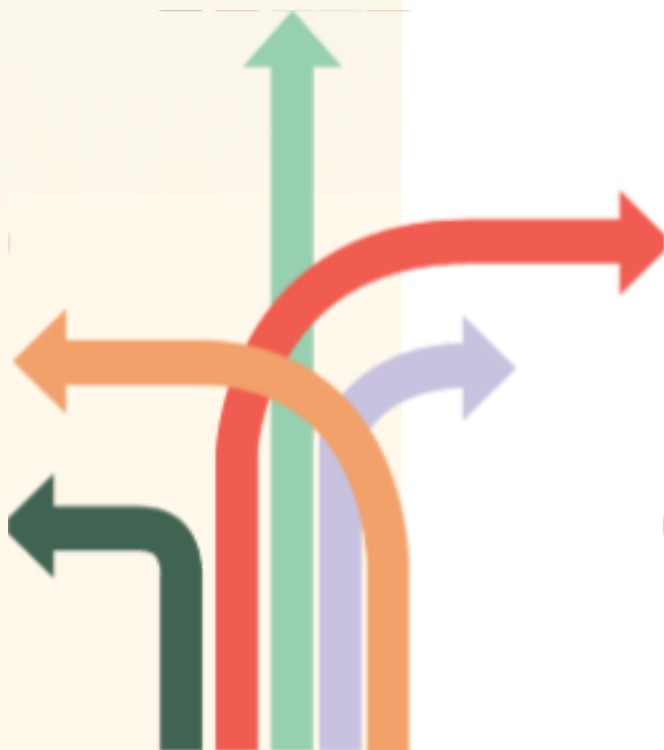

PDE

# Plano Diretor Estratégico 2024-2028

% de execução

## 47,75%

Total de projetos

### 9

Total de atividades

### 760

Atividades não iniciadas

### 364

Em atraso 364

No prazo 0

Atividades em execução

### 65

Atividades concluídas

### 331

Projetos

	Número de atividades	Atividades Concluídas	% de execução do projeto	% de execução do portfólio
[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD	76	37	31,0%	3,88%
[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD	177	91	68,0%	8,50%
[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD	71	35	55,0%	6,88%
[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBITO DO HU-UFGD	76	36	44,0%	5,50%
[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD	47	21	44,0%	5,50%
[HU-UFGD] [P2.01] QUALIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE NO HU-UFGD	72	0	0,0%	0,00%
[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD	47	27	69,0%	8,63%
[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD	88	17	8,0%	1,00%
[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE	106	67	63,0%	7,99%
<b>Total</b>	<b>760</b>	<b>331</b>		<b>47,75%</b>

### CALENDÁRIO DE MONITORAMENTO PDE 2024-2028

Nº	Etapa	Mês												Responsável	Destino	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez			
1	Checkagem dos Indicadores do Projeto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Responsável pelo indicador	Gerente   equipe de projeto
2	Elaboração do Relatório de Acompanhamento de Projetos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Gerente   equipe de projeto	Sector de Governança e Estratégia
3	Relatório de Monitoramento do PDE (indicadores, metas e projetos locais)				■				■				■	Sector de Governança e Estratégia	Colegiado Executivo	
4	Checkagem de Projetos e Indicadores e elaboração do RAP Mensal				■				■				■	Colegiado Executivo	DVPE   Reitoria   Comissão de monitoramento do contrato de gestão/Ites	

# [HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

Tema estratégico SOCIEDADE (ASSISTÊNCIA)		Objetivo estratégico AMPLIAR E QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO NA REDE NACIONAL DE CUIDADOS ONCOLÓGICOS	
Projeto local [HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD		% de execução <b>31,0%</b>	
Objetivo projeto local PROMOVER PREVENÇÃO E O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM CÂNCER POR MEIO DO SUS PARA TODOS OS PACIENTES DA MACRORREGIÃO DE DOURADOS-MS, DESENVOLVENDO ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO.		Início programado 01/05/2024	
Gerente <u>ALLINE CRISTHINE NUNES CERCHIARI MENON</u>		Áreas responsáveis GAD   GAS   STESP	
		Período avaliativo dezembro de 2025	
		Término programado (Em branco)	

Total de Tarefas <b>76</b>	Não iniciadas <b>33</b> Em atraso 33 No prazo 0	Em andamento <b>6</b>	Concluídas <b>37</b>
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	38,0%
22	PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO (ASSISTÊNCIA)	68,0%
64	ELABORAÇÃO DE LAYOUT INICIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ONCOLOGIA	100,0%
69	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Percentual de definição dos serviços	Anual	2025	100%		Maior, melhor
Percentual de elaboração do pré-projeto físico	Anual	2025	100%		Maior, melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	0,0%
35	Serviços a serem realizados	100,0%
36	Estrutura básica para implantação do serviço	100,0%
60	Finalizar processo preparatório de NO 01 para encaminhar Vice Presidência da Ebserh	100,0%
68	Layout final projeto oncologia	100,0%
73	RAP Anual 2025	0,0%
76	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome Observações Gerais

Projeto local

[HU-UFMG] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFMG

Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
11	Ponto de controle março 2025	31/03/2025	Não iniciada
12	Ponto de controle abril 2025	30/04/2025	Não iniciada
13	Ponto de controle maio 2025	30/05/2025	Não iniciada
14	Ponto de controle junho 2025	30/06/2025	Não iniciada
15	Ponto de controle julho 2025	31/07/2025	Não iniciada
16	Ponto de controle agosto 2025	29/08/2025	Não iniciada
17	Ponto de controle setembro 2025	30/09/2025	Não iniciada
18	Ponto de controle outubro 2025	31/10/2025	Não iniciada
19	Ponto de controle novembro 2025	28/11/2025	Não iniciada
20	Ponto de controle dezembro 2025	31/12/2025	Não iniciada
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	30/12/2025	Não iniciada
25	Realizar reunião com a equipe de urologia	23/09/2024	Não iniciada
26	Realizar reunião com a equipe de hematologia	07/10/2024	Não iniciada
27	Realizar reunião com a equipe de cirurgia geral	21/10/2024	Não iniciada
28	Realizar reunião com a equipe de ginecologia	04/11/2024	Não iniciada
29	Realizar reunião com a equipe de apoio diagnóstico	18/11/2024	Não iniciada
30	Realizar reunião com a equipe multiprofissional	25/11/2024	Não iniciada
49	Realizar reuniões com a equipe assistencial para levantamento das necessidades de medicamentos	27/05/2025	Não iniciada
50	Elaborar relatório consolidado das necessidades de medicamentos	27/06/2025	Não iniciada
51	Realizar reuniões com a equipe assistencial para levantamento das necessidades de insumos hospitalares	27/05/2025	Não iniciada
52	Elaborar relatório consolidado das necessidades de insumos hospitalares	27/06/2025	Não iniciada
59	Receber manifestação de interesse do Gestor do SUS para a criação do serviço assistencial	02/05/2024	Não iniciada
61	Realizar reunião de planejamento assistencial (Equipe Multiprofissional)	04/08/2025	Não iniciada
62	Realizar reunião de planejamento assistencial (Equipe Médica)	08/09/2025	Não iniciada
63	Realizar reunião de planejamento assistencial (Equipe Administrativa)	06/10/2025	Não iniciada
69	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	08/12/2025	Não iniciada
70	Avaliar a execução do projeto	08/12/2025	Não iniciada
71	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	08/12/2025	Não iniciada
72	Elaborar relatório de acompanhamento anual do projeto	08/12/2025	Não iniciada
73	RAP Anual 2025	09/12/2025	Não iniciada
74	Realizar reunião com COLEX para avaliar a manutenção do projeto para o próximo ano	11/12/2025	Não iniciada
75	Elaboração do cronograma para próximo ano	12/12/2025	Não iniciada
76	Cronograma 2026	30/12/2025	Não iniciada

[HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

<p>Tema estratégico</p> <p>SOCIEDADE (ASSISTÊNCIA)</p>		<p>Objetivo estratégico</p> <p>AMPLIAR E QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS</p>	
<p>Projeto local</p> <p>[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD</p>			<p>% de execução</p> <p><b>68,0%</b></p>
<p>Objetivo projeto local</p> <p>REESTRUTURAR O SERVIÇO DE CARDIOLOGIA VISANDO A RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E OFERTA DE SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA.</p>			<p>Início programado</p> <p>01/05/2024</p>
<p>Gerente</p> <p><u>LEONORA CORREA DA COSTA DE MARCHI</u></p>			<p>Áreas responsáveis</p> <p>GAS   STDT   UDE</p>
			<p>Período avaliativo</p> <p>dezembro de 2025</p>
			<p>Término programado</p> <p>(Em branco)</p>

<p>Total de Tarefas</p> <p><b>177</b></p>	<p>Não iniciadas</p> <p><b>70</b></p> <p>Em atraso 70 No prazo 0</p>	<p>Em andamento</p> <p><b>16</b></p>	<p>Concluídas</p> <p><b>91</b></p>
---	--	--------------------------------------	------------------------------------

Macroatividades			% concluída
Número de tarefa	Nome		
166	CAPTAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA OFERTA DOS SERVIÇOS		50,0%
119	ESTUDO DE VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA PARA MACRORREGIÃO DA GRANDE DOURADOS		58,0%
125	ESTUDO DE VIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA (NORMA 01)		40,0%
106	ESTUDO DE VIABILIDADE DO INÍCIO DA OFERTA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA PARA PACIENTES INTERNADOS		0,0%
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO		94,0%
141	PLANEJAMENTO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA		72,0%
133	PLANEJAMENTO PARA REESTRUTURAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA		53,0%
22	PLANEJAMENTO PARA RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA		80,0%
102	REALIZAR O LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA		50,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Realização de atendimentos por meio da Oferta de Cuidados Integrados em Cardiologia	Anual	2025	120		Maior , melhor
Realização de procedimentos hemodinâmicos	Anual	2025	120		Maior , melhor
Taxa de cumprimento de ações planejadas	Anual	2024	30%		Maior , melhor

## Projeto local

[HU-UGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UGD

## Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	0,0%
34	Angiógrafo e outros equipamentos em pleno funcionamento	100,0%
40	Manutenções elétricas e estruturais/prediais finalizadas	100,0%
49	Formalização de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	0,0%
56	Listas de insumos e precificação dos procedimentos	100,0%
64	Inclusão no Planejamento Anual de Compras 2025	100,0%
77	Disponibilização de estoque de insumos básicos para início da oferta do serviço	0,0%
101	Disponibilização de rol completo de insumos necessários para reabertura do serviço	0,0%
112	Todos os recursos disponíveis para início do serviço (humanos e estruturais)	0,0%
115	Agenda de procedimentos diagnósticos disponíveis	0,0%
118	Agenda de procedimentos terapêuticos disponíveis	0,0%
124	Disponibilidade em estoque de insumos essenciais para oferta de procedimentos diagnósticos e terapêuticos via SISREG	0,0%
132	Habilitação do serviço de hemodinâmica junto ao Município	0,0%
140	Planejamento de ampliação de vagas ambulatoriais em cardiologia	0,0%
147	Definição dos métodos gráficos que serão ofertados	100,0%
162	Equipamentos necessários para ampliação do serviço instalados	0,0%
165	Ampliação do ambulatório e ofertas de métodos gráficos em cardiologia	0,0%

## Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
Remanejamento ou contratação de novos colaboradores para retomada do serviço	Aguardando previsão de
Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	Aguardando retorno da li
Realizar manutenção preventiva do polígrafo	Aprovado orçamento. Ag
Agendamento de sessões públicas	Atividade descontinuada
Análise dos itens pelo setor demandante	Atividade descontinuada
Deflagração da fase externa	Atividade descontinuada
Disponibilização de estoque de insumos básicos para início da oferta do serviço	Atividade descontinuada
Elaboração de minutas	Atividade descontinuada
Elaboração do edital e correções do planejamento	Atividade descontinuada
Recebimento de materiais	Atividade descontinuada
Solicitação de confecção de empenho para envio ao fornecedor	Atividade descontinuada
Verificar check list de requisitos para habilitação	Check list com pendência
Solicitação de cotação de preços com empresa GE	Empresa GE informou qu manutenção
Formalização de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	Incluído no PAC 2025. Ag
Conformidade administrativa	Insumos serão adquiridos
Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	Mudança do gestor local

## Projeto local

[HU-UGFD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UGFD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
115	Agenda de procedimentos diagnósticos disponíveis	29/04/2025	Não iniciada
118	Agenda de procedimentos terapêuticos disponíveis	23/12/2025	Não iniciada
96	Agendamento das sessões públicas	14/10/2025	Não iniciada
73	Agendamento de sessões públicas	28/02/2025	Não iniciada
165	Ampliação do ambulatório e ofertas de métodos gráficos em cardiologia	10/12/2025	Não iniciada
74	Análise dos itens pelo setor demandante	05/03/2025	Não iniciada
97	Análise dos itens pelo setor demandante	27/10/2025	Não iniciada
156	Análise e aceitação das propostas dos equipamentos pelo setor de engenharia clínica	02/09/2025	Não iniciada
170	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	08/12/2025	Não iniciada
171	Avaliar a execução do projeto	08/12/2025	Não iniciada
172	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	08/12/2025	Não iniciada
69	Conformidade administrativa	17/01/2025	Não iniciada
169	Contratualização com o Município e Estado	16/12/2025	Não iniciada
177	Cronograma 2026	30/12/2025	Não iniciada
123	Definição de capacidade técnica para oferta do serviço para pacientes externos via SISREG	19/12/2025	Não iniciada
117	Definição de número de procedimentos terapêuticos a serem ofertados	23/12/2025	Não iniciada
114	Definição e disponibilização de número de procedimentos diagnósticos a serem ofertados	29/04/2025	Não iniciada
72	Deflagração da fase externa	27/02/2025	Não iniciada
95	Deflagração da fase externa	13/10/2025	Não iniciada
107	Disponibilidade de insumos , equipamentos e equipe para retomada do serviço	02/04/2025	Não iniciada
124	Disponibilidade em estoque de insumos essenciais para oferta de procedimentos diagnósticos e terapêuticos via SISREG	19/12/2025	Não iniciada
77	Disponibilização de estoque de insumos básicos para início da oferta do serviço	25/04/2025	Não iniciada
101	Disponibilização de rol completo de insumos necessários para reabertura do serviço	19/12/2025	Não iniciada
98	Elaboração das atas de registro de preço	10/11/2025	Não iniciada
70	Elaboração de minutas	10/02/2025	Não iniciada
93	Elaboração de minutas	06/10/2025	Não iniciada
176	Elaboração do cronograma para próximo ano	12/12/2025	Não iniciada
94	Elaboração do edital e correções do planejamento	08/10/2025	Não iniciada
129	Elaborar e encaminhar processo de Estudo de viabilidade para criação/ampliação do serviço assistencial	13/08/2025	Não iniciada
173	Elaborar relatório de acompanhamento anual do projeto	08/12/2025	Não iniciada
160	Emissão da ordem de fornecimento dos equipamentos	29/10/2025	Não iniciada
131	Encaminhar ofício para SES solicitando habilitação do serviço de hemodinâmica	14/10/2025	Não iniciada
157	Encaminhar para COLEX solicitação de autorização orçamentária	23/09/2025	Não iniciada
48	Encaminhar para COLEX solicitação de autorização orçamentária destinada a contratação de empresa de manutenção do angiógrafo	25/02/2025	Não iniciada

# [HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

Tema estratégico <b>SOCIEDADE (ENSINO)</b>		Objetivo estratégico <b>APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE ENSINO E OS CENÁRIOS DE PRÁTICA</b>	
Projeto local [HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA ...		% de execução <b>55,0%</b>	
Objetivo projeto local <b>PROMOVER INICIATIVAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NOS CENÁRIOS DE PRÁTICA, PROMOVENDO A EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DO TRABALHO EM SAÚDE.</b>		Início programado 01/05/2024	
Gerente <b>RENATA MARONNA PRAÇA LONGHI</b>		Áreas responsáveis GEP   SEGE	
		Período avaliativo dezembro de 2025	
		Término programado (Em branco)	

Total de Tarefas <b>71</b>	Não iniciadas <b>28</b> Em atraso 28 No prazo 0	Em andamento <b>8</b>	Concluídas <b>35</b>
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	89,0%
22	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	99,0%
26	DESENVOLVER PROJETO PERMANENTE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO	25,0%
35	DESENVOLVER PROJETO DE COMUNICAÇÃO PERMANENTE PARA O ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO E O SERVIÇO	80,0%
43	IDENTIFICAR E SOLICITAR AS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE ENSINO	52,0%
50	AMPLIAÇÃO DO ENSINO	99,0%
58	ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	0,0%
64	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO	ANÁLISE PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Percentual geral de satisfação com o ensino	Anual	2024	70%		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
25	Relatório diagnóstico	0,0%
33	Homologação de resultado dos preceptores dedicados	100,0%
34	Folder, convite, emails, processo de contratação	0,0%
41	Relatório do 1 semestre	100,0%
42	Relatório do 2 semestre	0,0%
48	Relatório de melhorias 1 semestre	100,0%
49	Relatório de melhorias 2 semestre	0,0%
56	Relatório de melhorias 1 semestre	100,0%
57	Relatório de melhorias 2 semestre	0,0%
62	Lotação de colaborador dedicado no laboratório de simulação clínica	0,0%
63	Lotação dos demais colaboradores	0,0%
68	RAP Anual 2025	0,0%
71	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome Observações Gerais

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD

Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
20	Ponto de controle dezembro 2025	12/12/2025	Não iniciada
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	31/12/2025	Não iniciada
25	Relatório diagnóstico	30/04/2025	Não iniciada
28	Ofertar qualificação para docentes dos serviços onde são realizados os estágios no HU.	03/02/2025	Não iniciada
29	Ofertar oficina de atualização para coordenadores e supervisores de programas de residência.	03/02/2025	Não iniciada
30	Ofertar qualificação da equipe de gestão do ensino	01/01/2025	Não iniciada
31	Ofertar capacitação para os preceptores, com conteúdo programático voltado para as principais habilidades de preceptoria, como: SOAP, SNAPPS, Preceptor Minuto, Sala invertid	03/02/2025	Não iniciada
34	Folder, convite, emails, processo de contratação	29/10/2025	Não iniciada
39	Implantar painel de indicadores da gestão do ensino	01/01/2025	Não iniciada
42	Relatório do 2 semestre	12/12/2025	Não iniciada
46	Desenvolver projeto executivo para construção do Centro de Estudos.	03/02/2025	Não iniciada
47	Desenvolver projeto executivo para construção do Centro de Simulação.	03/02/2025	Não iniciada
49	Relatório de melhorias 2 semestre	12/12/2025	Não iniciada
57	Relatório de melhorias 2 semestre	12/12/2025	Não iniciada
58	ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	03/02/2025	Não iniciada
59	Lotação de dois colaboradores dedicados ao laboratório de simulação clínica	03/02/2025	Não iniciada
60	Lotação de um profissional pedagogo no ensino	03/02/2025	Não iniciada
61	Lotação de um funcionário de apoio administrativo	03/02/2025	Não iniciada
62	Lotação de colaborador dedicado no laboratório de simulação clínica	31/07/2025	Não iniciada
63	Lotação dos demais colaboradores	12/12/2025	Não iniciada
64	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	08/12/2025	Não iniciada
65	Avaliar a execução do projeto	08/12/2025	Não iniciada
66	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	08/12/2025	Não iniciada
67	Elaborar relatório de acompanhamento anual do projeto	08/12/2025	Não iniciada
68	RAP Anual 2025	11/12/2025	Não iniciada
69	Realizar reunião com COLEX para avaliar a manutenção do projeto para o próximo ano	15/12/2025	Não iniciada
70	Elaboração do cronograma para próximo ano	15/12/2025	Não iniciada
71	Cronograma 2026	22/12/2025	Não iniciada

[HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

Tema estratégico SOCIEDADE (PESQUISA)		Objetivo estratégico CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO EM REDE DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS...	
Projeto local [HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOL...		% de execução <b>44,0%</b>	
Objetivo projeto local PROPOR AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO (NORMAS, PESSOAS, RECURSOS) ÀS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DE 2024 A 2028.		Início programado 01/05/2024	
Gerente DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO		Áreas responsáveis SGPITS   UGPESQ   UGITS	
		Período avaliativo dezembro de 2025	
		Término programado (Em branco)	

Total de Tarefas <b>76</b>	Não iniciadas <b>32</b> Em atraso 32 No prazo 0	Em andamento <b>8</b>	Concluídas <b>36</b>
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	44,0%
22	AUMENTO DO NÚMERO DE PESQUISAS NO HU-UFGD	38,0%
56	IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA EXISTENTES NO HU-UFGD/EBSERH	86,0%
69	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBIT... ▾

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	0,0%
30	Lista de potencialidades e dificuldades encontradas	100,0%
36	Ações implementadas	0,0%
40	Lista de pesquisadores participantes do evento	100,0%
45	Página eletrônica com os trabalhos científicos	0,0%
49	Lista de cursos publicitados	100,0%
62	Lista de atores por linha de pesquisa	100,0%
68	Número de projetos da linha de pesquisa de Saúde Indígena	0,0%
73	RAP Anual 2025	0,0%
76	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome Observações Gerais

## Projeto local

[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBIT... ▾

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
10	Ponto de controle fevereiro 2025	28/02/2025	Não iniciada
11	Ponto de controle março 2025	31/03/2025	Não iniciada
13	Ponto de controle maio 2025	30/05/2025	Não iniciada
14	Ponto de controle junho 2025	30/06/2025	Não iniciada
15	Ponto de controle julho 2025	30/07/2025	Não iniciada
16	Ponto de controle agosto 2025	29/08/2025	Não iniciada
17	Ponto de controle setembro 2025	30/09/2025	Não iniciada
19	Ponto de controle novembro 2025	28/11/2025	Não iniciada
20	Ponto de controle dezembro 2025	30/12/2025	Não iniciada
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	22/12/2025	Não iniciada
34	Instituir a ação de intervenção	22/05/2025	Não iniciada
35	Monitorar e avaliar a efetividade da intervenção	03/11/2025	Não iniciada
36	Ações implementadas	15/12/2025	Não iniciada
43	Publicitar o fluxo de trabalhos científicos realizados no HU-UFGD/Ebserh.	03/11/2025	Não iniciada
45	Página eletrônica com os trabalhos científicos	01/12/2025	Não iniciada
50	Promoção e divulgação de curso EAD e presencial sobre pesquisa e tecnologia entre os profissionais, graduandos e residentes 2025	01/05/2024	Não iniciada
51	Divulgar cursos EAD sobre pesquisa baseada em evidências	01/01/2025	Não iniciada
52	Divulgar cursos EAD sobre pesquisa clínica	01/04/2025	Não iniciada
53	Publicitar cursos EAD sobre pesquisa epidemiológica	01/08/2025	Não iniciada
54	Promover curso sobre pesquisa e tecnologia	01/08/2025	Não iniciada
55	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2025	01/05/2024	Não iniciada
64	Convidar os atores para participarem da linha de pesquisa	22/04/2025	Não iniciada
67	Realizar levantamento das pesquisas realizadas pela linha de pesquisa de saúde indígena	01/12/2025	Não iniciada
68	Número de projetos da linha de pesquisa de Saúde Indígena	15/12/2025	Não iniciada
69	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	08/12/2025	Não iniciada
70	Avaliar a execução do projeto	08/12/2025	Não iniciada
71	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	08/12/2025	Não iniciada
72	Elaborar relatório de acompanhamento anual do projeto	08/12/2025	Não iniciada
73	RAP Anual 2025	12/12/2025	Não iniciada
74	Realizar reunião com COLEX para avaliar a manutenção do projeto para o próximo ano	15/12/2025	Não iniciada
75	Elaboração do cronograma para próximo ano	16/12/2025	Não iniciada
76	Cronograma 2026	22/12/2025	Não iniciada

# [HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

<b>Tema estratégico</b> RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA	<b>Objetivo estratégico</b> PROMOVER SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL EM REDE
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD	<b>% de execução</b> <b>44,0%</b>
<b>Objetivo projeto local</b> IMPLANTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD, FILIAL EBSERH.	<b>Início programado</b> 01/05/2024
	<b>Término programado</b> (Em branco)
<b>Gerente</b> JOAO FERNANDES GUIMARAES JUNIOR	<b>Áreas responsáveis</b> GAD   DLIH
	<b>Período avaliativo</b> dezembro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <b>47</b>	<b>Não iniciadas</b> Em atraso 19 No prazo 0	<b>Em andamento</b> <b>7</b>	<b>Concluídas</b> <b>21</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	76,0%
22	DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE AÇÃO E REVISÃO DO PROJETO	72,0%
28	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	19,0%
40	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Quantidade de ações ambientais distintas implementadas	Anual	2024	1		Maior , melhor
Avanço de percentual de conformidade em questionário de diagnóstico ambiental da Ebserh/Sede	Anual	2025	10%		Maior , melhor
Quantidade de ações ambientais distintas implementadas	Anual	2025	3		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
44	RAP Anual 2025	0,0%
47	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
------	--------------------

## Projeto local

[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
18	Ponto de controle outubro 2025	31/10/2025	Não iniciada
19	Ponto de controle novembro 2025	28/11/2025	Não iniciada
20	Ponto de controle dezembro 2025	19/12/2025	Não iniciada
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	29/12/2025	Não iniciada
27	Aprovação da proposta de alteração do projeto e formalização de equipe pelo COLEX	01/09/2025	Não iniciada
32	Reunião de validação e priorização das ideias	19/09/2025	Não iniciada
33	Execução das ações para 2025	01/09/2025	Não iniciada
34	Avaliação dos resultados	08/12/2025	Não iniciada
37	Reunião de priorização e elaboração de plano de ação para os itens não conforme para 2025	01/08/2025	Não iniciada
38	Execução das ações para 2025	01/09/2025	Não iniciada
39	Avaliação dos resultados	08/12/2025	Não iniciada
40	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	08/12/2025	Não iniciada
41	Avaliar a execução do projeto	08/12/2025	Não iniciada
42	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	08/12/2025	Não iniciada
43	Elaborar relatório de acompanhamento anual do projeto	08/12/2025	Não iniciada
44	RAP Anual 2025	11/12/2025	Não iniciada
45	Realizar reunião com COLEX para avaliar a manutenção do projeto para o próximo ano	10/12/2025	Não iniciada
46	Elaboração do cronograma para próximo ano	11/12/2025	Não iniciada
47	Cronograma 2026	29/12/2025	Não iniciada

[HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

<b>Tema estratégico</b> DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		<b>Objetivo estratégico</b> DESENVOLVER CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTÃO HOSPITALAR	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA G...		<b>% de execução</b> <h1>69,0%</h1>	
<b>Objetivo projeto local</b> DISPONIBILIZAR PAINEL DE INDICADORES CONSTANDO INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA UMA DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, FAVORECENDO A DISCUSSÃO EM REUNIÕES COLEGIADAS NAS UNIDADES, ESTIMULANDO A PRÁTICA DA GESTÃO POR INDICADORES E ELABORAÇÃO DE CICLOS DE MELHORIA ATRAVÉS DE TREINAMENTO DOS GESTORES, COM DEFINIÇÃO DE METAS ANUAIS.		<b>Início programado</b> 01/05/2024	
		<b>Término programado</b> (Em branco)	
<b>Gerente</b> FUAD FAYEZ MAHMOUD		<b>Áreas responsáveis</b> SUP   STGQ   SETISD	<b>Período avaliativo</b> dezembro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>47</h1>	<b>Não iniciadas</b> Em atraso: 16 No prazo: 0	<b>Em andamento</b> <h1>4</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>27</h1>
--	--	-----------------------------------	----------------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	69,0%
22	COLETA DE DADOS NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS	77,0%
34	CAPACITAR GESTORES SOBRE GESTÃO INDICADORES	100,0%
40	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	0,0%

INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Proporção de gestores capacitados para gestão por indicadores	Anual	2024	50%		Maior , melhor
Proporção de unidades assistenciais com painel de indicadores	Anual	2024	50%		Maior , melhor
Proporção de gestores capacitados para gestão por indicadores	Anual	2025	80%		Maior , melhor
Proporção de unidades assistenciais com painel de indicadores	Anual	2025	80%		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES N... ▾

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	0,0%
39	Gestores capacitados em coleta, análise e monitoramento de indicadores	100,0%
44	RAP Anual 2025	0,0%
47	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
------	--------------------

## Projeto local

[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES N... ▾

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
16	Ponto de controle agosto 2025	28/08/2025	Não iniciada
17	Ponto de controle setembro 2025	29/09/2025	Não iniciada
18	Ponto de controle outubro 2025	30/10/2025	Não iniciada
19	Ponto de controle novembro 2025	27/11/2025	Não iniciada
20	Ponto de controle dezembro 2025	30/12/2025	Não iniciada
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	30/12/2025	Não iniciada
32	Acompanhar disponibilização de painéis - trimestre 02	01/08/2025	Não iniciada
33	Acompanhar disponibilização de painéis - trimestre 03	01/12/2025	Não iniciada
40	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	08/12/2025	Não iniciada
41	Avaliar a execução do projeto	08/12/2025	Não iniciada
42	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	08/12/2025	Não iniciada
43	Elaborar relatório de acompanhamento anual do projeto	08/12/2025	Não iniciada
44	RAP Anual 2025	11/12/2025	Não iniciada
45	Realizar reunião com COLEX para avaliar a manutenção do projeto para o próximo ano	10/12/2025	Não iniciada
46	Elaboração do cronograma para próximo ano	11/12/2025	Não iniciada
47	Cronograma 2026	29/12/2025	Não iniciada

# [HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

<b>Tema estratégico</b> SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	<b>Objetivo estratégico</b> PROMOVER EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DO TRABALHO
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD ▾	<b>% de execução</b> <b>8,0%</b>
<b>Objetivo projeto local</b> DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA AO LONGO DE 5 ANOS, COM O OBJETIVO DE EQUALIZAR AS RECEITAS E DESPESAS, CONCENTRANDO-SE NA REVISÃO DOS VALORES DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS FONTES DE RECURSOS E NA IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVAS DE MELHORIA CONTÍNUA DE INOVAÇÃO, PROCESSOS OPERACIONAIS E REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO DE RECURSOS.	<b>Início programado</b> 01/05/2024
	<b>Término programado</b> 15/12/2025
<b>Gerente</b> CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA	<b>Áreas responsáveis</b> GAD   DAF
	<b>Período avaliativo</b> dezembro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <b>88</b>	<b>Não iniciadas</b> <b>64</b> Em atraso <b>64</b> No prazo <b>0</b>	<b>Em andamento</b> <b>7</b>	<b>Concluídas</b> <b>17</b>
--------------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	69,0%
19	AÇÕES PARA MELHORIA DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS	13,0%
43	AÇÕES PARA OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	4,0%
81	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	0,0%

INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Diferença percentual entre receitas contratualizadas e despesas realizadas	Anual	2025	100%		Maior, melhor
Diferença percentual de recursos financeiros da contratualização	Anual	2025	105%		Maior, melhor
Variação percentual das despesas	Anual	2025	98%		Menor, melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
18	Fim do ciclo 2025 do Projeto	0,0%
21	- Identificar cada fonte de recurso financeiros atual (junho de 2024) e os valores de totais previsto para o ano	100,0%
23	Plano para melhoria das receitas contratualização	100,0%
35	Plano para obtenção das novas fontes de recursos identificadas	0,0%
46	Identificar com Análise de Pareto (curva ABC) os materiais de consumo do almoxarifado com maior gastos no hospital	100,0%
72	Elaborar proposta de melhoria de utilização e metas de gastos com serviços terceirizados	0,0%
85	RAP Anual 2025	0,0%
88	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome

Observações Gerais

## Projeto local

[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
28	1º Trimestre 2025	06/01/2025	Não iniciada
39	1º Trimestre 2025	06/01/2025	Não iniciada
53	1º Trimestre 2025	06/01/2025	Não iniciada
65	1º Trimestre 2025	06/01/2025	Não iniciada
77	1º Trimestre 2025	06/01/2025	Não iniciada
64	2025 Monitoramento, Avaliação e Ajustes para continuidade da otimização das despesa com gastos gerais	06/01/2025	Não iniciada
52	2025 Monitoramento, Avaliação e Ajustes para continuidade da otimização de uso dos insumos	06/01/2025	Não iniciada
38	2025 Monitoramento, Avaliação e Ajustes para continuidade das ações de inovação das fontes de recursos	06/01/2025	Não iniciada
27	2025 Monitoramento, Avaliação e Ajustes para continuidade das ações de melhorias das principais fontes de recursos existentes	06/01/2025	Não iniciada
76	2025 Monitoramento, Avaliação e Ajustes para continuidade das despesa com Serviços Terceirizados	06/01/2025	Não iniciada
29	2º Trimestre 2025	01/04/2025	Não iniciada
40	2º Trimestre 2025	01/04/2025	Não iniciada
54	2º Trimestre 2025	01/04/2025	Não iniciada
66	2º Trimestre 2025	01/04/2025	Não iniciada
78	2º Trimestre 2025	01/04/2025	Não iniciada
30	3º Trimestre 2025	01/07/2025	Não iniciada
41	3º Trimestre 2025	01/07/2025	Não iniciada
55	3º Trimestre 2025	01/07/2025	Não iniciada
67	3º Trimestre 2025	01/07/2025	Não iniciada
79	3º Trimestre 2025	01/07/2025	Não iniciada
31	4º Trimestre 2025	01/10/2025	Não iniciada
42	4º Trimestre 2025	01/10/2025	Não iniciada
56	4º Trimestre 2025	01/10/2025	Não iniciada
68	4º Trimestre 2025	01/10/2025	Não iniciada
80	4º Trimestre 2025	01/10/2025	Não iniciada
69	Ações para otimização dos contratos de serviços - Serviços Terceirizados	06/01/2025	Não iniciada
81	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	16/12/2025	Não iniciada
82	Avaliar a execução do projeto	16/12/2025	Não iniciada
83	Avaliar o resultado dos indicadores do projeto	16/12/2025	Não iniciada
74	Criar plano de melhoria dos recursos financeiros com os gastos de serviços terceirizados do hospital ref. ao ano de 2024	02/06/2025	Não iniciada
62	Criar plano de melhoria dos recursos financeiros com os gastos gerais do hospital ref. ao ano de 2024	20/05/2025	Não iniciada
50	Criar plano de melhoria na organização e utilização de insumos identificado na curva "A" da Análise de Pareto ref. ao ano de 2024	30/04/2025	Não iniciada

[HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

<b>Tema estratégico</b> DESENVOLVIMENTO DO TRABALADOR	<b>Objetivo estratégico</b> PROMOVER O ENGAJAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU... ▾	<b>% de execução</b> <b>63,0%</b>
<b>Objetivo projeto local</b> DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM TEMAS DE INTERESSE DAS UNIDADES LABORAIS.	<b>Início programado</b> 01/05/2024
	<b>Término programado</b> (Em branco)
<b>Gerente</b> MARIA ELENA AQUINO DUTRA	<b>Áreas responsáveis</b> UDP   NEP   UNIDADES
	<b>Período avaliativo</b> dezembro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <b>106</b>	<b>Não iniciadas</b> <b>30</b> Em atraso 30 No prazo 0	<b>Em andamento</b> <b>9</b>	<b>Concluídas</b> <b>67</b>
---------------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
99	AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 2025	52,0%
36	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA (PEPC) NO HU-UFGD	74,0%
26	DIAGNÓSTICO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES LABORAIS	100,0%
78	FASE DE LEVANTAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2026 EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR	3,0%
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	88,0%
22	REVISÃO DO PROGRAMA CRIADO NO PDE 2021-2023	100,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Tempo Médio de Capacitação por Pessoa	Anual	2025	5h	Não atingido	Maior , melhor
Percentual de satisfação dos colaboradores com as ações de capacitação realizadas	Anual	2024	50%		Maior , melhor
Percentual de satisfação dos colaboradores com as ações de capacitação realizadas	Anual	2025	70%	87,49%	Maior , melhor

Projeto local

[HU-UGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	0,0%
25	Publicação do programa de educação permanente e continuada em BS	100,0%
35	Relatório situacional das ações de educação permanente e continuada	100,0%
49	Lista de capacitações	100,0%
57	Plano de Desenvolvimento de Competências	100,0%
71	Relatório de execução do PDC	0,0%
77	Publicação da nova versão do Programa	0,0%
91	Lista de capacitações	0,0%
98	Plano de Desenvolvimento de Competências	0,0%
103	RAP Anual 2025	0,0%
106	Cronograma 2026	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
Avaliar os projetos básicos referentes as capacitações internas com ônus	A ação em destaque não foi desenvolvida, pois não houve a disponibilização de recurso orçamentário para sua realização
Dar suporte as unidades para execução das ações de capacitação sem ônus interna 2º trimestre	A ação em destaque não foi desenvolvida, pois não houve a disponibilização de recurso orçamentário para sua realização
Instruir a área demandante acerca do processo de contratação dos cursos com ônus	A ação em destaque não foi desenvolvida, pois não houve a disponibilização de recurso orçamentário para sua realização
Solicitar aos demandantes abertura do processo SEI das capacitações internas com ônus a serem realizadas	A ação em destaque não foi desenvolvida, pois não houve a disponibilização de recurso orçamentário para sua realização
Monitorar a execução das ações de capacitações com ônus	A única ação a ser realizada no ano de 2025, consta no processo 23529.013488/2025-48, as demais foram empenhadas e serão realizadas no ano de 2026.
Realizar as ações de capacitação interna com ônus	A única ação a ser realizada no ano de 2025, consta no processo 23529.013488/2025-48, as demais foram empenhadas e serão realizadas no ano de 2026.
Lista de capacitações	As ações serão organizadas conforme as orientações contidas no processo 23477.031247/2025-33 (Pessoal: Capacitação)
Elaborar formulário de levantamento de necessidades de capacitação interna para 2026	Formulário já está elaborado, estamos aguardando apenas as orientações da sede quanto a realização do levantamento

## Projeto local

[HU-UGFD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UGFD



## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
19	Ponto de controle novembro 2025	28/11/2025	Não iniciada
20	Ponto de controle dezembro 2025	30/12/2025	Não iniciada
21	Fim do ciclo 2025 do Projeto	01/05/2024	Não iniciada
67	Realizar as ações de capacitação interna com ônus	01/07/2025	Não iniciada
68	Monitorar a execução das ações de capacitações com ônus	01/07/2025	Não iniciada
71	Relatório de execução do PDC	26/12/2025	Não iniciada
74	Identificar as inconsistências	22/09/2025	Não iniciada
75	Lista de inconsistências	06/10/2025	Não iniciada
76	Definir melhorias a serem implementadas antes do próximo PDC	13/10/2025	Não iniciada
77	Publicação da nova versão do Programa	26/12/2025	Não iniciada
83	Encaminhar para validação do CNEP e demais membros do Subcomitê Desenvolvimento do Trabalhador	02/10/2025	Não iniciada
84	Enviar e-mail e/ou processo SEI com formulário para levantamento das capacitações a serem realizadas em 2026	16/10/2025	Não iniciada
85	Aplicar o formulários de levantamento	17/10/2025	Não iniciada
86	Monitorar o preenchimento do formulário pelos colaboradores	17/10/2025	Não iniciada
87	Realizar levantamento das necessidades de capacitações internas de 2026 junto as unidades.	17/10/2025	Não iniciada
88	Realizar levantamento das necessidades de capacitações externas com ônus para 2026	17/10/2025	Não iniciada
89	Realizar Levantamento das necessidades de capacitações externas sem ônus para 2026	17/10/2025	Não iniciada
90	Compilar dados coletados	28/11/2025	Não iniciada
91	Lista de capacitações	01/10/2025	Não iniciada
92	Elaboração do PDC	02/10/2025	Não iniciada
93	Realizar a análise e definição das capacitações a serem realizadas	02/10/2025	Não iniciada
94	Organizar as capacitações internas e externas sem ônus	16/10/2025	Não iniciada
95	Aplicar Matriz B.A.S.I.C.O para priorização das capacitações com ônus	30/10/2025	Não iniciada
96	Organizar as capacitações externas com ônus	06/11/2025	Não iniciada
97	Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Competências	20/11/2025	Não iniciada
98	Plano de Desenvolvimento de Competências	31/12/2025	Não iniciada
103	RAP Anual 2025	11/12/2025	Não iniciada
104	Realizar reunião com COLEX para avaliar a manutenção do projeto para o próximo ano	10/12/2025	Não iniciada
105	Elaboração do cronograma para próximo ano	11/12/2025	Não iniciada
106	Cronograma 2026	29/12/2025	Não iniciada

Observações referente ao quadrimestre

PROJETO	OBSERVAÇÕES
[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.
[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.
[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBITO DO HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.
[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.
[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.
[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.
[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UFGD	Realizado ajustes conforme orientação da SEDE. Atividades foram restringidas apenas ao ano de 2025 com revisão anual para os próximos ciclos.

Projeto	Número de atividades	Atividades sem data
		72
[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD		76
[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD		177
[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD		71
[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBITO DO HU-UFGD		76
[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD		47
[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD		47
[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD		88
[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-		106
<b>Total</b>		<b>760</b>
