

# Relatório de Acompanhamento de Portfólio de Projetos


## Plano Diretor Estratégico 2024-2028

Hospital Universitário da Universidade Federal  
da Grande Dourados - HU-UFOD

**Gerente de Portfólio**

Hélcio de Brito Lima

Fechamento Anual - 2024

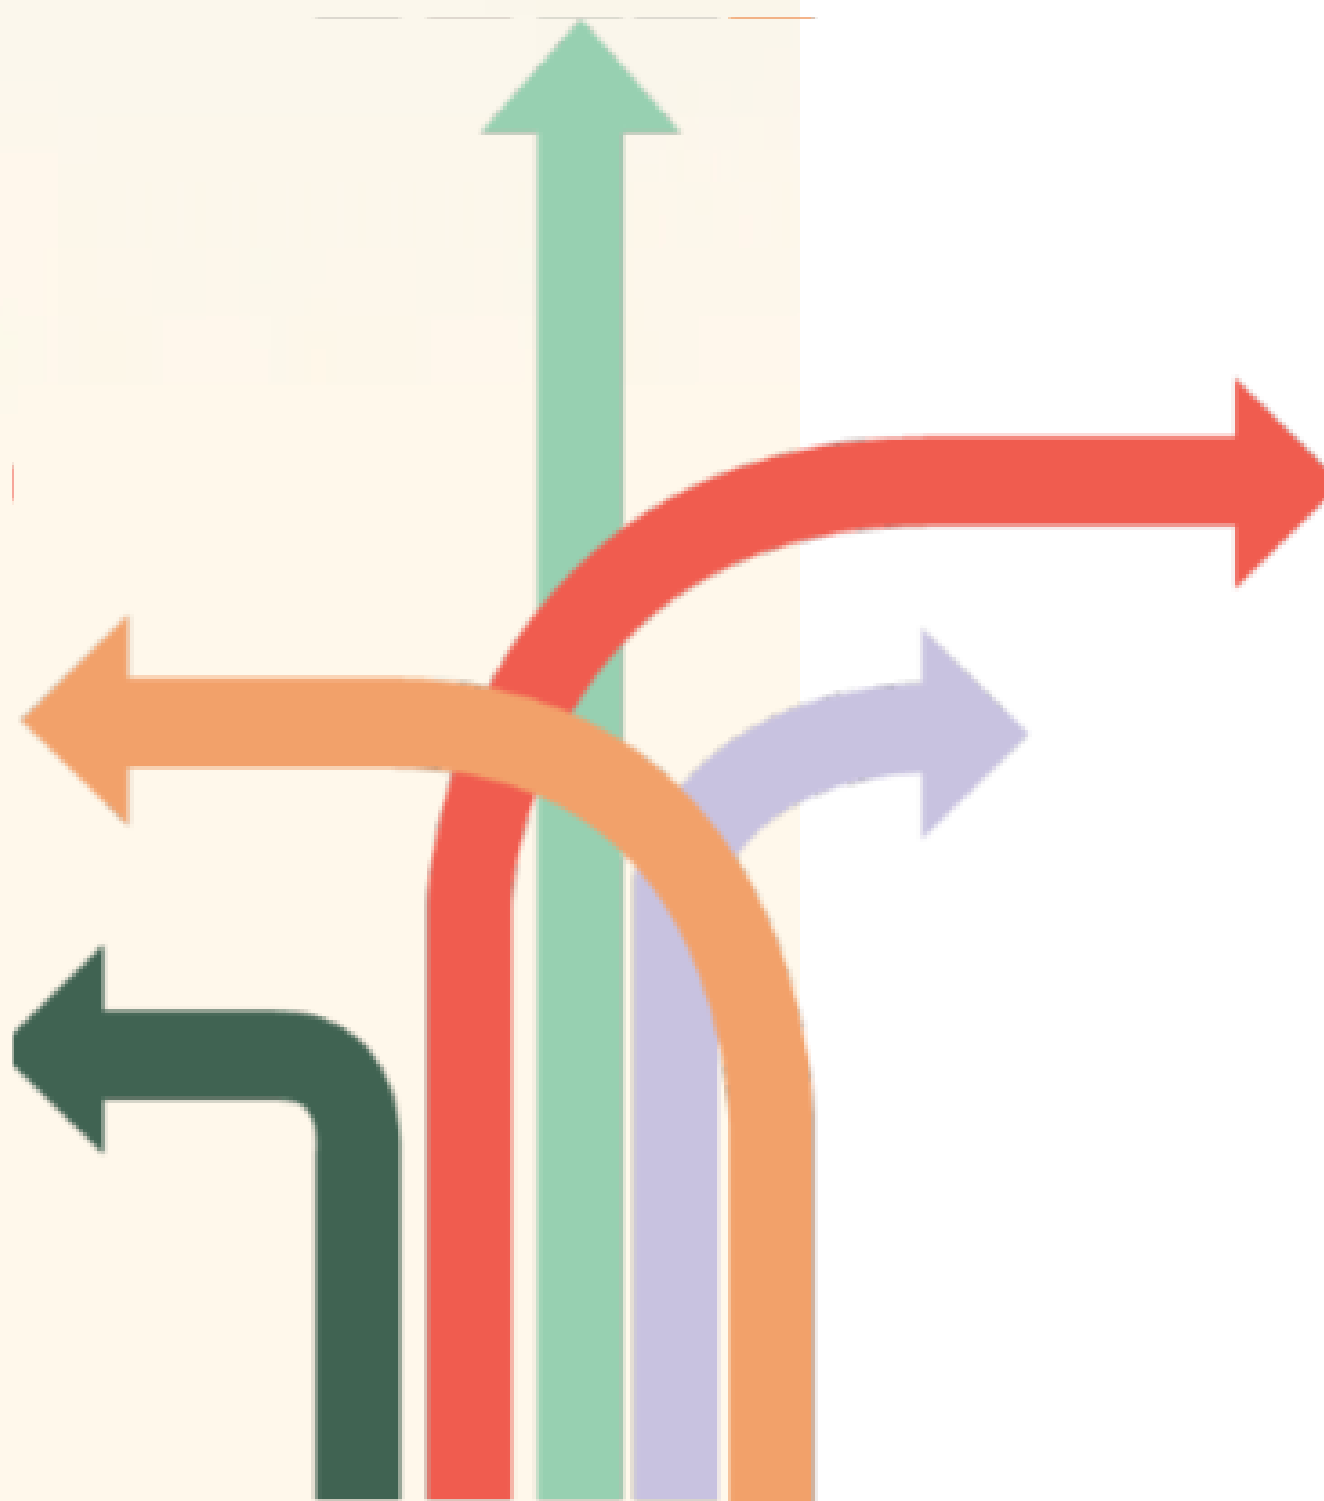

PDE

# Plano Diretor Estratégico 2024-2028

% de execução

## 5,75%

Total de projetos

### 8

Total de atividades

### 1298

Atividades não iniciadas

Em atraso 286  
No prazo 890

### 1176

Atividades em execução

### 31

Atividades concluídas

### 91

Projetos	Número de atividades	Atividades Concluídas	% de execução do projeto	% de execução do portfólio
[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD	233	0	0,0%	0,00%
[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD	199	39	23,0%	2,88%
[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD	89	0	0,0%	0,00%
[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBITO DO HU-UFGD	177	6	2,0%	0,25%
[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD	109	3	6,0%	0,75%
[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD	139	1	0,0%	0,00%
[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD	195	7	3,0%	0,38%
[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE	157	35	12,0%	1,50%
<b>Total</b>	<b>1298</b>	<b>91</b>		<b>5,75%</b>

### CALENDÁRIO DE MONITORAMENTO PDE 2024-2028

Nº	Etapa	Mês												Responsável	Destino		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez				
1	Checagem dos Indicadores do Projeto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Responsável pelo indicador	Gerente   equipe de projeto
2	Elaboração do Relatório de Acompanhamento de Projetos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Gerente   equipe de projeto	Setor de Governança e Estratégia
3	Relatório de Monitoramento do PDE (indicadores, metas e projetos locais)				■				■					■		Setor de Governança e Estratégia	Colegiado Executivo
4	Checagem de Projetos e Indicadores e elaboração do RAP Mensal				■				■					■		Colegiado Executivo	DVPE   Reitoria   Comissão de monitoramento do contrato de gestão/lfes

<b>Tema estratégico</b> SOCIEDADE (ASSISTÊNCIA)		<b>Objetivo estratégico</b> AMPLIAR E QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD		<b>% de execução</b> <h1>23,0%</h1>	
<b>Objetivo projeto local</b> REESTRUTURAR O SERVIÇO DE CARDIOLOGIA VISANDO A RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E OFERTA DE SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA.		<b>Início programado</b> 01/05/2024	<b>Término programado</b> 29/12/2028
<b>Gerente</b> LEONORA CORREA DA COSTA DE MARCHI	<b>Áreas responsáveis</b> GAS   STDT   UDE	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025	

<b>Total de Tarefas</b> <h1>199</h1>	<b>Não iniciadas</b> <table border="0"> <tr> <td>Em atraso</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>No prazo</td> <td>125</td> </tr> </table>	Em atraso	28	No prazo	125	<b>Em andamento</b> <h1>7</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>39</h1>
Em atraso	28						
No prazo	125						

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	2,0%
58	PLANEJAMENTO PARA RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA	54,0%
128	REALIZAR O LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA	50,0%
132	ESTUDO DE VIABILIDADE DO INÍCIO DA OFERTA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA PARA PACIENTES INTERNADOS	0,0%
145	ESTUDO DE VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA PARA MACRORREGIÃO DA GRANDE DOURADOS	0,0%
153	ESTUDO DE VIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA (NORMA 01)	0,0%
159	PLANEJAMENTO PARA REESTRUTURAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA	0,0%
167	PLANEJAMENTO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
% de economicidade	Anual	2024			Maior , melhor
Taxa de disponibilidade de equipamentos médico assistenciais	Anual	2024			Maior , melhor
Taxa de cumprimento de ações planejadas	Semestral	2024	30%	23%	Maior , melhor

## Projeto local

[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD



## Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
70	Angiógrafo e outros equipamentos em pleno funcionamento	100,0%
76	Manutenções elétricas e estruturais/prediais finalizadas	100,0%
85	Formalização de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	0,0%
92	Listas de insumos e precificação dos procedimentos	100,0%
100	Inclusão no Planejamento Anual de Compras 2025	100,0%
113	Disponibilização de estoque de insumos básicos para início da oferta do serviço	0,0%
127	Disponibilização de rol completo de insumos necessários para reabertura do serviço	0,0%
138	Todos os recursos disponíveis para início do serviço (humanos e estruturais)	0,0%
141	Agenda de procedimentos diagnósticos disponíveis	0,0%
144	Agenda de procedimentos terapêuticos disponíveis	0,0%
152	Oferta de vagas de procedimentos de hemodinâmica para pacientes externos - SISREG	0,0%
158	Manifestação da vice presidência da SEDE sobre a viabilidade	0,0%
166	Planejamento de ampliação de vagas ambulatoriais em cardiologia	0,0%
188	Equipamentos necessários para ampliação do serviço instalados	0,0%
191	Ampliação do ambulatório e ofertas de métodos gráficos em cardiologia	0,0%

## Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
Realizar manutenção preventiva da bomba injetora de contraste	Aguardando liberação de c
Realizar manutenção preventiva do polígrafo	Aguardando liberação de c
Solicitação de cotação de preços com empresa GE	Empresa GE informou que manutenção
Formalização de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	Fracasso no processo licitat
Agendamento de sessões públicas	Fracasso nos processos licit
Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	Mudança do gestor local d
Verificar disponibilidade de inclusão no AOC 2024	Não foi incluído no AOC de
Definir com o profissional médico especialista os insumos necessários	O profissional ainda não cc

## Projeto local

[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
6	Ponto de controle outubro 2024	31/10/2024	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	29/11/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	31/12/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	31/01/2025	Não iniciada
82	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	03/12/2024	Não iniciada
83	Elaboração de Termo de referência	14/01/2025	Não iniciada
101	Instruir processo de aquisição direta por valor para itens que não foram disponibilizados para empréstimo pelos hospitais da rede EBSEH	07/11/2024	Não iniciada
102	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	07/11/2024	Não iniciada
103	Realização da estimativa de preço	08/11/2024	Não iniciada
104	Formalização do Estudo técnico Preliminar e Elaboração do Termo de Referência	07/01/2025	Não iniciada
105	Conformidade administrativa	17/01/2025	Não iniciada
106	Elaboração de minutas	24/01/2025	Não iniciada
107	Elaboração do edital e correções do planejamento	27/01/2025	Não iniciada
114	Instruir processo regular com rol completo dos itens necessários para reabertura do serviço de Hemodinâmica (exceto incluídos na dispensa supracitada)	08/11/2024	Não iniciada
115	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	08/11/2024	Não iniciada
116	Realização da estimativa de preço	06/01/2025	Não iniciada
153	ESTUDO DE VIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA (NORMA 01)	04/11/2024	Não iniciada
154	Manifestação de interesse expedido pelo gestor SUS para contratação do serviço	04/11/2024	Não iniciada
159	PLANEJAMENTO PARA REESTRUTURAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA	14/10/2024	Não iniciada
160	Realizar diagnóstico situacional da oferta atual da especialidade ambulatorial de cardiologia	14/10/2024	Não iniciada
161	Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	04/11/2024	Não iniciada
162	Realizar estudo técnico da viabilidade de ampliação de oferta da especialidade ambulatorial de cardiologia	13/01/2025	Não iniciada
167	PLANEJAMENTO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA	14/10/2024	Não iniciada
168	Realizar diagnóstico situacional da oferta atual de métodos gráficos na Instituição	14/10/2024	Não iniciada
169	Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	04/11/2024	Não iniciada
170	Realizar estudo técnico da viabilidade de estruturação de oferta do serviço	27/01/2025	Não iniciada
192	CAPTAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA OFERTA DOS SERVIÇOS	30/10/2024	Não iniciada
193	Tratativas de custeio junto aos gestores municipal e Estadual para início do serviço	30/10/2024	Não iniciada

# [HU-UFGD] RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PDE 2024-2028

<b>Tema estratégico</b> SOCIEDADE (ASSISTÊNCIA)		<b>Objetivo estratégico</b> AMPLIAR E QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD			<b>% de execução</b> <h1>23,0%</h1>
<b>Objetivo projeto local</b> REESTRUTURAR O SERVIÇO DE CARDIOLOGIA VISANDO A RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E OFERTA DE SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA.			<b>Início programado</b> 01/05/2024
			<b>Término programado</b> 29/12/2028
<b>Gerente</b> LEONORA CORREA DA COSTA DE MARCHI		<b>Áreas responsáveis</b> GAS   STDT   UDE	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>199</h1>	<b>Não iniciadas</b> <table border="0"> <tr> <td>Em atraso</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>No prazo</td> <td>125</td> </tr> </table>	Em atraso	28	No prazo	125	<b>Em andamento</b> <h1>7</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>39</h1>
Em atraso	28						
No prazo	125						

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
192	CAPTAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA OFERTA DOS SERVIÇOS	0,0%
145	ESTUDO DE VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA PARA MACRORREGIÃO DA GRANDE DOURADOS	0,0%
153	ESTUDO DE VIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA (NORMA 01)	0,0%
132	ESTUDO DE VIABILIDADE DO INÍCIO DA OFERTA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA PARA PACIENTES INTERNADOS	0,0%
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	2,0%
167	PLANEJAMENTO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA	0,0%
159	PLANEJAMENTO PARA REESTRUTURAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA	0,0%
58	PLANEJAMENTO PARA RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA	54,0%
128	REALIZAR O LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA RETOMADA DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA	50,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
% de economicidade	Anual	2024			Maior , melhor
Taxa de disponibilidade de equipamentos médico assistenciais	Anual	2024			Maior , melhor
Taxa de cumprimento de ações planejadas	Semestral	2024	30%	23%	Maior , melhor

## Projeto local

[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD

## Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
70	Angiógrafo e outros equipamentos em pleno funcionamento	100,0%
76	Manutenções elétricas e estruturais/prediais finalizadas	100,0%
85	Formalização de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	0,0%
92	Listas de insumos e precificação dos procedimentos	100,0%
100	Inclusão no Planejamento Anual de Compras 2025	100,0%
113	Disponibilização de estoque de insumos básicos para início da oferta do serviço	0,0%
127	Disponibilização de rol completo de insumos necessários para reabertura do serviço	0,0%
138	Todos os recursos disponíveis para início do serviço (humanos e estruturais)	0,0%
141	Agenda de procedimentos diagnósticos disponíveis	0,0%
144	Agenda de procedimentos terapêuticos disponíveis	0,0%
152	Oferta de vagas de procedimentos de hemodinâmica para pacientes externos - SISREG	0,0%
158	Manifestação da vice presidência da SEDE sobre a viabilidade	0,0%
166	Planejamento de ampliação de vagas ambulatoriais em cardiologia	0,0%
188	Equipamentos necessários para ampliação do serviço instalados	0,0%
191	Ampliação do ambulatório e ofertas de métodos gráficos em cardiologia	0,0%

## Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
Realizar manutenção preventiva da bomba injetora de contraste	Aguardando liberação de c
Realizar manutenção preventiva do polígrafo	Aguardando liberação de c
Solicitação de cotação de preços com empresa GE	Empresa GE informou que manutenção
Formalização de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	Fracasso no processo licita
Agendamento de sessões públicas	Fracasso nos processos lici
Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	Mudança do gestor local d
Verificar disponibilidade de inclusão no AOC 2024	Não foi incluído no AOC de
Definir com o profissional médico especialista os insumos necessários	O profissional ainda não cc

## Projeto local

[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
192	CAPTAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA OFERTA DOS SERVIÇOS	30/10/2024	Não iniciada
105	Conformidade administrativa	17/01/2025	Não iniciada
82	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	03/12/2024	Não iniciada
106	Elaboração de minutas	24/01/2025	Não iniciada
83	Elaboração de Termo de referência	14/01/2025	Não iniciada
102	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	07/11/2024	Não iniciada
115	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	08/11/2024	Não iniciada
107	Elaboração do edital e correções do planejamento	27/01/2025	Não iniciada
153	ESTUDO DE VIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA (NORMA 01)	04/11/2024	Não iniciada
104	Formalização do Estudo técnico Preliminar e Elaboração do Termo de Referência	07/01/2025	Não iniciada
101	Instruir processo de aquisição direta por valor para itens que não foram disponibilizados para empréstimo pelos hospitais da rede EBSEH	07/11/2024	Não iniciada
114	Instruir processo regular com rol completo dos itens necessários para reabertura do serviço de Hemodinâmica (exceto incluídos na dispensa supracitada)	08/11/2024	Não iniciada
154	Manifestação de interesse expedido pelo gestor SUS para contratação do serviço	04/11/2024	Não iniciada
167	PLANEJAMENTO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA	14/10/2024	Não iniciada
159	PLANEJAMENTO PARA REESTRUTURAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA	14/10/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	31/12/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	31/01/2025	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	29/11/2024	Não iniciada
6	Ponto de controle outubro 2024	31/10/2024	Não iniciada
103	Realização da estimativa de preço	08/11/2024	Não iniciada
116	Realização da estimativa de preço	06/01/2025	Não iniciada
160	Realizar diagnóstico situacional da oferta atual da especialidade ambulatorial de cardiologia	14/10/2024	Não iniciada
168	Realizar diagnóstico situacional da oferta atual de métodos gráficos na Instituição	14/10/2024	Não iniciada
162	Realizar estudo técnico da viabilidade de ampliação de oferta da especialidade ambulatorial de cardiologia	13/01/2025	Não iniciada
170	Realizar estudo técnico da viabilidade de estruturação de oferta do serviço	27/01/2025	Não iniciada
161	Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	04/11/2024	Não iniciada
169	Realizar levantamento das necessidades e demanda reprimida junto a gestor local	04/11/2024	Não iniciada
193	Tratativas de custeio junto aos gestores municipal e Estadual para início do serviço	30/10/2024	Não iniciada

<b>Tema estratégico</b> SOCIEDADE (ENSINO)		<b>Objetivo estratégico</b> APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE ENSINO E OS CENÁRIOS DE PRÁTICA	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCI...			<b>% de execução</b> <h1>0,0%</h1>
<b>Objetivo projeto local</b> PROMOVER INICIATIVAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NOS CENÁRIOS DE PRÁTICA, PROMOVENDO A EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DO TRABALHO EM SAÚDE.			<b>Início programado</b> 01/05/2024
			<b>Término programado</b> 01/05/2024
<b>Gerente</b> RENATA MARONNA PRAÇA LONGHI		<b>Áreas responsáveis</b> GEP   SEGE	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>89</h1>	<b>Não iniciadas</b> Em atraso <b>89</b> No prazo <b>0</b>	<b>Em andamento</b> <h1>0</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>0</h1>
--	--	-----------------------------------	---------------------------------

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	0,0%
58	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	0,0%
63	DESENVOLVER PROJETO PERMANENTE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO	0,0%
69	DESENVOLVER PROJETO DE COMUNICAÇÃO PERMANENTE PARA O ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO E O SERVIÇO	0,0%
72	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ENSINO	0,0%
78	PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA	0,0%
86	ENCERRAMENTO DO PROJETO	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Percentual geral de satisfação com o ensino		2024	70%		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
58	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	0,0%
62	Criar Marco	0,0%
63	DESENVOLVER PROJETO PERMANENTE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO	0,0%
69	DESENVOLVER PROJETO DE COMUNICAÇÃO PERMANENTE PARA O ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO E O SERVIÇO	0,0%
72	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ENSINO	0,0%
78	PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
------	--------------------

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD

Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
1	[OE.05] APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE ENSINO E OS CENÁRIOS DE PRÁTICA	01/05/2024	Não iniciada
2	[P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD	01/05/2024	Não iniciada
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	01/05/2024	Não iniciada
4	Início do Projeto	01/05/2024	Não iniciada
5	Ponto de controle setembro 2024	01/05/2024	Não iniciada
6	Ponto de controle outubro 2024	01/05/2024	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	01/05/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	01/05/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	01/05/2024	Não iniciada
10	Ponto de controle fevereiro 2025	01/05/2024	Não iniciada
11	Ponto de controle março 2025	01/05/2024	Não iniciada
12	Ponto de controle abril 2025	01/05/2024	Não iniciada
13	Ponto de controle maio 2025		Não iniciada
14	Ponto de controle junho 2025		Não iniciada
15	Ponto de controle julho 2025		Não iniciada
16	Ponto de controle agosto 2025		Não iniciada
17	Ponto de controle setembro 2025		Não iniciada
18	Ponto de controle outubro 2025		Não iniciada
19	Ponto de controle novembro 2025		Não iniciada
20	Ponto de controle dezembro 2025		Não iniciada
21	Ponto de controle janeiro 2026		Não iniciada
22	Ponto de controle fevereiro 2026		Não iniciada
23	Ponto de controle março 2026		Não iniciada
24	Ponto de controle abril 2026		Não iniciada
25	Ponto de controle maio 2026		Não iniciada
26	Ponto de controle junho 2026		Não iniciada
27	Ponto de controle julho 2026		Não iniciada
28	Ponto de controle agosto 2026		Não iniciada
29	Ponto de controle setembro 2026		Não iniciada
30	Ponto de controle outubro 2026		Não iniciada
31	Ponto de controle novembro 2026		Não iniciada
32	Ponto de controle dezembro 2026		Não iniciada
33	Ponto de controle janeiro 2027		Não iniciada
34	Ponto de controle fevereiro 2027		Não iniciada
35	Ponto de controle março 2027		Não iniciada
36	Ponto de controle abril 2027		Não iniciada

<b>Tema estratégico</b> SOCIEDADE (PESQUISA)		<b>Objetivo estratégico</b> CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO EM REDE DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS...	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNO...			<b>% de execução</b> <h1>2,0%</h1>
<b>Objetivo projeto local</b> PROPOR AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO (NORMAS, PESSOAS, RECURSOS) ÀS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DE 2024 A 2028.			<b>Início programado</b> 01/05/2024
			<b>Término programado</b> 08/12/2028
<b>Gerente</b> DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO		<b>Áreas responsáveis</b> SGPITS   UGPESQ   UGITS	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>177</h1>	<b>Não iniciadas</b> <h1>165</h1> <table border="0"> <tr> <td>Em atraso</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>No prazo</td> <td>121</td> </tr> </table>	Em atraso	44	No prazo	121	<b>Em andamento</b> <h1>6</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>6</h1>
Em atraso	44						
No prazo	121						

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	0,0%
58	AUMENTO DO NÚMERO DE PESQUISAS NO HU-UFGD	4,0%
123	Promoção e divulgação de curso EAD ou presencial sobre pesquisa e tecnologia entre os profissionais, graduandos e residentes 2028	0,0%
129	IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA EXISTENTES NO HU-UFGD/EBSERH	0,0%
160	ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DO HU-UFGD/EBSERH	0,0%
174	ENCERRAMENTO DO PROJETO	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Número de participação em Editais de fomento	Anual	2024	1		Maior , melhor
Número de linhas de pesquisa implementadas	Anual	2024	1	0	Maior , melhor
Percentual do cumprimento de etapas para Instituição da Política	Anual	2024	28%		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBI... ▾

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
62	Lista de pesquisadores do HU-UFGD	0,0%
69	Lista de potencialidades e dificuldades encontradas	0,0%
83	Ações implementadas	0,0%
95	Lista de encontros e de parcerias estabelecidas	0,0%
100	Página eletrônica com os trabalhos científicos	0,0%
104	Lista de cursos publicitados	0,0%
110	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2025	0,0%
116	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2026	0,0%
122	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2027	0,0%
128	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2028	0,0%
135	lista de atores por linha de pesquisa	0,0%
141	Linha de pesquisa de Saúde Indígena implementada	0,0%
147	Linha de pesquisa Saúde Materno Infantil implementada	0,0%
153	Linha de pesquisa de estudos clínicos e saúde humana implementada	0,0%
159	Linha de pesquisa de Tecnologia, Inovação e Cuidado em Saúde implementada	0,0%
168	Minuta da Política institucional de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologias em saúde do HU-UFGD/Ebserh	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome Observações Gerais

## Projeto local

[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBI... ▾

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	01/05/2024	Não iniciada
5	Ponto de controle setembro 2024	30/09/2024	Não iniciada
6	Ponto de controle outubro 2024	30/10/2024	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	29/11/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	30/12/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	30/01/2025	Não iniciada
59	Identificação de atores para executar pesquisas no HU-UFGD/Ebserh	20/05/2024	Não iniciada
60	Verificar colaboradores que realizam pesquisas no HU-UFGD/Ebserh	01/07/2024	Não iniciada
61	Solicitar contatos de pesquisadores das instituições parceiras	01/08/2024	Não iniciada
62	Lista de pesquisadores do HU-UFGD	20/05/2024	Não iniciada
63	Mapeamento de potencialidade e dificuldades encontradas, entre os pesquisadores em formato de pesquisa de opinião.	15/11/2024	Não iniciada
64	Criar formulário eletrônico	18/11/2024	Não iniciada
65	Enviar formulário eletrônico aos contatos de pesquisadores	18/11/2024	Não iniciada
66	Solicitar apoio da unidade de comunicação na divulgação do formulário eletrônico	18/11/2024	Não iniciada
67	Tabular os dados dos formulários recebidos	18/11/2024	Não iniciada
68	Analisar os dados tabulados	18/11/2024	Não iniciada
69	Lista de pontencialidades e dificuldades encontradas	15/11/2024	Não iniciada
70	Implementação de ações que favoreçam pesquisas no HU-UFGD/Ebserh	25/10/2024	Não iniciada
71	Realizar reunião com equipe para traçar ações de intervenção.	25/11/2024	Não iniciada
72	Definir as ações prioritárias a serem realizadas	09/12/2024	Não iniciada
73	Instituir a ação de intervenção 1	13/01/2025	Não iniciada
83	Ações implementadas	25/10/2024	Não iniciada
86	Reunir com pesquisadores 2	01/08/2024	Não iniciada
87	Reunir com pesquisadores 3	01/01/2025	Não iniciada
95	Lista de encontros e de parcerias estabelecidas	01/05/2024	Não iniciada
96	Desenvolvimento de um fluxo de divulgação dos trabalhos científicos realizados no HU-UFGD/Ebserh.	01/05/2024	Não iniciada
100	Página eletrônica com os trabalhos científicos	01/05/2024	Não iniciada
103	publicitar cursos EAD sobre Avaliação de Tecnologia em Saúde	01/08/2024	Não iniciada
104	Lista de cursos publicitados	01/05/2024	Não iniciada
105	Promoção e divulgação de curso EAD e presencial sobre pesquisa e tecnologia entre os profissionais, graduandos e residentes 2025	01/05/2024	Não iniciada
106	Divulgar cursos EAD sobre pesquisa baseada em evidências	01/01/2025	Não iniciada
110	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2025	01/05/2024	Não iniciada
111	Promoção e divulgação de curso EAD ou presencial sobre pesquisa e tecnologia entre os profissionais, graduandos e residentes 2026	01/05/2024	Não iniciada
116	Lista de cursos divulgados e promovidos em 2026	01/05/2024	Não iniciada

<b>Tema estratégico</b> RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA		<b>Objetivo estratégico</b> PROMOVER SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL EM REDE	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD			<b>% de execução</b> <h1>6,0%</h1>
<b>Objetivo projeto local</b> IMPLANTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD, FILIAL EBSERH.			<b>Início programado</b> 01/01/2024
			<b>Término programado</b> 29/12/2028
<b>Gerente</b> JOAO FERNANDES GUIMARAES JUNIOR		<b>Áreas responsáveis</b> GAD   DLIH	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>109</h1>	<b>Não iniciadas</b> <h1>100</h1> <table border="0"> <tr> <td>Em atraso</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>No prazo</td> <td>93</td> </tr> </table>	Em atraso	7	No prazo	93	<b>Em andamento</b> <h1>6</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>3</h1>
Em atraso	7						
No prazo	93						

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	2,0%
59	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS	69,0%
66	ANÁLISE INICIAL	0,0%
79	ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS E METAS	0,0%
90	IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO	0,0%
100	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	0,0%
106	ENCERRAMENTO DO PROJETO	0,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Capacitação de colaboradores	Anual	2024	0		Maior , melhor
Quantidade de ações ambientes distintas implementadas	Anual	2024	0%	0%	Maior , melhor
Avanço do projeto	Anual	2024	12%	6%	Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
72	Capacitação de equipe técnica	0,0%
89	Plano de Ação de implementação de projetos/ações ambientais	0,0%
98	Documentação técnica ambiental da instituição	0,0%
99	Equipe de auditoria ambiental interna	0,0%
105	Atualização da documentação técnica ambiental da instituição	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
------	--------------------

Projeto local

[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD

Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
6	Ponto de controle outubro 2024	31/10/2024	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	29/11/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	20/12/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	31/01/2025	Não iniciada
63	Comunicar e disponibilizar políticas e objetivos da gestão ambiental a todos os funcionários.	25/11/2024	Não iniciada
64	Propor modelo de comunicação da política e objetivos da gestão ambiental	25/11/2024	Não iniciada
65	Realizar divulgação conforme modelo proposto e aprovado	06/01/2025	Não iniciada

<b>Tema estratégico</b> DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		<b>Objetivo estratégico</b> DESENVOLVER CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTÃO HOSPITALAR	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA ...			<b>% de execução</b> <h1>0,0%</h1>
<b>Objetivo projeto local</b> DISPONIBILIZAR PAINEL DE INDICADORES CONSTANDO INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA UMA DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, FAVORECENDO A DISCUSSÃO EM REUNIÕES COLEGIADAS NAS UNIDADES, ESTIMULANDO A PRÁTICA DA GESTÃO POR INDICADORES E ELABORAÇÃO DE CICLOS DE MELHORIA ATRAVÉS DE TREINAMENTO DOS GESTORES, COM DEFINIÇÃO DE METAS ANUAIS.			<b>Início programado</b> 01/05/2024  <b>Término programado</b> 01/05/2028
<b>Gerente</b> FUAD FAYEZ MAHMOUD		<b>Áreas responsáveis</b> SUP   STGQ   SETISD	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>139</h1>	<b>Não iniciadas</b> <h1>138</h1> <table border="0"> <tr> <td>Em atraso</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>No prazo</td> <td>87</td> </tr> </table>	Em atraso	51	No prazo	87	<b>Em andamento</b> <h1>0</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>1</h1>
Em atraso	51						
No prazo	87						

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	0,0%
58	CRIAR E DISPONIBILIZAR PAINEL COM INDICADORES BÁSICOS	0,0%
113	CAPACITAR GESTORES SOBRE COLETA E ANÁLISE DE INDICADORES	0,0%
134	REVISÃO DE PAINÉIS E DEFINIÇÃO DE MELHORIAS	0,0%
136	ENCERRAMENTO DO PROJETO	0,0%

INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Percentual de unidades assistenciais com paineis de indicadores disponibilizados		2024	60%		Maior , melhor
Proporção de gestores capacitados para gestão por indicadores		2024	60%		Maior , melhor
Proporção de unidades com pelo menos um ciclo de melhoria realizado a partir da análise dos		2024	60%		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES N... ▾

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
66	Painel de ambulatório	0,0%
67	Painel de cirurgias	0,0%
68	Painel de internação	0,0%
69	Painel de exames	0,0%
81	Relação de indicadores das unidades assistenciais	0,0%
98	Painéis de dados validados	0,0%
118	Gestores capacitados em coleta, análise e monitoramento de indicadores	0,0%
134	REVISÃO DE PAINÉIS E DEFINIÇÃO DE MELHORIAS	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais
------	--------------------

## Projeto local

[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES N... ▾

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
1	[OE.17] DESENVOLVER CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTÃO HOSPITALAR	01/05/2024	Não iniciada
2	[P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD	01/05/2024	Não iniciada
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	01/05/2024	Não iniciada
5	Ponto de controle setembro 2024	30/09/2024	Não iniciada
6	Ponto de controle outubro 2024	30/10/2024	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	28/11/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	30/12/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	30/01/2025	Não iniciada
58	CRIAR E DISPONIBILIZAR PAINEL COM INDICADORES BÁSICOS	02/09/2024	Não iniciada
59	Definir indicadores passíveis de extração do aghu	02/09/2024	Não iniciada
60	Extrair os dados do sistema	11/10/2024	Não iniciada
61	Disponibilizar painel de internação com os dados extraídos	02/09/2024	Não iniciada
62	Criar painel de ambulatório	07/11/2024	Não iniciada
63	Criar painel de cirurgias	21/11/2024	Não iniciada
64	Criar painel de internação	05/12/2024	Não iniciada
65	Criar painel de exames	02/09/2024	Não iniciada
66	Painel de ambulatório	20/11/2024	Não iniciada
67	Painel de cirurgias	04/12/2024	Não iniciada
68	Painel de internação	18/12/2024	Não iniciada
69	Painel de exames	02/09/2024	Não iniciada
70	Reunir com chefias das unidades assistenciais e RT's de Enfermagem para definição de indicadores, organização das coletas e definição de prioridades	18/11/2024	Não iniciada
71	Reunir com UCIR	18/11/2024	Não iniciada
72	Reunir com UTIA	19/11/2024	Não iniciada
73	Reunir com UTIP	21/11/2024	Não iniciada
74	Reunir com Pediatria	22/11/2024	Não iniciada
75	Reunir com UTIN	25/11/2024	Não iniciada
76	Reunir com USME	26/11/2024	Não iniciada
77	Reunir com UBCME	27/11/2024	Não iniciada
78	Reunir com UAMB	28/11/2024	Não iniciada
79	Reunir com UMUL	29/11/2024	Não iniciada
80	Reunir com UCM	02/12/2024	Não iniciada
81	Relação de indicadores das unidades assistenciais	02/12/2024	Não iniciada
82	CONSTRUIR PAINÉIS ESPECÍFICOS PARA AS ÁREAS ASSISTENCIAIS	02/12/2024	Não iniciada
83	Realizar definição operacional dos indicadores	02/12/2024	Não iniciada
84	Elaborar ferramenta de coleta e alimentação dos dados	02/12/2024	Não iniciada

<b>Tema estratégico</b> SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA		<b>Objetivo estratégico</b> PROMOVER EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DO TRABALHO	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD			<b>% de execução</b> <b>3,0%</b>
<b>Objetivo projeto local</b> DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA AO LONGO DE 5 ANOS, COM O OBJETIVO DE EQUALIZAR AS RECEITAS E DESPESAS, CONCENTRANDO-SE NA REVISÃO DOS VALORES DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS FONTES DE RECURSOS E NA IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVAS DE MELHORIA CONTÍNUA DE INOVAÇÃO, PROCESSOS OPERACIONAIS E REDUÇÃO DE DESPÉRCIO DE RECURSOS.			<b>Início programado</b> 01/05/2024
			<b>Término programado</b> 30/06/2028
<b>Gerente</b> CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA		<b>Áreas responsáveis</b> GAD   DAF	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <b>195</b>	<b>Não iniciadas</b> Em atraso 23 No prazo 157 <b>180</b>	<b>Em andamento</b> <b>8</b>	<b>Concluídas</b> <b>7</b>
---------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

Macroatividades			% concluída
Número de tarefa	Nome		
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO		2,0%
52	AÇÕES PARA MELHORIA DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS		4,0%
99	AÇÕES PARA OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		2,0%
192	ENCERRAMENTO DO PROJETO		0,0%

INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Diferença percentual entre receitas contratualizadas e despesas realizadas	Trimestral	1º TRI 2024			Igual, melhor
Varição percentual de despesas realizadas	Trimestral	1º TRI 2024			Menor, melhor
Varição percentual de recursos financeiros da contratualização	Anual	2024	100%		Maior, melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
54	- Identificar cada conte de recurso financeiros atual (junho de 2024) e os valores de totais previsto para o ano	100,0%
56	Plano para melhoria das receitas contratualização	0,0%
57	Plano par melhoria das receitas do PROSUS	0,0%
58	Plano para incremento de recursos de emendas	0,0%
81	Plano para obtenção das novas fontes de recursos identificadas	0,0%
82	Obtenção de recursos de novas fontes	0,0%
102	- identificar com Análise de Pareto (curva ABC) os materiais de consumo do almoxarifado com maior gastos no hospital	100,0%
104	- elaboração de proposta de melhoria de utilização e metas de consumo dos principais itens identificado na curva "A" da Análise de Pareto	0,0%
106	- plano de melhoria na organização e utilização de insumos identificado na curva "A" da Análise de Pareto ref. ao ano de 2024	0,0%
108	- plano de melhoria na organização e utilização de insumos identificado na curva "A" da Análise de Pareto ref. ao ano de 2025	0,0%
110	- plano de melhoria na organização e utilização de insumos identificado na curva "A" da Análise de Pareto ref. ao ano de 2026	0,0%
112	- plano de melhoria na organização e utilização de insumos identificado na curva "A" da Análise	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome	Observações Gerais

## Projeto local

[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Sta
104	- elaboração de proposta de melhoria de utilização e metas de consumo dos principais itens identificado na curva "A" da Análise de Pareto	31/12/2024	Nã
165	- elaboração de proposta de melhoria de utilização e metas de gastos com serviços terceirizados	31/12/2024	Nã
134	- elaboração de proposta de melhoria de utilização e metas de gastos gerais do hospital	31/12/2024	Nã
135	Desenvolvimento e Implementação de estratégias de otimização das despesas com gastos gerais para 2025	01/01/2025	Nã
166	Desenvolvimento e Implementação de Estratégias de otimização das despesas com Serviços Terceirizados para 2025	01/01/2025	Nã
105	Desenvolvimento e Implementação de estratégias de otimização do uso dos insumos para 2025	01/01/2025	Nã
80	Desenvolvimento e implementação de estratégias para inovação das fontes de recursos	08/01/2025	Nã
55	Desenvolvimento e implementação de estratégias para melhoria das principais fontes de recursos existentes	02/09/2024	Nã
78	Estudo para identificar possíveis novas fontes de recursos e como incrementá-las em nossas receitas	01/05/2024	Nã
79	Identificação de novas fontes recursos financeiros e requisitos necessários para obter-lás	01/05/2024	Nã
133	Identificar oportunidade de melhoria e estabelecimento de metas para otimização das despesas com gastos gerais	16/07/2024	Nã
164	Identificar oportunidade de melhoria e estabelecimento de metas para otimização das despesas com Serviços Terceirizados	16/07/2024	Nã
103	Identificar oportunidade de melhoria e estabelecimento de metas para otimização de uso dos insumos	16/07/2024	Nã
4	Início do Projeto	01/05/2024	Nã
82	Obtenção de recursos de novas fontes	08/01/2025	Nã
57	Plano par melhoria das receitas do PROSUS	31/12/2024	Nã
58	Plano para incremento de recursos de emendas	31/12/2024	Nã
56	Plano para melhoria das receitas contratualização	31/12/2024	Nã
81	Plano para obtenção das novas fontes de recursos identificadas	08/01/2025	Nã
8	Ponto de controle dezembro 2024	06/01/2025	Nã
9	Ponto de controle janeiro 2025	31/01/2025	Nã
7	Ponto de controle novembro 2024	29/11/2024	Nã
6	Ponto de controle outubro 2024	31/10/2024	Nã

<b>Tema estratégico</b> DESENVOLVIMENTO DO TRABALADOR		<b>Objetivo estratégico</b> PROMOVER O ENGAJAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES	
<b>Projeto local</b> [HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO H...			<b>% de execução</b> <h1>12,0%</h1>
<b>Objetivo projeto local</b> DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM TEMAS DE INTERESSE DAS UNIDADES LABORAIS.			<b>Início programado</b> 01/05/2024
			<b>Término programado</b> 29/12/2026
<b>Gerente</b> MARIA ELENA AQUINO DUTRA		<b>Áreas responsáveis</b> UDP   NEP   UNIDADES	<b>Período avaliativo</b> janeiro de 2025

<b>Total de Tarefas</b> <h1>157</h1>	<b>Não iniciadas</b> <h1>118</h1> <table border="0"> <tr> <td>Em atraso</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>No prazo</td> <td>104</td> </tr> </table>	Em atraso	14	No prazo	104	<b>Em andamento</b> <h1>4</h1>	<b>Concluídas</b> <h1>35</h1>
Em atraso	14						
No prazo	104						

Macroatividades		
Número de tarefa	Nome	% concluída
72	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA (PEPC) NO HU-UFGD	20,0%
114	DESENVOLVIMENTO NOVA VERSÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA (PEPC) NO HU-UFGD	0,0%
62	DIAGNÓSTICO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES LABORAIS	100,0%
154	ENCERRAMENTO DO PROJETO	0,0%
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	0,0%
58	REVISÃO DO PROGRAMA CRIADO NO PDE 2021-2023	100,0%

Indicadores					
INDICADOR	PERIODICIDADE ANÁLISE	PERÍODO ANÁLISE	PLANEJADO	REALIZADO	POLARIDADE
Percentual de satisfação dos colaboradores com as ações de capacitação realizadas	Semestral	2024	50%		Maior , melhor
Percentual de colaboradores capacitados no HU-UFGD no ano	Anual	2024	50%		Maior , melhor
Média de adesão por ações de capacitação	Semestral	2024	50%		Maior , melhor

Projeto local

[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UFGD

Entregas previstas

Número de tarefa	Nome	% concluída
61	Publicação do programa de educação permanente e continuada em BS	100,0%
71	Relatório situacional das ações de educação permanente e continuada	100,0%
85	Lista de capacitações	100,0%
93	Plano de Desenvolvimento de Competências	0,0%
107	Relatório de execução do PDC	0,0%
113	Publicação da nova versão do Programa	0,0%
127	Lista de capacitações	0,0%
134	Plano de Desenvolvimento de Competências	0,0%
147	Relatório de execução do PDC	0,0%
153	Publicação da versão final do Programa	0,0%

Pontos de atenção na execução das atividades

Nome Observações Gerais

## Projeto local

[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UFGD

## Relação de atividades em atraso

Número de tarefa	Nome	Início	Status Geral
3	GERENCIAMENTO DO PROJETO	29/03/2024	Não iniciada
7	Ponto de controle novembro 2024	29/11/2024	Não iniciada
8	Ponto de controle dezembro 2024	31/12/2024	Não iniciada
9	Ponto de controle janeiro 2025	31/01/2025	Não iniciada
11	Ponto de controle março 2025	29/03/2024	Não iniciada
12	Ponto de controle abril 2025	30/04/2024	Não iniciada
92	Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Competências	04/12/2024	Não iniciada
93	Plano de Desenvolvimento de Competências	24/01/2025	Não iniciada
94	Executar o PDC Anual	02/01/2025	Não iniciada
95	Identificar profissionais habilitados no banco de Instrutoria para realizar as ações de capacitações internas sem ônus levantadas	02/01/2025	Não iniciada
96	Dar suporte as unidades para execução das ações de capacitação interna sem ônus 1º trimestre	02/01/2025	Não iniciada
97	Analisar os projetos básicos de capacitação internas quando demandado pelas unidades laborais do HU	20/01/2025	Não iniciada
98	Monitorar e dar suporte a execução das ações de capacitação interna e externa sem ônus 1º trimestre	02/01/2025	Não iniciada
107	Relatório de execução do PDC	02/01/2025	Não iniciada

Observações referente ao quadrimestre

PROJETO	OBSERVAÇÕES
[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD	Projeto finaliza 2024 ainda com necessidades de ajustes no cronogram do MS Project, visto que ainda constam atividades sem data, além da necessidade de criação dos marcos de entrega, e revisão dos indicadores.
[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD	Projeto finaliza 2024 ainda com necessidades de ajustes dos marcos de entrega, e revisão dos indicadores.
[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBITO DO HU-UFGD	Projeto finaliza 2024 ainda com necessidades de ajustes dos marcos de entrega, e revisão dos indicadores.
[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD	Projeto finaliza 2024 ainda com necessidades de ajustes dos marcos de entrega e cronograma de atividades.
[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD	Projeto finaliza 2024 ainda com necessidades de ajustes dos marcos de entrega e cronograma de atividades.
[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UFGD	Projeto finaliza 2024 ainda com necessidades de ajustes dos marcos de entrega e cronograma de atividades.
[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD	Projeto ainda necessita de ajustes no cronogram do MS Project, visto que ainda constam atividades sem data, além da necessidade de criação dos marcos de entrega e revisão dos indicadores.

Projeto	Número de atividades	Atividades sem data
[HU-UFGD] [P1.01] IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONCOLOGIA NO HU-UFGD	233	
[HU-UFGD] [P1.01] REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HU-UFGD	199	
[HU-UFGD] [P1.02] PROJETO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA NO HU-UFGD	89	74
[HU-UFGD] [P1.03] AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO ÂMBITO DO HU-UFGD	177	
[HU-UFGD] [P2.01] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO HU-UFGD	109	
[HU-UFGD] [P3.01] DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR INDICADORES NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS NO HU-UFGD	139	2
[HU-UFGD] [P4.01] SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HU-UFGD	195	
[HU-UFGD] [P5.01] DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HU-UFGD	157	
<b>Total</b>	<b>1298</b>	<b>76</b>
