



Plano
de Ação
INPI
2018

- 1ª Revisão -

PLANO DE AÇÃO INPI 2018:

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

31 de janeiro de 2019

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1 APRESENTAÇÃO.....	3
2 METAS	4
3 AÇÕES.....	10

1 APRESENTAÇÃO

O presente Relatório divulga os resultados da execução, em 2018, das metas e ações do Plano de Ação do INPI – 1ª Revisão¹. Apresenta os resultados alcançados em relação às metas previstas para 10 indicadores de desempenho finalístico, e detalha a execução das 70 entregas vigentes das 21 ações planejadas.

Por se tratar do relatório de final do planejamento anual, foram considerados os resultados da execução das ações e entregas até o mês de janeiro de 2019. Com relação às metas de eficiência operacional (Tabela 1), os resultados apresentados correspondem ao desempenho em 2018.

Os resultados apresentados demonstram efetiva capacidade de execução do planejamento anual, bem como a melhoria do desempenho operacional em relação ao ano anterior. Dentre os resultados observados, podemos destacar:

- **Todas as metas** previstas para o ano foram superadas; e
- Foram concluídos **90% das entregas** vigentes controláveis pelo INPI.

Nota:

Foram mantidas referências aos extintos MDIC e MP, incorporados ao Ministério da Economia, uma vez que as informações se aplicam a fatos ocorridos em 2018.

¹ A revisão do Plano de Ação 2018 foi publicada em 30/11/2018, após aprovação formal do MDIC. Por determinação do Presidente do INPI, foram acrescentadas duas ações em relação àquelas submetidas ao MDIC em 22/10/2018, a saber: “Elaborar Manual de Desenho Industrial”; e “Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas”.

2 METAS

A Tabela 1 apresenta os resultados alcançados na execução das metas fixadas no Plano de Ação do INPI – 1ª Revisão para as atividades de exame de pedidos de propriedade industrial.

Todas as metas institucionais foram superadas. Além disso, em sua grande maioria, os **resultados de 2018 superaram os resultados alcançados em 2017**, com duas exceções justificáveis: o indicador de instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marca, em virtude do trabalho realizado por força-tarefa de exame de recursos de marcas em 2017, que não se manteve em 2018; e o indicador de decisões de contratos de tecnologia, cuja produção anual varia naturalmente de acordo com a demanda de pedidos recebidos pelo INPI, uma vez que não se trabalha com estoque de pendências nessa área de exame.



Tabela 1: Metas de eficiência operacional em atividades de exame



Indicadores	Meta 2018	Resultado (em 31/12/2018)
Primeiro exame técnico de pedidos de patentes ⁽¹⁾	15.018	16.148
Decisão de exame técnico de pedidos de patentes ⁽¹⁾	13.948	17.264
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca	269.414	366.484
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	9.236	9.924
Taxa de desempenho de decisões emitidas de contratos e faturas averbadas ou registradas	97%	105%
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de patentes	1.888	2.373
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas	23.978	33.075
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de desenho industrial e outros registros	1.730	2.104
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedido de registro de marca	18 meses ⁽²⁾	12 meses ⁽²⁾
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	12 meses	8,3 meses ⁽³⁾



⁽¹⁾ Não considerou o impacto operacional da eventual aprovação de medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em 2018, o que de fato não ocorreu.



⁽²⁾ Este tempo é referente à moda (não à média) do tempo de todos os processos examinados, com e sem oposição. A moda do tempo de exame para processos com oposição é de 13 meses, e para processos sem oposição é de 12 meses.



⁽³⁾ Caso considerados apenas os pedidos depositados em 2018, o tempo médio de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial é de 3,8 meses. A existência residual de processos antigos no *backlog* pode causar uma elevação da variância nos dados relacionados a este indicador, como pode ser observado no gráfico dos resultados mensais (vide pág. 9).

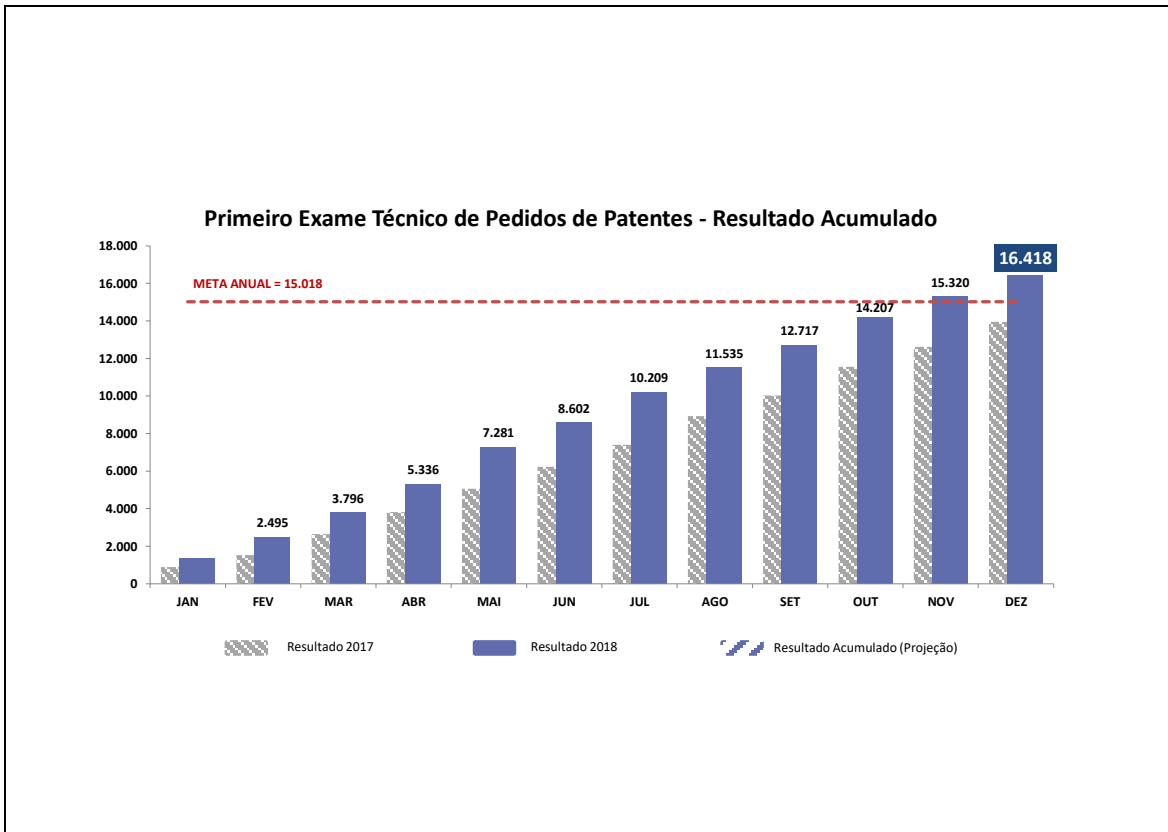

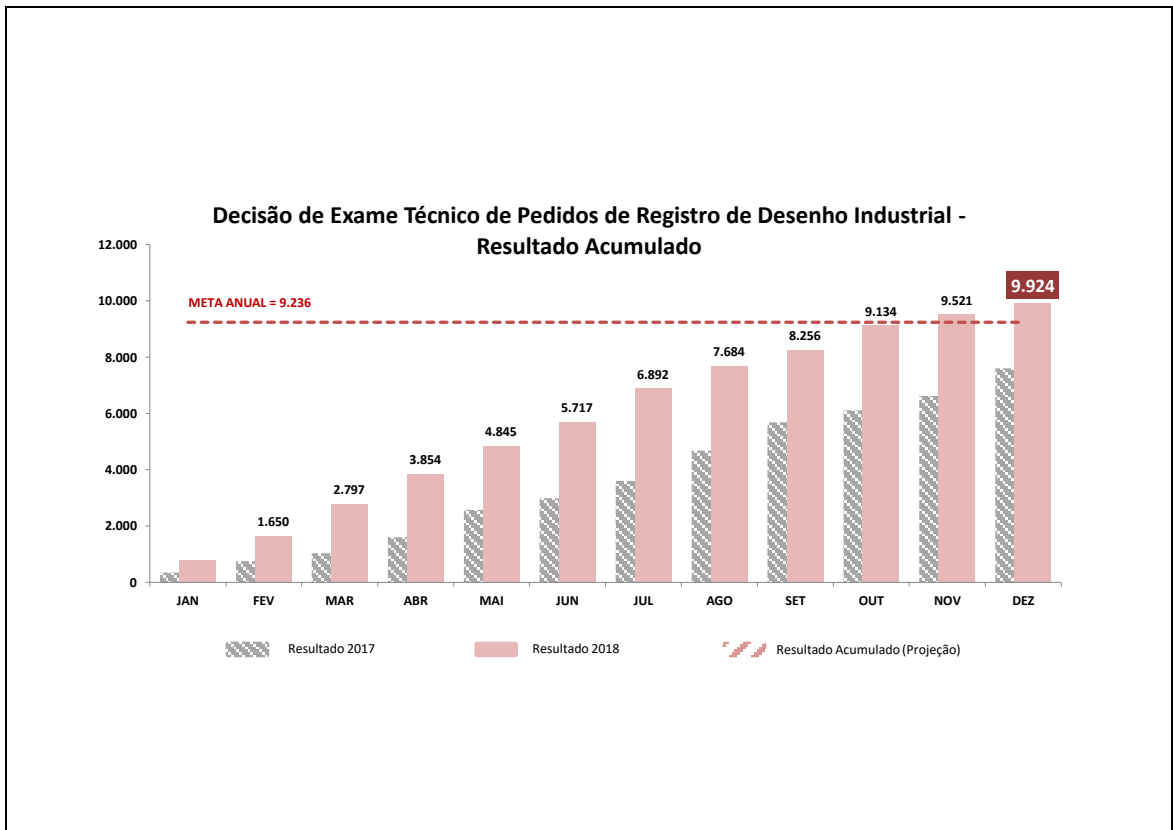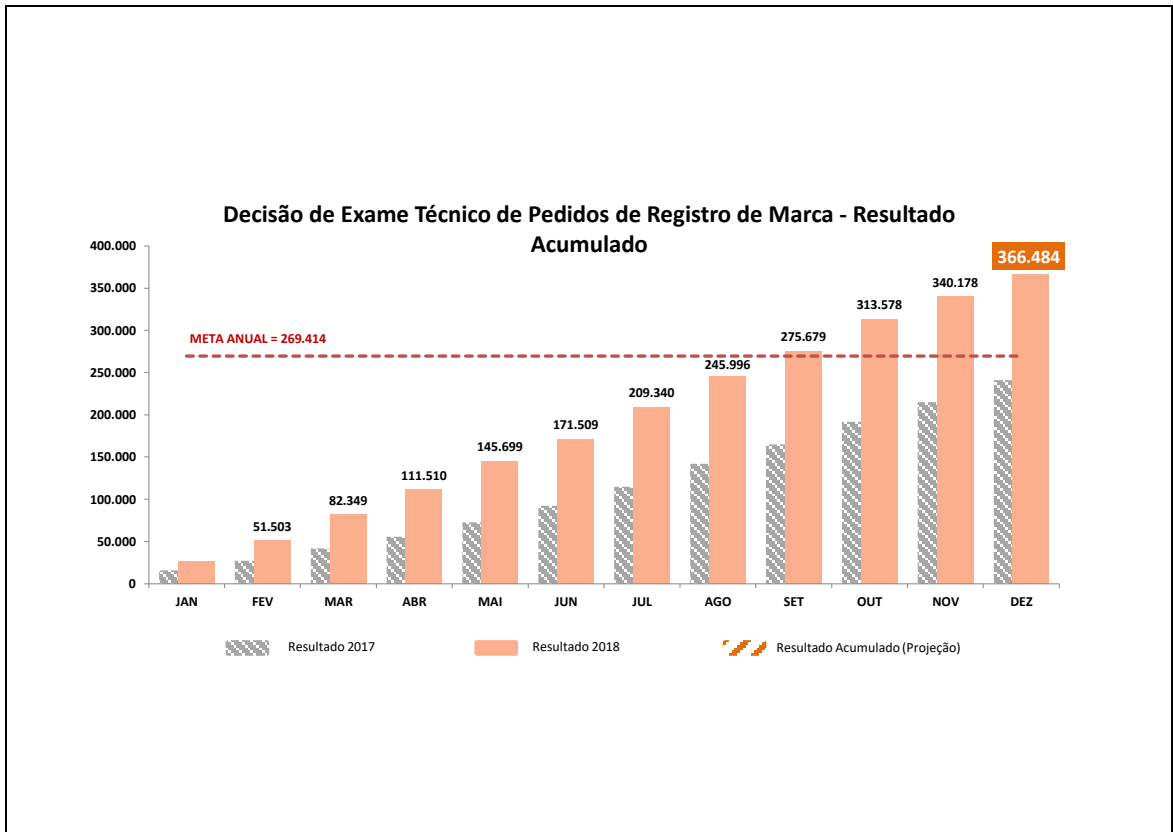

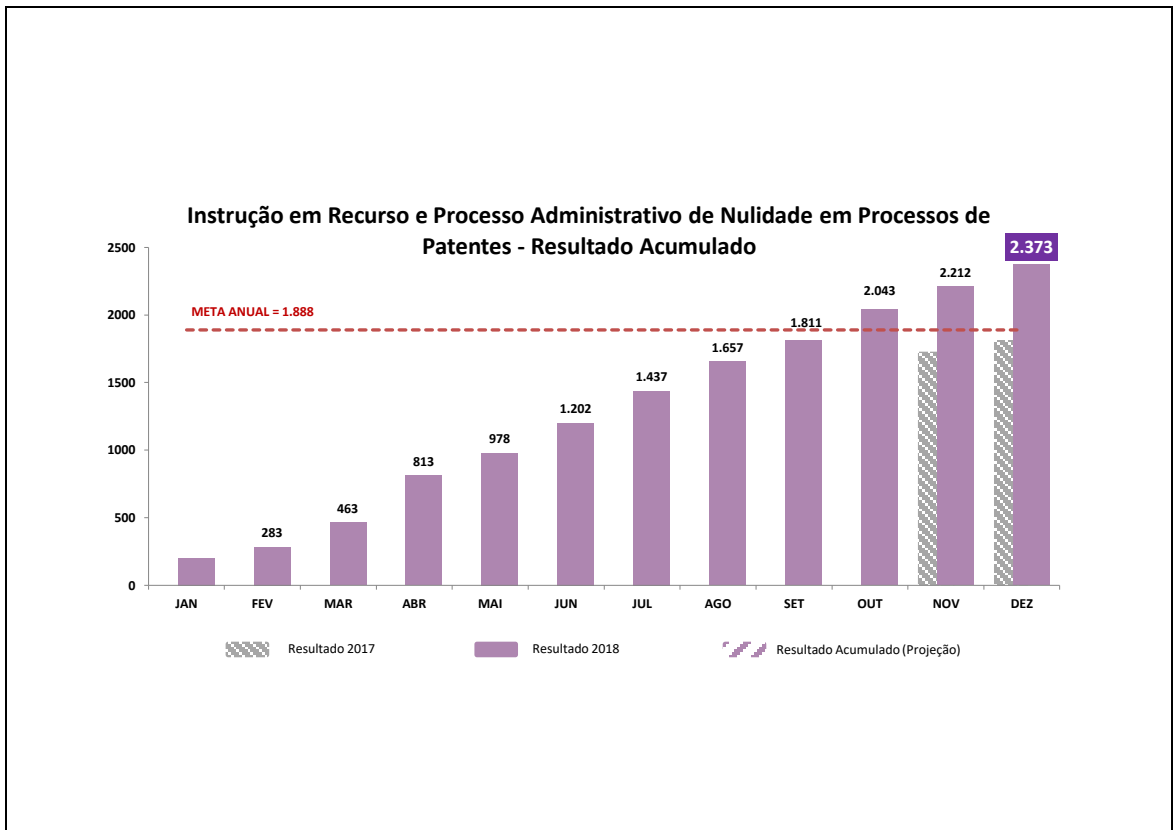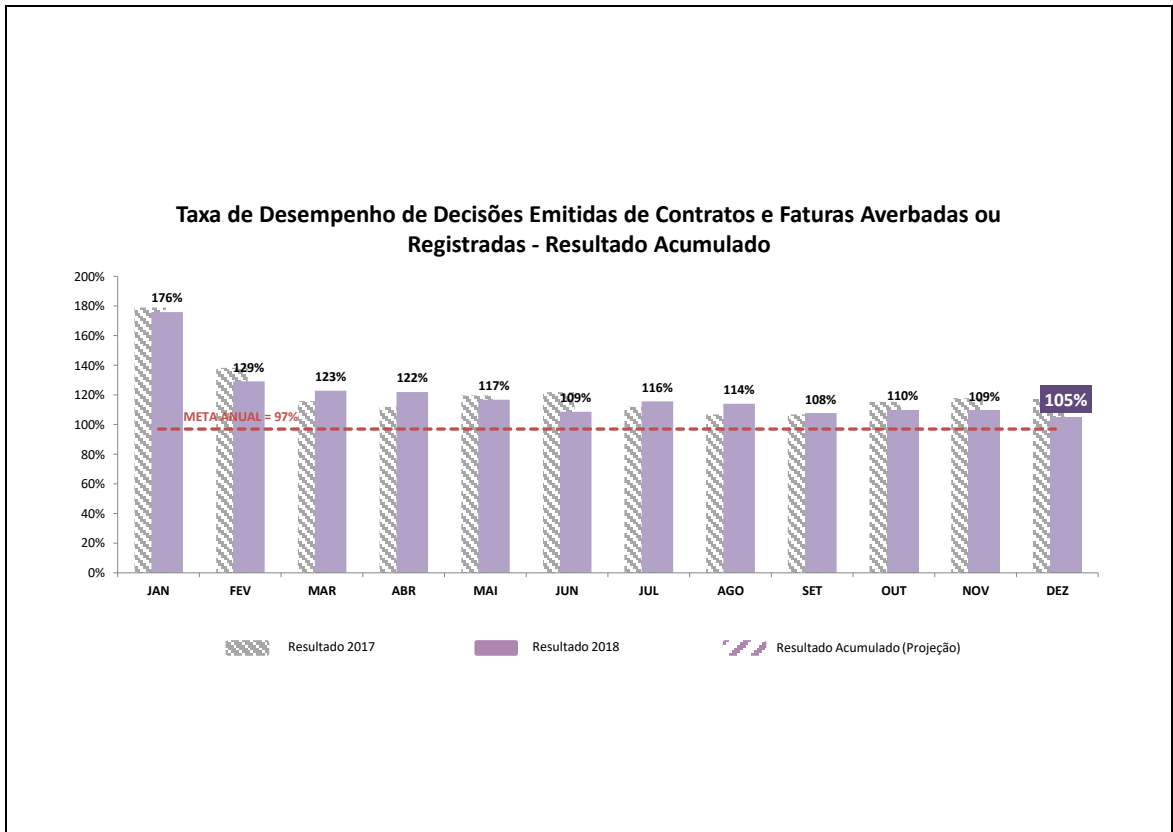

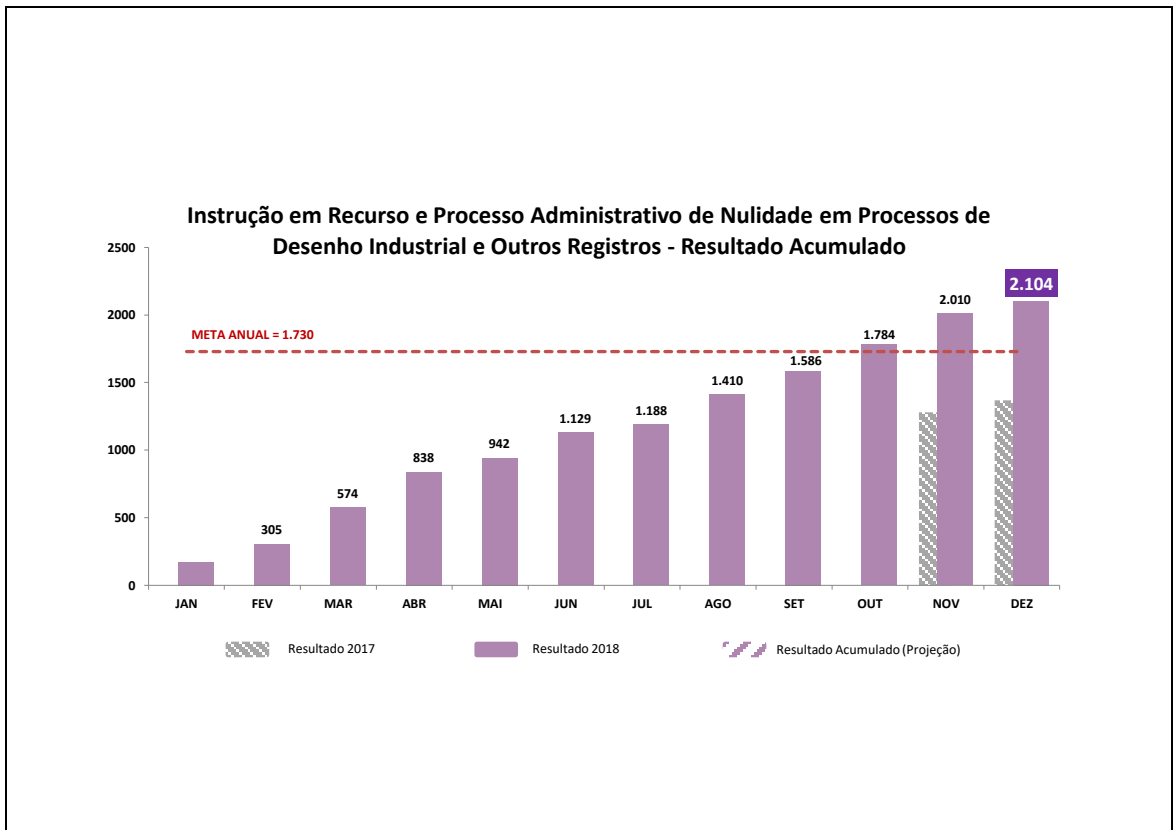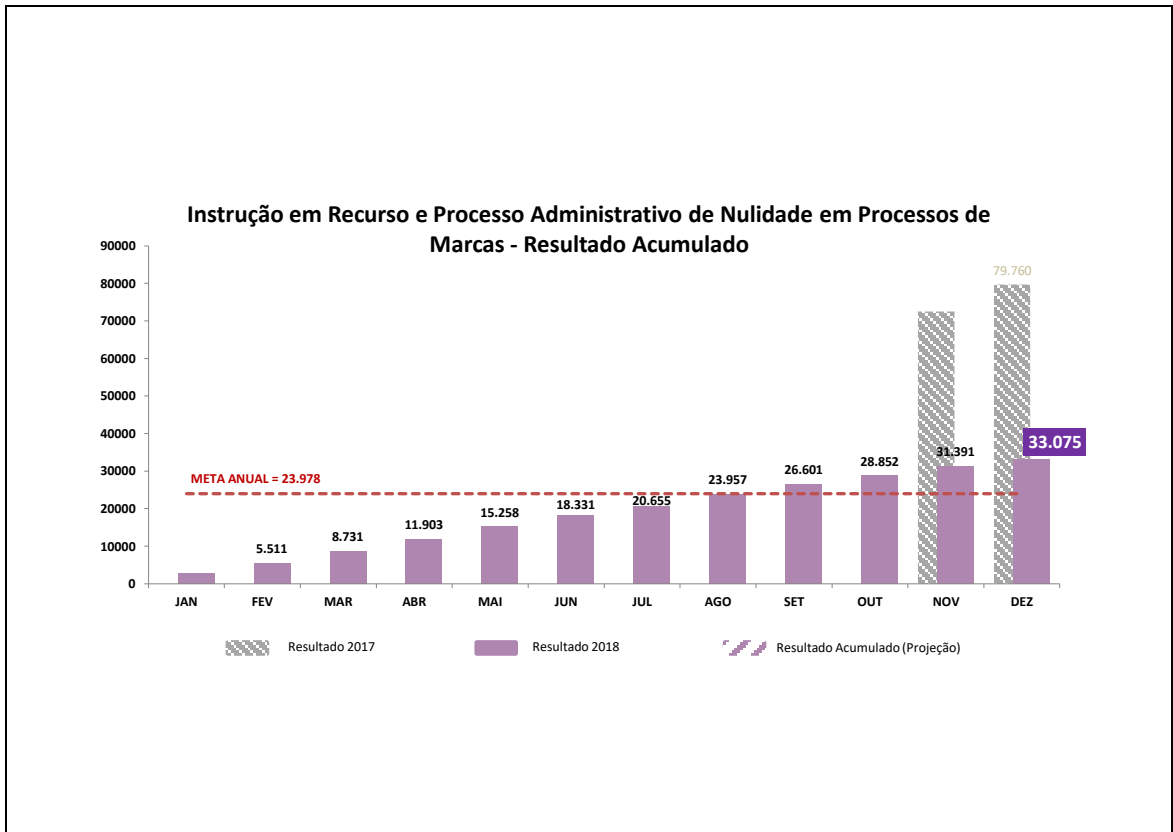

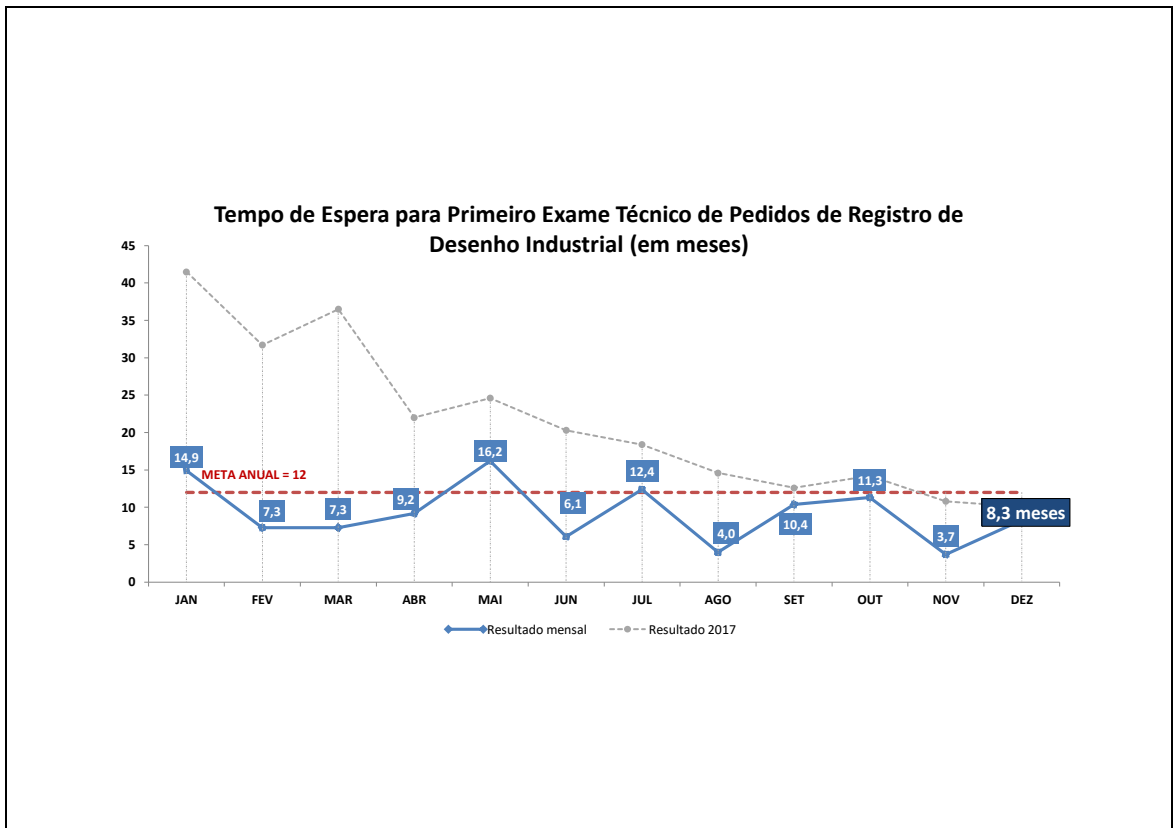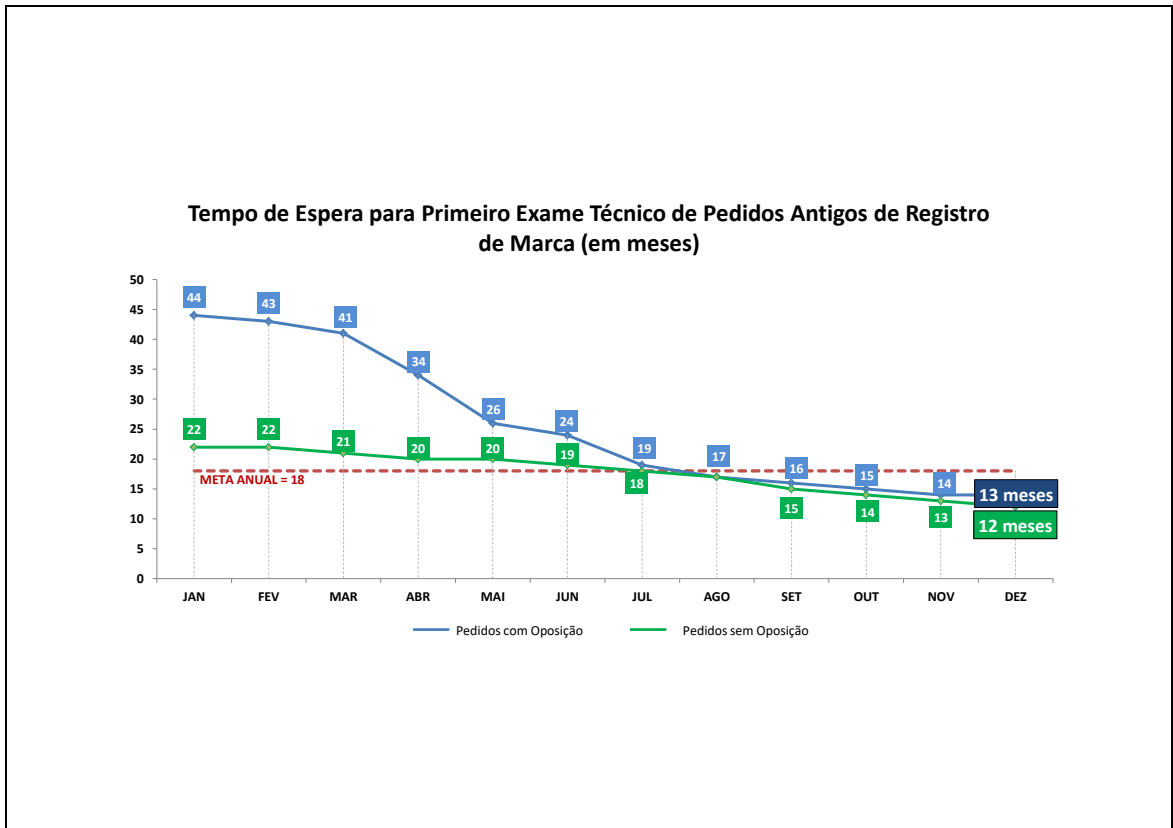

3 AÇÕES


3.1 Visão geral da execução das entregas vigentes

Por se tratar do relatório de final do planejamento anual, foram considerados os resultados da execução das ações e entregas vigentes **até o mês de janeiro de 2019**.

Do total de 80 entregas previstas para as 21 ações, 6 entregas foram suspensas (reprogramadas para 2019) e 5 foram canceladas (descontinuadas em definitivo), resultando em 69 entregas vigentes.

Das 69 entregas vigentes: 47 (68%) foram concluídas e 22 (32%) estão muito atrasadas (> 30 dias). Vale destacar que 17 das 22 entregas muito atrasadas não são controláveis direta ou exclusivamente pelo INPI, dependendo de decisões e encaminhamentos externos.

Figura 1: Evolução mensal da execução das entregas vigentes² – junho/2018 a janeiro/2019

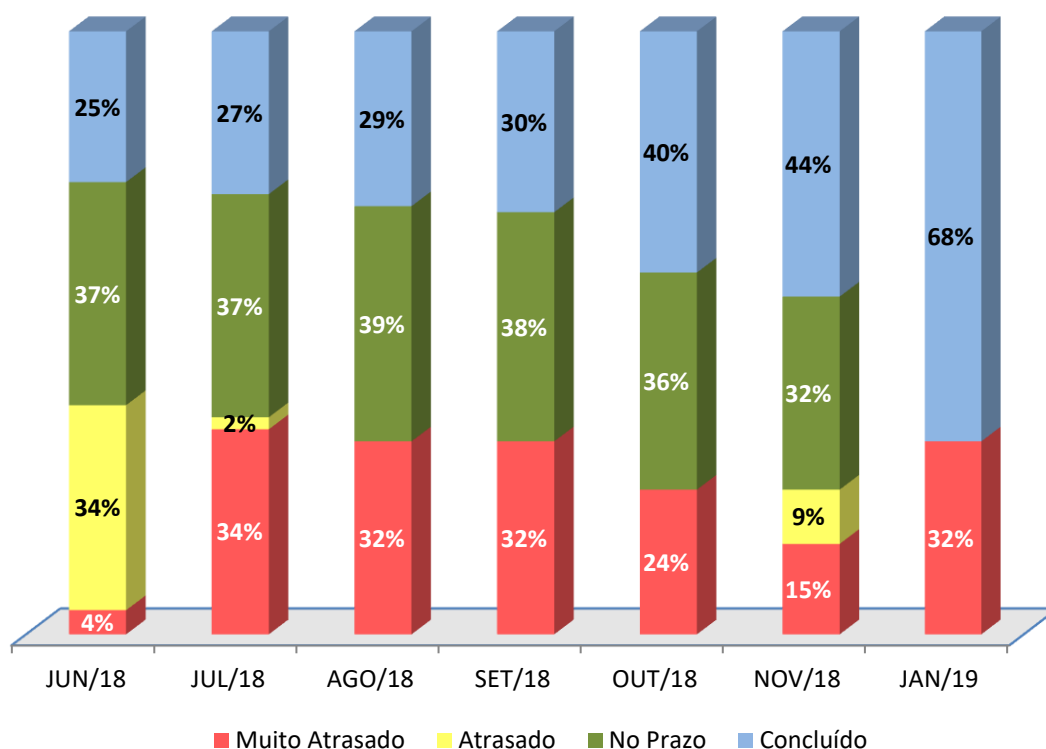

3.2 Execução das entregas vigentes controláveis pelo INPI

Foram **concluídas 90%** (47 de 52) das entregas vigentes controláveis pelo INPI.

² Não considera as entregas suspensas e canceladas.

3.3 Detalhamento do status das entregas planejadas.

AÇÃO 1: Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes e rever marco regulatório administrativo, para redução do backlog de pedidos pendentes de decisão em primeira instância (PD 2018 e ACT MDIC/ABDI/INPI)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Medida legislativa aprovada pela Casa Civil	16/04/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Em análise na Casa Civil a proposta de Medida Provisória de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes. Dependência externa: Casa Civil.
Medida legislativa aprovada pelo Congresso Nacional	31/05/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Não iniciada. Depende de aprovação da medida legislativa pela Casa Civil. Dependência externa: Casa Civil.
Contratações de infraestrutura e digitalização/ saneamento realizadas	30/06/2018	CONCLUÍDO Em 15/10/2018, a ABDI comunicou a assinatura do contrato com a empresa SOS Docs, que realizará os serviços de digitalização e saneamento dos documentos, selecionada por meio do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico ABDI nº 0024/2018 (publicado em 07/08/2018 e pregão realizado em 20/08/2018). Quanto às contratações de infraestrutura, os três primeiros lotes foram entregues em 2018 e atualmente estão em curso os treinamentos em VM (virtual machine) das novas máquinas. Está previsto para fevereiro de 2019 o treinamento dos backups. O quarto (e último) lote foi entregue ao INPI em 08/01/2019: VDIs - infraestrutura de desktops virtuais. A previsão de instalação e de treinamento da equipe da CGTI é até março de 2019. <ul style="list-style-type: none">Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 14/2018 (publicado no DOU em 21/05/2018).
Procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em implementação	31/03/2019	SUSPENSO* Não iniciado. Proposta em análise na Casa Civil. <i>*Entrega reprogramada para 2019.</i>

AÇÃO 2: Implantar programa-piloto de colaboração técnica com instituições científicas e tecnológicas para expansão da capacidade de exame de pedidos de patentes pelo INPI (PD 2018)

ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Protocolo de Intenções assinado com o CNPq	17/09/2018	CONCLUÍDO Protocolo de Intenções assinado em 05/09/2018.
Programa de capacitação aprovado pelo INPI e CNPq	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O INPI apresentou ao CNPq em 25/10/2018 o Piloto do Plano de Capacitação para formação de pesquisadores externos em atividades e opiniões para o exame técnico pelo INPI. Na mesma oportunidade, iniciou-se a confecção do Plano de Trabalho e do Termo de Execução Descentralizada (TED). Após reanálise do Piloto do Plano de Capacitação pelo CNPq, foram realizadas algumas considerações acerca do escopo do projeto. Próxima reunião entre o INPI e o CNPq para redefinição conjunta do escopo e viabilidade da parceria deverá ser realizada em janeiro de 2019. Dependência externa: CNPq.
Instrumento jurídico assinado	28/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Depende da conclusão do Termo de Parceria, do Plano de Trabalho e do Termo de Execução Descentralizada (TED). Dependência externa: CNPq.

AÇÃO 3: Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI (PD 2018)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Plano Executivo do projeto-piloto aprovado pelo Presidente do INPI	31/08/2018	CONCLUÍDO. Plano Executivo do projeto-piloto aprovado pelo Presidente do INPI.
Minutas de atos normativos* encaminhadas à PFE *Sobre procedimento de aproveitamento do resultado das buscas	15/09/2018	CONCLUÍDO Minuta da Resolução sobre aproveitamento do resultado das buscas realizadas em escritórios de patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais enviada à PFE. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.212997/2018-77.
Minutas de atos normativos* encaminhadas à PFE *Sobre dispensa do controle de assiduidade	15/10/2018	CANCELADO Solicitada diretamente a aprovação do MDIC do programa de gestão na modalidade “por tarefa”, por meio do ofício SEI nº 12/2018/PR de 20/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.007018/2018-41. Dependência Externa: MDIC.
Parecer(es) jurídico(s) elaborado(s) pela PFE* *Sobre procedimento de aproveitamento do resultado das buscas	15/10/2018	CONCLUÍDO em 15/10/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.212997/2018-77.
Parecer(es) jurídico(s) elaborado(s) pela PFE* *Sobre dispensa do controle de assiduidade	15/11/2018	CANCELADO Solicitada diretamente a aprovação do MDIC do programa de gestão na modalidade “por tarefa”, por meio do ofício SEI nº 12/2018/PR de 20/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.007018/2018-41. Dependência externa: MDIC.
Atos normativos do INPI publicados	15/11/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Resolução INPI/PR N° 227, publicada em 25/10/2018. Instrução Normativa aguardando a aprovação pelo MDIC do pacote de documentos encaminhado por meio do ofício SEI nº 12/2018/PR de 20/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.007018/2018-41. Dependência externa: MDIC.

Continuação da Ação 3**AÇÃO 3:** Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI (PD 2018)

ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Ato normativo do MDIC publicado	15/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Depende da publicação da portaria de aprovação do programa de gestão pelo MDIC. Dependência externa: MDIC.
Projeto-piloto iniciado	28/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Depende da publicação da portaria de aprovação do programa de gestão pelo MDIC. Dependência externa: MDIC.

AÇÃO 4: Expandir os acordos de *Patent Prosecution Highway* (PPH)

ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Visita realizada (KIPO)	18/09/2018	CONCLUÍDO A visita ao KIPO foi realizada no período de 13 a 18/09/2018.
Reunião realizada (KIPO)	26/09/2018	CONCLUÍDO Reunião bilateral com o KIPO durante a Assembleia Geral da OMPI ocorrida no dia 25/09/2018.
MdE assinado com KIPO	31/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O KIPO (escritório coreano de propriedade intelectual) informou que o MdE de Cooperação Geral será assinado somente junto com o MdE de projeto-piloto de PPH, o que deverá ocorrer somente em 2019. Dependência externa: KIPO.

AÇÃO 5: Implantar o sistema de gestão da qualidade dos processos de exame de propriedade industrial em conformidade com a ISO 9001:2015 (PD 2018)

ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Política da Qualidade do INPI publicada	31/12/2018	CONCLUÍDO * Política da Qualidade do INPI publicada por meio da Instrução Normativa nº 097 de 21/01/2019 no Boletim de Pessoal de 22/01/2019. <i>*Entrega concluída em janeiro/2019.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.008522/2018-68.
Processo de recebimento mapeado e documentado (RO/PCTO)	31/07/2018	CONCLUÍDO Processo do RO/PCT mapeado e documentado. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.000546/2018-77.
Processos de busca e exame de pedido internacional de patente mapeados e documentados (ISA e IPEA/PCT)	31/12/2018	CONCLUÍDO * Mapeamento do processo ISA/PCT finalizado em 12/12/2018. Trabalhos técnicos do mapeamento do processo IPEA/PCT concluídos em 30/01/2019 (evidência do resultado do mapeamento IPEA/PCT será inserido no processo administrativo em 31/01/2019). <i>*Entrega concluída em janeiro/2019.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.000546/2018-79.

AÇÃO 6: Elaborar Manual de Desenho Industrial

ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Minuta de Manual revisada	07/12/2018	CONCLUÍDO Manual revisado. Encaminhado à Presidência em 11/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo nº 52400.224.664/2017 (SINPI 297471).
Manual publicado	28/12/2018	CONCLUÍDO * Manual Publicado por meio da Resolução nº 232/2019 de 07/01/2019 na RPI 2505 de 08/01/2019. Processo nº 52400.224.664/2017 (SINPI 297471). <i>*Entrega concluída em janeiro/2019.</i>

AÇÃO 7: Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Consulta pública encerrada	06/12/2018	CONCLUÍDO Consulta Pública nº 04, de 05/11/2018, encerrada em 06/12/2018. (DOU de 06/11/2018, Seção 1, página 29).
Minuta de Instrução Normativa revisada	10/12/2018	CONCLUÍDO Avaliação das manifestações da consulta pública concluída em 10/12/2018. Instrução Normativa elaborada e enviada à PFE em 11/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo Nº 52402.007434/2018-49.
Minuta revisada de Instrução Normativa analisada pela PFE	14/12/2018	CONCLUÍDO Instrução Normativa elaborada e enviada à PFE em 11/12/2018. Parecer da PFE elaborado em 19/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo nº 52402.007434/2018-49.
Instrução Normativa publicada	21/12/2018	CONCLUÍDO* Instrução Normativa nº 95/2018 publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2504, em 02/01/2019. <p><i>*Entrega concluída em janeiro/2019.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo nº 52402.007434/2018-49.

AÇÃO 8: Elaborar estudos de propriedade industrial para geração de inteligência competitiva (ACT MDIC/ABDI/INPI)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Plano de estudos aprovado pelo Comitê Gestor do ACT MDIC/ABDI/INPI	31/08/2018	CONCLUÍDO Plano de Estudos aprovado na 5ª Reunião do Comitê Gestor do ACT, realizada em 27/11/2018.
Relatórios e estudos elaborados pelo INPI	31/12/2018	CONCLUÍDO Estudos sobre carros híbridos e elétricos e sobre mobilidade em cidades inteligentes elaborados e enviados ao MDIC e à ABDI, por e-mail, pelo Coordenador-Geral da CGPE, em 21/12/2018. Os estudos ainda serão encaminhados formalmente para o Ministério da Economia, por ofício da Presidência do INPI. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.009773/2018-60.

AÇÃO 9: Promover medidas operacionais e administrativas previstas no Projeto de Adesão ao Protocolo de Madri para simplificar o registro internacional de marcas **(PD 2018)**

ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Adesão autorizada pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo)	29/06/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Audiência Pública realizada em 07/08/2018. Questionamentos ABPI respondidos, inclusive em palestra do Diretor da DIRMA na ABPI em agosto. Dependência externa: Congresso Nacional.
Proposta de nova estrutura regimental do INPI apresentada ao MDIC	28/06/2018	CONCLUÍDO Proposta encaminhada ao MDIC por meio do ofício nº 345/2018 INPI de 13/07/2018. Ofício nº 395/2018 INPI enviado a MDIC contendo a documentação complementar.
Solicitação de concurso apresentada ao MDIC	30/04/2018	CONCLUÍDO Solicitação de concurso enviada ao MDIC, por meio do ofício nº 186/2018, de 27/04/2018. Ofício nº 118/2018-SEI-GAB-SE não autorizando a realização de concurso.
Sistema Multiclasse implementado	07/11/2018*	SUSPENSO* Em implementação pequenas melhorias pontuais no sistema Busca Web e no XML para público externo. As modificações requeridas à OMPI no IPAS ainda não foram disponibilizadas, aguardando nova versão do IPAS 3.5.b. Dependência externa: OMPI. <i>*Entrega reprogramada para 2019.</i>
Proposta de nova Tabela de Retribuições do INPI apresentada ao MDIC	31/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Proposta de nova tabela de retribuição elaborada pela DIRAD/CGOF, aguardando avaliação das áreas envolvidas, em especial a DIRMA, diante da adoção iminente do Protocolo de Madrid. <ul style="list-style-type: none">• Processo SEI nº 52400.080336/2017
Decreto Executivo	30/03/2019*	SUSPENSO* <i>*Pelo novo cronograma revisado do PD 2018, a previsão atual é 30/08/2019.</i> Dependência externa: Casa Civil. <i>*Entrega reprogramada para 2019.</i>

AÇÃO 10: Esvaziar e devolver o edifício A Noite		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Manutenção realizada	28/12/2018	<p>SUSPENSO*. Contratos necessários à manutenção mínima do edifício em transferência para o TRF-2ª Região até julho/2019. TR para retirada do gradil pronto, com a autorização do IPHAN. Previsão em final de fevereiro/2019 para início das obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.005471/2018-12. <p><i>* Entrega reprogramada para 2019.</i></p>
Bens e documentos retirados do prédio com destinação adequada	02/01/2019*	<p>SUSPENSO* Toda documentação retirada do edifício. Bens móveis com destinação estabelecida, com retirada dentro de cronograma definido com as instituições receptoras até julho. Contratação de empresa de “colocation” efetuada para remoção dos ativos de TI da Praça Mauá, com previsão de retirada em abril/2019, caso não haja recurso no processo de licitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo 52402.009447/2018-52. • Processo SEI nº 52402.009447/2018-52. • Processo: 52402.005569/2018-70. <p><i>*Entrega reprogramada para 2019.</i></p>
Contrato de cessão revogado	28/12/2018	<p>CONCLUÍDO Termo de Entrega do Edifício “À Noite” firmado entre a SPU e o TRF-2ª Região em 06/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.001145/2018-36

AÇÃO 11: Preparar a destinação do prédio do INPI na Praça da Bandeira		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Avaliação realizada por empresa contratada	28/12/2018	CANCELADO Após estudos, a opção do Instituto será a doação/cessão do imóvel da Praça da Bandeira. Desta forma, não haverá necessidade de contratar a avaliação desse imóvel. <ul style="list-style-type: none"> • Processo nº 52400.127496/2018-97.
Imóvel em posse do INPI	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O INPI notificou o INMETRO para a entrega das chaves e poderá encaminhar a demanda para a câmara de conciliação. Novo prazo para o recebimento formal do imóvel: dia 15/01/2019. Processo nº 52400.146571/2017-37. Dependência externa: INMETRO.
Imóvel transferido para a SPU	31/10/2018	CANCELADO A propriedade do imóvel não será mais transferida para a SPU. Após a avaliação do imóvel, o INPI alienará o bem.

AÇÃO 12: Preparar a alienação dos imóveis funcionais do INPI em Brasília		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Avaliação realizada por empresa contratada	28/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O INPI iniciará planejamento para alienação internamente, uma vez que foi decidida a alienação do imóvel. Tanto a contratação da avaliação quanto a da alienação ocorrerão pela Caixa Econômica Federal. Dependência externa: Caixa Econômica Federal.
Imóvel transferido para a SPU	31/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O INPI irá iniciar planejamento para alienação internamente, uma vez que foi decidida a alienação do imóvel. Tanto a contratação da avaliação quanto a da alienação ocorrerão pela Caixa Econômica Federal. Dependência externa: Caixa Econômica Federal.

AÇÃO 13: Realizar a cessão parcial do prédio da unidade regional do INPI em Brasília para o MDIC		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Laudo de vistoria elaborado	17/08/2018	CONCLUÍDO Laudo de vistoria elaborado. <ul style="list-style-type: none"> • Processo nº 52400.137551/2017-17.
Termo de cessão encaminhado à PFE	31/08/2018	CONCLUÍDO Termo de cessão encaminhado à PFE em setembro/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo nº 52400.137551/2017-17.
Termo de cessão assinado	31/10/2018	CONCLUÍDO O termo de cessão parcial do imóvel foi assinado em 06/11/2018 e publicado no DOU nº 231 em 03/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.008576/2018-23.

AÇÃO 14: Ampliar e melhorar as condições de ocupação do edifício Mayrink Veiga, 9 (MV9)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Bicicletário construído pelo condomínio (10 Vagas)	30/11/2018	CONCLUÍDO Instalado bicicletário na entrada de serviço do edifício MV9 em 26/12/2018.
Sala de vistas da DIRMA em funcionamento	31/08/2018	CONCLUÍDO em 20/08/2018.
13º e 14º locados	30/11/2018	CONCLUÍDO A assinatura do Termo Aditivo para a locação dos 13º e 14º andares foi realizada no dia 14/12/2018. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.005375/2018-74.
5º andar reestruturado	28/12/2018	CONCLUÍDO * Reforma do refeitório concluída. Inauguração será no dia 06/02/2019. <i>*Entrega concluída em janeiro/2019.</i>
Obra iniciada pelo Condomínio (vestiário)	28/12/2018*	SUSPENSO * Houve um reposicionamento do condomínio no sentido de não realizar a construção do vestiário. Dependência externa: Condomínio do edifício MV9. <i>*Entrega reprogramada para 2019.</i>

AÇÃO 15: Alterar a estrutura organizacional do INPI (PD 2018)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MDIC	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Proposta encaminhada ao MDIC por meio do ofício nº 345/2018 INPI de 13/07/2018. Ofício nº 395/2018 enviado a MDIC contendo a documentação complementar. Dependência externa: MDIC.
Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MP	30/11/2018	CANCELADO Incorporação do MDIC e MP pelo novo Ministério da Economia.
Decreto publicado	28/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Após a publicação do Decreto que aprovará a nova estrutura regimental, o INPI terá um prazo de 60 dias para encaminhar ao Ministério da Economia a minuta do novo regimento interno. Dependência externa: Casa Civil.

AÇÃO 16: Reestruturar as unidades regionais do INPI		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Indicadores elaborados e implementados	30/06/2018	CONCLUÍDO 1º Relatório Gerencial Semestral entregue no II Workshop das Regionais, realizado na sede do INPI em 30-31/08/2018.
Mudança da Unidade Regional de MG para o SENAI/DRMG realizada	30/06/2018	CONCLUÍDO Mudança realizada em 25/06/2018.
Contrato de link WAN assinado	31/07/2018	CONCLUÍDO Contrato nº 007/2018 assinado. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.005666/2018-62.
Instruções Normativas substitutas da IN nº 53/16 publicadas	31/10/2018	CONCLUÍDO Publicadas a IN 89 de 01/11/2018 e a IN 90 de 01/11/2018 no Boletim de Pessoal de 06/11/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.000081/2017-75.
Contrato assinado* (exceção SC, SE, PE e MG) *Contrato de manutenção predial.	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Vistoria da equipe de engenharia nas regionais críticas, todas com condições de receber novos servidores, com exceção de São Paulo, com previsão para Julho. <u>Obs.:</u> Após as tentativas infrutíferas de contratação via pregão eletrônico realizadas em 2018, a DIRAD estuda alternativas de contratação individualizada (especialmente para SP) para as localidades em que os acordos de cooperação técnica não abarcam serviços essenciais. O cartão corporativo está em viabilização para utilização como ferramenta de gestão, segundo regras já repassadas às chefias das unidades regionais (Manual CGU). <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.093209/2017.
Lista dos servidores publicada, conforme Edital	15/10/2018	CONCLUÍDO Homologação do resultado de remoção publicada no Boletim de Pessoal de 23/10/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.000081/2017-75.
Mudança da Unidade Regional do RS para o Tecnopuc realizada	31/12/2018	CONCLUÍDO Mudança física realizada em 30/12/2018. Unidade Regional do RS aberta no novo endereço a partir de 02/01/2019. Contrato de locação de imóvel nº 16/2018 com a Tecnopuc assinado em 27/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.007102/2018-64.

Continuação da Ação 16

AÇÃO 16: Reestruturar as unidades regionais do INPI		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Protocolo presencial encerrado	31/12/2018	<p>MUITO ATRASADO (> 30 dias) Solicitado pelo Diretor Executivo em 24/01/19 à Assessoria da Presidência a inclusão da Nota Técnica nº 02 e a manifestação da CGDI nos autos do processo físico 52400.122285/2017-86, a fim de esclarecer questões referentes ao peticionamento exclusivamente eletrônico. Apesar das manifestações técnicas já realizadas, o processo ainda carece de saneamento e maiores esclarecimentos que condicionam o processo decisório.</p> <p><u>Obs.:</u> Na avaliação da CGDI, a decisão de entrada do Rio de Janeiro (sede) no escopo da entrega deveria ser revista e tratada de forma apartada das unidades regionais, como originalmente previsto. Os procedimentos de comunicação ao usuário estão prontos, mas encontram-se suspensos para melhor estudo interno e consulta às unidades, especialmente a CGTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.122285/2017-86.
Contrato assinado* *Contrato de mudança de bens.	23/10/2018	<p>CONCLUÍDO Contrato nº 13/2018 assinado em 04/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.005381/2018-21.

AÇÃO 17: Implantar sistema eletrônico de controle de frequência		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Sistema selecionado	30/10/2018	CONCLUÍDO Realizada pesquisa e selecionado sistema Grifo em outubro/2018.
Sistema instalado	30/11/2018	CONCLUÍDO Sistema Grifo implantado. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.009473/2018-81.
Ato normativo elaborado e publicado	31/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Ato normativo elaborado e avaliado pela PFE. Sistema em teste no mês de janeiro, com previsão de plena utilização em março de 2019. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52402.009473/2018-77.

AÇÃO 18: Elaborar e aprovar a nova tabela de preços		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Produto 1 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (benchmarking internacional)	13/08/2018	CONCLUÍDO MDIC encaminhou ao INPI a versão final do estudo em 28/08/2018. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.080336/2017.
Produto 2 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (relatório de entrevistas)	20/09/2018	CONCLUÍDO Em 08/10/2018, foi realizada videoconferência com a participação do MDIC, ABDI e INPI para apresentação do Produto 2 pela consultora do projeto. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.080336/2017.
Produto 3 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (workshop)	10/10/2018	CONCLUÍDO Em 16/10/2018, foi realizado o Workshop (Produto 3) com representantes dos usuários do sistema de propriedade industrial em São Paulo, com a participação do MDIC, ABDI e INPI (DIRAD). <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.080336/2017.
Produto 4 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (critérios e parâmetros para o reajuste da tabela)	06/11/2018	CONCLUÍDO Relatório do Produto 4 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (critérios e parâmetros para o reajuste da tabela). <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.080336/2017.
Proposta de alteração da tabela encaminhada ao MDIC	28/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Proposta de nova tabela de retribuição elaborada pela DIRAD/CGOF, aguardando avaliação das áreas envolvidas, em especial a DIRMA, diante da adoção iminente do Protocolo de Madrid. <ul style="list-style-type: none"> • Processo SEI nº 52400.080336/2017.

AÇÃO 19: Aperfeiçoar a gestão de processos, por meio da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) (PD2018)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Manual de gerenciamento de processos publicado	29/06/2018	CONCLUÍDO Manual publicado. Portaria/INPI/PR Nº 109, de 27/06/2018.
Processos administrativos em tramitação por meio eletrônico	28/10/2018	CONCLUÍDO A partir do dia 1º de outubro, todos os novos processos administrativos passaram a ser abertos exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme prazo de implantação previsto pelo Decreto nº 8.539, de 08/10/2015. Além disso, a partir do dia 15 de outubro, também todos os memorandos e ofícios do Instituto passaram a ser gerados somente no SEI.

AÇÃO 20: Integrar os serviços do INPI à Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal (PD2018)		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Adesão ao Plano de Integração assinada	31/05/2018	CONCLUÍDO Adesão do INPI realizada em 14/06/2018.
Cadastro de serviços revisado	29/06/2018	CONCLUÍDO Revisão realizada em 11/06/2018. Carta de Serviços revisada e publicada no site do INPI.
Métricas iniciais aferidas	31/07/2018	CONCLUÍDO Métricas aferidas em 25/07/2018. Plano de Configuração enviado ao Ministério do Planejamento em 25/07/2018, por e-mail.
Serviços projetados e automatizados	28/09/2018	CONCLUÍDO Plano de Configuração enviado ao Ministério do Planejamento em 25/07/2018, por e-mail.

AÇÃO 21: Reestruturar a carreira de Propriedade Industrial		
ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
Grupo de trabalho constituído	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Em face da transição de governo, não foi possível obter agenda para discussão do assunto com o MP. Dependência externa: Ministério do Planejamento.
Propostas aprovadas no grupo de trabalho	28/11/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Depende da constituição do Grupo de Trabalho. Dependência externa: Ministério do Planejamento.
Proposta de alteração legal encaminhada para o MP	31/12/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Depende da constituição do Grupo de Trabalho. Dependência externa: Ministério do Planejamento.
