



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MJSP

PDTIC 2021-2023

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Flávio Dino de Castro e Costa

Secretário-Executivo

Ricardo Garcia Cappelli

Secretário-Executivo Adjunto

Diego Galdino de Araujo

Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação - Substituto

Ney Rego Barros Junior

Equipe Técnica de Elaboração do PDTIC (Portaria nº 1.162, de 8 de setembro de 2020)

Equipe Técnica de Revisão e Monitoramento (Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 19, de 22 de junho de 2023 e atualizações)

Grupo de Trabalho

Almerindo Motta Andersen Trindade

Ana Lourdes Reis Brod

André Ricardo de Oliveira Monteiro

Bárbara Silveira Matsuura

Bruno Crescenti de Paiva

Carlos Renato Xavier de Resende

Daniele Correa Cardoso

Deivid dos Santos Feitosa

Dérik Reis do Nascimento

Edimar Dantas Nobrega

Fabiana Vieira de Queiroz

Fábio Vilela de Albuquerque

Flávio Soares da Silva

Francisco Ferreira

Helena Melo Moura

Iggo de Paulo Ferreira e Silva

Igor Sant Ana da Silva

Juliana Amorim Zacariotto

Lany Cristina Silva Brito

Leandro Campos Souza

Leonardo Ayodele Cardoso Santos Costa

Leozílio Ferreira França

Lucas Alexsandro Rodrigues Pinheiro

Márcio de Freitas Mozini

Marcos Adriano Rocha de Oliveira

Maria Cristina Leite

Maria Luiza Bueno Benevides



Muller Luiz Borges
Paulo Gustavo Iansen de Sant'Ana
Ricardo Haacke Suppion
Roberta Oliveira Gomes Almeida
Rodrigo Cesar de Melo
Ronaldo Alves Nogueira
Yasmim de Sousa Galeno

Colaboradores

Alex de Oliveira Meireles
Elvis Lopes Monteiro
Fábio Vilela de Albuquerque
Marcelo Villares Coelho
Saimon Cláudio Sterf Pires
Samantha Almeida Gomes
Sheila Maria Aguiar de Araújo

Aprovadores

Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação – CGDSIC
Comitê de Governança Estratégica – CGE

Reunião de aprovação no CGDSIC: 11 de outubro de 2023

HISTÓRICO DE VERSÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
26/11/2020	1.0	Elaboração do PDTIC do MJSP	DTIC
12/02/2021	1.1	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 44ª reunião do CTIC e inclusão dos anexos	CPN
14/06/2021	1.2	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 45ª reunião do CTIC, atualizações: GT de revisão, plano de metas e ações, plano orçamentário, plano de gestão de riscos, plano de gestão de pessoas, resultado do PDTIC anterior, anexos e revisão textual	CPN
16/06/2021	1.3	Ajustes no documento	CPN
17/06/2021	1.4	Validação do documento	DTIC
17/06/2021	1.5	Validação do documento	DTIC
21/06/2021	1.6	Ajustes no documento	CPN
28/06/2021	1.7	Ajustes baseados nas considerações da AECI	CPN
17/09/2021	1.8	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 47ª reunião do CTIC e atualizações: GT de revisão e plano de metas e ações	CPN
17/11/2021	1.9	Revisão do documento	CGGOV
26/11/2021	2.0	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 48ª reunião do CTIC e atualização do plano de metas e ações	CPN
14/01/2022	2.1	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 49ª reunião do CTIC e atualização do plano de metas e ações	CPN
25/03/2022	2.2	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 1ª reunião do CGDSIC e atualização do plano de metas e ações	CPN
14/04/2022	2.3	Atualização das Necessidades de TIC	CPN
30/05/2022	2.4	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 2ª reunião do CGDSIC e atualização do plano de metas e ações	CPN
08/06/2022	2.5	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 1ª reunião extraordinária do CGDSIC e atualização do plano de metas e ações	CPN
21/06/2022	2.6	Revisão estrutural e textual, adequação às conformidades e atualizações: das Necessidades e do seu respectivo Inventário de TIC e do plano de metas e ações inseridas na 1ª reunião extraordinária do CGDSIC	CPN
17/11/2022	2.7	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 4ª reunião do CGDSIC, atualizações: Plano de Metas e Ações, Plano Orçamentário, Plano de Gestão de Pessoas, Nova Sistemática de Priorização, Anexos e revisão textual	CPN



22/06/2023	2.8	Atualização das Necessidades de TIC	DPN
21/09/2023	2.9	Revisão estrutural e textual, adequação às conformidades e atualizações: das Necessidades e do seu respectivo Inventário de TIC e do plano de metas e ações inseridas na 7ª reunião ordinária do CGDSIC	DEP
11/10/2023	3.0	Atualização das Necessidades de TIC inseridas na 2ª reunião extraordinária do CGDSIC e atualização do plano de metas e ações	DEP

SUMÁRIO

ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS	9
1. APRESENTAÇÃO	10
2. INTRODUÇÃO	11
1.1. OBJETIVO.....	12
1.2. ABRANGÊNCIA	12
1.3. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO.....	14
1.4. PERÍODO DE VIGÊNCIA E REVISÃO	14
3. METODOLOGIA	17
4. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC.....	20
4.1 ATRIBUIÇÕES DA STI.....	20
4.2 OUTRAS ATRIBUIÇÕES QUE ENVOLVE A STI	20
4.2.1 CGDI	20
4.2.2 CGDSIC	22
4.3 ORGANOGRAMA	25
Organograma Geral	26
5. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR	29
6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO	36
7. SISTEMÁTICA DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE TIC	38
1.1 Objetivo	38
1.2 Por que priorizar?	38
1.3 Priorização das Necessidades de TIC	39
1.4 Planejamento atendimento das necessidades de TIC (Plano de Metas e Ações).....	42
1.5 Execução das ações de TIC.....	43
8. PLANO DE METAS E AÇÕES	47
9. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	48
9.1 EFETIVO ATUAL	48
9.2 ATRIBUIÇÕES E NECESSIDADES DE PESSOAL	49
9.3 PROCESSOS CRÍTICOS COM CARÊNCIA DE SERVIDORES.....	51
9.4 ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DISPONÍVEL DA TIC	52
9.5 AÇÕES DE PESSOAL EM ANDAMENTO	53
9.5.1 Mestrado Profissionalizante.....	53
9.5.2 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados	53
9.5.3 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados	53



9.5.4 Plano de Transformação Digital	54
10. PLANO ORÇAMENTÁRIO	55
11. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	56
11.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS.....	56
11.2 ANÁLISE DOS RISCOS	57
11.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS RISCOS	58
12. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	63
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
14. REFERÊNCIAS E NORMATIVOS	66
ANEXOS	70
I. NECESSIDADES DE TIC.....	70
II. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC	73
III. PLANO DE METAS E AÇÕES.....	122

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Fluxo de Revisão do PDTIC.....	16
Figura 2: Fases de elaboração do PDTIC.....	17
Figura 3: Fluxo de Elaboração do PDTIC.....	19
Figura 4: Estrutura Organizacional do MJSP.....	26
Figura 5: Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva.....	27
Figura 6: Estrutura Organizacional da STI.....	28
Figura 7: Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade.....	30
Figura 8: Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade.....	31
Figura 9: Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade.....	32
Figura 10: Necessidades de TIC do PDTIC anterior Concluídas por Áreas.....	33
Figura 11: Necessidades de TIC do PDTIC anterior Canceladas por Áreas.....	34
Figura 12: Necessidades de TIC do PDTIC anterior Aguardando Atendimento.....	35
Figura 13: Elementos do Referencial Estratégico Delineado.....	37
Figura 14: Painel Execução por Ação.....	55
Figura 15: Painel por Priorização.....	71
Figura 16: Painel por Status da Necessidade.....	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Efetivo de Servidores da STI.....	48
Tabela 2: Perfis dos Servidores para execução do Plano de Transformação Digital.....	54
Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.....	57
Tabela 4: Escala para Classificação de Níveis de Risco.....	58
Tabela 5: Respostas aos Riscos.....	59
Tabela 6: Plano de Gestão de Riscos.....	62
Tabela 7: Inventário de Necessidades de TIC.....	122
Tabela 8: Plano de Metas e Ações das Necessidades de TIC.....	161

ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS

APF	Administração Pública Federal
CGD	Comitê de Governança Digital
CGDI	Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação
CGE	Comitê de Governança Estratégica
CGGOV	Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
CGDSIC	Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação
CGSID	Coordenação-Geral de Sistemas e Informação de Dados
CGISE	Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços
CGISP	Coordenação-Geral de Planejamento, Inovação e Integração de TIC para Segurança Pública
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technolog</i>
DPN	Divisão de Portfólio e Normativos
CTIC	Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
STI	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGD	Estratégia de Governança Digital
GM	Gabinete do Ministro
GSI	Gabinete de Segurança Institucional
IN	Instrução Normativa
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
ME	Ministério da Economia
MJSP	Ministério da Justiça e Segurança Pública
OETIC	Objetivo Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PAC	Plano Anual de Contratações
PDA	Plano de Dados Abertos
PDP	Plano de Desenvolvimento Pessoal
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PETIC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PMBOK	<i>Project Management Body of Knowledge</i>
POSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação
PTD	Plano de Transformação Digital
PR	Presidência da República
SE	Secretaria-Executiva
SEME	Secretaria Especial de Modernização do Estado
SGD	Secretaria de Governo Digital
SG-PR	Secretaria-Geral da Presidência da República
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SUSP	Sistema Único de Segurança Pública
TCU	Tribunal de Contas da União
TED	Termo de Execução Descentralizada
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

1. APRESENTAÇÃO

Entende-se que Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP representa um instrumento de gestão que permite nortear e acompanhar a atuação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI, da Secretaria Executiva - SE, definindo as estratégias e o Plano de Metas e Ações para implementá-las.

O PDTIC do MJSP compõe-se, de forma resumida, por princípios, diretrizes e resultados do PDTIC 2017-2020, além de evidenciar o referencial estratégico de TIC, Inventários das Necessidades, critérios de priorização, planos de metas e ações, de gestão de pessoas, orçamentário, de gestão de riscos e do monitoramento e avaliação do plano.

Este plano abrange as Necessidades de TIC de todas as áreas do MJSP, tendo em vista as especificidades e diferenças de maturidade e complexidade dentre elas.

O conteúdo deste PDTIC está organizado nas seguintes seções:

- Seção 1 – Apresentação;
- Seção 2 – Introdução;
- Seção 3 – Metodologia;
- Seção 4 – Organização da Área de TIC;
- Seção 5 – Resultado do PDTIC Anterior;
- Seção 6 – Referencial Estratégico;
- Seção 7 – Sistemática de Priorização das Necessidades de TIC;
- Seção 8 – Plano de Metas e Ações;
- Seção 9 – Plano de Gestão de Pessoas;
- Seção 10 – Plano Orçamentário;
- Seção 11 – Plano de Gestão de Riscos;
- Seção 12 – Monitoramento e Avaliação;
- Seção 13 – Considerações Finais;
- Seção 14 – Glossário e Conceitos; e
- Seção 15 – Referências e Normativos.

2. INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados o objetivo, o conteúdo, a abrangência e o período de vigência do PDTIC do MJSP, alinhado com a mais recente revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2021-2023, que consequentemente, está alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI do órgão.

A Instrução Normativa – IN SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, Art. 2º, Inciso XXV, define o PDTIC como: “um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.” Assim sendo, o PDTIC é um instrumento orientador e balizador das contratações de TIC do Ministério.

Conforme preconizado pelo Guia de PDTIC do SISP, alguns dos principais componentes que compreendem o referencial estratégico do PETIC são partes integrantes deste PDTIC. Desse modo, não só o governo federal como ainda os órgãos de controle têm demonstrado e cobrado sobre a relevância de que as áreas de TIC mantenham-se estruturadas e organizadas. Assim, de forma a aderir aos modernos modelos de gestão e governança em específico, o Tribunal de Contas da União – TCU destacou, por meio do Acórdão nº 1.603, de 13 de agosto de 2008, as seguintes recomendações, quais sejam:

O alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organizacionais é um fator fundamental para que a estratégia delineada no planejamento possa ser implementada. Assim, o planejamento estratégico de TI tem que estar alinhado com os planos de negócio da organização para o estabelecimento das prioridades e das ações a serem realizadas na área de TI.

Deve-se destacar, mais uma vez, a importância do planejamento estratégico institucional para a governança de TI. Para que o planejamento estratégico de TI seja efetivo e proporcione os resultados esperados, ele deve estar alinhado ao planejamento estratégico institucional. A falta deste impede o alinhamento desejado e ainda dificulta o estabelecimento de diretrizes para a área de TI.

O planejamento estratégico de TI deve indicar os projetos e serviços de TI que receberão recursos, os custos, as fontes de recursos e as metas a serem alcançadas. Deve ser uma atividade regular e os documentos resultantes devem ser aprovados pela alta administração. (...)

Ressalta-se, pois, que segundo a IN nº 04/2014, no Art. 4º, ainda corrobora com tal adequação:

“As contratações de que trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.”



Em vista disso, a necessidade de contratação deve inevitavelmente considerar as Necessidades de TIC, bem como os Objetivos Estratégicos de TIC (OETICs) relacionadas ao PDTIC. Afinal, este documento trata do esforço em conjunto no que tange o aperfeiçoamento contínuo do modelo de gestão e governança propriamente dito, como ainda da efetiva melhoria dos serviços prestados, seja em relação aos órgãos de controle e às diretrizes do governo federal.

1.1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar o PDTIC do MJSP e suas respectivas revisões durante a vigência estabelecida, possibilitando justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle e aplicar os recursos naquilo que é considerado mais relevante. Por fim, melhorar a qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade como um todo. É um plano estabelecido em um nível tático.

Enquanto o PETIC fornece o referencial estratégico, o PDTIC subsidia os elementos táticos, os caminhos a serem traçados, para a realização da missão e o alcance de visão de futuro da TIC do MJSP. Tais ações têm por intuito contribuir para o atingimento dos objetivos estratégicos e das respectivas metas. Neste sentido, o maior desafio é garantir que o PETIC esteja alinhado ao PEI do MJSP.

1.2. ABRANGÊNCIA

A seguir, apresentam-se as Unidades do MJSP abrangidas por este PDTIC:

- Assessoria de Participação Social e Diversidade – ASPAD;
- Assessoria Especial de Controle Interno – AECl;
- Assessoria Especial Internacional – ASINT;
- Consultoria Jurídica – CONJUR;
- Corregedoria-Geral – COGER;

- Gabinete do Ministro – GM;
- Ouvidoria-Geral – OUV;
- Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI;
- Secretaria de Acesso à Justiça – SAJU;
- Subsecretaria de Administração – SAA;
- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO;
- Secretaria-Executiva – SE;
- Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos – SAL;
- Secretaria Nacional de Justiça – SENAJUS;
- Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD;
- Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN;
- Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP; e
- Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON.

Destaque-se que a Polícia Federal – PF, a Polícia Rodoviária Federal – PRF e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE possuem Unidades de TIC internas e elaboram PDTIC próprios.

Além do planejamento de todas as contratações e aquisições de TIC necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais, do MJSP, este documento apresenta as seguintes características:

- Diagnóstico da execução do PDTIC anterior;
- Consolidação das Necessidades e do seu respectivo Inventário levantadas para o triênio 2020-2023; e
- Nova Sistemática de Priorização;
- Proposição do Plano de Metas e Ações a serem executadas para o seu atendimento; e
- Revisão, alterações e atualizações de âmbito geral no que se refere aos contextos estruturais, textuais e conformidades.

1.3. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO

O PDTIC 2021-2023 deve ser avaliado e deliberado pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação – CGDSIC do MJSP, em conformidade com a Portaria nº 2/2022, que, além de instituir o Sistema de Governança do MJSP define, assim, o CGE. Por conseguinte, pela Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 289/2022, a qual designa seus representantes e estabelece a STI para presidi-lo, bem como para exercer o papel de Gestor de Segurança da Informação e Comunicação.

Com a finalidade de poder dar publicidade e transparência, o documento é divulgado na área de acesso à informação de governança do sítio eletrônico do MJSP (<https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/pdtic/pdtic-2021-2023>).

1.4. PERÍODO DE VIGÊNCIA E REVISÃO

O PDTIC compreende o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, dispõe de um horizonte de 3 anos.

As revisões serão realizadas pelo menos uma vez por ano ou a qualquer momento quando forem necessárias para manter a TIC sempre alinhada com as necessidades das áreas do Ministério.

Atualizações atemporais (revisões extraordinárias) podem ocorrer diante de mudanças nas referências estratégicas utilizadas – incluindo-se as alterações tanto no PETIC como no PEI –, ou, ainda, de modo a permitir às Unidades do MJSP o replanejamento de suas necessidades de TIC não somente em relação à revisão das solicitações, como também diante da possibilidade de inserir novas Necessidades que porventura possam vir a surgir após a elaboração do PDTIC.

Por ocasião de tais revisões, poderão ser submetidas ao CGDSIC eventuais propostas de inclusão de novas Necessidades de TIC ou de outras alterações, cujas reuniões ocorrem, ordinariamente, a cada dois meses. Extraordinariamente, tais propostas poderão ser



submetidas ao referido comitê em datas distintas daquelas previstas para as revisões do PDTIC, mediante solicitação formal à STI. Assim, tal justificativa deverá ser aprovada pela autoridade máxima da unidade membro do CGDSIC interessada, de modo a detalhar os motivos pelos quais não foi possível prever, total ou parcialmente, tal necessidade quando da elaboração ou da última revisão do PDTIC.

Em caso de urgência, a aprovação da inclusão de novas Necessidades de TIC, no PDTIC, poderá ser suprida por autorização do CGE ou do Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública.

Por conseguinte, foi criado o Grupo de Trabalho – GT com o objetivo de revisar o PDTIC para o período de 2021-2023, por meio da Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021, e respectivas atualizações: Portarias nº 153 e 226 de 1º e 24 de março de 2021; Portaria nº 954 de 10 de setembro de 2021; Portaria nº 1.383 de 19 de novembro de 2021; Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP Nº 2, de 28 de março de 2022; Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP Nº 19, de 22 DE junho de 2023.

Para este GT, cada Unidade do MJSP indicou um integrante titular e substituto com a função de obter, consolidar e validar, junto as suas instâncias decisórias, as informações indispensáveis à revisão do PDTIC. A título de exemplificação, tais informações compreendem-se em: Necessidades de TIC levantadas, riscos identificados, planos orçamentário e de pessoal e capacitação, metas estabelecidas, ações formuladas, objetivos definidos, critérios de priorização acordados, dentre outros.

Diante do exposto, sob a coordenação do representante titular da STI, o referido GT executou as atividades em consonância com o fluxo de revisão, qual seja:

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a elaboração do PDTIC 2021-2023 do MJSP baseou-se no modelo proposto pelo Guia de PDTIC do SISP versão 2.0, de 2016, adaptado às condições do ambiente organizacional do Ministério, bem como nas orientações dos órgãos de controle quanto à observância e recomendações das boas práticas referentes à Gestão e Governança de TIC.

Seguindo as recomendações do Guia do SISP, o processo de elaboração do PDTIC foi dividido em 3 (três) Fases:

- Preparação;
- Diagnóstico; e
- Planejamento.

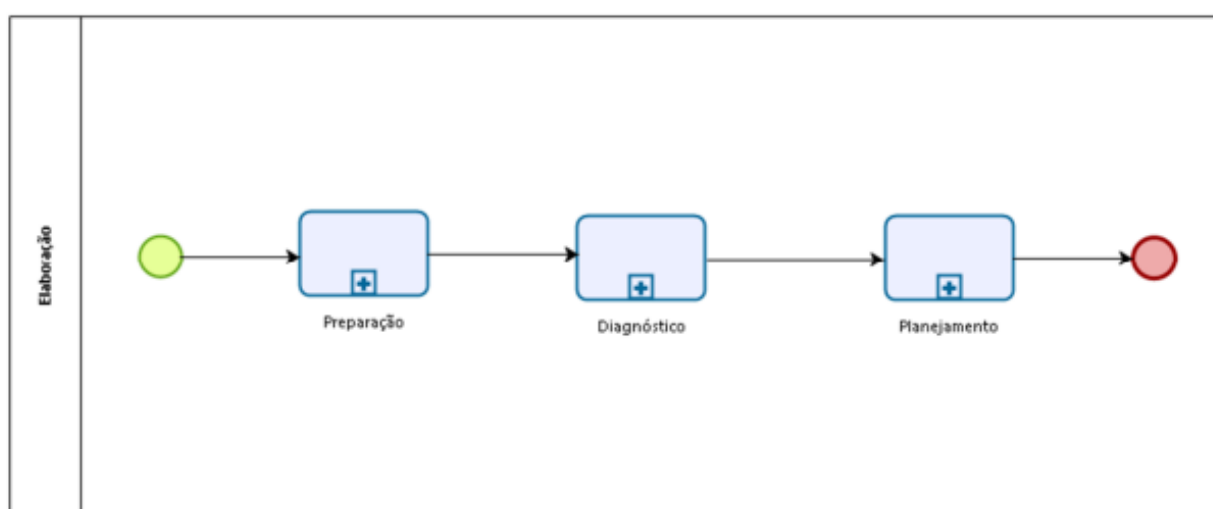


Figura 2: Fases de elaboração do PDTIC

Na Fase Preparação: foi institucionalizada no âmbito do MJSP uma equipe de Elaboração do PDTIC, com a formação de um Grupo de Trabalho – GT, por meio da Portaria SE nº 1.162, de 8 de setembro de 2020. Foram indicados um integrante titular e um substituto para cada Unidade integrante do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação - CGDSIC, que atuaram como pontos focais para o levantamento das Necessidades de TIC, nas áreas de negócio de suas respectivas Unidades Organizacionais.



Nesta fase, foram realizadas reuniões com os pontos focais para esclarecer sobre a necessidade de envolvimento de todos no processo de elaboração do PDTIC e orientar quanto à coleta das Necessidades de TIC.

Também foram definidas a abrangência e o período do PDTIC, identificados os documentos de referência e estabelecidos os critérios de priorização, bem como os de desempate, devidamente aprovados pelo GT.

A Fase Diagnóstico: objetivou a compreensão da situação atual da TIC, no Ministério, por meio da análise das ações previstas no PDTIC anterior e da identificação das Necessidades de TIC.

Após o levantamento de tais Necessidades e sua consolidação, conforme o tipo, foi elaborado um Inventário das Necessidades de TIC (ANEXO II) priorizado com base nas informações fornecidas por cada Unidade.

Finalmente, na última Fase Planejamento: foi possível, com base no diagnóstico realizado na fase anterior, definir as ações de atendimento das demandas alinhadas aos objetivos e indicadores estratégicos, contemplados no PETIC. Além da definição do Plano de Metas e Ações foi realizado o Planejamento das ações de pessoal, o Planejamento Orçamentário e o Planejamento da Gestão de Riscos.

Diante disso, sob a coordenação do representante titular da STI, o referido GT executou as atividades de acordo com o seguinte fluxo de elaboração do Plano:

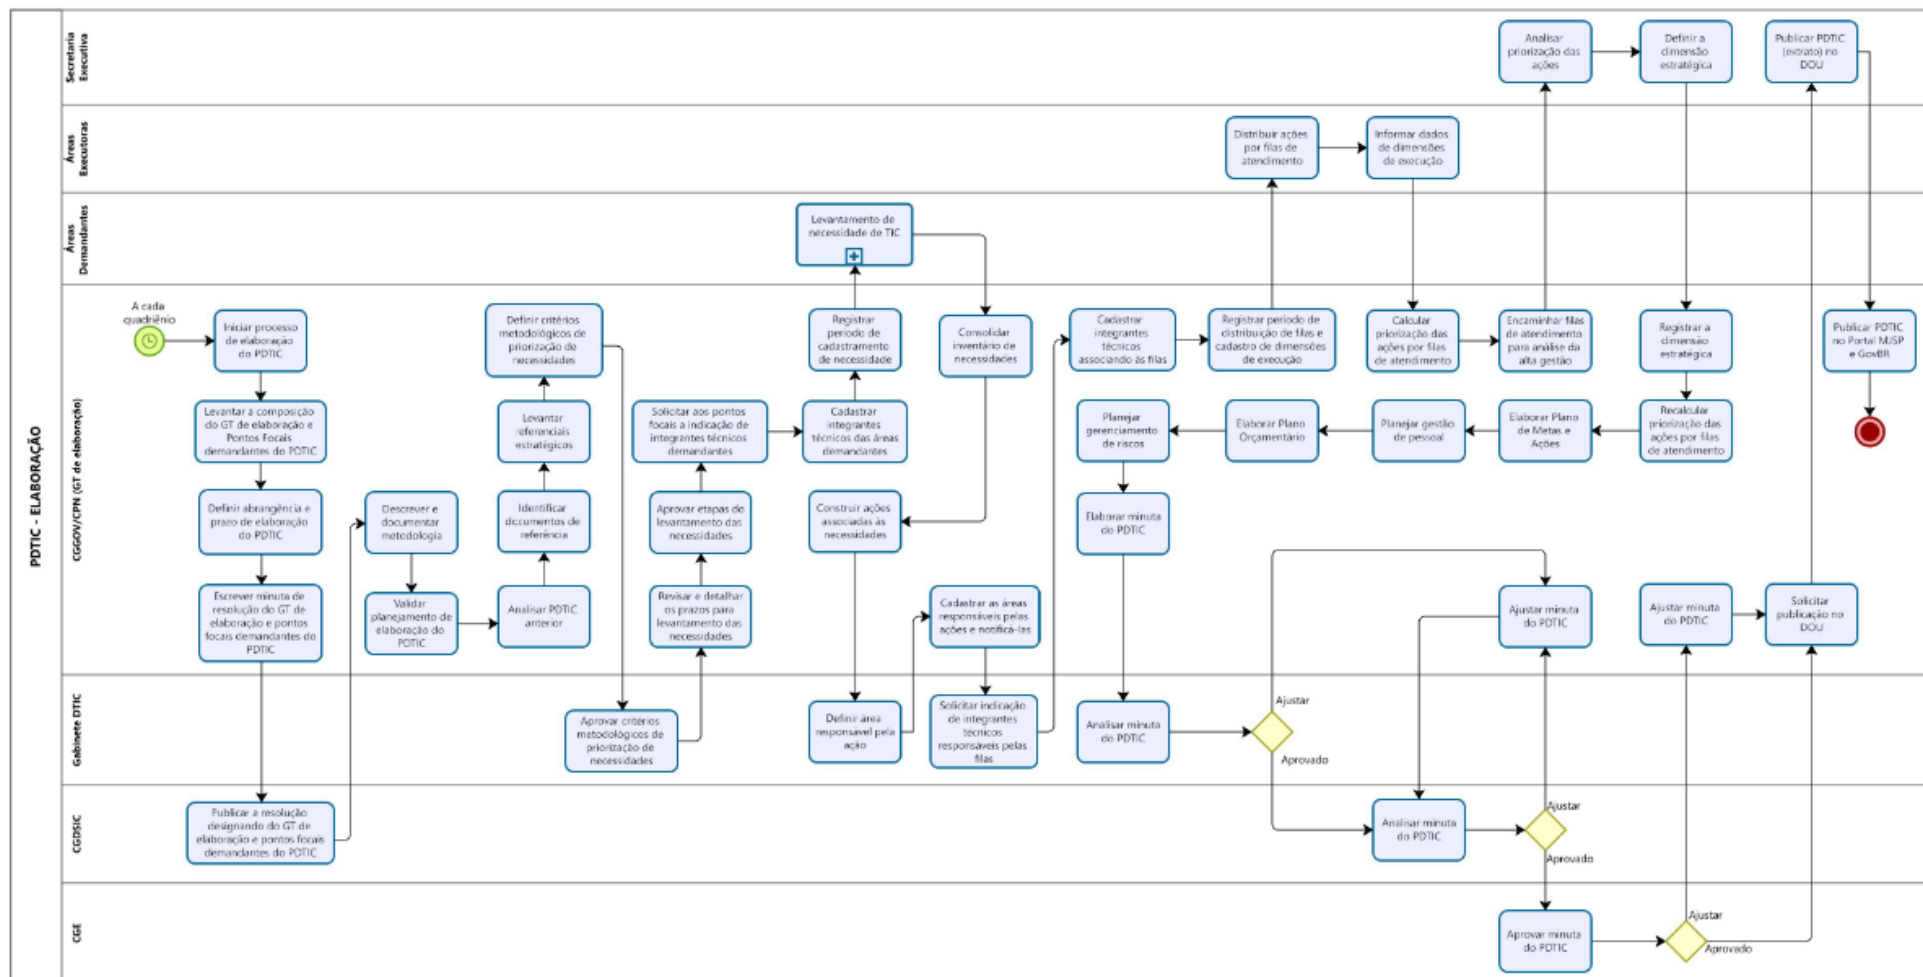


Figura 3: Fluxo de Elaboração do PD TIC

4. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC

Esta seção abrange as competências da STI, tal qual a estrutura organizacional da TIC, além de apresentar os Comitês que direta ou indiretamente têm influência nas ações de TIC do Ministério.

4.1 ATRIBUIÇÕES DA STI

No contexto do MJSP e de suas entidades vinculadas, a STI exerce o papel de órgão setorial do SISP. Suas competências estão definidas no Art. 12, do Anexo I, do Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, *in verbis*:

- I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao Sisp no âmbito do Ministério;
- II - promover a articulação com o órgão central do Sistema federal a que se refere o inciso I do caput e informar e orientar os órgãos integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
- III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; e
- IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no âmbito de sua competência.

Assim, cabe à STI acompanhar, cumprir e assegurar a aplicação das normas emanadas do SISP, incluindo-se a elaboração do PDTIC para as Unidades do MJSP elencadas no Item 2.2. ABRANGÊNCIA.

4.2 OUTRAS ATRIBUIÇÕES QUE ENVOLVE A STI

4.2.1 CGDI

O CGDI, instituído por meio da Portaria MJSP nº 2, de 28 de janeiro de 2022, de natureza consultiva e deliberativa, é subordinado à SE do Ministério.

Compete ao CGDI:

I - prestar assessoria técnica ao CGE no tocante à gestão, ao compartilhamento, à transparência e abertura de dados, às informações e sistemas de informação;

II - manter atualizada a PGDS-MJSP, encaminhando as propostas de aprimoramento ao CGE, para aprovação;

III - dirimir dúvidas e decidir sobre conflitos entre os integrantes do Sistema de Governança de Dados e Sistemas de Informação do MJSP, quando relacionados à gestão, ao compartilhamento, à transparência e abertura de dados, às informações e sistemas de informação;

IV - aprovar:

a) seu próprio regimento interno e suas atualizações;

b) o manual do agente de curadoria de bases de dados e Sistemas de Informação e suas atualizações; e

c) as solicitações para captação ou fornecimento de base de dados e informações, podendo delegar tal atribuição ao Comitê Executivo Permanente;

V - monitorar as solicitações de abertura de bases de dados prevista no art. 6º do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

VI - avaliar as solicitações de abertura de bases de dados, conforme critérios estabelecidos pelo Comitê, e encaminhar para aprovação pelo CGDSIC;

VII - avaliar as propostas de conteúdo e sugestões de alteração do PDTIC e da POSIC submetidas à aprovação do CGDSIC e do CGE, a fim de resguardar o alinhamento com a política e o plano de ação de governança de dados e sistemas de informação, bem como a compatibilidade e adequação à política de segurança da informação e comunicações da Administração Pública Federal, e encaminhar para aprovação pelo CGDSIC;

VIII - determinar a realização de estudos e levantamentos necessários à aplicação e ao aprimoramento da PGDS;

IX - avaliar constantemente a qualidade, a tempestividade, a acurácia, a validade, a completude e a consistência das bases de dados no âmbito do MJSP;

X - resolver controvérsias acerca da validade de informações cadastrais e regras de prevalência entre registros administrativos conflitantes no âmbito do MJSP;

XI - emitir orientações e diretrizes para o compartilhamento de bases de dados entre as Unidades do MJSP ou entre estas e os órgãos e entidades da Administração Pública dos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando a legislação referente ao sigilo e à proteção de dados pessoais;

XII - propor políticas, estruturas e diretrizes para integração dos sistemas que compõem a plataforma operacional, conforme normativos e orientações do governo e melhores práticas;

XIII - emitir orientações e formular propostas para assegurar a sustentação econômico-financeira do compartilhamento de bases de dados, tabelas, consultas e sistemas entre Unidades que compõem o MJSP e entre estes e os demais órgãos e entidades da Administração Pública dos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

XIV - aprovar anualmente o Plano de Ações da PGDS do MJSP e o Relatório Anual de Governança de Dados e Sistemas de Informação;

XV - acompanhar o Plano de Dados Abertos e submetê-lo ao CGDSIC para aprovação; e

XVI - designar o representante do MJSP em órgãos, colegiados ou eventos afetos à governança de dados e sistemas de informação.

Parágrafo único. As decisões do Comitê poderão ser submetidas ao CGE, em casos de conflitos não resolvidos no âmbito do CGDI ou em casos considerados estratégicos.

4.2.2 CGDSIC

O CGDSIC, instituído por meio da Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 1, de 28 de março de 2022, de natureza consultiva e deliberativa, é subordinado à SE do Ministério.

Compete ao CGDSIC:

I - prestar assessoria técnica ao CGE no tocante aos assuntos relacionados à TIC, auxiliando a alta administração na adequação das diretrizes e dos procedimentos aos mecanismos de governança;

II - promover a integração entre as estratégias organizacionais e as estratégias da área de TIC;

III - estabelecer diretrizes de alinhamento entre soluções de TIC, a EGD e o planejamento estratégico do Ministério;

IV - estabelecer as políticas de minimização de riscos, de priorização e distribuição dos recursos orçamentários de TIC;

V - aprovar, revisar e monitorar o PTD do Ministério;

VI - aprovar e monitorar o PDA do Ministério;

VII - aprovar, revisar e monitorar o PETIC;

VIII - promover a elaboração, aprovar e monitorar a execução do PDTIC, incluindo:

a) definição da abrangência e período de validade;

b) aprovação da composição do GT de elaboração e revisão;

c) priorização das Necessidades de TIC, seguindo as diretrizes; e

d) encaminhamento ao CGE para aprovação e ao Ministro para publicação.

IX - estabelecer e propor plano de investimento para a área de TIC;

X - definir prioridades e monitorar o desempenho de projetos relacionados à TIC;

XI - aprovar as alterações a este regimento interno;

XII - aprovar, monitorar e manter a POSIC do Ministério e as normas internas de segurança da informação, observadas as disposições do art. 15, § 3º, do Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, e as normas de segurança da informação editadas pelo GSI/PR;

XIII - orientar a criação e avaliar a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério por meio de um plano integrado de ações, considerando o planejamento estratégico do Ministério, as políticas e orientações do Governo Federal;

XIV - analisar os trabalhos e os pareceres técnicos afetos às suas competências que forem encaminhados pelos grupos de trabalho, pelas comissões e pela área de TIC do Ministério;

XV - avaliar, periodicamente, o modelo e os mecanismos de governança de TIC, como estruturas, políticas e processos, verificando seu alinhamento estratégico e a efetividade dos mecanismos, em apoio ao CGE;

XVI - avaliar o portfólio de TIC para garantir o alinhamento com os objetivos estratégicos do órgão, quanto a:

a) riscos;

b) conformidade com leis, regulamentos internos e externos, processos de negócio e demais boas práticas;

c) eficácia de desempenho e de resultados, durante e após os projetos; e

d) eficiência em termos de custo, sem redundância de investimentos e com viabilidade técnica para preservar o investimento no tempo;

XVII - propor diretrizes básicas ao CGE para a política de gestão de pessoas na área de TIC e a execução de contratações relacionadas a TIC do Ministério;

XVIII - propor estratégias e normas relacionadas à gestão dos recursos de TIC, zelando pelo seu cumprimento, cabendo ao CGE a sua aprovação, quando necessário;

XIX - propor diretrizes relacionadas com a salvaguarda dos recursos de TIC ao CGE;

XX - avaliar os fatores de riscos de TIC e averiguar se as decisões estratégicas estão sendo realizadas em conformidade com as avaliações, bem como com a política de riscos do Ministério;

XXI - propor planos de comunicação e de resposta a riscos de TIC;

XXII - exercer as funções e atribuições de CGD de que trata a EGD, deliberando sobre os assuntos relativos à implementação das ações de governo digital e ao uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação;



XXIII - analisar e incorporar as recomendações e determinações contidas nas normas de segurança da informação estabelecidas pelo GSI/PR; e

XXIV - editar Resoluções para o desempenho de suas competências, por meio de publicação no Boletim de Serviço do MJSP.

4.3 ORGANOGRAMA

Os organogramas do MJSP – correspondente à Figura 4 abaixo –, da Secretaria-Executiva e da STI estão representados nesta seção, de forma unitária para um melhor entendimento das suas estruturas organizacionais.

Organograma Geral

[Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023](#), que aprova a Estrutura Regimental do MJSP

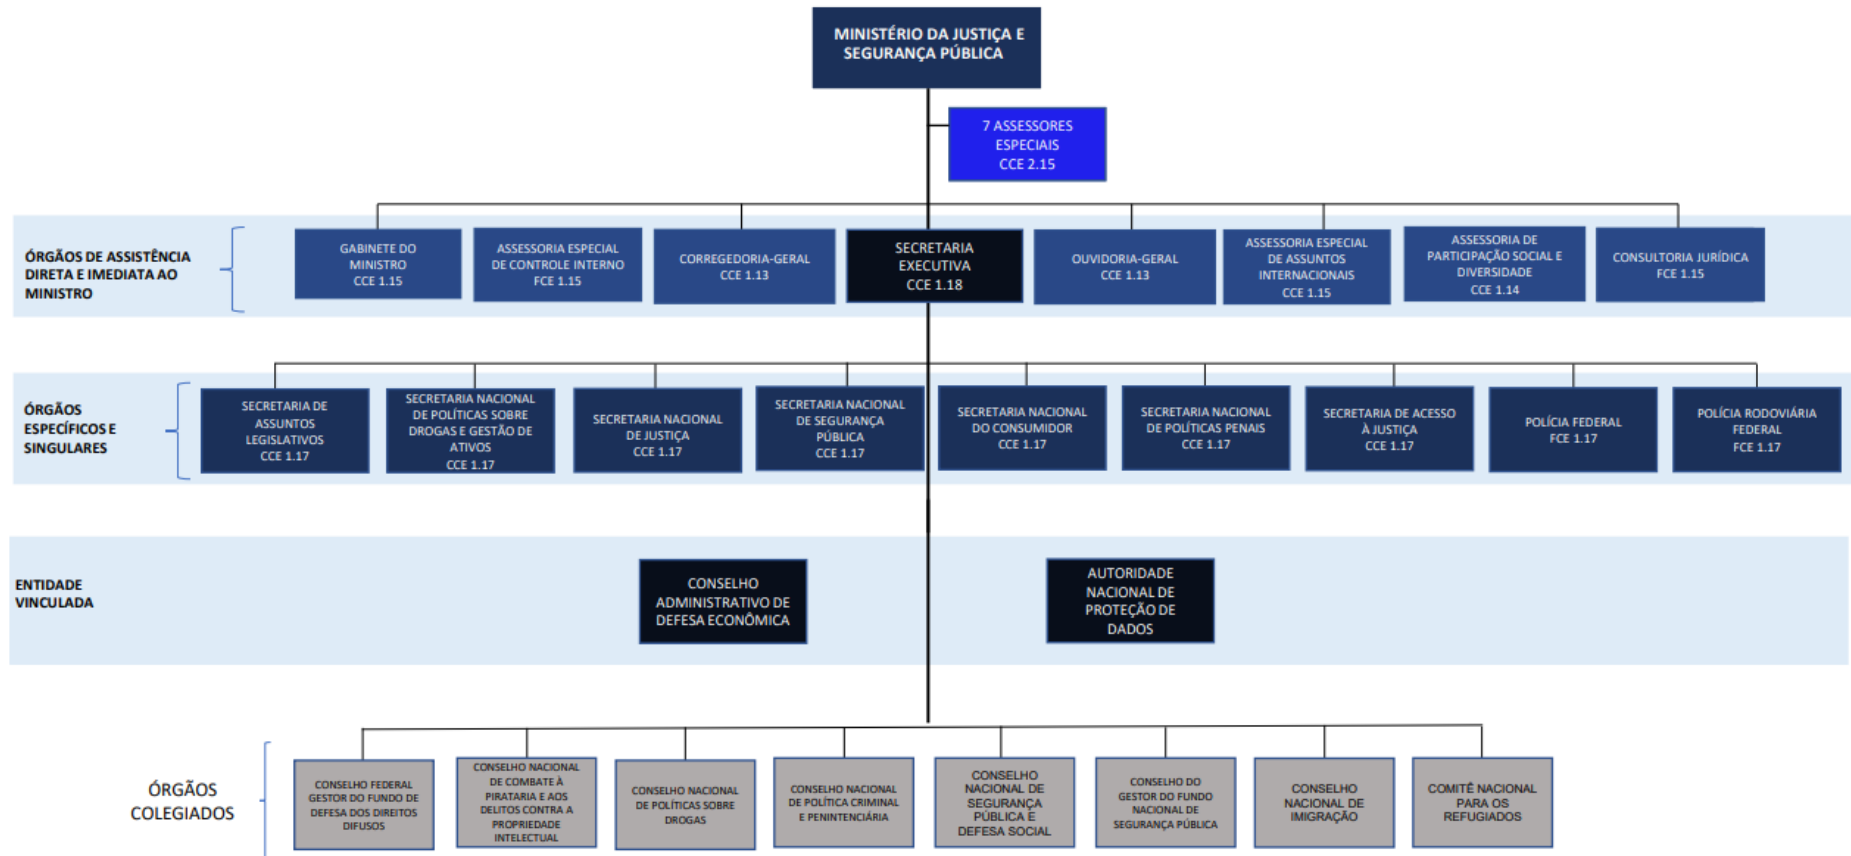


Figura 4: Estrutura Organizacional do MJSP

Consequentemente, é possível identificar a posição da SE na estrutura organizacional do Ministério, à qual a STI está diretamente subordinada, conforme representada pela, abaixo.

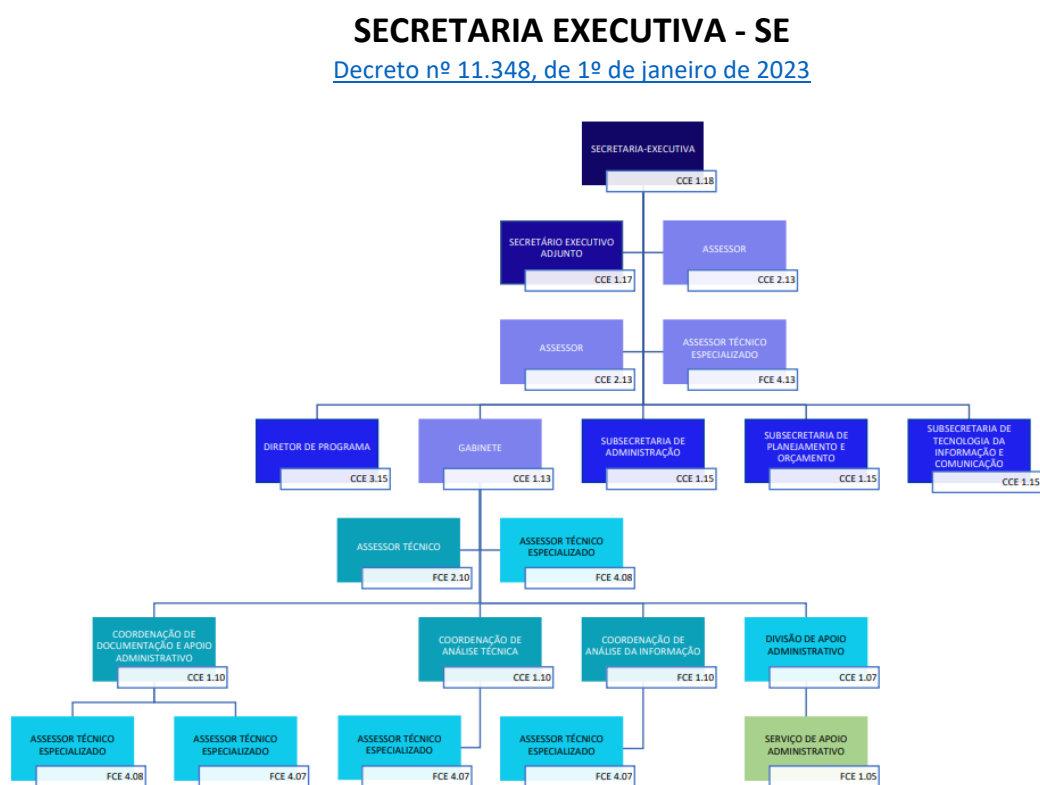


Figura 5: Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva

A STI é o órgão representante da área de TIC do MJSP, além de integrar a estrutura da SE, respondendo diretamente ao Secretário Executivo.

Atualmente, a STI do Ministério é composta por uma equipe formada por 51 (cinquenta e um) servidores, organizada em 4 (quatro) Coordenações-Gerais, conforme estrutura organizacional interna representada pela Figura 6 abaixo.

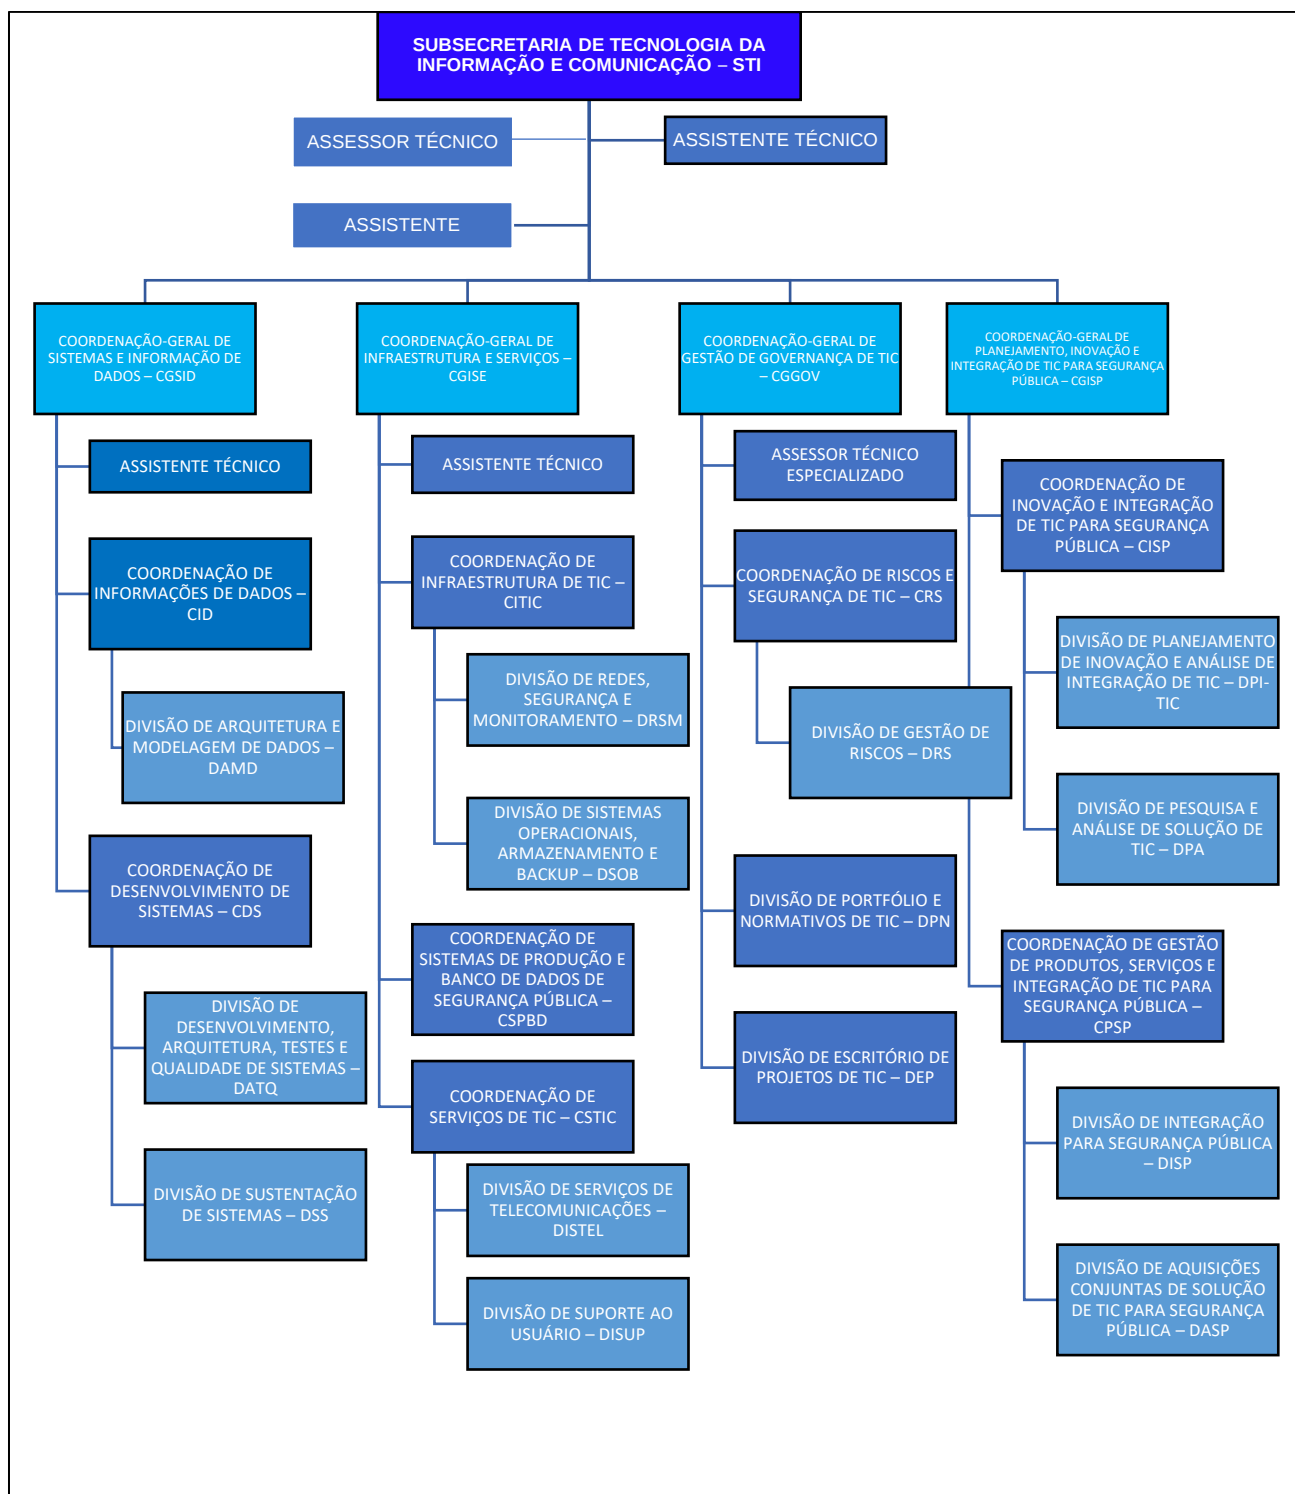


Figura 6: Estrutura Organizacional da STI

As atribuições da STI e de suas Unidades internas estão sendo definidas no processo de elaboração do novo Regimento Interno do MJSP.



5. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR

Na última revisão do PDTIC 2017-2020, foram levantadas 578 (quinhentos e setenta e oito) Necessidades de TIC junto às Unidades do MJSP.

Ressalta-se que, em vista da necessidade de aprovação do PDTIC à época antes do término do período de vigência do plano anterior, as informações referiam-se à execução ocorrida envolvendo todo o exercício de 2020, que seriam contemplados na próxima revisão do PDTIC.

Os resultados deste PDTIC anterior encontram-se demonstrados pelos gráficos abaixo.

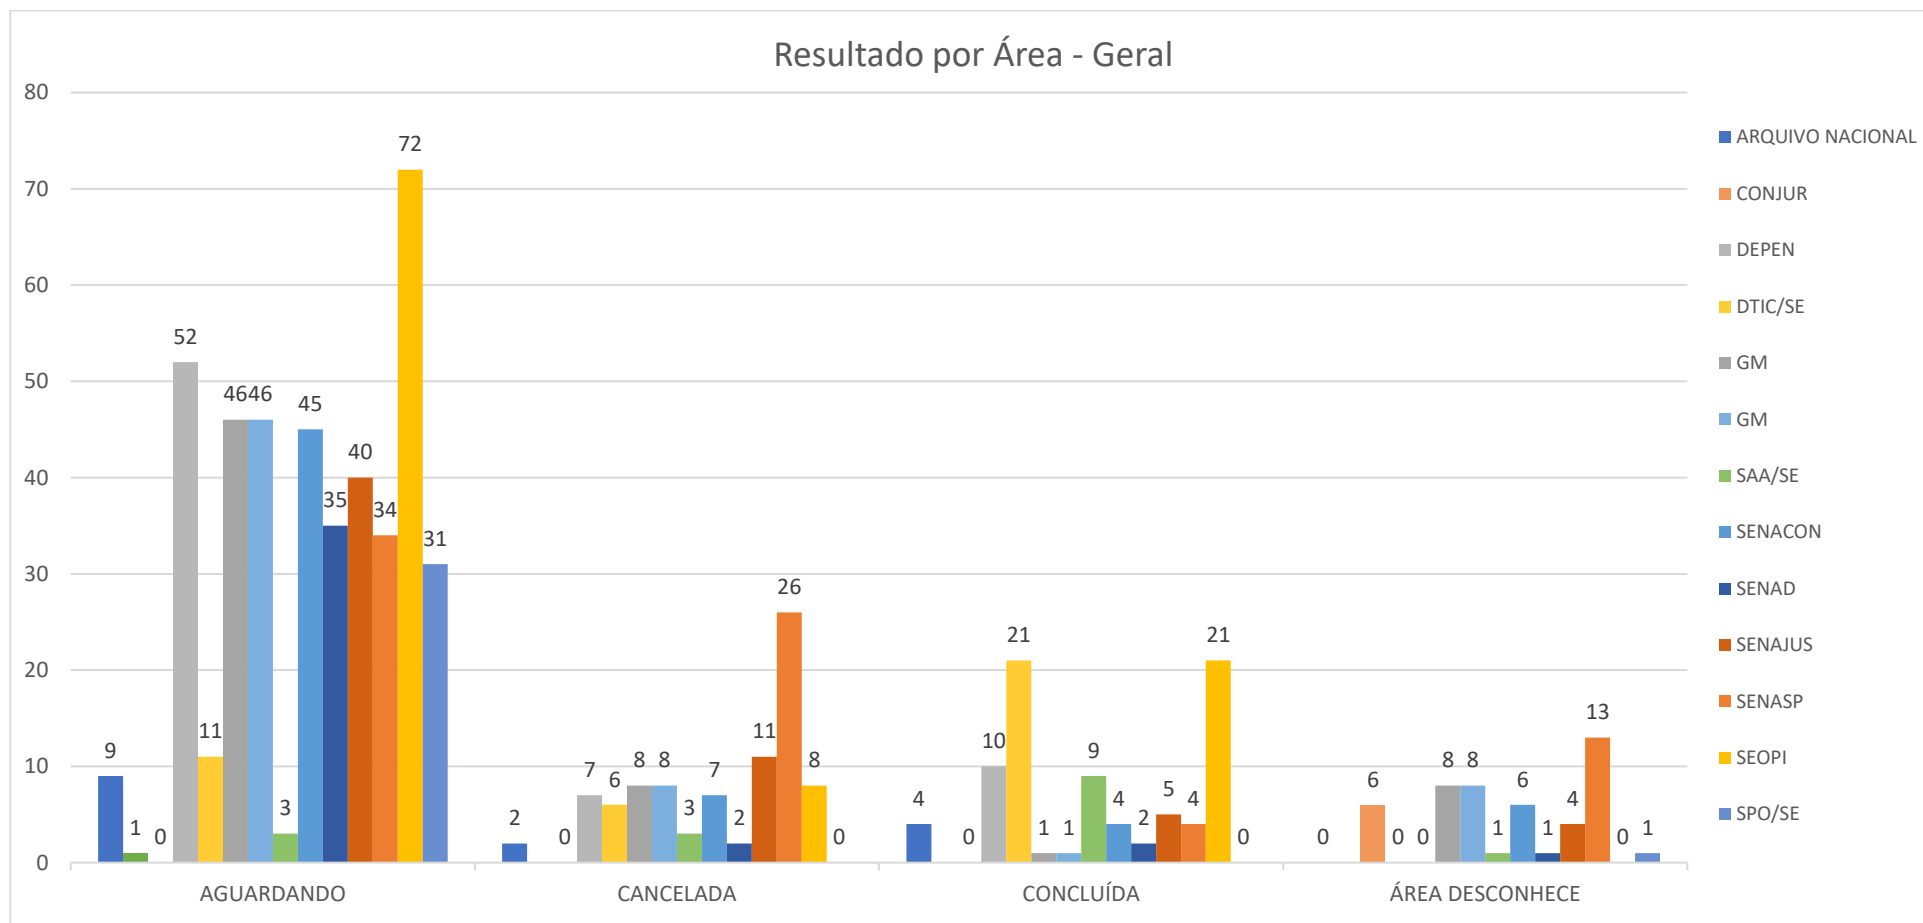


Figura 7: Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade

RESULTADO - NECESSIDADES POR ÁREA PRIORIDADE ALTA - PDTIC 2017-2020

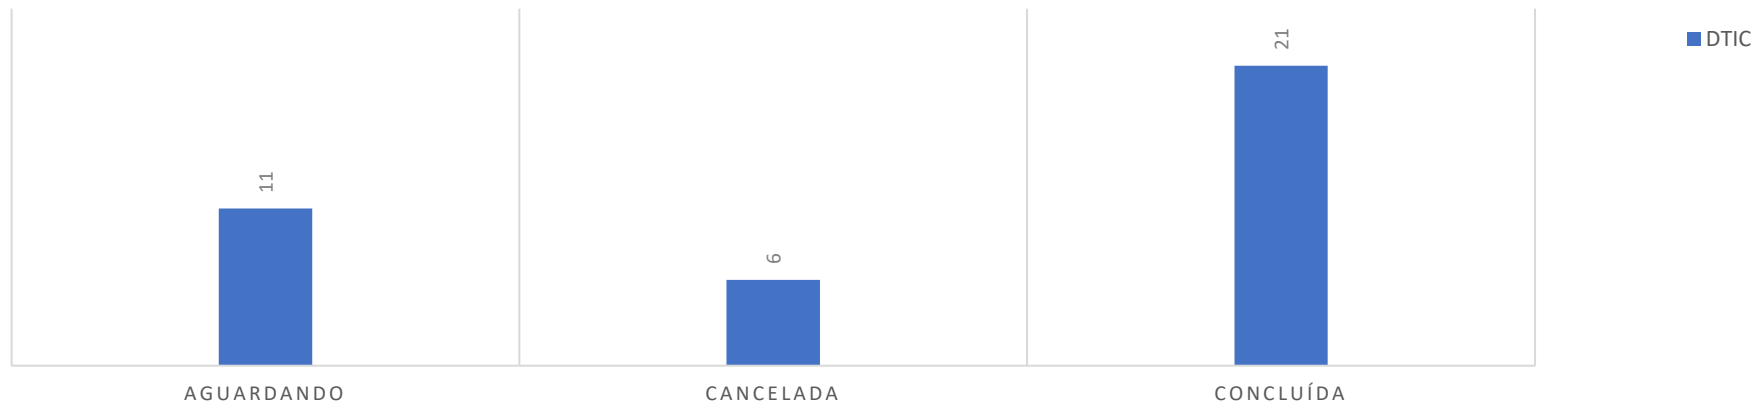


Figura 8: Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade

Resultado - Necessidades por Área Prioridade Média - PDTIC 2017-2020

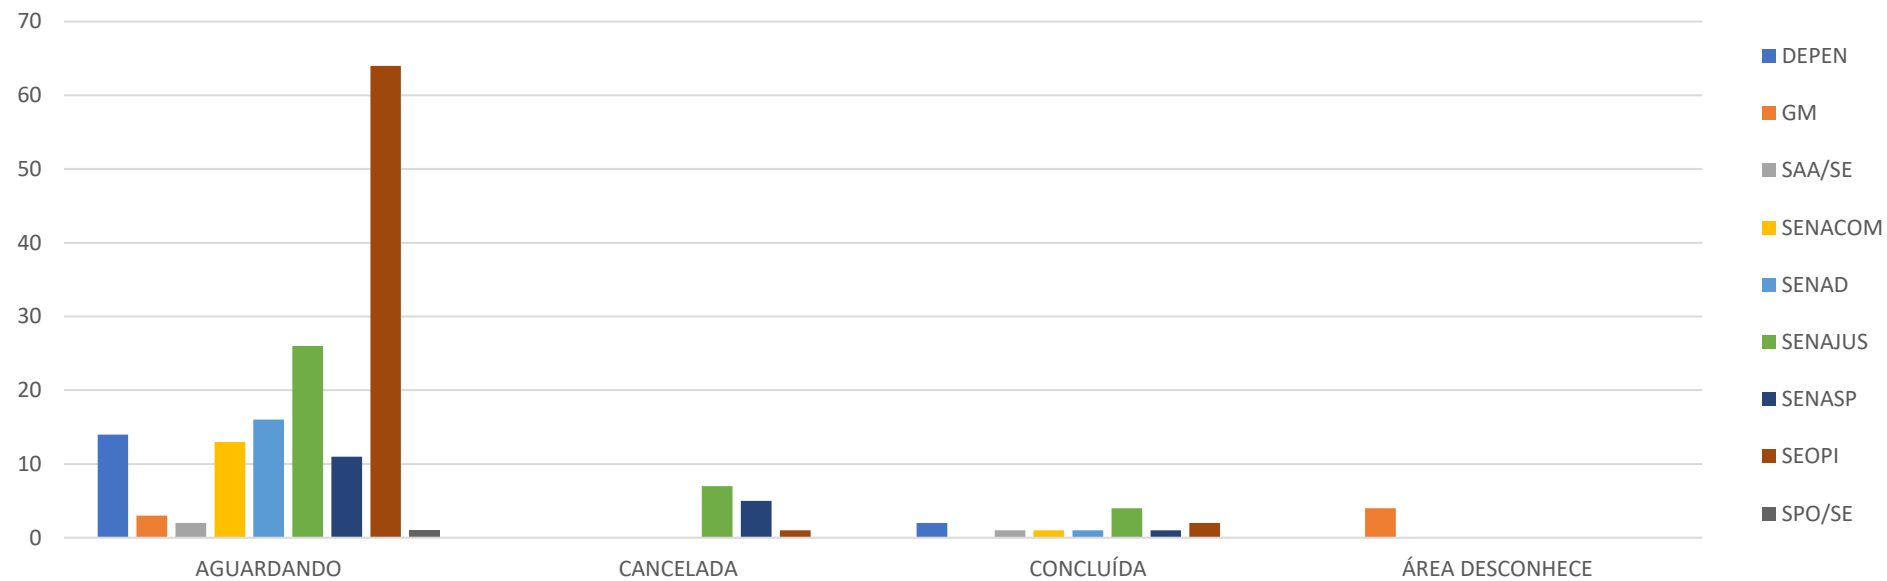


Figura 9: Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade

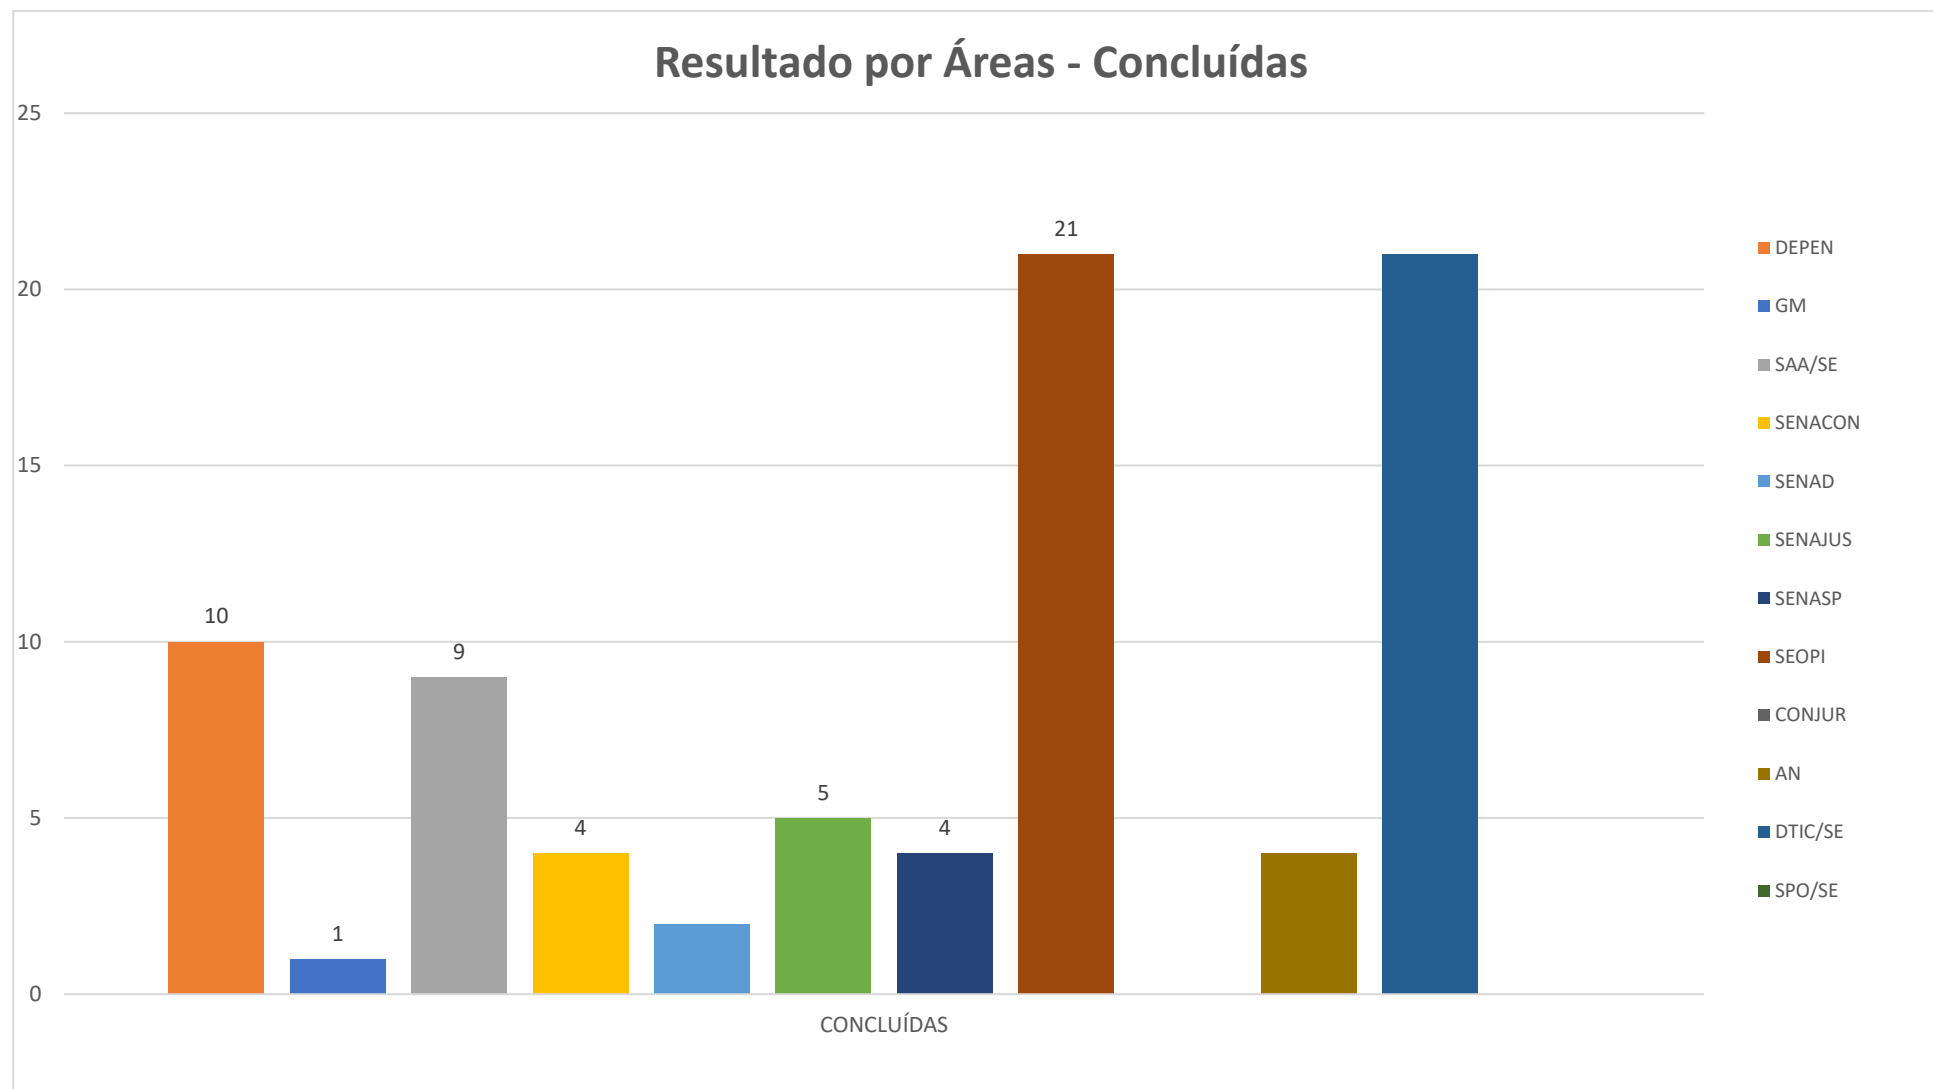


Figura 10: Necessidades de TIC do PDTIC anterior Concluídas por Áreas

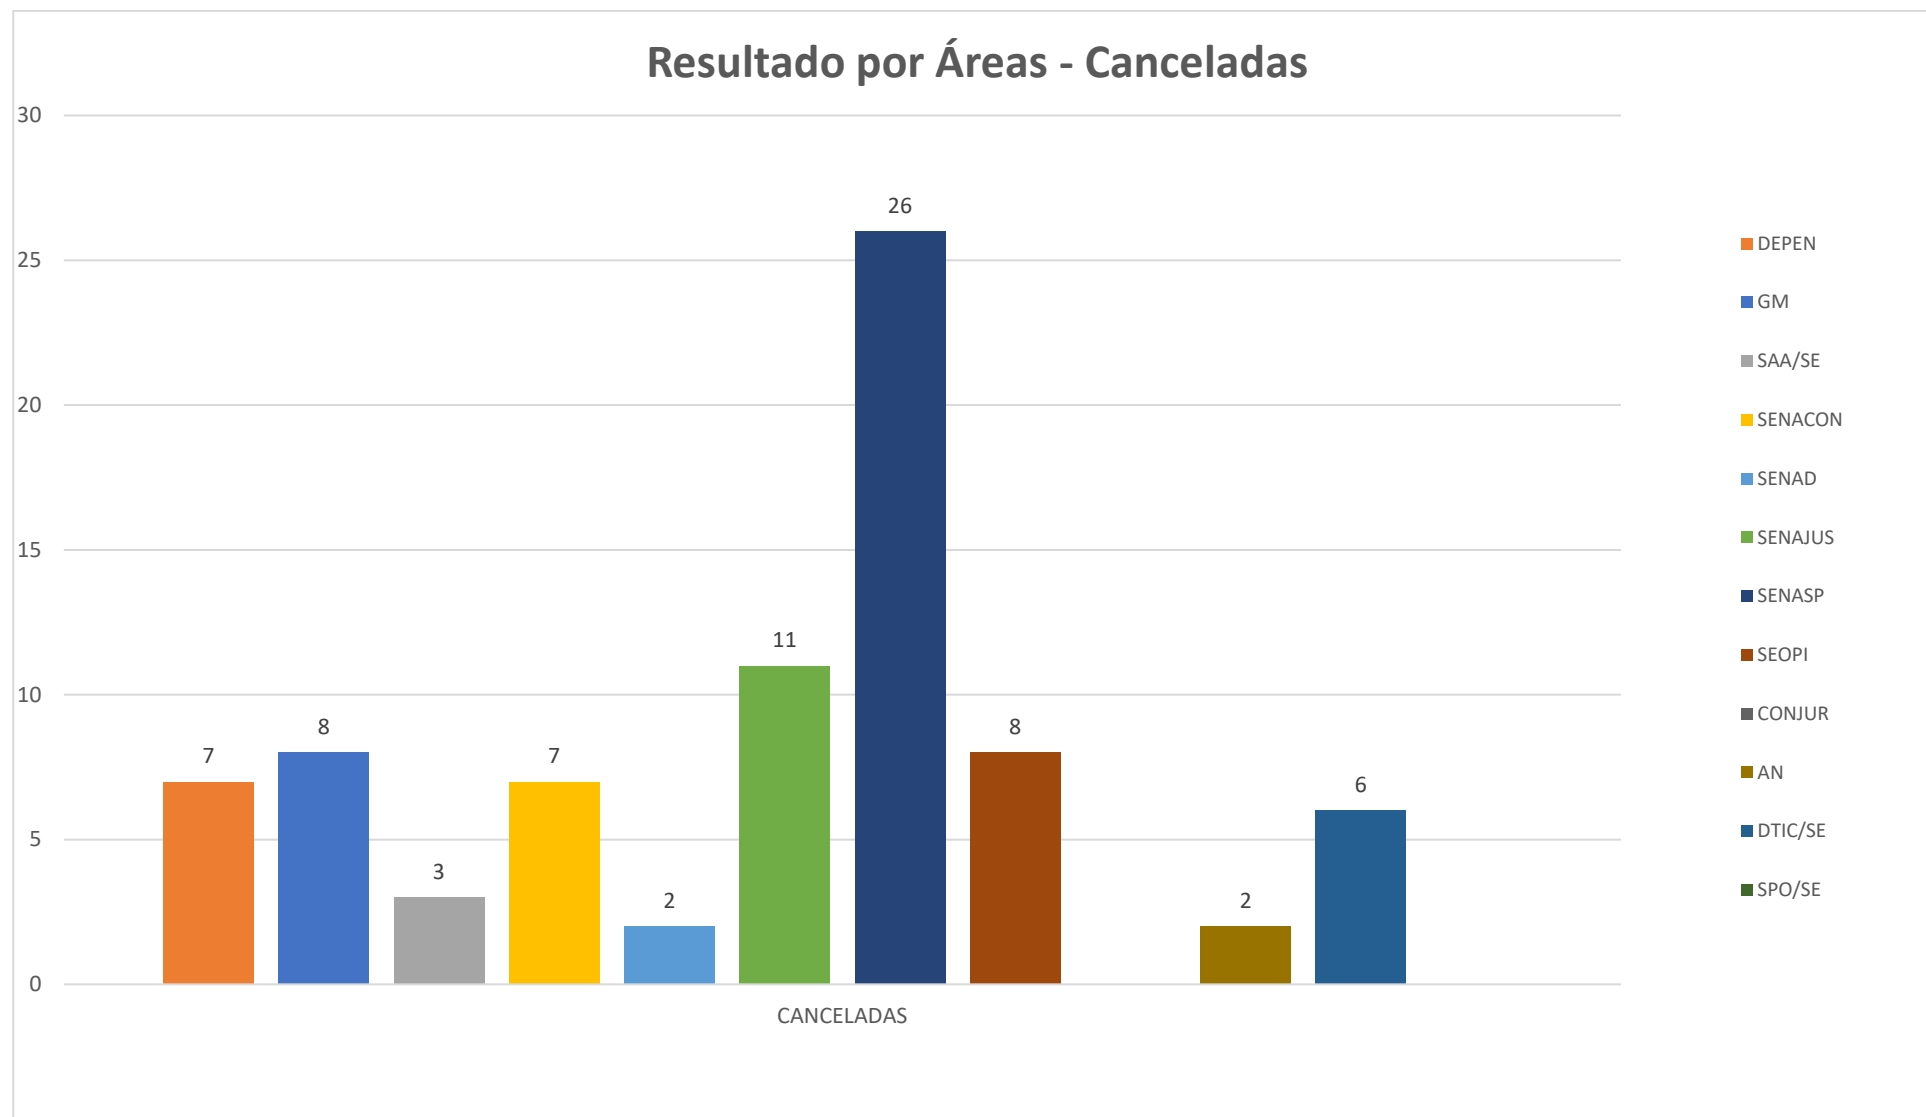


Figura 11: Necessidades de TIC do PDTIC anterior Canceladas por Áreas

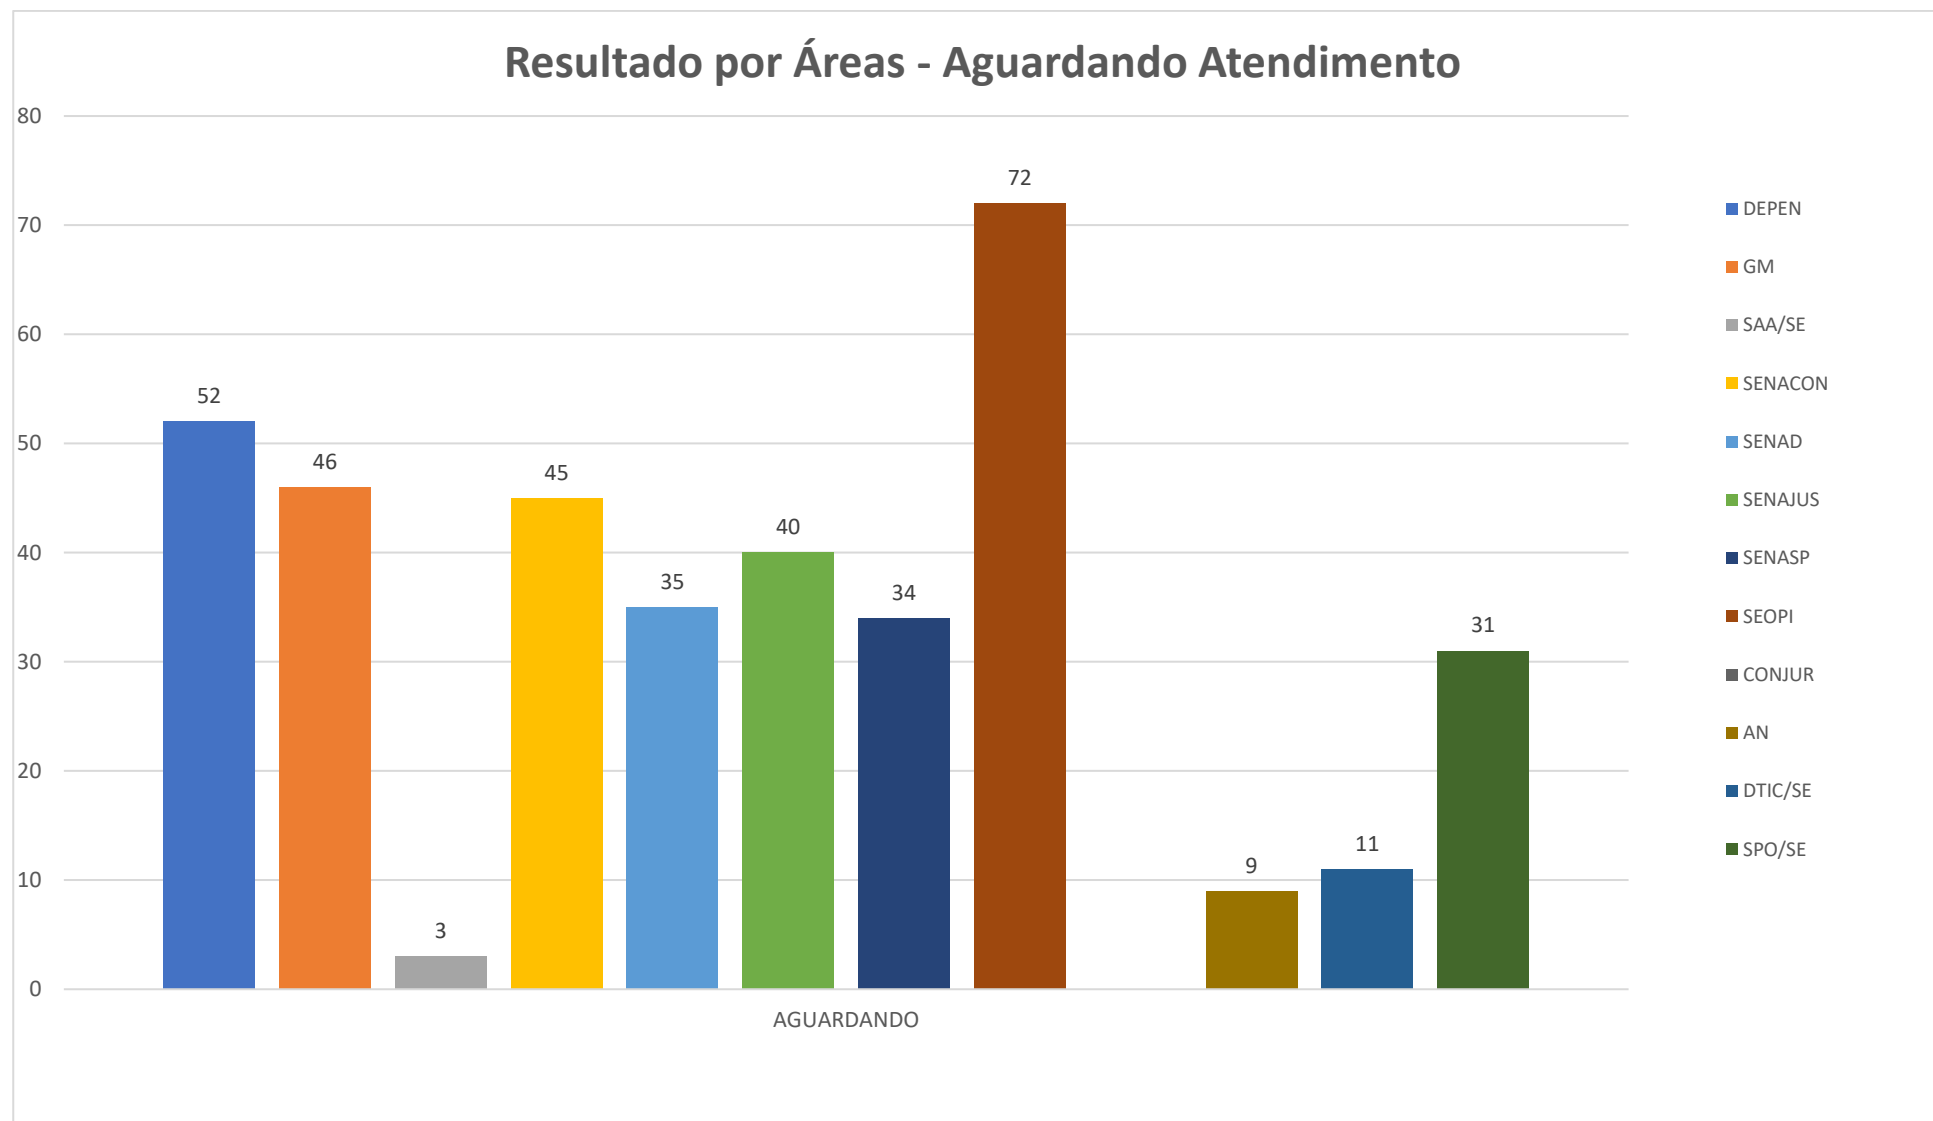


Figura 12: Necessidades de TIC do PDTIC anterior Aguardando Atendimento

6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

No âmbito do MJSP, o referencial estratégico da área de TIC é construído no PETIC 2021-2023.

No PETIC, estão elencados os artefatos estratégicos de TIC (princípios e diretrizes, missão, visão, valores, análise do ambiente, mapa estratégico, objetivos e indicadores estratégicos), bem como são descritas suas principais fontes direcionadoras, com destaque para o PEI.

Aqui, portanto, cabe demonstrar o alinhamento do PDTIC ao PETIC, do qual decorrerão sua coerência, compatibilidade e alinhamento com a estratégia organizacional, o modelo de negócio e os objetivos de negócio.

Inicialmente, cabe destacar que, a partir da análise do ambiente, foram incluídas no Inventário de Necessidades de TIC as demandas específicas para aproveitar oportunidades de melhoria e a mitigação de ameaças.

Outro esforço de alinhamento está no estabelecimento para o atendimento das Necessidades de TIC, dos Sistemática de Priorização das Necessidades de TIC (Capítulo 7), que atribuem maior peso àquelas vinculadas aos projetos estratégicos do MJSP. Os princípios, valores e diretrizes estratégicas também estão devidamente contemplados nos demais critérios que privilegiam a conformidade (atendimento de exigência legal e previsão no PAC), a eficiência (transversalidade da Necessidade), eficácia (viabilidade assegurada pela previsão no PAC) e a transformação digital (vinculação ao PTD).

Assim, neste PDTIC fazem-se presentes elementos do PEI, da EGD, do PTD do MJSP, da LGPD e de outras referências adotadas pelo PETIC. A figura abaixo representa a integração da EGD com as demais estratégias (PEI, PETIC e PDTIC), da mesma maneira com os níveis de planejamento e os planos de ação.



Figura 13: Elementos do Referencial Estratégico Delineado

7. SISTEMÁTICA DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE TIC

1.1 Objetivo

A STI, que representa a área de TIC do MJSP deve planejar o atendimento das Necessidades negociais, estabelecendo os planos e as ações adequados para o alcance dos objetivos estratégicos esperados. Para isto, contempla-se atividades relacionadas à priorização das Necessidades de TIC e planejamento de Metas e Ações de TIC, abrangendo aspectos de pessoal, orçamento e riscos.

Sendo assim, visando garantir que o investimento de recursos, tempo e esforços da área de TIC seja o mais adequado às necessidades negociais do Ministério, definiu-se critérios como balizadores para cálculo da prioridade das Necessidades de TIC cujo atendimento está sob responsabilidade da STI.

1.2 Por que priorizar?

Devido à disponibilidade finita de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, ou mesmo legais, a totalidade das Necessidades de TIC não pode ser atendida de modo imediato. Isto torna necessária a priorização do atendimento das Necessidades de TIC segundo critérios técnicos, objetivos e estratégicos. Dado o volume de Necessidades, a priorização não se dá de maneira simples, inclusive em função dos inúmeros aspectos que devem ser levados em conta, que vão além das limitações de recursos, passando pelo alinhamento à diretrizes estratégicas da organização e até mesmo condicionantes impostos pela gestão ou legislação.

Quando se identifica com clareza o que deve ser executado, produz-se mais em menos tempo, pois a atenção estará totalmente voltada às atividades que, naquele momento, foram entendidas como de maior importância estratégica ou cujas informações associadas indicaram sua importância e, em alguns casos, urgência.

1.3 Priorização das Necessidades de TIC

Parte crucial do processo de elaboração e de revisão do PDTIC é a definição (ou redefinição) de seus princípios e diretrizes, incluindo os critérios de priorização e de desempate das Necessidades nas Filas de Atendimento sob responsabilidade da STI. Nesse contexto, estabeleceu-se a Diretriz SE nº 01/2022 (Documento SEI 18630308), na forma do art. 11 do Anexo VII da Portaria MJSP nº 2, de 31 de janeiro de 2022 (Documento SEI 16851098):

A proposta envolve a revisão da pontuação básica, alterando a pontuação dos critérios objetivos (Dimensão A), conforme proposta abaixo:

- Caráter Legal: 100 pontos;
- Projeto Estratégico Governo: 75 pontos;
- Projeto Estratégico MJSP: 75 pontos;
- Necessidade Transversal: 50 pontos.
- Total: 300 pontos

A implantação da pontuação estratégica (Dimensões E) com critérios definidos para que a instância superior possa priorizar qualquer necessidade definida anteriormente:

- CGDSIC (E1): 300 pontos (+/-)
- SE (E2): 600 pontos (+/-)
- CGE (E3): 1.200 pontos (+/-)
- GM (E4): 2.400 pontos (+/-)

Verifica-se que a sistemática de priorização das Necessidades de TIC submetidas à inclusão no PDTIC abrange tanto componentes objetivos quanto subjetivos.

Os primeiros, referenciados como Dimensão A, facilitam a identificação daquelas Necessidades consideradas mais ou menos relevantes, em que a ordem de priorização é calculada, automaticamente, a partir de um conjunto de critérios-chave tabulados e



ponderados. Estes são preenchidos pela unidade demandante, por meio do seu respectivo Ponto Focal.

Os segundos, referenciados como Dimensão E1, E2, E3 e E4, permitem realizar ajustes nessa priorização com base na percepção subjetiva e individualizada do valor que o atendimento de uma determinada Necessidade de TIC agregará à atuação do Ministério. Eles são necessários porque não se vislumbra a possibilidade de construção de critérios puramente objetivos capazes de assegurar o total alinhamento das Necessidades de TIC às estratégias do órgão de forma consistente, homogênea e impessoal.

Assim, buscou-se conciliar essas duas naturezas do processo de priorização por meio de regras claras e transparentes, com um ranqueamento inicial baseado em critérios objetivos e subsequentes ajustes sucessivamente realizados pelas diferentes instâncias estratégicas que participam do processo, a saber:

- 1ª instância: CGDSIC;
- 2ª instância: SE;
- 3ª instância: CGE; e
- 4ª instância: Senhor Ministro (GM).

Acredita-se que tal sistemática permita determinar a relevância de cada Necessidade de TIC com eficiência e eficácia, possibilitando que a alocação dos recursos de TIC do Ministério para seu atendimento se dê de forma otimizada e alinhada às estratégias estabelecidas.

Em linha com o objetivo, na Dimensão A, foram elencados critérios vinculados à Necessidade de atendimento de exigência legal, ao caráter estratégico dos projetos vinculados e à transversalidade da Necessidade, todos passíveis de verificação direta quanto ao correspondente dispositivo legal, quanto à carteira de projetos estratégicos e quanto à identificação das distintas unidades beneficiadas, respectivamente. A Diretriz SE nº 01/2022 definiu a pontuação a ser atribuída a tais critérios.

Nesses critérios, é possível identificar os principais eixos que, de forma subjacente, orientarão o estabelecimento das prioridades para as Necessidades. Há aspectos financeiros,

de abrangência na organização e de alinhamento com programas estratégicos formais, incluindo a EGD.

A aplicação dos critérios da Dimensão A resulta em uma pontuação atribuída a cada Necessidade de TIC, que pode variar entre 0 (zero) a 300 (trezentos) pontos e subsidia a formação de Filas ordenadas para o seu atendimento.

Nesse momento, o CGDSIC pode realizar ajustes iniciais na priorização, com a adição ou subtração de até 300 (trezentos) pontos por meio da Dimensão E1, possibilitando assim que, cumpridos os ritos internos de deliberação do Comitê, seja possível promover uma determinada Necessidade de TIC que estiver em último lugar na Fila para o primeiro lugar, e vice-versa.

Da mesma forma, a SE, o CGE e o GM poderão assim proceder por meio, respectivamente, das Dimensões E2, E3 e E4, ressaltando que a quantidade total de pontos que poderão ser adicionados ou subtraídos em cada dimensão aumenta a cada nível, de maneira a permitir que continue sendo possível posicionar cada Necessidade em qualquer lugar da Fila.

Cabe acrescentar a necessidade de que, sempre que for revisada (aumentada ou diminuída) a pontuação de alguma dessas dimensões para uma dada Necessidade de TIC, seja feita avaliação do impacto na priorização das demais Necessidades de TIC cuja posição na Fila tenha sido afetada, de modo a evitar interferências nas priorizações realizadas pelas instâncias superiores.

Por fim, em casos de pontuação idêntica de duas ou mais Necessidades de TIC, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:

1. atendimento a medidas de caráter legal (leis, decretos etc.) e/ou atendimento a determinações judiciais e/ou órgãos de controle;
2. atendimento a projetos estratégicos do Governo Federal (PTD, por exemplo);
3. atendimento a projetos estratégicos do Ministério (PETIC);
4. Necessidade transversal (atende a 2 Secretarias ou mais); e
5. data/horário de cadastramento na ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC.

1.4 Planejamento atendimento das necessidades de TIC (Plano de Metas e Ações)

Após a construção do Inventário de Necessidades priorizadas, é necessário elaborar o Plano de Metas e Ações do PDTIC e verificar a viabilidade de atendimento de cada Necessidade, considerando-se as limitações de tempo e de recursos existentes.

Para tanto, foram estabelecidas outras três dimensões sob as quais as Necessidades de TIC são avaliadas.

A primeira é a Dimensão B, que consiste na definição, por parte do demandante, da data máxima aceitável em que a correspondente Necessidade de TIC deverá ser atendida, sob pena de perda do objeto e/ou de graves prejuízos à Administração Pública.

A justificativa para o valor definido nessa dimensão deve ser objetivamente detalhada e comprovada, pois balizará decisões quanto à revisão, descarte ou pedidos de repriorização da respectiva Necessidade. Além disso, cabe ressaltar que ela não é levada em consideração para a determinação da priorização propriamente dita. Assim, é necessária atenção especial por parte do demandante para evitar a atribuição arbitrária de prazos exíguos a essa Dimensão, o que provocará a necessidade de frequentes avaliações de viabilidade e atrasará o processo de elaboração ou revisão do PDTIC.

As outras duas dimensões, C e D, referem-se aos aspectos relacionados ao atendimento da Necessidade de TIC, e, portanto, aplicam-se às correspondentes Ações de TIC.

O primeiro passo para a elaboração do Plano de Metas e Ações é vincular uma Ação de atendimento a cada uma das Necessidades de TIC do Inventário, sendo que uma mesma Ação poderá ser vinculada a mais de uma Necessidade.

Cada Ação terá um executor definido, que agrupará as demais Necessidades sob sua responsabilidade em Filas de Atendimento priorizadas de acordo com a respectiva pontuação. Cabe destacar que, sempre que uma Ação de TIC possuir mais de uma Necessidade de TIC vinculada, ela será priorizada de acordo com a maior pontuação dentre todas as Necessidades de TIC associadas.



Por fim, a Dimensão D é estabelecida pelo executor da Ação e indica quantos meses são necessários para concluí-la, após ter sido iniciada sua execução.

Com isso, reúnem-se todos os elementos necessários à construção de um plano efetivo, bem como à análise de sua viabilidade.

Diante disso, é possível iniciar o planejamento das Metas, sendo que o próximo passo é verificar se elas estão compatíveis com a expectativa de atendimento pelos demandantes (informação incluída no momento do cadastro da demanda), por meio de cotejamento com os prazos definidos na Dimensão B.

Caso se verifique que não há compatibilidade entre o tempo de atendimento dado pelo Executor e a Dimensão B, o demandante deve avaliar que medidas podem ser tomadas para sanar essa situação, como readequar seu planejamento interno para se adaptar ao prazo da Meta, cancelar a respectiva Necessidade ou pleitear sua priorização.

É importante também frisar que os efeitos dessa verificação também serão validados junto às instâncias superiores de priorização, pois interferem nas priorizações anteriormente realizadas.

Um pedido de repriorização de Necessidade, portanto, envolve a revisão das Metas de toda a Fila e sua validação junto a todas as instâncias de priorização. O mesmo se aplica aos casos em que se constata a Necessidade de alteração da Fila de uma determinada Necessidade de TIC após análises mais aprofundadas, o que ressalta a importância da adequada alocação no momento da inclusão no PDTIC.

1.5 Execução das ações de TIC

Estabelecido o Plano de Metas e Ações, cabe detalhar o funcionamento da sua sistemática de execução.

Conforme já apresentado, as Necessidades de TIC inventariadas são organizadas em Filas de Atendimento, gerenciadas pelas diferentes equipes especializadas e responsáveis por executar as respectivas Ações de atendimento. Tal arranjo visa a um controle mais efetivo

acerca da execução de cada uma dessas Necessidades, tendo sido estabelecidas as seguintes Filas:

- I. Filas de Atendimento executadas, exclusivamente, pela Coordenação-Geral de Governança de TIC – CGGOV, que englobam demandas relacionadas à:
 - a. Governança de TIC; e
 - b. Segurança da Informação e Comunicação.
- II. Filas de Atendimento executadas, exclusivamente, pela Coordenação-Geral de Serviços e Infraestrutura - CGISE, que englobam demandas relacionadas à:
 - a. Aquisição de Software para Servidor de Aplicação;
 - b. Ferramenta de usuário; e
 - c. Infraestrutura.
- III. Filas de Atendimento executadas, exclusivamente, pela Coordenação-Geral de Planejamento, Inovação e Integração para Segurança Pública – CGISP, que englobam demandas relacionadas a:
 - a. Acompanhamento de aquisições de TIC (Integrante Técnico);
 - b. Acompanhamento de aquisições de TIC (Consultor Técnico);
 - c. Capacitação de Servidores STI; e
 - d. Desenvolvimento de Soluções *Low Code* e Automação.
- IV. Filas de Atendimento executadas, exclusivamente, pela Coordenação-Geral de Sistemas, Informações e Dados – CGSID, que englobam demandas relacionadas a:
 - a. Desenvolvimento e Evolução de sistemas;
 - b. Internalização de Bases;
 - c. Painéis; e
 - d. Absorção.



Cada uma das Filas possui um gerente, responsável por monitorar e, principalmente, organizar a execução das Ações de atendimento correspondentes. Tal execução se dará em ciclos trimestrais, mediante a publicação em Boletim de Serviço, pela STI, de edital contendo todas as Necessidades de cada Fila cujo atendimento está previsto para ser iniciado no período seguinte.

A elaboração do edital deve ser seguida estritamente a ordem de prioridade estabelecida para cada Fila, podendo incluir, em caráter excepcional:

1. as Necessidades de TIC cujos recursos para atendimento, em análise individualizada, não concorram com os recursos necessários ao atendimento das Necessidades de maior prioridade; e
2. as Necessidades de TIC que forem imprescindíveis à viabilização do atendimento das Necessidades de maior prioridade, ou à própria execução do PDTIC.

Quaisquer outras Necessidades de TIC que não estejam na ordem de prioridade estabelecida só poderão ser incluídas no PDTIC mediante autorização de alguma das instâncias estratégicas que participam do processo de priorização (CGDSIC, SE, CGE e GM). Tal regra é válida inclusive para algumas demandas que possuem data certa para serem atendidas, a exemplo de contratações para manutenção de serviços que já são prestados, exigindo assim planejamento adequado por parte dos envolvidos para que tais demandas sejam priorizadas adequadamente com a antecedência necessária, e, assim, seja minimizado o impacto da reformulação do Plano de Metas que se faz necessária toda vez que há uma alteração na ordem de execução das Ações previstas.

Publicado o edital, cabe às unidades interessadas encaminhar à STI, no prazo de 15 (quinze) dias, a formalização da demanda, com o envio do Documento de Oficialização de Demanda - DOD no caso de contratações ou de Ofício de solicitação de desenvolvimento de sistema, internalização de bases de dados, absorção de aplicações ou equivalente.

Caso, por algum motivo (falta de recursos financeiros, indisponibilidade de pessoal, etc), o demandante se omita em oferecer as condições necessárias para a execução da Ação de atendimento pela STI, será convocada a Necessidade seguinte da Fila, permanecendo a



original na mesma posição por mais um ciclo. Em caso de nova omissão, a demanda será despriorizada para o final da Fila, cabendo recurso às instâncias competentes para sua repriorização.

A execução das Ações será monitorada pela área de governança da STI, com prestação de informações à direção da STI, ao CGDSIC e aos demandantes. Acrescente-se que tal sistemática será implantada de forma gradual, iniciando-se pela Fila de desenvolvimento de sistemas, e poderá sofrer aperfeiçoamentos conforme é avaliado o seu funcionamento.

Sendo assim, neste momento inicial, a falta de parâmetros e referências consolidadas para uma estimativa mais precisa do esforço de atendimento das Necessidades faz com que as de maior prioridade tenham um Plano de Metas mais preciso (mês/trimestre de início de atendimento), enquanto as do final da Fila tenham metas mais genéricas (granularidade por semestre/ano).

Assim, com tal tratamento das demandas em 2 níveis de prioridade (alta e baixa), busca-se minimizar o impacto das dificuldades para determinar as Metas com maior precisão e, ao mesmo tempo, obtém-se um macroplanejamento compatível com o que se espera de um PDTIC.



8. PLANO DE METAS E AÇÕES

Após análise e consolidação das Necessidades de TIC foram definidas Ações a serem executadas pela STI ou, ainda, pelas próprias Unidades demandantes para o seu atendimento.

As Necessidades semelhantes que pudessem ser contempladas por uma mesma ação foram agrupadas, possibilitando, assim, otimizar os recursos disponíveis e maximizar o alcance da atuação da STI.

Diante disto, coerente com a metodologia utilizada para poder apresentar um Plano de Metas e Ações de maneira mais uniforme e padronizada, foram dispostas e relacionadas aos respectivos indicadores, responsáveis e Necessidades vinculadas, conforme exposto detalhadamente no ANEXO III.

9. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

9.1 EFETIVO ATUAL

A STI conta atualmente com um total de 57 (cinquenta e sete) colaboradores, assim distribuídos:

	Servidores STI	Quantidade
GABINETE	Cedidos	2
	Comissionados s/ vínculo	2
	Subtotal	4
CGGOV	Administradora	1
	Agente Administrativo	1
	Cedidos	4
	Temporários	5
	Missão	1
	Subtotal	12
CGSID	Cedidos	9
	Temporários	10
	Subtotal	19
CGISE	Cedidos	7
	Analista Técnico Administrativo - ATA	5
	Assistente técnico	1
	Temporários	2
	Subtotal	15
CGISP	Cedidos	1
	Temporários	1
	Comissionados s/ vínculo	5
	Subtotal	07
Total Geral de Servidores		57

Tabela 1: Efetivo de Servidores da STI

Entretanto, com vista à gestão de pessoas da STI torna-se relevante não apenas a manutenção do quadro existente de servidores, como também das suas respectivas qualificações, conforme o OETIC 10 – Desenvolver Equipes de TIC com Competências Digitais e Gerenciais. Neste contexto, tais qualificações foram integradas com o PDP do Ministério

mediante o Levantamento de Necessidade de Treinamento encaminhado, anualmente, ao ME.

Assim, no período de vigência deste PDTIC, dentre as ações de capacitação para todos os servidores da STI, destacam-se algumas habilidades a serem aprimoradas ou desenvolvidas para com seus servidores, quais sejam:

- Planejamento de Contratação de TIC baseado nas novas instruções normativas;
- Gerenciamento de Riscos voltados para contratação TIC;
- Gerenciamento de Projetos de TIC;
- Liderança Ágil;
- Governança;
- Segurança de Informação;
- Infraestrutura de TIC;
- Engenharia de Dados;
- *Big Data*;
- *Cloud Computing*;
- Ecossistema Azure;
- Estratégias de Inovação de Processos e Produtos;
- Integração Tecnológica;
- Entendimento Orçamentário sobre a Administração alinhado à TIC;
- Planejamento estratégico, tático e operacional voltado para Administração Pública; e
- Gerenciamento de Banco de Dados;
- Programação;
- Desenvolvimento de Aplicações; e
- Serviços de TIC.

9.2 ATRIBUIÇÕES E NECESSIDADES DE PESSOAL

O Decreto nº 11.348, de 01 de janeiro de 2023, que constituiu a STI na reestruturação do MJSP, estabeleceu um significativo aumento da estrutura de TIC no Ministério. Torna-se,

portanto, primordial o reforço no atual quadro de servidores efetivos da STI em razão desse acréscimo recente da estrutura organizacional e da rotatividade elevada dos servidores.

A instituição do SUSP e a criação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS, pela Lei nº 13.675/2018, teve por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Para isso, a referida Lei prevê a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade. Nesse cenário, o MJSP é definido como o órgão central daquela estrutura e ator fundamental na condução da PNSPDS, ao coordenar a atuação de todos os integrantes operacionais do SUSP (PF, PRF, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, entre outros).

De acordo com a referida lei, são algumas das diretrizes da PNSPDS (Art. 5º):

- V - coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas;
- VII - fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica;
- VIII - sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;
- XI - padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública;
- XXIII - uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos.

A coordenação e a integração entre órgãos e instituições de segurança pública exige a intercomunicação entre dezenas de sistemas e centenas de bancos de dados já existentes, bem como o desenvolvimento de diversas aplicações ou funcionalidades de novos sistemas.

Além disso, para que o SUSP possa ser realmente efetivo, será necessário criar e manter um ambiente de compartilhamento de dados para coletar, manipular, analisar e exibir dados, construindo valor agregado com as análises geradas, por meio da implantação de um *Big Data* no âmbito do MJSP. Nesse contexto, é imperioso que a STI seja estruturada de forma a suportar as demandas de projetos voltados à utilização de tecnologias de *Big Data Analytics*, no Ministério.



Isto porque projetos dessa natureza demandam, além de infraestrutura robusta, especialistas altamente capacitados em diversas áreas da ciência da computação, a exemplo de cibersegurança, da arquitetura de sistemas distribuídos, da arquitetura de dados escaláveis, da otimização de SGBD, do processamento de fluxos contínuos de dados, dentre outras habilidades, todas voltadas à manutenção de ambiente capaz de coletar e processar grandes volumes de dados, estruturados ou não estruturados.

9.3 PROCESSOS CRÍTICOS COM CARÊNCIA DE SERVIDORES

Para fins de avaliação do dimensionamento da força de trabalho, foram identificados 4 (quatro) processos mais críticos da STI, assim considerados aqueles prioritários por demandarem um elevado volume de trabalho: processos (I) e (II) e/ou pela sua criticidade quanto ao impacto nos resultados alcançados: processos (III) e (IV):

- (I) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas;
- (II) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de desenvolvimento de sistemas;
- (III) gestão dos processos de TIC; e
- (IV) compartilhamento de dados e sustentação da Plataforma *Big Data*.

A Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços – CGISE, da STI, é responsável pela fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC (segurança e monitoramento de redes, sistemas operacionais, armazenamento, sistemas de produção, bancos de dados e serviços de telecomunicações), além do atendimento aos usuários dos sistemas de TIC. Nessa área, atualmente, a STI conta com 13 (treze) servidores técnicos efetivos envolvidos com a fiscalização (fiscal requisitante e fiscal técnico) de 25 (vinte e cinco) contratos de TIC, que totalizam um montante de cerca de R\$ 30 (trinta) milhões por ano.

Ademais, do montante em recursos financeiros, a diversidade dos contratos de TIC envolvem as complexidades tecnológicas, da gestão de especialistas, além de lidar com sistemas críticos, que exigem operação ininterrupta (24/7), muitas vezes em regime de urgência/emergência. Os sistemas desenvolvidos e/ou suportados pela STI atendem aos

vários órgãos que integram o MJSP, tais como: SENACON, SENAD, SENASP, SENAJUS, bem como mais de 250 (duzentos e cinquenta) mil profissionais de segurança pública da União, estados e municípios, como policiais federais, civis e militares, guardas municipais, bombeiros, agentes penitenciários e peritos criminais.

A recorrência de eventos e incidentes de segurança indica a necessidade de se reforçar os padrões e os processos de segurança da informação, a fim de proteger o MJSP contra comportamentos hostis. Nesse sentido, há necessidade de reforço e qualificação do pessoal, próprio e terceirizado, com perfil especializado em segurança da informação.

Desde a instauração do CGDI, a integração do compartilhamento de dados, entre Unidades do MJSP e outros órgãos da APF, tem sido facilitada em níveis que superam todos os alcançados anteriormente. Este novo patamar de compartilhamento de dados demandará da área de TIC, do Ministério, uma estrutura de pessoal adequada para processar e atender às solicitações de compartilhamento, em apoio ao referido Comitê.

Tal ação insere-se num contexto mais amplo de adequação da STI, a fim de se possibilitar às áreas de negócio a tomada de decisões orientada a dados (*data driven*), aumentando a efetividade das suas políticas públicas. Esta nova orientação da gestão demandará profissionais com competência para tratamento e análise de dados, além de profissionais para a gestão dos processos de compartilhamento de dados.

9.4 ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DISPONÍVEL DA TIC

Embora não haja limitações para a quantidade de contratos ou sistemas em desenvolvimento que um fiscal/gestor de TIC consiga acompanhar simultaneamente, é preciso evitar que o profissional fique sobrecarregado, de forma a prejudicar a fiscalização/gestão da prestação do serviço pela empresa contratada (fábrica de *software*). Sobre essa questão, manifestou-se o TCU¹ no seguinte sentido:

A qualidade dos serviços prestados pelas contratadas e, por conseguinte, dos sistemas desenvolvidos, reflete de maneira direta no desempenho das organizações, já que os sistemas objeto de desenvolvimento/manutenção dão suporte aos seus processos de trabalho. Nesse sentido, a carência de pessoal capacitado para

¹ CAVALCANTI, A.S. (Ministro-substituto). Auditorias na Gestão de Contratos de TI. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, 2015.

conduzir o processo de gestão contratual, além da falta de estrutura da organização contratante, prejudica sobremaneira a realização de avaliação de qualidade de forma sistemática.

A experiência de gestão/fiscalização de contratos na STI recomenda que a cada gestor/fiscal de TIC seja designado para o acompanhamento simultâneo do desenvolvimento de, no máximo, 3 (três) sistemas (ou contratos) a depender da complexidade.

9.5 AÇÕES DE PESSOAL EM ANDAMENTO

9.5.1 Mestrado Profissionalizante

Termo de Execução Descentralizada – TED entre o MJSP e Universidade de Brasília para a capacitação (mestrado profissionalizante) do corpo de servidores da STI, na área de ciência, engenharia e segurança de dados, de forma que haja especialistas aptos a manterem o projeto de *Big Data* após sua implantação.

9.5.2 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados

Encontra-se em andamento o planejamento para contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em soluções para Arquitetura de Dados e Metadados, *Business Intelligence*, Inteligência Artificial, *Big Data*, Ciência de Dados, Governança e Gestão de Dados para atender às necessidades do MJSP.

9.5.3 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados

Assim como o serviço anterior, também se encontra em processo de contratação de empresa para prestação de serviços de apoio à gestão do compartilhamento de dados, no âmbito do MJSP. Esse serviço tem por objetivo apoiar a STI na formalização, renovação e monitoramento de Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Acesso celebrados entre o MJSP e outros órgãos públicos para o compartilhamento de dados.

9.5.4 Plano de Transformação Digital

O PTD pactuado entre secretarias interministeriais: SE/MJSP, SEME/SG-PR e a SGD/ME em setembro de 2019 e repactuado em outubro de 2020 prevê a alocação de 24 (vinte e quatro) servidores com os seguintes perfis:

Perfil	Qtd	Descrição	Motivação
Governança	3	Profissional capacitado e orientado a entender as necessidades de negócio e buscar as melhores soluções.	É necessário a ampliação dessa capacidade para o atendimento do quantitativo dos serviços previstos para o gerenciamento da integração dos serviços da TI.
Infraestrutura	5	Profissional com alta experiência em otimização de infraestrutura e implantação de processos ITIL.	Com a ampliação dos serviços digitais ofertados, assim como a otimização dos já existentes, é necessário que haja um reforço técnico na área de infraestrutura, de forma a otimizar os ambientes que hospedarão os serviços.
Segurança	3	Profissional com experiência em segurança da informação, e com conhecimentos diversos a respeito dos normativos sobre o tema.	A adaptação de todos os serviços que interagem com o público externo necessitará de uma atenção especial em relação ao atendimento das normas de segurança da informação, em especial à Lei de Proteção de Dados.
Gestor de Projeto	13	Profissional com capacidade para apoiar na gestão e no monitoramento do órgão referente ao portfólio de serviços estabelecido no Plano Digital.	Tendo em vista a dimensão das metas estabelecidas no Plano Digital, será necessário montar uma estratégia de acompanhamento e monitoramento, identificando as necessidades e potencialidades de atuação conjunta com órgãos/entidades, definindo estratégia de abordagem, atores, para implementação da Estratégia de Governo Digital.
TOTAL	24		

Tabela 2: Perfis dos Servidores para execução do Plano de Transformação Digital

Em 2020, foram disponibilizadas pela SGD/ME 5 (cinco) Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – GSISP para serem concedidas, por meio de processo seletivo simplificado, a servidores que fossem atuar de forma dedicada ao Projeto de Transformação Digital do MJSP.

10. PLANO ORÇAMENTÁRIO

O planejamento orçamentário necessário para apoiar tecnologicamente o cumprimento das atribuições da STI está demonstrados nas figuras abaixo extraídas do Painel do Orçamento 2023, que pode ser acessado, por meio do seguinte link:

<https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=4a2671e0-3f1c-479d-9f70-d18dbe488f59&autoAuth=true&ctid=eb090420-444c-43f7-91f2-4b8da6bfe8e1>



Figura 14: Painel Execução por Ação

11. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Segundo o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP, 2ª edição de 2020, o risco pode ser definido como sendo todo “evento futuro e incerto que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos do Ministério”. Adicionalmente, ainda conforme este Manual, considera-se que:

O simples fato de executar alguma atividade abre a possibilidade de ocorrência de eventos ou situações cujas consequências constituem oportunidades para obter vantagens (lado positivo), ou então ameaças ao sucesso (lado negativo).

Eventos são situações em potencial, de origem interna ou externa, que podem provocar impactos positivos ou negativos na consecução dos objetivos da organização. Os eventos negativos são denominados riscos, enquanto os positivos, oportunidades.

Com o objetivo de gerenciar os riscos de maneira simples e objetiva, foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos, inspirado nos processos de gerenciamento de riscos previstos no Guia *PMBOK® - Project Management Body of Knowledge*.

De acordo com este Guia, o Gerenciamento dos Riscos inclui identificar, analisar, planejar respostas e controlar os riscos. Sendo assim, a ideia é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos sobre a execução deste Plano.

11.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Inicialmente, para que os riscos possam ser geridos é primordial identificá-los para que, então, posteriormente, sejam decididos tanto o tipo de resposta quanto o tratamento a serem dados a tais riscos.

Contudo, esta etapa tem por característica não apenas a identificação, como também a documentação dos riscos para que se obtenham como resultado evidências objetivas e fundamentadas. Afinal, é de primordial importância catalogar os possíveis eventos que porventura possam comprometer a capacidade de o MJSP alcançar os resultados propostos em sua estratégia.

11.2 ANÁLISE DOS RISCOS

A segunda etapa para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos foi estimar os Riscos utilizando o método qualitativo.

Esta abordagem consiste em definir a criticidade dos Riscos por meio da avaliação combinada da Probabilidade do Risco ocorrer e da classificação do Impacto que o Risco poderá causar sobre a execução do PDTIC.

Neste método, os componentes dos Riscos são estimados como Alto, Médio e Baixo. Para tanto, foi desenvolvida uma Matriz de Probabilidade x Impacto utilizada para definir a criticidade dos Riscos identificados:

Probabilidade	Impacto	Criticidade
Muito Alta	Insignificante	Médio
Muito Alta	Fraco	Médio
Muito Alta	Moderado	Alto
Muito Alta	Forte	Extremo
Muito Alta	Catastrófico	Extremo
Alta	Insignificante	Baixo
Alta	Fraco	Médio
Alta	Moderado	Alto
Alta	Forte	Extremo
Alta	Catastrófico	Extremo
Média	Insignificante	Baixo
Média	Fraco	Médio
Média	Moderado	Médio
Média	Forte	Alto
Média	Catastrófico	Alto
Baixa	Insignificante	Baixo
Baixa	Fraco	Baixo
Baixa	Moderado	Médio
Baixa	Forte	Médio
Baixa	Catastrófico	Médio
Muito Baixa	Insignificante	Baixo
Muito Baixa	Fraco	Baixo
Muito Baixa	Moderado	Baixo
Muito Baixa	Forte	Baixo
Muito Baixa	Catastrófico	Médio

Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto

A escala apresentada no quadro abaixo reflete os limites de exposição aceitáveis, ou seja, a tolerância ao risco.

Probabilidade	Impacto	Classificação
Muito Alta	Insignificante	RM (Risco Médio)
Muito Alta	Fraco	RM (Risco Médio)
Muito Alta	Moderado	RA (Risco Alto)
Muito Alta	Forte	RE (Risco Extremo)
Muito Alta	Catastrófico	RE (Risco Extremo)
Alta	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Alta	Fraco	RM (Risco Médio)
Alta	Moderado	RA (Risco Alto)
Alta	Forte	RE (Risco Extremo)
Alta	Catastrófico	RE (Risco Extremo)
Média	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Média	Fraco	RM (Risco Médio)
Média	Moderado	RM (Risco Médio)
Média	Forte	RA (Risco Alto)
Média	Catastrófico	RA (Risco Alto)
Baixa	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Baixa	Fraco	RB (Risco Baixo)
Baixa	Moderado	RM (Risco Médio)
Baixa	Forte	RM (Risco Médio)
Baixa	Catastrófico	RM (Risco Médio)
Muito Baixa	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Fraco	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Moderado	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Forte	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Catastrófico	RM (Risco Médio)

Tabela 4: Escala para Classificação de Níveis de Risco

11.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS RISCOS

Após identificar e priorizar os Riscos, foi definida uma estratégia de tratamento e resposta aos Riscos negativos, visando trazer os níveis de risco para patamares aceitáveis. Foram consideradas as seguintes medidas para o tratamento dos Riscos negativos identificados:

Tipo de Tratamento do Risco	Resposta ao Risco
Evitar	Sugere que nenhuma opção de resposta tenha sido identificada para reduzir o impacto e a probabilidade a um nível aceitável. Significa descontinuação das atividades que geram o risco, ou seja, não executar, interromper ou substituir a atividade que gera o risco.
Reduzir	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Serão adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.
Transferir ou Compartilhar	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Sugere-se a redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco com as partes interessadas ou envolvidas.
Aceitar	Indica que o risco inerente já esteja dentro das tolerâncias ao risco. Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Tabela 5: Respostas aos Riscos

Por conseguinte, o trabalho realizado não se limita apenas naquele Guia supracitado, como, também, está baseado na estrutura do COSO ERM, na Norma Internacional ISO 31000/2009 e nas boas práticas adotadas no setor público. E, sempre que necessário, será revisto e alinhado ao Modelo proposto, nas revisões futuras deste PDTIC.

Diante do exposto, tem-se que o Plano de Gestão de Riscos foi revisto e alinhado ao Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP – extraído por meio do sistema AGIR. Complementarmente, de maneira sintética, tal Plano pode ser mais bem visualizado mediante o Quadro 6: Plano de Gestão de Riscos, abaixo relacionado.

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
1	a. Falta de recursos humanos para a execução do PDTIC b. Mudanças frequentes no cenário político ou na legislação vigente c. Falta de priorização do processo de contratação junto às áreas competentes d. Descumprimento da ordem de priorização definida e. Alta suscetibilidade do processo licitatório a impugnação, questionamento, judicialização	Atraso na execução das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Legal	RE (Risco Extremo)	Alta	Forte	Extremo	a. Não execução de todas as necessidades do PDTIC b. Prejuízo na execução dos projetos estratégicos c. Atraso do processo licitatório	Reduzir	Revisar semestralmente o PDTIC para adequar ao novo cenário político ou novas regras legais	STI	25/06/2021 - 31/12/2022
										Construção de fluxo de acompanhamento de todos os processos licitatórios referentes ao PDTIC		01/07/2021 - 30/11/2021
										Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade orçamentária		25/06/2021 - 15/12/2022
										Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de recursos humanos capacitados		25/06/2021 - 15/12/2022

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
2	a. Falta de recursos humanos para o monitoramento do PDTIG b. Ausência de repasse de conhecimento adequado acerca do monitoramento do PDTIC c. Comunicação ineficiente entre a STI e as áreas de negócio	Monitoramento inadequado das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Operacional	RM (Risco Médio)	Média	Moderado	Médio	a. Gestão ineficiente do monitoramento do PDTIC b. Não atingimento das metas do PDTIC	Reduzir	Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de pessoal	STI	25/06/2021 - 15/12/2022
										Implantar ferramenta de gestão de atividades e/ou projetos para melhorar o monitoramento das necessidades do PDTIC	STI	01/10/2021 - 29/10/2021
										Estabelecer pontos focais para comunicação com as áreas para que ela seja mais eficiente e transparente	CGISP	01/07/2021 - 31/12/2022
										Solicitar cursos de capacitação referentes à elaboração de PDTIC	STI	01/07/2021 - 15/12/2022

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
3	a. Desconhecimento e/ou não aplicação das regras de priorização e/ou atendimento b. Determinação superior fora do fluxo previsto c. Falta de alinhamento entre as unidades do ministério e a STI	Desobediência às regras de priorização e/ou atendimento	Risco Operacional	RE (Risco Extremo)	Alta	Forte	Extremo	a. Não execução da ordem de prioridade e/ou atendimento estabelecida b. Desestímulo ao processo de elaboração e revisão do PDTIC	Reduzir	Incluir na portaria 86 a designação por função dos representantes do CGDSIC	STI	12/03/2021 - 30/11/2021
										Endomarketing - divulgação e capacitação sobre o funcionamento do PDTIC		01/07/2021 - 06/06/2023
										Instituição de sistemática de editais periódicos que preveem a ordem de execução das necessidades do PDTIC		01/07/2021 - 31/05/2023

Tabela 6: Plano de Gestão de Riscos



12. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Segundo o Guia do PDTIC do SISP, o monitoramento, no âmbito do acompanhamento do PDTIC, pode ser considerado como uma atividade constante e sistemática de coleta de informações a respeito do desempenho da execução do PDTIC. Logo, a identificação não somente de possíveis desvios das ações programadas assim como a colaboração para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões também estão compreendidas nesse contexto.

Cabe à DPN a responsabilidade de monitorar a execução do PDTIC, acompanhando a implementação das Ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos do Ministério.

Avalia-se que, desta forma, seja maximizada a possibilidade de alcance das metas planejadas com maior eficácia.



Além disso, visando apoiar a verificação pela gestão da STI acerca do monitoramento do PDTIC, foram desenvolvidos painéis de controle (*dashboards*), no qual a gestão pode verificar o progresso das suas ações. Ou seja, se de fato estão evoluindo conforme o planejado o que facilita o processo de análise e a respectiva tomada de decisão.

Para construção dos referidos painéis, foram utilizados – como fonte – dados da ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC. Tais painéis foram elaborados utilizando o *Power BI*, da Microsoft, com integração direta à base de dados do *Redmine*.

Com o intuito da obtenção de informações gerenciais sobre o status das Necessidades de TIC (Atendida, Cancelada, Aguardando Atendimento, Em Execução) são fornecidas por intermédio dos respectivos painéis, conforme evidenciados de maneira sucinta no ANEXO I. Necessidades de TIC.



13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MJSP por meio da atuação efetiva da STI tem direcionado esforços incessantes no aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC.

Este PDTIC tem por propósito não somente transparecer a alocação dos investimentos em TIC, no período de vigência 2021-2023, como também de propiciar a melhoria contínua dos serviços prestados a todas as Unidades abrangidas pelo Ministério juntamente com o aperfeiçoamento dos serviços digitais aos cidadãos.

Portanto, espera-se com este plano tático a possibilidade de realização de um planejamento dos recursos cada vez mais integrado e em constante evolução, não só com as estratégias tecnológicas como também as institucionais.

14.REFERÊNCIAS E NORMATIVOS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **NBR 6023**: Informação e documentação: Referências – Elaboração, 2018. **NBR 10520**: Informação e documentação: Citações em documentos – Apresentação, 1993.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 7579, de 11 de outubro de 2011**. Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISF, do Poder Executivo Federal, Brasília, 2011.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 10.230, de 5 de fevereiro de 2020**. Altera o Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF, do Poder Executivo Federal, Brasília, 2020.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018**. Dispõe sobre a execução indireta de serviços da administração pública federal, Brasília, 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 10.183, de 20 de dezembro de 2019**. Altera o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, Brasília, 2019.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018**. Institui a Política Nacional de Segurança da Informação e dispõe sobre a governança da segurança da informação, Brasília, 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 10.641, de 2 de março de 2021**. Altera o Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera o , que regulamenta o disposto no art. 24, caput , inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança nacional, Brasília, 2021.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019**. Institui o Plano Nacional de Internet das Coisas, Brasília, 2019.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020**. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, Brasília, 2020.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 11.260, de 22 de novembro de 2022**. Dispõe sobre a elaboração e o encaminhamento da Estratégia Nacional de Governo Digital e prorroga o período de vigência da Estratégia de Governo Digital, instituída pelo Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, Brasília, 2022.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.319, de 21 de março de 2018**. Institui o Sistema Nacional para a Transformação Digital e estabelece a estrutura de

governança para a implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI. **Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0**, dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de TIC, Brasília: MP/SLTI, 2016.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI. **Instrução normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014**. Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de TIC pelos órgãos integrantes do SISP do Poder Executivo Federal. Modificada pela Instrução normativa nº 2, de 12 de janeiro de 2015.

BRASIL. Ministério da Economia – ME. Secretaria de Governo Digital – SGD. **Instrução normativa nº 94, de 23 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP, 2ª edição de 2020**. Disponível em <<https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/Gestao-de-Riscos/biblioteca/Manual/manual-de-gerenciamento-de-riscos-mjsp-2021.pdf/view>>. Acesso em: jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Plano de Transformação Digital**. Justiça e Segurança Pública. Plano pactuado entre o MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME. Visa oferecer maior facilidade e simplificação para o acesso, a solicitação e o acompanhamento de serviços ao cidadão. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/plano-transformacao-digital/@@template_plano_transformacao_digital>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 86, de 23 de março de 2020**. Institui o Sistema de Governança do MJSP e da Fundação Nacional do Índio. Disponível em <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/322>>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia – ME. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Secretaria de Governo Digital. **Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao SISP. Disponível em <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70268218/do1-2019-04-05-portaria-n-778-de-4-de-abril-de-2019-70268126>. Acesso em: jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 895, de 19 de dezembro de 2019**. Aprova o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 2020-2023. Disponível em <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/2794>>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 1.162, de 8 de setembro de 2020**. Institui o Grupo de Trabalho de elaboração do PDTIC 2021-2023.

Disponível em <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/pdtic/normativos/portaria_gt_pdtic-2021-2023.pdf>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 2, de 28 de janeiro de 2022**. Institui o Sistema de Governança do MJSP. Disponível em <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/planejamento-estrategico-2020-2023/pdfs-planejamento-estrategico-20-23/portaria-gm-no-2-de-28-de-janeiro-de-2022-sei_mj-16851098-portaria-do-ministro.pdf>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. **Portaria SLTI/MP nº 92, de 24 de dezembro de 2014** (Atualizada pela **Portaria nº 41, de 3 de Setembro de 2019**). Institui a arquitetura ePING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) para interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico. Disponível em <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=50&data=26/12/2014>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 1, de 28 de março de 2022**. Institui o Regimento Interno do CGDSIC/MJSP. Disponível em <<https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/cgdsic/normativo-designacao-membros/resolucao-cgdsic-no-1-de-28-de-marco-de-2022-regimento-cgdsic.pdf/view>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 2, de 28 de março de 2022**. Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de revisar e monitorar o PDTIC 2021-2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/pdtic/normativos/resolucao-cgdsic-no-2-de-28-de-marco-de-2022-gt-pdtic-revisao-e-monitoramento.pdf/view>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 4, de 18 de julho de 2018**. Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos no âmbito do Ministério da Justiça. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/Gestao-deRiscos/biblioteca/Resolucoes_CGE/bs_n__127__de_18_de_julho_de_2018-somente-a-parte-da-girc.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 9, de 10 de março de 2020**. Altera o conteúdo do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2020/resolucao-cge-no-9-de-10-de-marco-de-2020_v1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 10, de 25 de agosto de 2020**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2020/resolucao-cge-no-10-de-25-de-agosto-de-2020_v1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 11, de 30 de setembro de 2020**. Altera o conteúdo da cadeia de valor do Planejamento Estratégico

2020-2023. Disponível em: < https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2020/resolucao-cge-no-11-de-30-de-setembro-de-2020_v1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 12, de 15 de março de 2021**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: < https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2021/resolucao-cge-no-12-de-15-de-marco-de-2021_v1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 13, de 20 de julho de 2021**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: < https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2021/resolucao-cge-no-13-de-20-de-julho-de-2021_v1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 14, de 24 de novembro de 2021**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: < https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2021/resolucao-cge-no-14-de-24-de-novembro-de-2021_v-1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução SE/MJSP nº 15, de 29 de dezembro de 2021**. Altera o conteúdo da Carteira de Políticas Públicas do MJSP. Disponível em: < <https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2021/resolucao-cge-no-15-de-29-de-dezembro-de-2021.pdf/view>>. Acessado em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 16, de 7 de abril de 2022**. Altera o conteúdo de projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: < https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2022/resolucao-cge-no-16-de-7-de-abril-de-2022_v-1.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 17, de 15 de julho de 2022**. Aprovar, na forma do anexo a esta Resolução, a Norma de Segurança da Informação e Comunicação para a Prevenção contra a Perda de Dados Digitais no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. Disponível em: < <https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca/cge/resolucoes/2022/resolucao-cge-no-17-de-15-de-julho-de-2022.pdf/view>>. Acesso em: jun. 2023.

CAVALCANTI, A.S. (Ministro-substituto). **Auditorias na Gestão de Contratos de TI**. Brasília: Tribunal de Contas da União, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, 2015. Disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A250D20C480150F29AC0BE34A6>>. Acesso em: abr. 2022.

PROJECT Management Body of Knowledge – **PMBOK, 7ª edição**. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Project Management Institute, Inc. – PMI, 2021.

ANEXOS


I. NECESSIDADES DE TIC

Este Anexo traz informações gráficas acerca do Monitoramento do PDTIC. Sendo assim, é possível verificar todas as demandas, que foram cadastradas na ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC, bem como seus respectivos *status*, tais como: Pendente de Inclusão, Aguardando Atendimento, Em Execução, Atendida e Cancelada).

O Painel de Monitoramento pode ser acessado, por meio do seguinte link: <https://app.powerbi.com/groups/me/apps/bea2a50e-44ae-42ef-adb1-d359119492b2/reports/fb8b3dc4-d972-4c09-9116-ad7aaef51371/ReportSection5c9df49f4c74c226c60e?experience=power-bi>

Priorização das Necessidades

Necessidades por Unidade/Subunidade

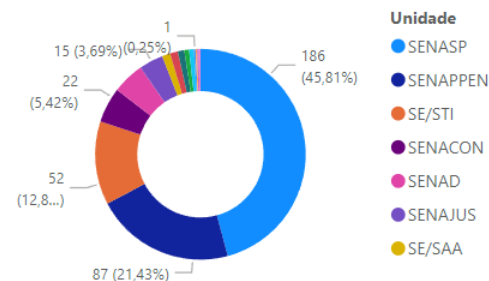

Necessidades por Subtipo



Usa Recursos da STI/SE

- ☐ Não
- ☐ Sim

Execução pela STI/SE

- ☐ Não
- ☐ Sim


Projeto estratégico vinculado

- ☐ 01 - Fortalecimento do Arquivo Nacional digital
- ☐ 17 - Dinamização da plataforma Consumidor.gov.br, com foco na...
- ☐ 1B - Maximização da geração de vagas em unidades prisionais
- ☐ 1P - Alienação de ativos em todo o Brasil - Edição 2022
- ☐ 1U - ComprasSUSP - Estratégia de Compra Nacional do Sistema ...
- ☐ 1X - Segurança da informação e privacidade
- ☐ 50 - Disponibilização do sistema Recall.gov.br

Necessidades

406

Situação



Código	Unidade	Área	Objetivo estratégico	Projeto estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtde.	*	Prioridade Atual	Prioridade Prevista	STI
N5077	AECI	CGCITIR	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores	13		404	404	Sim
N4685	AECI	CGCITIR	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Aquisição de licenças ChatPDF	04		296	296	Sim
N4613	AECI	CGCITIR	OE11	PE59	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento do Sistema Agir			1	1	Sim
N4817	AECI	CGCITIR	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Implementação do Sistema AGIR em Dispositivos Móveis (Android e iOS)			30	30	Sim
N0006	AN	COAD	OE08	PE01	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN	1		12	12	Sim
N0385	COGER	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	1		39	39	Sim
N4405	CONJUR	DIADM	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Desenvolvimento do Portal CONJUR			364	364	Sim
N4641	GM	ASCOM	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	"TAP: Automatização dos questionamentos à imprensa"	1		371	371	Sim

Figura 15: Painel por Priorização

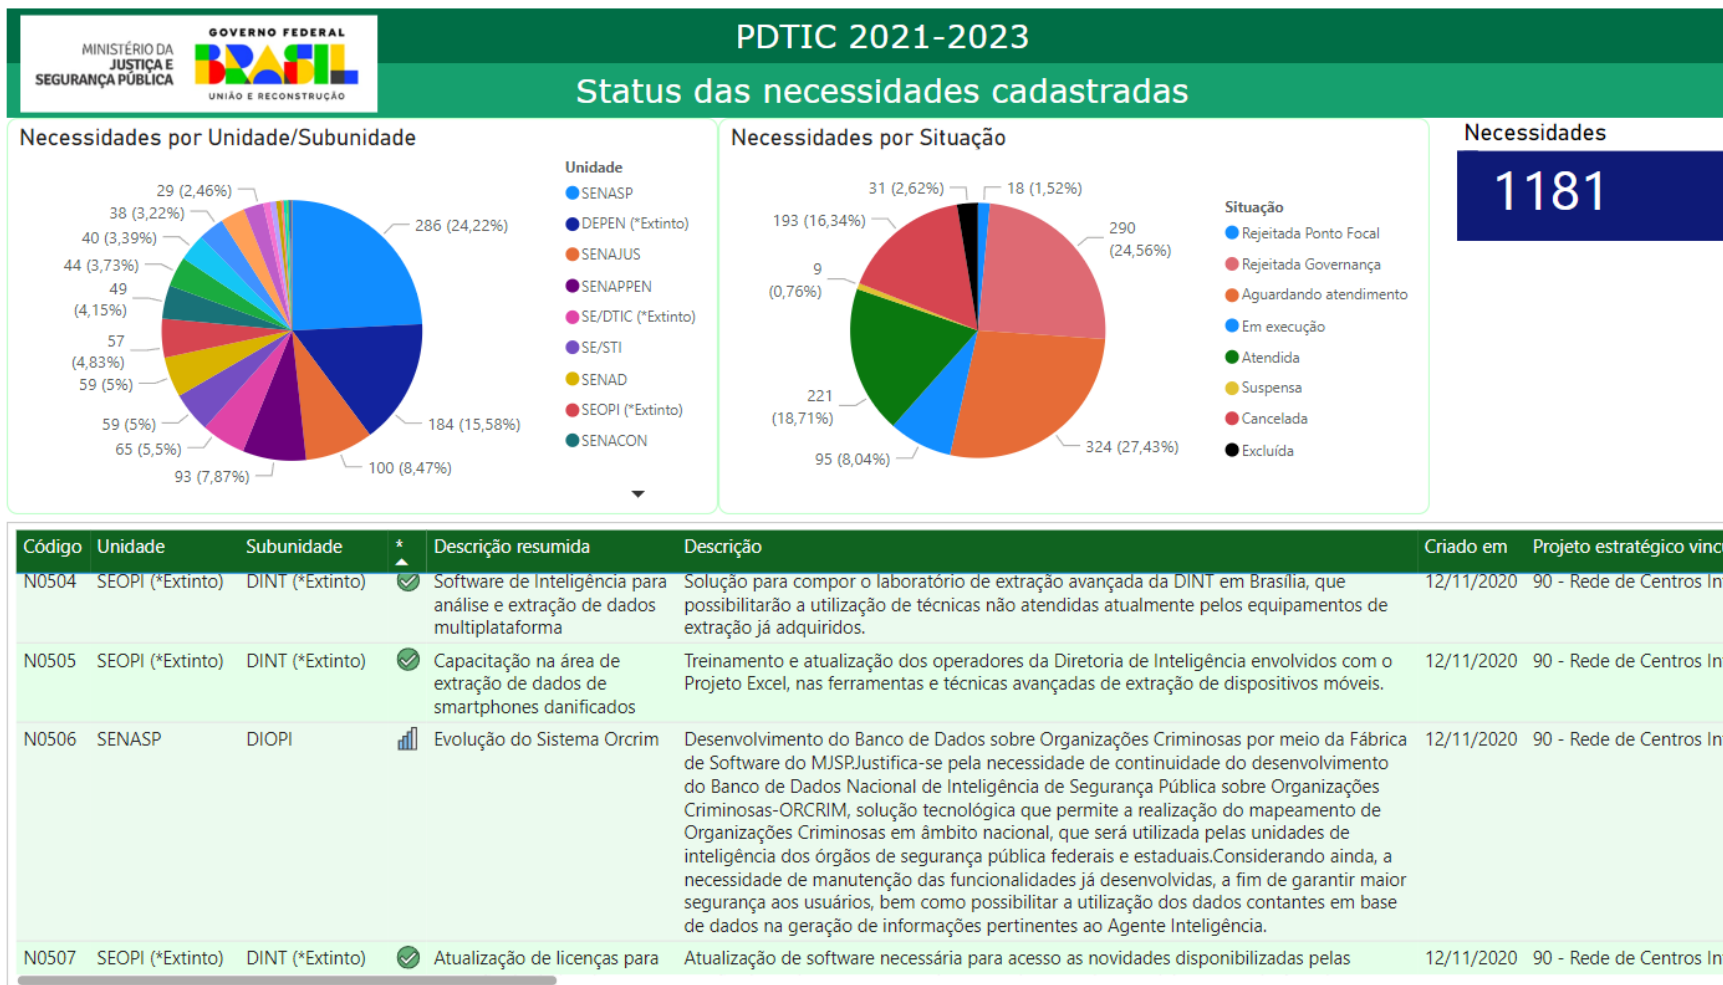


Figura 16: Painel por Status da Necessidade

II. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC

Este Anexo reúne a relação completa sobre o Inventário das Necessidades de TIC obtidas não só pelo trabalho de elaboração, como, ainda, principalmente, da revisão deste PDTIC 2021-2023. Atualização está ocorrida durante o processo de levantamento de Necessidades de TIC, no âmbito do Ministério, por meio de formulário disponibilizado no ferramental de Gestão e Monitoramento de TIC.

Código	Unidade	Área	Objetivo estratégico	Projeto estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtde.	Prioridade Atual	Prioridade Prevista
N0006	AN	COAD	OE08	PE01	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN	1	12	12
N0010	SENASP	DEP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de software de análise de similaridade textual	1	145	145
N0154	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Software para gerenciamento de biblioteca	1	142	142
N0155	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de gerenciamento de consultas e	5	323	323

							de estoque de medicamentos			
N0158	SENA CON	CNCP	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Criação de um Canal de Denúncias do CNCP	1	72	72
N0160	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	SINESP Big Data - desenvolvimento	1	41	41
N0161	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Infoseg - desenvolvimento	1	125	125
N0164	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	Portal SINESP	1	49	49
N0165	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	SINESP DW Análise	1	126	126
N0168	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SINESP - Replicação da base de dados	1	127	127
N0170	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktop com 2 monitores	1100	324	324
N0172	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	1100	325	325

N0175	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP PPE - Sistema de Boletim Eletrônico	1	234	234
N0176	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Segurança	1	128	128
N0177	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Auditoria	1	34	34
N0178	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Integração	1	238	238
N0179	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Cidadão	1	99	99
N0180	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Rede SINESP	1	239	239
N0182	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	SINESP Delegacia Virtual	1	235	235
N0183	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SINESP SAIE	1	100	100
N0184	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP VDE	1	101	101
N0185	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Agente de Campo	1	50	50
N0193	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP CAD	1	129	129
N0197	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Identidades Funcionais Digital	1	11	11

N0202	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do MJSP	1	130	130
N0218	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Prezi	1	326	326
N0221	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença AutoCAD 2019	3	327	327
N0222	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença CorelDRAW 2020	3	328	328
N0226	SENASP	DSUSP	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do sistema DESARMA	1	21	21
N0238	SENASP	DSUSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidores (Equipamento de TI)	54	157	157
N0247	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do SINESP	1	131	131
N0259	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação de servidores que atuam na área de Segurança da Informação	1	143	143
N0261	SE/STI	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Indicadores e controles de monitoramento contínuo de Segurança da	1	144	144

							Informação e Comunicação			
N0268	SE/STI	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Ferramenta para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	1	240	240
N0271	SE/STI	DPDC	OE06	PE50	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Internalização do Sistema de Recall	0	40	40
N0280	SE/SAA	CGGP	OE09	PE64	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema Competências	1	5	5
N0300	SE/STI	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras	10	329	329
N0312	SE/STI	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional	100	330	330
N0316	SE/STI	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional - taxa de ativação	100	331	331
N0320	SE/STI	DSUSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	8700	332	332
N0343	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do sistema SIMAP	1	18	18
N0345	SAJU	DIPROJU	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para cadastro de entidades sociais (OSCIPI)	1	17	17

N0355	SENAPPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	5	333	333
N0385	COGER	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	1	39	39
N0408	SENAD	DPAGI	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias	1	241	241
N0409	SENAPPEN	DIREX	OE04	PE1B	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de monitoramento das obras prisionais	1	76	76
N0414	SENASP	DGFNSP	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo (FaF)	1	105	105
N0417	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Software para gerenciamento de materiais	1	334	334
N0418	SENAPPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Central Telefônica de aparelhos	1	335	335
N0425	SENAPPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	15	336	336
N0426	SENAPPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de software	Extrator de dados em aparelhos de telefonia móvel	6	158	158
N0429	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamentos de infraestrutura	20	74	74

							hiperconvergente			
N0437	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Switches de acesso e de equipamentos de rede sem fio	100	107	107
N0438	SENAPPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de rede	27	159	159
N0448	SE/STI	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Solução de armazenamento de dados em storages de rede (NAS/Object Storage) e de backup de dados	8	102	102
N0479	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores do tipo Servidores	6	160	160
N0480	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de VideoWall	28	161	161
N0502	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Software de extração de dados em dispositivos móveis com licença de uso perpétua	10	162	162
N0503	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Software capaz de analisar inúmeras extrações ao mesmo tempo	10	163	163
N0506	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou	Evolução do Sistema Orcrim	1	4	4

						aplicativo móvel já existente				
N0530	SENASP	DGFNSP	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo (SEMOB)	1	19	19
N0554	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	60	242	242
N0555	SENASP	DGFNSP	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil do Banco do Brasil	1	63	63
N0559	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Monitoramento por áudio	1	337	337
N0563	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP e seus terminais	1	338	338
N0565	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Injetores POE para alimentação elétrica de todos os VoIPs	500	339	339
N0572	SENASP	DGFNSP	OE03	PE1U	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução para gerenciar os processos licitatórios	1	20	20
N0574	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	30	243	243

N0577	SENAPPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	210	340	340
N0586	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de impressão (outsourcing) de abrangência nacional		109	109
N0587	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e Internet		113	113
N0591	SENASP	DIOPI	OE03	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador tipo workstation	10	164	164
N0592	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Serviços de TIC	Créditos para uso no sistema premium ou contrato anual ilimitado de uso	10	167	167
N0594	SENASP	DIOPI	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de software	Ferramenta para pesquisa cruzada de dados globais da internet, facilitando consulta a endereço de e-mail, perfis sociais e contatos telefônicos.	8	166	166
N0595	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	15	165	165

N0596	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Solução para extração de dados em HDs e Memórias defeituosas	9	156	156
N0599	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Solução de extração de dados para computador de bordo veicular	10	118	118
N0600	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução de inteligência para parlatórios	5	146	146
N1253	SENAPPEN	COGER/S ENAPPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	54	244	244
N1255	SENAPPEN	COGER/S ENAPPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras Multifuncional	27	245	245
N1257	SENAPPEN	COGER/S ENAPPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	16	246	246
N1259	SENAPPEN	GABSEC	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	20	247	247
N1261	SENAPPEN	AGRAE	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	2	248	248
N1265	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de Software de Engenharia	200	249	249
N1273	SENAPPEN	ENASP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1	250	250
N1277	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	2	251	251
N1285	SENAPPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	10	252	252
N1289	SENAPPEN	ONASP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	2	253	253
N1291	SENAPPEN	ONASP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Desktop	1	254	254
N1293	SENAPPEN	ONASP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	2	255	255
N1301	SENAPPEN	AGRAE	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1	256	256

N1303	SENAPPEN	GABSEC	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	5	257	257
N1359	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	3	258	258
N1395	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Atualização de Software Dctective e ClearID - CGCCO	30	168	168
N1399	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	106	169	169
N1403	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação de Softwares - Cellebrite - CGCCO	47	170	170
N1407	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Infraestrutura de dados para videowall - CICCE	12	171	171
N1409	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software - Pacote Office - CGCCO	762	172	172
N1411	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Licença Qlik Sense	50	173	173
N1425	SENASP	DSUSP	OE03	PE96	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	1	73	73
N1427	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de dados para uso dos Centros Integrados de Operações de Fronteira - CGFRON	1	174	174

N1431	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física - CGCCO	47	175	175
N1439	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software blockchain-darkweb-copiar sites - CGCCO	5	176	176
N1441	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software Antivírus - CGCCO	20	177	177
N1447	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação Ethical Hacking - CGCCO	120	178	178
N1449	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software edição de PDF - CGCCO.	762	179	179
N1451	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para análise de criptoativos - CGCCO	2	180	180
N1455	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software extração dispositivos moveis - CGCCO	20	181	181
N1457	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software extração de dados diversos - CGCCO	60	182	182
N1459	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para extração dados veículos - CGCCO	10	183	183

N1465	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para análise de dispositivos - roteadores e outros - CGCCO	32	184	184
N1469	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para classificação de entidades - CGCCO	20	185	185
N1473	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para produção de inteligência em dados de fontes abertas - CGCCO	547	186	186
N1475	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software pesquisa de domínios - CGCCO	20	187	187
N1479	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software Spiderfood e Recon NG - CGCCO	20	188	188
N1481	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software SINAC - CGCCO	20	189	189
N1483	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software SAS INVESTIGATION - CGCCO	30	190	190
N1485	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Telefones via satélite - CGFRON	100	191	191
N1487	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Solução de Melhoramento de Imagem e	30	192	192

							Som - Dtective e ClearID - CGCCO			
N1489	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Softwares para análise de vínculos - IBM - CGCCO	20	193	193
N1509	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Software para gerenciamento de acervo e normativos	1	259	259
N1551	SENASP	DSUSP	OE01	PE93	Contratação	Licença e uso de software	Software e licenças	1	66	66
N1589	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de software e Serviço de TIC	Implantação do ambiente em nuvem (software I2)	1	194	194
N1603	SENASP	DSUSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	1500	341	341
N1607	SENASP	DSUSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Scanners 3D	28	195	195
N1609	SENASP	DSUSP	OE01	PE93	Contratação	Serviços de TIC	Solução Integrated Ballistics Identification System -IBIS da Ultra Forensic Technology	37	67	67
N1611	SENASP	DSUSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Rastreador Veicular	2000	342	342
N1641	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Links de Internet via Satélite	2000	343	343
N1645	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Scanners	300	344	344

N1669	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - Notebook - CGCCO	354	196	196
N1671	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - Workstation - CGCCO	408	197	197
N1673	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - Servidores - CGCCO	02	198	198
N1675	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Monitores - CGCCO	80	199	199
N1677	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Impressoras - CGCCO	60	200	200
N2263	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Migrante-WEB	1	7	7
N2271	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sisconare	1	2	2
N2289	SENASP	DEP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Ead-Gestão Acadêmica	1	13	13
N2293	SENASP	DFNSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Intranet Força Nacional	1	14	14
N2297	SENAPPEN	DIPEN	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SIAPEN	1	15	15

N2301	SAJU	DIPROJU	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Classind	1	24	24
N2305	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SIGAP	1	3	3
N2309	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sisexp	1	16	16
N2317	SENASP	DSUSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sindna	1	6	6
N2325	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Blockchain CPF e CNPJ		57	57
N2329	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Carga de Dados e API CEP	1	44	44
N2337	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados	Carga de Dados da Tabela FIPE		58	58

						(desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics				
N2349	SENAACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Disponibilização dados Moodle CENDC	1	59	59
N2353	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Carga de dados e API de Expulsos		60	60
N2373	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Carga de Dados e API CGU		61	61
N2377	SE/SAA	CGDS	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (analytics)	Solução de videoconferência com integração com Teams	1	139	139

N2385	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas	1	33	33
N2389	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Telefonia Fixa Comutada	6	345	345
N2391	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Infraestrutura em Nuvem	1	319	319
N2393	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Serviço de Segurança em Nuvem	1	320	320
N2395	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Integração da base de boletins de ocorrência de desaparecidos com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas	1	51	51
N2403	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	600	260	260
N2405	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Dock Station	600	103	103
N2407	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores LED FHD Widescreen	1200	261	261
N2413	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Solução de gerenciamento e de gravação de áudio	7	147	147
N2419	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Software de ampliação digital biométrica	2	262	262
N2421	SENAPPEN	ENASP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Software para edição de vídeo	1	263	263

N2427	SENAPPEN	AGRAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de Software Canva Pro	1	264	264
N2449	SENAPPEN	DIPEN	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Link de Acesso à Internet	1	321	321
N2451	SENAPPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	995	265	265
N2453	SENASP	DIOPI	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini-Desktop com dois monitores - CGPOP-VETUS	103	346	346
N2459	SENASP	DIOPI	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Videowall - CGCICCN - Nova sede	64	347	347
N2473	SENASP	DIOPI	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema completo de videoconferência - CGCICCN - Nova sede	3	348	348
N2477	SENASP	DIOPI	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistemas de Firewall - CGFRON	28	201	201
N2479	SENASP	DIOPI	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Videoconferência - DIOP	10	349	349
N2483	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP (Centro Integrado de Inteligência de	1	75	75

							Segurança Pública)			
N2513	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Switches	44	141	141
N2515	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Painéis sistema Competências	4	45	45
N2527	SE/STI	COAT	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Construção de Painéis de Bases estratégicas		202	202
N2539	SENAD	DPAGI	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de acompanhamento da execução financeira e orçamentária	1	119	119
N2593	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Cortex – Desenvolvimento do módulo App Mobile	1	31	31
N2639	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados	RENAVAM - Adaptação API Cortex		62	62

						(desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics				
N2641	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	SINDEC Nacional - Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP	1	46	46
N2649	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	TSE - integração de API - (Gateway de API)		65	65
N2699	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Internalização da plataforma DATAMIGRA		104	104
N3317	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	1500	114	114
N3319	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	1000	111	111
N3325	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Memória RAM para workstation - 16 GB	64	203	203
N3327	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Memória RAM para workstation - 32 GB	12	204	204

N3329	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de software	Software de Geoprocessamento Tipo 1	21	205	205
N3331	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de software	Software de Geoprocessamento Tipo 2	105	206	206
N3333	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de software	Solução de Análise e Mineração de dados na web	6	124	124
N3337	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de software	Solução para Reconhecimento de Padrões em Bases Abertas	10	207	207
N3339	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Tipo Desktop	50	208	208
N3341	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook - 16GB	40	209	209
N3345	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Licenças perpétuas de software para recuperação de informações em Macbooks	6	210	210
N3355	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Suíte de Aplicativos para edição de Documentos em Nuvem Privada	900	211	211
N3399	SE/STI	CGSID	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Gestão de Criminalística	1	22	22

N3409	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora Multifuncional	8	212	212
N3857	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Processamento e Armazenamento de Dados Multicloud	1	120	120
N3859	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Certificação do SANS Institute		350	350
N3861	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Certificação de servidores DTIC em gestão e gerenciamento de projetos		351	351
N3863	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Certificação de servidores DTIC em DPO (Data Protection Officer)		352	352
N3865	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Certificação de servidores da DTIC no International Information System Security Certification Consortium - (ISC) ²		353	353
N3867	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Certificação de servidores DTIC em normas e padrões		354	354

							internacionais relacionados a Segurança da Informação			
N3869	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Certificação Internacional Council of E-Commerce Consultants (Ethical Hacker)		355	355
N3871	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Operacionalização do TED de Ciência e Engenharia de Dados		266	266
N3875	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento do SISDEN [Dev Lowcode]	1	267	267
N3877	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento do Chatbot CórTEX [Dev Lowcode]	1	56	56
N3879	SE/STI	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Solução para coleta, processamento, análise e acompanhamento de dados	1	213	213
N3881	SE/STI	DSUSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Solução tecnológica, hardware e software, para captura de dados	27	268	268

							biométricos, correlação e análise, visando integração das informações referentes a identificação civil e criminal.			
N3883	SENASP	DSUSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Workstation	540	269	269
N3885	SENASP	DSUSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Extrator de Dados de Dispositivos Móveis	27	270	270
N3887	SENASP	DSUSP	OE03	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Sistema de Gestão de Projetos	1	271	271
N3889	SENASP	DSUSP	OE01	PE93	Contratação	Equipamentos de TIC	Microscópio para realização dos exames de microcomparação balística, com integração para possibilitar comunicação entre diferentes laboratórios	27	25	25
N4029	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	ATIC-PV - leitor biométrico com RFID	20	272	272
N4035	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Solução Controlador de acesso	10	273	273

N4039	SENACON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de metodologia e implementação da ferramenta de acompanhamento da efetividade dos Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, no âmbito dos fornecedores dos serviços regulados pelo Poder Executivo Federal		112	112
N4043	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de Controle de acesso facial	15	274	274
N4045	SENASP	DIOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Base Central de Dados de Gestão Estratégica SEOPI		356	356
N4047	SENAJUS	GAB-SENAJUS	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados	Desenvolvimento de BI e API a partir do Sistema Classind	1	275	275

						(desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics				
N4049	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Pessoas		276	276
N4069	SAJU	DIPROJU	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Internalizar e manter o Sistema de Informações de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (SISETP)	1	277	277
N4071	SENASP	DSUSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet - Dispositivo Digital de captura de impressões digitais	27	121	121
N4073	SENASP	DSUSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet - Equipamento multiespectral para detecção de resíduos biológicos	28	122	122
N4075	SENASP	DSUSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Microscópio óptico para captura de imagem para o processamento de amostras questionadas	25	123	123

							dos Laboratórios de DNA Forense (Hardware e software)			
N4099	SENASP	DSUSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Entrega Voluntária de Armas de Fogo	1	148	148
N4101	SE/SPO	CGGE	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Canva PRO	20	357	357
N4111	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de controle de acesso	1	358	358
N4119	SENAPPEN	GABSEC	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de Uso de Banco de Imagens	1	278	278
N4121	SENAD	GAB-SENAD	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablets	10	214	214
N4125	SENASP	DGI	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Desktop com 2 monitores	1100	236	236
N4133	SENASP	DGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Sinesp Geo inteligência		237	237
N4135	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Software PIX4Dmapper	01	359	359
N4157	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet 10,1'	402	360	360
N4159	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Internet Satelital Móvel	20	361	361
N4183	SE/GAB	CODAP	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema de autenticação e		23	23

							autorização de usuários			
N4307	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento do SIGAP 2.0 (Antigo GFUNAD)		64	64
N4309	SENASP	DGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Carteiras de Identidades Funcionais Digitais (mobile /APP)	1	10	10
N4313	SENASP	DIOPI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Veículo Conectado ao serviço de emergência do Brasil		48	48
N4319	SENASP	DIOPI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Veículo Clonado		43	43
N4325	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): DW Análise, Integração/Barramento/Placas Vinculadas/Dados Corporativos; Rede Sinesp	1	32	32
N4327	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): CAD 2.0, CAD 3.0 e	1	36	36

							Devir (Delegacia Virtual)			
N4329	SENASP	DGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Segurança, Auditoria, Infoseg e PPE	1	37	37
N4333	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Sala-Cofre do CICC		35	35
N4335	SE/STI	CGISE	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Suporte a Central Telefônica PABX IP Alcatel		115	115
N4337	SE/STI	CGISE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Subscrições de Softwares Adobe		132	132
N4339	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de Service Desk, atendimento de 1º, 2º e 3º níveis aos usuários de TIC e suporte à Infraestrutura de TIC		52	52
N4341	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Licença e uso de software	Subscrição de Software para Balanceamento de tráfego de		116	116

							aplicações, segurança e inspeção de tráfego SSL			
N4343	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Expansão e Atualização Tecnológica de Ferramenta de Firewall		108	108
N4345	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Solução de infraestrutura Outdoor		47	47
N4347	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Equipamentos de TIC	Dispositivos para autenticação sem senha (passwordless)		106	106
N4349	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidores de Rede para implantação remota		140	140
N4351	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Subscrições de Middleware e de Plataforma de indexação Open Source		133	133
N4353	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Modernização dos Aparelhos Telefônicos IP Alcatel		117	117
N4355	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Suporte especializado e de missão crítica da Microsoft		42	42

N4357	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de nuvem Oracle e de Cloud at Customer		110	110
N4359	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de nuvem Microsoft Azure		38	38
N4387	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do Portal RT Gestores de TIC		362	362
N4391	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do Portal DTIC		363	363
N4393	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento do Portal Comunidades de Práticas		279	279
N4405	CONJUR	DIADM	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Desenvolvimento do Portal CONJUR		364	364
N4409	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de software	Contratação de Atualização de Licenças Perpétuas Completas de Software de Extração de Dados de dispositivos Móveis	12	215	215

N4411	SENASP	DGFNSP	OE03	PE1U	Contratação	Licença e uso de software	Software para pesquisa de preços	8	26	26
N4413	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Desenvolvimento e Suporte da Plataforma Sinesp	1	149	149
N4415	SENASP	DEP	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Desktops	231	365	365
N4417	SENASP	DEP	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Notebooks	231	366	366
N4419	SENASP	DGFNSP	OE03	PE1U	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de notebooks	100	216	216
N4421	SENASP	DGFNSP	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de laptop	22	367	367
N4423	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Notebooks	301	280	280
N4435	SENAPPEN	AGRAE	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de Software - Miro	15	368	368
N4437	SENAPPEN	AGRAE	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de Software - Ahaslides	15	369	369
N4439	SENAPPEN	AGRAE	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Monitor interativo digital com suporte	17	281	281
N4443	SENASP	DGI	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do SISME	1	150	150
N4445	SE/STI	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de Fábrica de Software		134	134

N4447	SE/STI	CGGOV	OE11	PE1X	Contratação	Licença e uso de software	Solução de auditoria		27	27
N4461	SENASP	DIOPI	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Ferramenta para busca e localização de pessoas (físicas e jurídicas) e confirmação de óbitos	1	217	217
N4465	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Orcrim 2.0	1186	218	218
N4467	SE/STI	CGGOV	OE11	PE1X	Contratação	Licença e uso de software	Contratação de ferramenta profissional de conscientização de segurança da informação	1	28	28
N4483	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Aplicativo - Carteira Nacional de Identidade [Fábrica de Software]	1	68	68
N4487	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Projeto Strings - Identificadores Nacionais		322	322
N4605	SENASP	DEP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento de Chatbot para o Sistema de Gestão Acadêmica - SGA	1	282	282

							(Rede Ead Senasp)			
N4609	SE/STI	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Prospecção de soluções emergentes e inovadoras		283	283
N4611	SENASP	DGFNSP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Renovação/Contratação de Licenças de Sistema Contábil	1	151	151
N4613	AECI	CGCITIR	OE11	PE59	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento do Sistema Agir		1	1
N4615	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Compra de 01 Tablet	01	370	370
N4617	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Serviços de TIC	Solução de Armazenamento de Grande Volume de Dados		219	219
N4619	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Serviços de TIC	Solução de Análise de Vínculos em Grande Volume de Dados		220	220
N4621	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Serviços de TIC	Ferramenta Para Pesquisa Cruzada De Dados Globais Da Internet, Facilitando Consulta A		221	221

							Endereço De E-Mail, Perfis Sociais E Contatos Telefônicos			
N4623	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook de Alta Performance (Workstation) 32GB		222	222
N4625	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador de alta performance (Workstation) 32 GB, com 2 monitores de 23.8"		223	223
N4627	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador de alta performance (Workstation) 64 GB, com 2 monitores de 23.8"		224	224
N4629	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador de alta performance (Workstation) 128 GB, com 2 monitores de 23.8"		225	225
N4631	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Tipo Desktop 16		226	226

							GB, com 2 monitores de 23.8"			
N4633	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook 16GB		227	227
N4635	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor de Vídeo 23,8"		228	228
N4637	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Estação de ancoragem universal para notebook (Dock Station Universal com conexão USB Tipo C)		229	229
N4639	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador de desktop compacto do tipo Mini PC		230	230
N4641	GM	ASCOM	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	"TAP: Automatização dos questionamentos à imprensa".	1	371	371
N4645	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Plataforma SINAP	1	284	284
N4647	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores	7	372	372
N4649	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de um novo sistema de leilões		231	231
N4651	SENAPPEN	ONASP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Canva Pro Equipes	1	285	285

N4653	SENAPPEN	ONASP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	4	286	286
N4655	SENAPPEN	COGER/S ENAPPEN	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	5	287	287
N4657	SENAPPEN	DIRPP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores Desktop	162	152	152
N4659	SENAPPEN	DIRPP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	54	153	153
N4661	SENAPPEN	DIRPP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora	108	154	154
N4663	SENAPPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	5	288	288
N4665	SENAPPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores Desktop	4	289	289
N4667	SENAPPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de empresa especializada para prover suporte, manutenção preventiva, corretiva e adaptativa da infraestrutura de rede Gigabit Passive Optical Network - GPON	1	290	290
N4673	SENAPPEN	DISPF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Terminal Hub de comando com sistema para operacionalizaçã o dos projetos voltados aos internos do SPF	500	291	291

N4675	SENAPPEN	DISPF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Desktop	10	292	292
N4677	SENAPPEN	DISPF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	20	293	293
N4679	SENAPPEN	DISPF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Workstation	1	373	373
N4681	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores de Mesa	702	294	294
N4683	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	1445	295	295
N4685	AECI	CGCITIR	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Aquisição de licenças ChatPDF	04	296	296
N4689	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Barramento	1	77	77
N4691	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Placas Vinculada	1	78	78
N4693	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro):Dados Corporativos	1	79	79
N4695	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SINESP Auditoria	1	80	80
N4697	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): CAD	1	81	81
N4699	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Devir (Delegacia Virtual)	1	82	82

N4701	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Segurança,	1	83	83
N4703	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Integração	1	84	84
N4705	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): Infoseg	1	85	85
N4707	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro): PPE	1	86	86
N4709	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Portal SINESP	1	87	87
N4711	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Rede SINESP	1	88	88
N4713	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Chatboot para uso do Sistema SINESP	1	89	89
N4715	SENAACON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Módulo Superendividamento (ProConsumidor)		69	69
N4717	SENAACON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Manutenção, sustentação e evolução do ProConsumidor		70	70

N4719	SENAACON	DPDC	OE06	PE17	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Consumidor.gov.br (Evolução - manutenção, sustentação) - APP		8	8
N4721	SENAACON	DPDC	OE06	PE17	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Consumidor.gov.br (Evolução - manutenção, sustentação) - WEB		9	9
N4723	SENAACON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sindec (manutenção e sustentação)		71	71
N4725	SENAPPEN	DICAP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	3	297	297
N4727	SENAPPEN	DICAP	N/D	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (analytics)	Sistema especializado para coletar e tratar dados	1	298	298
N4731	SENAPPEN	DICAP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Canva Pro Equipes	1	299	299
N4733	SENAPPEN	DICAP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	6	300	300
N4737	SENAACON	DPPDD	N/D	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (analytics)	Painéis de monitoramento dos projetos		374	374
N4739	SENAPPEN	DISPF	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção corretiva, preventiva e adaptativa de infraestrutura de rede GPON	1	301	301
N4741	SENAACON	DPPDD	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Capacitação	Capacitação em Power Bi	6	375	375

N4743	SENA CON	DPPDD	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença para uso do Power BI	7	376	376
N4745	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	21	377	377
N4759	SENA CON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Gerenciamento de processos administrativos sancionadores de proteção e defesa do consumidor		135	135
N4761	SENAPPEN	ENASP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Aquisição da assinatura da ferramenta Canva Pro	1	378	378
N4763	SENAPPEN	ENASP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Deteção de similaridade em documentos	1	379	379
N4765	SENA CON	DPPDD	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença ADOBE	10	380	380
N4767	SENA CON	DPPDD	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença para pesquisa de preços	3	381	381
N4769	SENA CON	DPPDD	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Bizagi	5	382	382
N4771	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 9 computadores	9	383	383
N4773	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 27 telas de computador	27	384	384
N4775	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de notebook	1	385	385
N4777	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	aquisição de tablet	1	386	386

N4799	SENAACON	DPDC	OE06	PE50	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento de medidas evolutivas no tocante ao Sistema de Recall - Projeto Recall.Gov e Integração, Manutenção e Evolução do Painel Power Bi - Monitoramento de Recalls Internacionais		53	53
N4809	SENAACON	DPDC	OE06	PE50	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Gerenciamento de Procedimentos/ Processos no âmbito da CCSS		54	54
N4817	AECI	CGCITIR	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Implementação do Sistema AGIR em Dispositivos Móveis (Android e iOS)		30	30
N4831	SE/SPO	CGGE	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	ADESÃO DE LICENÇA CANVA PRÓ		302	302
N4833	SE/SPO	CGOF	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	ADESÃO DE LICENÇA CANVA PRÓ		303	303

N4835	SE/SPO	CGCONTA B	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	ADESÃO DE LICENÇA CANVA PRÓ		304	304
N4837	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de equipamentos computacionais (desktops)	2153	305	305
N4839	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Serviço de Atualização do Sistema SEI para a versão 4	1	306	306
N4841	SE/STI	CGISE	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de Links de Internet para penitenciárias federais	1	307	307
N4843	SE/STI	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de Multicloud e de Nuvem Soberana		55	55
N4845	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Tipo Desktop 16 GB, com 2 monitores de 23.8"	45	155	155
N4847	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook 16GB		90	90
N4851	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de SSD Externo de 1T.	4	91	91
N4853	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença para uso de plataformas de survey (LimeSurvey).	01	92	92

N4855	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença para uso de ferramenta de design gráfico online (Canva).	01	93	93
N4857	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença para uso de plataforma ou ferramenta para a SENASP	01	94	94
N4859	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Plataforma Web/Online tipo survey para a Pesquisa Perfil e Pesquisas Temáticas em Segurança Pública.	01	95	95
N4861	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook tipo III	3	387	387
N4865	SENAD	GAB-SENAD	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1	388	388
N4867	SENAPPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook		389	389
N4869	SENAD	DPAGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento da plataforma OBID	1	390	390
N4871	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	3	391	391
N4875	SENAD	DPAGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Desenvolvimento do Portal Aberta	1	392	392
N4877	SENASP	DIOPI	OE01	PE88	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evoluções do Sistema Córtex		232	232

N4879	SENASP	DIOPI	OE01	PE91	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evoluções do Sistema ORCRIM		233	233
N4887	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 30 Computadores (Desktops)	30	96	96
N4895	SENAD	DPRS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	1 Notebook	1	393	393
N4897	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Estação de trabalho completa (Desktop)	5	394	394
N4901	SENAD	GAB-SENAD	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores	5	395	395
N4905	SENAJUS	GAB-SENAJUS	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 8 Computadores (Desktops)	8	97	97
N4907	SENAJUS	CGCF	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 10 computadores (Desktops)	10	308	308
N4909	SENACON	GAB-SENACON	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Computadores - Desktop		396	396
N4911	SENACON	GAB-SENACON	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de Notebooks		397	397
N4913	SENAJUS	GAB-SENAJUS	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 6 computadores (Desktops)	6	309	309
N4915	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 6 notebooks	6	310	310
N4917	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 6 notebooks	6	398	398

N4919	SENAJUS	CGCF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 4 notebooks	4	311	311
N4921	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Desenvolvimento de Chatbot	1	399	399
N4925	SE/SPO	CGOF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores de Alta Performance	27	400	400
N4927	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktop	14	312	312
N4929	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor LCD	28	313	313
N4933	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Dock Station	1	314	314
N4935	SENAPPEN	DIPEN	N/D	N/D	Contratação	Capacitação	Cursos de Capacitação	2	315	315
N5025	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Sistema Building Information Modeling - BIM	10	401	401
N5027	GM	CGGAB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Elaboração de ferramenta automatizada	1	136	136
N5029	GM	CGGAB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Elaboração de mecanismo para criação de sites padronizados para canais de denúncias	1	137	137

N5037	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Internalização do Sisme		98	98
N5041	SENAJUS	GAB-SENAJUS	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores de alto desempenho		402	402
N5047	SE/STI	CGSID	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Projeto proteção da cidadania digital		316	316
N5051	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de subscrições Red Hat Enterprise Linux, TAM (RedHat Technical Account Management), DEE (Dedicated Enterprise Engineer) e capacitação (RedHat Learning Subscription Basic)		138	138
N5055	SE/STI	CGGOV	OE11	PE1X	Contratação	Serviços de TIC	Contratação/Re novação de Serviço de Centro Operações de Segurança e		29	29

							Serviço de Blue Team			
N5059	SE/STI	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Suporte da solução de armazenamento de dados (storage) dos data centers MJSP	1	403	403
N5077	AECI	CGCITIR	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores	13	404	404
N5081	SENAPPEN	DIRPP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Aplicativo Mobile para utilização do Formulário de Inspeção Prisional (FIP)	1	317	317
N5087	SENAPPEN	DIREX	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Pacote de softwares, treinamento e assessoria técnica sob a orientação de Building Information Modeling – BIM		405	405
N5089	SENAPPEN	DIREX	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licenças Autodesk AEC Collection com Plugins OF Elétrico e OF Hidráulico,		406	406

							Autodesk Build, e Orçafascio Prime			
N5091	SENAPPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licenças em Sistema Contábil para integração de rotinas tributárias junto à Receita Federal do Brasil	10	318	318

Tabela 7: Inventário de Necessidades de TIC

III. PLANO DE METAS E AÇÕES

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M542	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0558	Adquirir Sistema Building Information Modeling - BIM	CGISE/STI	N5025, N4433
M541	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0557	Adquirir Licenças em Sistema Contábil para integração de rotinas tributárias junto à Receita Federal do Brasil	SENAPPEN	N5091

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M540	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0556	Adquirir Licenças Autodesk AEC Collection com Plugins OF Elétrico e OF Hidráulico, Autodesk Build, e Orçafascio Prime	SENAPPEN	N5089
M539	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0555	Desenvolver o Aplicativo Mobile para utilização do Formulário de Inspeção Prisional (FIP)	CGSID/STI	N5081, N3443
M538	Percentual de aquisição realizado	aquisição realizada	100%	Até 06 meses	A0554	Aquisição de computadores - AECI	CGISE/STI	N5077, N3455
M537	Percentual de aquisição realizado	aquisição realizada	100%	Até 06 meses	A0553	Adquirir Solução de armazenamento de dados em storages de rede (NAS/Object Storage) e de backup de dados	CGISE/STI	N663, N3455
M532	Percentual de aquisição realizado	aquisição realizada	100%	Até 06 meses	A0548	Adquirir Licença para uso de plataforma ou ferramenta para a SENASP	CGISE/STI	N4857, N4433
M531	Percentual de contratação realizado	contratação realizada	100%	Até 06 meses	A0547	Contratar Suporte da solução de armazenamento de dados (storage) dos data centers MJSP	CGSID/STI	N5059, N3455
M535	Percentual de desenvolvimento realizado	desenvolvimento realizado	100%	Até 06 meses	A0551	Desenvolver plataforma OBID	CGSID/STI	N4869, N3443
M534	Percentual de aquisição realizado	aquisição realizada	100%	Até 06 meses	A0550	Adquirir Licença para uso de plataformas de survey (LimeSurvey)	CGISE/STI	N4853, N4433

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M533	Percentual de aquisição realizado	aquisição realizada	100%	Até 06 meses	A0549	Adquirir software de detecção de similaridade em documentos	CGISE/STI	N4763, N4433
M536	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 06 meses	A0552	Desenvolver sistema de leilões	CGISE/STI	N4649, N3443
M530	Percentual de contratação realizado	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0546	Contratar Serviço de Centro Operações de Segurança e Serviço de Blue Team	CGISE/STI	N5055, N3451
M529	Percentual de contratação realizado	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0545	Contratar subscrições Red Hat Enterprise Linux	CGISE/STI	N5051, N3455
M528	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0544	Desenvolver sistema para o proteção da cidadania digital	CGSID/STI	N5047, N3443
M527	Percentual de internalização realizado	Internalização realizada	100%	Até 12 meses	A0543	Internalizar o SISME - SENASP	CGSID/STI	N5037, N3441
M526	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0542	Desenvolver mecanismo para criação de sites padronizados para canais de denúncias	CGSID/STI	N5029, N3443
M525	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0541	Desenvolver ferramenta automatizada	CGSID/STI	N5027, N3443
M524	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0540	Adquirir Sistema Building Information Modeling - BIM	SENAPPEN	N5087
M523	Percentual de manutenção realizado	Manutenção realizada	100%	Até 12 meses	A0539	Manter infraestrutura de rede GPON	CGSID/STI	N4739, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M522	Percentual adquirido das licenças.	Percentual adquirido das licenças.	100%	Até 12 meses	A0538	Aquisição de licença de software no âmbito da SENAPPEN	CGISE/STI	N3455, N4727, N4731
M521	Percentual de licenças adquiridas	Percentual de licenças adquiridas	100%	Até 12 meses	A0537	Aquisição de licenças de software no âmbito da SENACON	CGISE/STI	N4743, N3455
M520	Percentual da executado da capacitação	Percentual da executado da capacitação	100%	Até 12 meses	A0536	Capacitação de servidores em soluções de TIC no âmbito da SENACON	CGISP/STI	N4741, N3463
M519	Percentual do sistema desenvolvido.	Percentual do sistema desenvolvido.	100%	Até 12 meses	A0535	Desenvolver/manter/evoluir sistemas - SENACON	CGSID/STI	N3441, N4809, N4799, N4719, N4723, N4721, N4737
M518	Percentual do sistema desenvolvido.	Percentual do sistema desenvolvido.	100%	Até 12 meses	A0534	Desenvolver sistema de gerenciamento de processos administrativos - SENACON	CGSID/STI	N3443, N4759
M517	Percentual do sistema já atualizado.	Sistema atualizado	100%	Até 12 meses	A0533	Atualização do sistema de processos eletrônicos SEI para a versão mais recente, com atualização de tecnologia de infraestrutura em utilização para versão de containers.	CGISE/STI	N3455, N4839
M516	Percentual do serviço adquirido	Serviço adquirido	100%	Até 12 meses	A0532	Aquisição de serviço de nuvem pela CGISE	CGISE/STI	N3455, N4843
M515	Percentual de licenças adquiridas	licenças adquiridas	100%	Até 12 meses	A0531	Aquisição de licenças para a SPO	CGISE/STI	N4835, N3455, N4833, N4831
M514	Percentual de computadores adquiridos	computadores adquiridos	100%	Até 12 meses	A0530	Aquisição de computadores para a SENASP	CGISE/STI	N3455, N4845

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M513	Percentual de periféricos adquiridos	Periféricos adquiridos	100%	Até 12 meses	A0529	Aquisição de periféricos de TI para a SENASP	CGISE/STI	N3455, N4851
M512	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0528	Plataforma Web/Online tipo survey para a Pesquisa Perfil e Pesquisas Temáticas em Segurança Pública.	CGSID/STI	N4859, N3443
M511	Percentual adquirido	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0527	Adquirir notebook com maleta e acessórios. Configurações mínimas ou equivalentes: 13ª geração de Intel® Core? i9-13900HX - NVIDIA® GeForce® RTX? 4070, 8GB GDDR6 - Memória de 32GB - SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 - Tela 16.0? Quad HD+ (2560X1600) 240Hz.	CGISE/STI	N4861, N3455
M510	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0526	Desenvolvimento do portal Aberta - SENAD	CGSID/STI	N4875, N3443
M509	Percentual de evolução realizada	Evolução realizada	100%	Até 12 meses	A0525	Evoluções do CórteX que envolvem atividades de frontend, backend, banco de dados e ferramentas acessórias. A necessidade deve ser aplicada tanto no sistema legado quanto em outros tipos de client (frontend novo, mobile, api)	CGSID/STI	N4877, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M508	Percentual de aquisição realizada	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0524	Adquirir Terminal Hub	CGISE/STI	N4673, N4431
M507	Percentual de absorção realizada	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0523	Absorver SINESP (Serpro): Barramento	CGSID/STI	N4689, N3441
M506	Aquisição realizada	Percentual de aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0522	Aquisição de computadores para SENAJUS	CGISE/STI	N4887, N3455, N5041
M505	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0521	Absorver SINESP (Serpro):Placas Vinculada	CGSID/STI	N4691, N3441
M504	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0520	Aquisição de um notebook para a Coordenação-Geral de Prevenção - CGP/DPRS com processador intel core i5 ou superior, memória ssd de 256 ou superior, conexão wi-fi, bluetooth, entradas usb e hdmi.	CGSID/STI	N4895, N3455
M503	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0519	Absorver SINESP (Serpro):Dados Corporativos	CGSID/STI	N4693, N3441
M502	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0518	Absorver SINESP (Serpro):Auditoria	CGSID/STI	N4695, N3441
M501	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0517	Aquisição de estação de trabalho completa (gabinete, 2 monitores, teclado e mouse); configurações mínimas ou	CGISE/STI	N4897, N3455

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
						equivalentes: processador AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80 GHz; RAM Instalada 16 GB.		
M500	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0516	Absorver Sistema Sinesp (Serpro): CAD	CGSID/STI	N4697, N3441
M499	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0515	Absorver Sistema Sinesp (Serpro): Devir (Delegacia Virtual)	CGSID/STI	N4699, N3441
M498	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0514	Absorver Sistema Sinesp (Serpro): Segurança	CGSID/STI	N4701, N3441
M497	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0513	Absorver Sistema Sinesp (Serpro): Integração	CGSID/STI	N4703, N3441
M496	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0512	Absorver Sistema Sinesp (Serpro): Infoseg	CGSID/STI	N4705, N3441
M495	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0511	Absorver Sistema Sinesp (Serpro): PPE	CGSID/STI	N4707, N3441
M494	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0510	Desenvolver Portal SINESP	CGSID/STI	N4709, N3443
M493	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0509	Absorver Rede SINESP - Sistema de Informação comercial	CGSID/STI	N4711, N3443
M492	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0508	Desenvolver Chatboot para uso da SENAJUS	CGSID/STI	N4921, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M491	Percentual de desenvolvimento realizado	Desenvolvimento realizado	100%	Até 12 meses	A0507	Desenvolver Chatboot para uso do Sistema SINESP	CGSID/STI	N4713, N3443
M490	Percentual de manutenção, sustentação e evolução realizado	Manutenção, sustentação e evolução realizada	100%	Até 12 meses	A0506	Manter, sustentar e evoluir o ProConsumidor	CGSID/STI	N4717, N3443, N4715
M489	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0505	Adquirir computadores (com configuração mínima: processador intel core i7, memória ssd de 256G, memória ram de 8 Gigas, conexão wi-fi, bluetooth, entradas hdmi e usb) para atender a demanda do Gabinete da SENAD e substituir máquinas obsoletas e lentas.	CGISE/STI	N4901, N3455, N4865
M488	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0504	Aquisição de Notebooks para utilização em expediente fora do Ministério.	CGISE/STI	N4911, N3455, N4919, N4917, N4915, N4871, N4725, N4847
M487	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0503	Aquisição de desktop 12ª geração ou superior - intel core i7-12700T (12-core, 20-thread, cache de 25MB, até 4,7 GHz), windows 11 pro em português, memória de 16 GB DDR 4 3200MHz, SSD de 512GB	CGISE/STI	N4927, N3455, N4913, N4907, N4905

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M486	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0502	Adquirir Licença de Software Bizagi	CGISE/STI	N4769, N4433
M485	Percentual de absorção realizado	Absorção realizada	100%	Até 12 meses	A0501	Absorção da Plataforma Sistema Nacional de Prevenção - SINAP	CGSID/STI	N4645, N3441
M484	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0500	Aquisição de cursos de capacitação nas áreas de T.I. para SENAPPEN	CGISP/STI	N4935, N3463
M483	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0499	Adquirir Computadores Desktop para doação - SENAPPEN	SENAPPEN	N4657, N4431
M482	Percentual de contratação realizado	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0498	Contratar serviço especializado para prover suporte, manutenção preventiva, corretiva e adaptativa da infraestrutura de rede Gigabit Passive Optical Network - GPON	SENAPPEN	N4667, N4431
M481	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0497	Adquirir notebook para doação - SENAPPEN	SENAPPEN	N4659, N4431, N4867
M480	Percentual de aquisição realizado	Aquisição realizada	100%	Até 12 meses	A0496	Adquirir impressora para doação - SENAPPEN	SENAPPEN	N4661, N4431
M479	Percentual de prospecção realizado	Prospecção realizada	100%	Até 12 meses	A0495	Prospectar soluções emergentes e inovadoras	CGISP/STI	N4609, N4431
M478	Percentual do sistema evoluído	Sistema evoluído	100%	Até 12 meses	A0494	Manutenção evolutiva do Sistema Agir	CGSID/STI	N4613, N3443, N4817

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M477	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0493	Adquirir licenças ChatPDF	CGISE/STI	N4685, N4433
M476	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0492	Adquirir solução de snálise de vínculos em grande volume de dados	CGISE/STI	N4619, N3455
M475	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0491	Ferramenta para pesquisa cruzada de dados globais da internet, facilitando consulta a endereço de e-mail, perfis sociais e contatos telefônicos	CGISE/STI	N4621, N3455
M474	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0490	Solução de Armazenamento de Grande Volume de Dados	CGISE/STI	N4617, N3455
M473	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0489	Adquirir notebook de alta performance	CGISE/STI	N4623, N4433
M472	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0488	Adquirir e distribuir computador de alta performance	CGISE/STI	N4629, N4433, N4627, N4625
M471	Percentual de aquisição realizado	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0487	Adquirir e distribuir monitor	CGISE/STI	N4635, N4433, N4677, N4683, N4745, N4773, N4929

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M470	Percentual de automatização dos questionamentos à imprensa realizado	Automatizar ferramenta dos questionamentos à imprensa	100%	Até 12 meses	A0486	Automatização dos questionamentos à imprensa	CGSID/STI	N4641, N3443
M469	Percentual de desenvolvimento de ChatBot realizado	Desenvolvimento de Chatbot para o Sistema de Gestão Acadêmica - SGA (Rede Ead Senasp)	100%	Até 12 meses	A0485	Desenvolver Chatbot para o Sistema de Gestão Acadêmica - SGA (Rede Ead Senasp)	CGSID/STI	N4605, N3443
M468	Percentual de aquisição de ferramenta realizada	Aquisição de ferramenta realizada	100%	Até 12 meses	A0484	Adquirir ferramenta profissional de consciencialização de segurança da informação	CGGOV/STI	N4467, N3451
M467	Percentual do sistema ORCRIM 2.0 Desenvolvido	Sistema ORCRIM 2.0 Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0483	Desenvolver Orcrim 2.0	CGSID/STI	N4465, N3443
M466	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0482	Adquirir e distribuir tablets SEOPI	SENASP	N811
M465	Percentual de Sistema Desenvolvido	Sistema Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0481	Desenvolver sistema para cadastrar e manter strings (identificadores) únicos para cada tipo penal [Projeto Strings]	CGSID/STI	N4487, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M464	Percentual de Aplicativo Desenvolvido	Aplicativo Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0480	Desenvolver aplicativo - Carteira Nacional de Identidade	CGSID/STI	N4483, N3443
M462	Percentual de aquisição de ferramenta realizada	Aquisição de ferramenta para busca e localização de pessoas realizada	100%	Até 06 meses	A0478	Adquirir Ferramenta para busca e localização de pessoas (físicas e jurídicas) e confirmação de óbitos	SENASP	N4461, N4431
M461	Percentual de contratação de licenças para solução de auditoria realizada	Contratação de licenças para solução de auditoria realizada	100%	Até 12 meses	A0477	Contratar licenças para solução de auditoria, gestão, automação, monitoração de gerenciamento de serviços do AD	CGGOV/STI	N4447, N3451
M460	Percentual de contratação de fábrica de software realizada	Contratação de fábrica de software realizada	100%	Até 12 meses	A0476	Contratar Fábrica de Software	CGSID/STI	N4445, N3443
M457	Percentual de desktops para doação adquiridos	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0473	Adquirir notebooks para doação - SEGEN	SENASP	N4415, N4431
M459	Percentual de monitores interativos adquiridos	Aquisição de monitores interativos realizada	100%	Até 18 meses	A0475	Adquirir Monitores interativos digitais com suporte	SENAPPEN	N4439, N4431
M458	Percentual de notebooks para doação adquiridos	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0474	Adquirir notebooks para doação - SEGEN	SENASP	N4419, N4421, N4417, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M456	Percentual de API adaptada	API adaptada	100%	Mais de 24 meses	A0472	Adaptar API Cortex RENAVAL	SENASP	N2639
M455	Percentual de Contratação de Software de Extração de Dados de dispositivos Móveis Realizada	Contratação de Software de Extração de Dados de dispositivos Móveis Realizada	100%	Até 12 meses	A0471	Contratar Software de Extração de Dados de dispositivos Móveis	SENASP	N4409, N4431
M454	Percentual de Contratação de Software para pesquisa de preços Realizada	Contratação de Software para pesquisa de preços Realizada	100%	Até 03 meses	A0470	Contratar Software para pesquisa de preços	SENASP	N4431, N4411, N4767
M453	Percentual de Contratação de Solução Suporte da Plataforma Sinesp Realizada	Contratação de Solução Suporte da Plataforma Sinesp Realizada	100%	Até 03 meses	A0469	Contratar Solução Suporte da Plataforma Sinesp	SENASP	N4413, N4431
M452	Percentual de Aquisição de Licença de Software Realizada	Aquisição de Licença de Software Realizada	100%	Até 18 meses	A0468	Adquirir Licença de Software - Ahaslides	SENAPPEN	N4435, N4431
M451	Percentual de Aquisição de Licença de Software Realizada	Aquisição de Licença de Software Realizada	100%	Até 18 meses	A0467	Adquirir Licença de Software - Ahaslides	SENAPPEN	N4437, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M450	Percentual de Evolução Realizada	Evolução Realizada	100%	Até 12 meses	A0466	Evoluir Sistema Sisme	CGSID/STI	N3443, N4443
M449	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 18 meses	A0465	Adquirir Microscópio óptico para captura de imagem para o processamento de amostras questionadas dos Laboratórios de DNA Forense para Doação - SENASP	SENASP	N4075, N4431
M446	Percentual de Portal Desenvolvido	Portal Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0462	Desenvolver Portal Comunidades de Práticas	CGISP/STI	N4393, N3465
M445	Percentual de Portal evoluído	Portal evoluído	100%	Até 06 meses	A0461	Evoluir Portal DTIC	CGISP/STI	N4391, N3465
M444	Percentual de Portal evoluído	Portal evoluído	100%	Até 12 meses	A0460	Evoluir Portal RT Gestores de TIC	CGISP/STI	N4387, N3465
M443	Percentual do Suporte a Central Telefônica PABX IP Alcatel Contratado	Suporte a Central Telefônica PABX IP Alcatel Contratado	100%	Até 24 meses	A0459	Contratar Suporte a Central Telefônica PABX IP Alcatel	CGISE/STI	N4335, N4433
M442	Percentual de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura Contratados	Serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura Contratados	100%	Até 18 meses	A0458	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura	CGISE/STI	N4333, N3455

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M441	Percentual de subscrições de softwares Adobe Contratadas	Subscrições de softwares Adobe Contratadas	100%	Até 18 meses	A0457	Contratar subscrições de softwares Adobe	CGISE/STI	N4337, N4433, N4765
M440	Percentual de serviços de Service Desk Contratado	Serviços de Service Desk Contratado	100%	Até 18 meses	A0456	Contratação de serviços de Service Desk	CGISE/STI	N4339, N4433
M439	Percentual de Subscrição de Software para Balanceamento SSL Contratada	Subscrição de Software para Balanceamento SSL Contratada	100%	Até 24 meses	A0455	Contratação de Subscrição de Software para Balanceamento SSL	CGISE/STI	N4341, N3457
M437	Percentual de Solução de infraestrutura Outdoor Contratada	Solução de infraestrutura Outdoor Contratada	100%	Até 12 meses	A0453	Contratação de Solução de infraestrutura Outdoor	CGISE/STI	N4345, N3455
M436	Percentual de dispositivos para autenticação sem senha Contratados	Dispositivos para autenticação sem senha Contratados	100%	Até 24 meses	A0452	Contratação de dispositivos para autenticação sem senha	CGISE/STI	N4347, N4433
M435	Percentual de Servidores de Rede para implantação remota Contratados	Servidores de Rede para implantação remota Contratados	100%	Até 24 meses	A0451	Contratação de Servidores de Rede para implantação remota	CGISE/STI	N4349, N3455
M434	Percentual de Subscrições de	Subscrições de Middleware e de	100%	Até 18 meses	A0450	Contratação de Subscrições de Middleware e de	CGISE/STI	N4351, N3457

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
	Middleware e de Plataforma de indexação Open Source Contratadas	Plataforma de indexação Open Source Contratadas				Plataforma de indexação Open Source		
M433	Percentual dos Aparelhos Telefônicos IP Alcatel Contratados	Aparelhos Telefônicos IP Alcatel Contratados	100%	Até 18 meses	A0449	Contratação dos Aparelhos Telefônicos IP Alcatel	CGISE/STI	N4353, N4433
M432	Percentual de Suporte especializado e de missão crítica da Microsoft Contratado	Suporte especializado e de missão crítica da Microsoft Contratado	100%	Até 12 meses	A0448	Contratação de Suporte especializado e de missão crítica da Microsoft	CGISE/STI	N4355, N3455
M431	Percentual de Serviços de nuvem Oracle e de Cloud at Customer Contratado	Serviços de nuvem Oracle e de Cloud at Customer Contratado	100%	Até 12 meses	A0447	Contratação de Serviços de nuvem Oracle e de Cloud at Customer	CGISE/STI	N4357, N3455
M430	Percentual de Serviço de Nuvem Adquirido	Serviço de Nuvem Adquirido	100%	Até 12 meses	A0446	Aquisição de Serviços de nuvem Microsoft Azure	CGISP/STI	N4359, N4429
M429	Percentual de Absorção dos Sistemas Sinesp Realizada	Absorção dos Sistemas Sinesp Realizada	100%	Mais de 24 meses	A0445	Absorção dos Sistemas Sinesp (Serpro)	CGSID/STI	N4325, N4327, N4329, N3441

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M428	Percentual de desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 03 meses	A0444	Desenvolver Veículo Clonado	SENASP	N4319
M427	Percentual de desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 06 meses	A0443	Desenvolver Veículo Conectado ao serviço de emergência do Brasil	CGSID/STI	N4313, N3465
M426	Percentual de desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 18 meses	A0442	Desenvolver SIGAP 2.0 (antigo GFUNAD)	CGSID/STI	N4307, N3443
M424	Percentual de Sistema de Informações de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (SISETP) Internalizado	Sistema de Informações de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (SISETP) Internalizado	100%	Até 12 meses	A0440	Internalizar o Sistema de Informações de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (SISETP)	CGSID/STI	N4069, N3441
M423	Percentual de Desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 18 meses	A0439	Desenvolver metodologia e implementar ferramenta de acompanhamento da efetividade dos Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC	CGSID/STI	N4039, N3443
M422	Percentual de Desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 12 meses	A0438	Desenvolver Sistema de Entrega Voluntária de Armas de Fogo (novo Desarma)	CGSID/STI	N4099, N3443
M421	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 06 meses	A0437	Adquirir Licença de Software para Gestão de Projetos	SENASP	N3887, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M419	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 18 meses	A0435	Adquirir Microscópio para realização dos exames de microcomparação balística, com integração para possibilitar comunicação entre diferentes laboratórios para Doação - SENASP	SENASP	N3889, N4431
M417	Percentual de Operacionalização Realizada	Operacionalização Realizada	100%	Mais de 24 meses	A0433	Operacionalizar TED de Ciência e Engenharia de Dados	CGISP/STI	N3871, N3463
M416	Percentual de Desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 18 meses	A0432	Desenvolver Sistema de Gestão de Pessoas	SENAPPEN	N4049, N4431
M415	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 12 meses	A0431	Adquirir Tablet para Doação - SENASP	SENASP	N4071, N4073, N4431
M414	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 06 meses	A0430	Contratar Serviço de Processamento e Armazenamento de Dados Multicloud	SENASP	N3857, N4431
M413	Percentual de Capacitação Realizada	Capacitação Realizada	100%	Até 06 meses	A0429	Capacitar servidores da DTIC em gestão e gerenciamento de projeto	CGISP/STI	N3861, N3463
M412	Percentual de Capacitação Realizada	Capacitação Realizada	100%	Até 06 meses	A0428	Capacitar servidores da DTIC em DPO (Data Protection Officer)	CGISP/STI	N3863, N3463
M411	Percentual de Capacitação Realizada	Capacitação Realizada	100%	Até 06 meses	A0427	Capacitar servidores da DTIC em normas e padrões internacionais relacionados a Segurança da Informação	CGISP/STI	N3867, N3463

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M410	Percentual de Desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 12 meses	A0426	Desenvolver SISDEN [Dev Lowcode]	CGISP/STI	N3465, N3875
M409	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 06 meses	A0425	Contratar Solução para coleta, processamento, análise e acompanhamento de dados	CGSID/STI	N3879, N4431
M408	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 18 meses	A0424	Contratar Solução Tecnológica de Hardware e Software para a Identificação Civil e Criminal	SENASP	N3881, N4431
M389	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 18 meses	A0405	Adquirir ATIC-PV - leitor biométrico com RFID	SENAPPEN	N4029, N4431
M385	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 12 meses	A0401	Contratar Base Central de Dados de Gestão Estratégica SEOPI	CGSID/STI	N4045, N4427
M384	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 12 meses	A0400	Adquirir Licença Canva PRO	CGISE/STI	N4101, N4433, N4651, N4761, N4855
M383	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 18 meses	A0399	Contratar Soluções de controle de acesso	SENAPPEN	N4111, N4043, N4035, N4431
M381	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 12 meses	A0397	Adquirir Licença de Uso de Banco de Imagens	SENAPPEN	N4119
M376	Percentual de Desenvolvimento Realizado	Desenvolvimento Realizado	100%	Até 06 meses	A0392	Desenvolver Sinesp Geo inteligência	CGSID/STI	N4133, N3441

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M375	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 06 meses	A0391	Contratar Internet Satelital Móvel	SENASP	N4159, N4431
M373	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 06 meses	A0389	Adquirir Sistema de autenticação e autorização de usuários	CGSID/STI	N4183, N3441
M372	Percentual de Aquisição Realizada	Aquisição Realizada	100%	Até 06 meses	A0388	Adquirir Licença de Software PIX4Dmapper	SENASP	N4135, N4429
M370	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 06 meses	A0386	Contratar certificações da EC-Council	CGISP/STI	N3869, N3463
M369	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 06 meses	A0385	Contratar Certificações da International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) ²	CGISP/STI	N3865, N3463
M368	Percentual de Contratação Realizada	Contratação Realizada	100%	Até 06 meses	A0384	Contratar Certificações do SANS Institute	CGISP/STI	N3859, N3463
M052	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0062	Aquisição de equipamentos de infraestrutura hiperconvergente	CGISE/STI	N657, N3455
M364	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0380	Adquirir suíte de aplicativos para edição de documentos em nuvem privada	SENASP	N3355, N4429
M360	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0376	Adquirir sistema completo de videoconferência - CGCICCN - Nova sede	SENAPPEN	N2473, N2479, N4429

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M357	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0372	Adquirir Impressoras Multifuncionais	SENASP	N3409, N4429
M355	Percentual de sistema Gestão de Criminalística Desenvolvido	Sistema Gestão de Criminalística Desenvolvido	100%	Até 24 meses	A0370	Desenvolver sistema de Gestão de Criminalística	CGSID/STI	N3399, N3443
M350	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0365	Adquirir Desktop - SEOPI	CGISE/STI	N3339, N3455
M349	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0364	Adquirir Notebooks - SEOPI	CGISE/STI	N3341, N3455
M348	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0363	Adquirir licenças perpétuas de software para recuperação de informações em Macbooks - SEOPI	SENASP	N3345, N4431
M347	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0362	Adquirir solução para Reconhecimento de Padrões em Bases Abertas - SEOPI	SENASP	N3337, N4429
M346	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0361	Adquirir solução de Análise e Mineração de dados na web - SEOPI	SENASP	N3333, N4431
M345	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições/Total	100%	Até 18 meses	A0360	Adquirir software de Geoprocessamento - SEOPI	SENASP	N3329, N3331, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
		de aquisições previstas) *100						
M344	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0359	Adquirir memória RAM para workstation - SEOPI	SENASP	N3325, N3327, N4431
M343	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0358	Adquirir licenças de software para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SEOPI	SENASP	N707, N1457, N1455, N4429
M342	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0357	Adquirir licenças de software para extração e análise de dados de dispositivos móveis - DEPEN	SENAPPEN	N331, N4431
M341	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0356	Adquirir Monitores- DEPEN	SENAPPEN	N367, N347, N1293, N2407, N4431
M340	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0355	Adquirir Desktops - DEPEN	CGISE/STI	N355, N353, N381, N365, N1291, N1259, N2443, N343, N4433
M339	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0354	Adquirir Notebooks - DEPEN	SENAPPEN	N1303, N1301, N1289, N1277, N1273, N1261, N1257, N2403, N4431
M337	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0352	Adquirir e distribuir Desktops	CGISE/STI	N3319, N4433, N4631, N4675, N4665, N4647, N4679, N4771, N4909, N4681, N4837, N4639, N4925

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M336	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0351	Adquirir e distribuir Notebooks	CGISE/STI	N3317, N4433, N4633, N4663, N4775
M100	Percentual de sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	Sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	100%	Até 18 meses	A0117	Desenvolver sistema SINESP Agente de Campo	CGSID/STI	N505, N3441
M330	Percentual de DATAMIGRA Desenvolvido	DATAMIGRA absorvido	100%	Até 06 meses	A0345	Absorver DATAMIGRA	CGSID/STI	N2699, N3441
M319	Percentual de TSE - integração de API Realizada	TSE - integração de API Realizada	100%	Até 18 meses	A0334	Integrar API TSE - (Gateway de API)	SENASP	N2649
M317	Percentual de Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP Realizada	Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP Realizada	100%	Até 18 meses	A0332	SINDEC Nacional - Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP	CGSID/STI	N2641, N4427
M310	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0325	Adquirir Licença de Software para edição de áudio, vídeo e imagem	SENAPPEN	N2421, N4431
M309	Percentual de sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária Desenvolvido	Sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0324	Desenvolver sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária	CGSID/STI	N2539, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M307	Percentual de Portal público sobre pessoas desaparecidas Desenvolvido	Portal público sobre pessoas desaparecidas Desenvolvido	100%	Até 18 meses	A0322	Desenvolver Portal público sobre pessoas desaparecidas	CGSID/STI	N2385, N3443
M304	Percentual de Serviço de Infraestrutura em Nuvem adquirido	Serviço de Infraestrutura em Nuvem adquirido	100%	Até 18 meses	A0319	Adquirir Serviço de Infraestrutura em Nuvem	SENAPPEN	N2391, N4431
M303	Percentual de Equipamento de Dock Station adquirido	Equipamento de Dock Station adquirido	100%	Até 06 meses	A0318	Adquirir Dock Station	SENAPPEN	N2405, N4431, N4637, N4933
M302	Percentual Serviço de Segurança em Nuvem Contratado	Serviço de Segurança em Nuvem Contratado	100%	Até 18 meses	A0317	Contratar Serviço de Segurança em Nuvem	CGISE/STI	N2393, N3455
M301	Percentual de base de desaparecidos Integradas	base de desaparecidos Integradas	100%	Até 12 meses	A0316	Integrar base de desaparecidos	CGSID/STI	N2395, N3445
M298	Percentual de Solução de gerenciamento e de gravação de áudio Adquirido	Solução de gerenciamento e de gravação de áudio Adquirido	100%	Até 18 meses	A0313	Adquirir Solução de gerenciamento e de gravação de áudio	SENAPPEN	N2413, N4429
M296	Percentual de de Software de ampliação digital	Software de ampliação digital biométrica Adquirido	100%	Até 24 meses	A0311	Adquirir Software de ampliação digital biométrica	SENAPPEN	N2419, N4429

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
	biométrica Adquirido							
M291	Percentual de Link de Acesso à Internet Contratado	Link de Acesso à Internet Contratado	100%	Até 12 meses	A0306	Contratar link de acesso à Internet - DEPEN	SENAPPEN	N2449, N4431
M290	Percentual de Solução de Videowall Adquirida	Solução de Videowall Adquirida	100%	Até 12 meses	A0305	Adquirir solução de Videowall	SENASP	N2459, N4431
M287	Percentual de Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI Adquirido	Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI Adquirido	100%	Até 12 meses	A0302	Adquirir sistemas de Firewall para Doação - SEOPI	SENASP	N2477, N4431
M286	Percentual de Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP Realizada	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP	100%	Até 06 meses	A0301	Integrar sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP	CGSID/STI	N2483, N3443
M282	Percentual de Painéis de Bases Estratégicas Construídos	Painéis de Bases Estratégicas Construídos	100%	Mais de 24 meses	A0297	Construir Painéis de Bases estratégicas	CGSID/STI	N2527, N4427
M278	Percentual de Carga de Dados e API CGU Realizada	Carga de Dados e API CGU Realizada	100%	Até 12 meses	A0293	Realizar carga de dados e API CGU	CGSID/STI	N2373, N3445

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M274	Percentual de Carga de dados e API de Expulsos Realizada	Carga de dados e API de Expulsos Realizada	100%	Até 12 meses	A0289	Realizar carga de dados e API de Expulsos	CGSID/STI	N2353, N3445
M267	Percentual de API's Desenvolvidas	API's Desenvolvidas	100%	Até 12 meses	A0282	Absorver bases de CPF e CNPJ com a tecnologia blockchain	CGSID/STI	N2325, N3445
M265	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal Desenvolvido	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0280	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal	CGSID/STI	N2317, N3443
M263	Percentual de Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País Desenvolvido	Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0278	Desenvolver Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País	CGSID/STI	N2309, N3443
M262	Percentual de Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas Desenvolvido	Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0277	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas	CGSID/STI	N2305, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M261	Percentual de Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo Desenvolvido	Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0276	Desenvolver Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo	CGSID/STI	N2301, N4047, N4427
M260	Percentual de Sistema de Gestão Penitenciária Desenvolvido	Sistema de Gestão Penitenciária Desenvolvido	100%	Até 18 meses	A0275	Desenvolver Sistema de Gestão Penitenciária	CGSID/STI	N2297, N3443
M259	Percentual de Sistema de gestão da Força Nacional Desenvolvido	Sistema de gestão da Força Nacional Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0274	Desenvolver Sistema de gestão da Força Nacional	CGSID/STI	N2293, N3443
M258	Percentual de Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública Desenvolvido	Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0273	Desenvolver Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública	CGSID/STI	N2289, N2503, N3443
M254	Percentual de sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real Desenvolvido	Sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0269	Desenvolver sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real	CGSID/STI	N2593, N3443
M253	Percentual de sistema de Gestão	Sistema de Gestão de	100%	Até 06 meses	A0268	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de	CGSID/STI	N2271, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
	de Entrada de Refugiados no Brasil Desenvolvido	Entrada de Refugiados no Brasil Desenvolvido				Entrada de Refugiados no Brasil		
M252	Percentual de sistema de Gestão de Imigração Laboral Desenvolvido	Sistema de Gestão de Imigração Laboral Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0267	Desenvolvimento de sistema de Gestão de Imigração Laboral	CGSID/STI	N2263, N3443
M249	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0264	Adquirir licenças de software para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SEOPI	SENASP	N715, N705, N4429
M176	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	Até 12 meses	A0195	Adquirir e implantar ambiente em nuvem (software I2)	SENAJUS	N1589, N4431
M229	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0251	Contratar curso Ethical Hacking - CGCCO - SEOPI	SENASP	N1447, N4431
M211	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0232	Contratar Software - Pacote Office - doação	SENASP	N1409, N4431
M210	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0231	Contratar QLIK SENSE - Gerenciamento de banco de dados - doação	SENASP	N1411, N4431
M207	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0228	Adquirir Servidor de dados	SENASP	N1427, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M206	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0226	Contratar Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física	SENASP	N1431, N4431
M205	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0225	Contratar Software blockchain-darkweb-copiar sites	SENASP	N1439, N4431
M204	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0224	Contratar software Antivírus para doação	SENASP	N1441, N4431
M201	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *110	100%	Até 12 meses	A0221	Contratar software editor de PDF	SENASP	N1449, N4431
M200	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *109	100%	Até 12 meses	A0220	Contratar Software para análise de criptoativos	SENASP	N1451, N4431
M198	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *107	100%	Até 12 meses	A0218	Contratar Software para análise de dispositivos - roteadores e outros	SENASP	N1465, N4431
M197	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *106	100%	Até 12 meses	A0217	Contratar Software para classificação de entidades	SENASP	N1469, N4431
M196	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total	100%	Até 12 meses	A0216	Contratar Software para produção de inteligência em dados de fontes abertas	SENASP	N1473, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
		de aquisições previstas) *105						
M195	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	Até 12 meses	A0215	Contratar Software pesquisa de domínios	SENASP	N1475, N4431
M194	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	Até 12 meses	A0214	Contratar Software Spiderfood e Recon NG	SENASP	N1479, N4431
M193	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *102	100%	Até 12 meses	A0213	Contratar Software SINAC	SENASP	N1481, N4431
M192	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	Até 12 meses	A0212	Contratar Software SAS INVESTIGATION	SENASP	N1483, N4431
M191	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0211	Contratar Solução de Melhoramento de Imagem e Som - Ddetective e ClearID	SENASP	N1487, N1395, N4431
M190	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	Até 06 meses	A0210	Contratar Telefonia satelital	SENASP	N1493, N1485, N4431
M182	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	Até 06 meses	A0202	Adquirir softwares para análise de vínculos - IBM - CGCCO - SEOPI - Doação	SENASP	N1489, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M164	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0183	Adquirir impressoras para doação - SEOPI	SENASP	N1677, N4431
M243	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	Até 18 meses	A0012	Adquirir impressoras	CGISE/STI	N297, N3455
M171	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *107	100%	Até 18 meses	A0190	Adquirir sistema de segurança Integrated Ballistics Identification System - IBIS	SENASP	N1609, N4431
M170	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *106	100%	Até 18 meses	A0189	Adquirir licenças Integrated Ballistics Identification System - IBIS	SENASP	N1551, N4431
M169	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0188	Contratar links de Internet via Satélite para doação - SENASP	SENASP	N1641, N4431
M168	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	Até 18 meses	A0187	Adquirir scanners para doação - SENASP	SENASP	N1645, N1607, N4431
M215	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	Até 24 meses	A0236	Adquirir licença de uso de software Canva	SENAPPEN	N2427, N4431
M218	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	Até 24 meses	A0239	Adquirir Licença de Software de Engenharia - doação	SENAPPEN	N1265, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M187	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 24 meses	A0207	Contratar software para gerenciamento de acervo e normativos	SENAPPEN	N1509, N4431
M208	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida Desenvolvido	100%	Até 24 meses	A0229	Desenvolver Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	CGSID/STI	N1425, N3443
M241	Percentual de Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0111	Desenvolver Sistema de Identidades Funcionais Digital	CGSID/STI	N511, N3443, N4309
M212	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	Até 18 meses	A0233	Contratar Cursos de Software - Cellebrite	SAA	N1403, N4431
M163	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 18 meses	A0182	Contratar solução para extração de dados para computadores de bordo veicular	SENASP	N801, N1459, N4429
M162	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 06 meses	A0181	Contratar solução de inteligência para parlatórios	SENAPPEN	N323, N4431
M159	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0178	Adquirir solução para extração de dados em HDs e memórias defeituosas	SENASP	N813, N4431
M158	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 12 meses	A0177	Contratar serviço de pesquisa cruzada de dados globais da internet	SENASP	N809, N4429
M156	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total	100%	Até 06 meses	A0175	Adquirir novos créditos ou possibilidade de	SENASP	N805, N4429

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
		de aquisições previstas) *100				contratação anual sem limite de uso para desbloqueio de dispositivos móveis		
M152	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 06 meses	A0171	Contratar serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e Internet, incluindo proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS)	CGISE/STI	N745, N3457, N4841
M151	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 18 meses	A0170	Adquirir Serviços de impressão (outsourcing) de abrangência nacional	CGISE/STI	N743, N4433
M144	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0163	Adquirir licenças de software para verificação de similaridade dos trabalhos científicos e demais produções acadêmicas dos integrantes do SUSP	SENASP	N781, N4431
M143	Percentual de base de dados do SINESP Replicado	Base de dados do SINESP Replicado	100%	Até 06 meses	A0162	Replicar base de dados do SINESP	CGSID/STI	N499, N3445
M133	Percentual de sistema Recall Internalizado	Sistema Recall Internalizado	100%	Até 03 meses	A0152	Internalizar sistema Recall	CGSID/STI	N689, N3441
M132	Percentual de Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	100%	Até 18 meses	A0151	Internalizar Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	CGSID/STI	N651, N3441

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M118	Percentual do sistema SINESP SAIE Evoluído	Sistema SINESP SAIE Evoluído	100%	Até 06 meses	A0136	Evoluir sistema SINESP SAIE	CGSID/STI	N531, N3441
M117	Percentual do sistema SIMAP Evoluído	Sistema SIMAP Evoluído	100%	Até 06 meses	A0135	Evoluir sistema SIMAP	CGSID/STI	N839, N3443
M116	Percentual do sistema ORCRIM Evoluído	Sistema ORCRIM Evoluído	100%	Até 06 meses	A0134	Evoluir sistema ORCRIM	CGSID/STI	N713, N3443, N4879
M115	Percentual do Sistema Desarma Evoluído	Sistema Desarma Evoluído	100%	Até 18 meses	A0132	Evoluir sistema Desarma	CGSID/STI	N233, N3443
M114	Aquisição de sistema de monitoramento para os presídios federais	Sistema de monitoramento para os presídios federais Adquirido	100%	Até 06 meses	A0131	Especificar e adquirir sistema de monitoramento para os presídios federais	SENAPPEN	N359, N371, N377, N379, N383, N4429
M112	Serviço de solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	Solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	100%	Até 12 meses	A0129	Disponibilizar solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	CGGOV/STI	N611, N393, N3449
M106	Percentual de solução analytics - SINESP DW Análise Desenvolvido	Solução analytics - SINESP DW Análise Desenvolvido	100%	Até 03 meses	A0123	Desenvolver solução analytics - SINESP DW Análise	CGSID/STI	N495, N4427

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M105	Percentual de solução analytics - SINESP Big Data Desenvolvido	Solução analytics - SINESP Big Data Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0122	Desenvolvimento de solução analytics - SINESP Big Data	CGSID/STI	N485, N3441
M101	Percentual de sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	Sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0118	Desenvolver sistema SINESP Auditoria	SENASP	N503
M098	Percentual de sistema SIAN (AN) Desenvolvido	Sistema SIAN (AN) Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0115	Desenvolver sistema SIAN (AN)	CGSID/STI	N847, N3443
M097	Percentual de sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD Desenvolvido	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD Desenvolvido	100%	Até 24 meses	A0114	Desenvolver sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD	CGSID/STI	N857, N3443
M096	Percentual de sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	Sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0113	Desenvolver sistema de OSCIPs e OEs	CGSID/STI	N687, N3443
M095	Percentual de sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	Sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	100%	Até 24 meses	A0112	Desenvolver sistema de monitoramento das obras prisionais	CGSID/STI	N321, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M094	Percentual de sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0110	Desenvolver sistema de Gestão e Controle de Efetivo	CGSID/STI	N773, N3443
M091	Percentual de sistema de gestão de competências a partir do SGC	Sistema de gestão de competências a partir do SGC Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0107	Desenvolver sistema de gestão de competências a partir do SGC	CGSID/STI	N795, N3443
M090	Percentual de sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	100%	Mais de 24 meses	A0106	Desenvolver sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo	CGSID/STI	N579, N3443
M089	Percentual de sistema de gerenciamento de processos licitatórios Desenvolvido	Sistema de gerenciamento de processos licitatórios Desenvolvido	100%	Até 18 meses	A0105	Desenvolver sistema de gerenciamento de processos licitatórios	CGSID/STI	N769, N3443
M088	Percentual de painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	Painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	100%	Até 12 meses	A0104	Desenvolver painel de BI para o Portal SINESP	CGSID/STI	N493, N4427
M083	Percentual de Desenvolvimento de Front End para o CNCP Desenvolvido	Front End Para o CNCP Desenvolvido	100%	Até 24 meses	A0099	Desenvolver Front End para o CNCP	CGSID/STI	N835, N3443

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M081	Percentual de Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	100%	Até 06 meses	A0097	Desenvolver API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil	CGSID/STI	N775, N3445
M079	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 06 meses	A0095	Contratar suporte para usuários de sistemas críticos	CGISP/STI	N831, N509, N4429
M076	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0092	Contratar sistema SINESP Segurança	SENASP	N501
M075	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0091	Contratar sistema SINESP PPE	SENASP	N523
M074	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0089	Contratar sistema SINESP Integração	SENASP	N513
M073	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0088	Contratar sistema SINESP Infoseg	SENASP	N487
M072	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0087	Contratar sistema SINESP Delegacia Virtual	SENASP	N529
M071	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0086	Contratar de sistema SINESP CAD	SENASP	N507
M068	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 24 meses	A0082	Contratar sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	SENAPPEN	N351, N4431
M067	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 24 meses	A0081	Contratar sistema de gerenciamento de biblioteca	SENAPPEN	N325, N4431
M060	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 18 meses	A0072	Contratar manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP do DEPEN e seus terminais	CGISE/STI	N375, N3455

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M059	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	Até 03 meses	A0071	Contratar manutenção do SINESP	SENASP	N515, N535, N4431
M042	Quantidade de servidores que atuam na área de SIC Capacitados	(Quantidade de Servidores que Atuam na Área de SIC Capacitados/ Quantidade Total de Servidores que Atuam na Área de SIC) * 100	100%	Até 06 meses	A0052	Capacitar servidores que atuam na área de SIC	CGISP/STI	N641, N3463
M033	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0043	Adquirir equipamento localizador comunicador satelital bidirecional	SENASP	N305, N309, N4431
M032	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 24 meses	A0042	Adquirir e distribuir tablets para o MJSP	CGISE/STI	N277, N279, N307, N59, N1359, N1285, N2429, N4157, N4121, N2439, N4433, N4615, N4655, N4653, N4733, N4777
M029	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0039	Adquirir de solução de videowall para doação	SENASP	N693, N1491, N1407, N4431
M026	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 24 meses	A0033	Adquirir sistema de gerenciamento de estoque	SENAPPEN	N361, N4431
M025	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 12 meses	A0032	Adquirir de servidores para doação	SENASP	N691, N1673, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
M024	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0031	Adquirir servidores para doação - DEPEN	SENAPPEN	N339, N341, N4431
M023	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0030	Adquirir servidores para doação - RIBPG	SENASP	N231, N4429
M022	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0027	Adquirir rastreadores veiculares para doação	SENASP	N559, N1611, N4431
M020	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0025	Adquirir licenças de software para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SENASP	SENASP	N247, N249, N3885, N4431
M019	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0022	Adquirir licenças de software para apresentações não lineares	SENASP	N285, N4431
M013	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0015	Adquirir licenças de software de edição gráfica	CGISE/STI	N293, N4433
M011	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0013	Adquirir licenças de software CAD	CGISE/STI	N291, N4433
M010	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições/Total	100%	Até 18 meses	A0011	Adquirir impressoras para doação	SENAPPEN	N327, N1255, N4431

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Tempo de atendimento	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade Atendida
		de aquisições previstas) *100						
M008	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0009	Aquisição de equipamentos de TIC para videoconferência	CGISP/STI	N757, N759, N221, N223, N81, N815, N823, N753, N761, N763, N683, N685, N73, N61, N751, N357, N655, N369, N765, N53, N345, N793, N1681, N1667, N1665, N1649, N1647, N1637, N1635, N1625, N1621, N1617, N1585, N1581, N1545, N1543, N1521, N1519, N1515, N1499, N1321, N1319, N1307, N1305, N1279, N1275, N1263, N1249, N1229, N1227, N349, N2377, N2491, N2499, N4429
M006	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0006	Adquirir computadores e periféricos para doação - SEOPI	SENASP	N717, N719, N721, N803, N1675, N1671, N1669, N1399, N2453, N4431
M005	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 06 meses	A0005	Adquirir computadores e periféricos para doação - SENASP	SENASP	N539, N551, N239, N245, N1225, N1603, N4125, N3883, N4431
M003	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	Até 18 meses	A0003	Adquirir computadores e periféricos para doação - DEPEN	SENAPPEN	N337, N1253, N2451, N2423, N4431, N4423

Tabela 8: Plano de Metas e Ações das Necessidades de TIC
